

THE REPUBLIC OF IRAQ
COUNCIL OF MINISTERS
RECONSTRUCTION FUND OF THE
AREAS AFFECTED BY THE
TERRORIST OPERATIONS



جمهورية العراق
مجلس الوزراء
صندوق إعادة اعمار المناطق
المتضررة من العمليات الارهابية



الية عمل الصندوق:

- يعمل الصندوق كمنسق ومراقب على تنفيذ القروض التي تقدم للعراق مثل قرض البنك الدولي وقرض بنك التنمية الألماني والتي تنفذ من قبل الوزارات القطاعية.
- كما ويعمل الصندوق كمنفذ للمشاريع التي تقدم له من المحافظات المتضررة من خلال المبالغ المرصودة من الموازنة الاتحادية او من خلال المنح (المنحة الكويتية للقطاع الصحي والمنحة الصينية لأليات البلديات).
- شملت المرحلة الأولى من المشاريع التي نفذها الصندوق من خلال الموازنة الفدرالية لعام ٢٠١٦ ما مجموعه ١٥٢ مشروعا صغيرا في كافة القطاعات ولكافة المحافظات وبمبلغ لا يزيد عن ٢٠ مليار دينار عراقي.

مشاريع صندوق إعادة الاعمار من الموازنة الفدرالية

الكلفة الكلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار لعام ٢٠١٧ من الموازنة الفدرالية 150,000,000,000 دينار

الكلفة الكلية لمشاريع الخطة الاستثمارية ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار

الكلفة الكلية لمشاريع البرامج الخاصة ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار

عدد المشاريع ضمن خطة الصندوق (الاستثمارية والبرامج الخاصة) ٢٠٠ مشروع

مشاريع صندوق إعادة الاعمار من الموازنة الفدرالية لغاية ١٨/٢/٢٠٢٨

مشروع ١٥٧

- عدد المشاريع قيد التنفيذ

عدد مشاريع الخطة الاستثمارية والتي هي قيد التنفيذ

٨٨

مشروع

كلفة مشاريع الخطة الاستثمارية والتي هي قيد التنفيذ

٦٧,٦٦٨,٠٥١,٢٠٠

دينار

المحافظة	عدد المشاريع	الكلفة (دينار)
محافظة الانبار	٣١	٣٦,٨٣٢,٠٢٣,٨٠٠
محافظة صلاح الدين	١٠	٦,٨٩٠,٢٤٦,٠٠٠
محافظة كركوك	٢	٦١٣,٨٥٢,٠٠٠
محافظة نينوى	٢٥	١٣,٠٢٦,٠٦٨,٩٠٠
محافظة بغداد/ حزام بغداد	٨	٤,٧٣٤,٧٢٢,٠٠٠
محافظة ديالى	١١	٤,٧٥١,٣٥٢,٥٠٠
المجموع	<u>٨٨</u>	<u>٦٧,٦٦٨,٠٥١,٢٠٠</u>

عدد مشاريع البرامج الخاصة والتي هي قيد التنفيذ

٦٩

مشروع

كلفة مشاريع البرامج الخاصة والتي قيد التنفيذ

٢٣,٩٩٠,١٣٤,٨٧٩

دينار

المحافظة	عدد المشاريع	الكلفة (دينار)
محافظة الانبار	٢١	١١,٣٥٢,٦٩٧,٠٠٠
محافظة صلاح الدين	١٧	٥,١٠٧,٨١٣,٠٠٠
محافظة كركوك	٩	٢,٢٩١,٧٥٥,٠٠٠
محافظة نينوى	٧	٢,٤٣٤,٣٩٦,٥٠٠
محافظة بغداد / حزام بغداد	٥	١,١٦٧,٠١٨,٣٧٠
محافظة ديالى	٤	٤٩٢,١٥٠,٠٠٠
محافظة بابل / شمال بابل	٦	١,١٤٤,٣٠٥,٠٠٠
المجموع	<u>٦٩</u>	<u>٢٣,٩٩٠,١٣٤,٨٧٩</u>

المشاريع التي يعمل الصندوق كمنسق لها من خلال القروض والمنح

مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي

الصحة	قطاع الطرق والجسور	قطاع البلديات	قطاع الكهرباء	
٣	٣٩	٣٩	٣١	المشاريع
٤٢,٠٠٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	الكلفة (دولار)
			<u>٣١٧,٠٠٠,٠٠٠</u>	<u>الكلفة الكلية</u>
		دولار		

مشاريع القرض الألماني

قطاع الكهرباء		
١٠ مشاريع محافظة نينوى ٣ مشروع محافظة الانبار ٢ مشروع محافظة صلاح الدين	١٥	عدد المشاريع
<u>دولار</u>	<u>١٩٠,٨٨٩,٨٦٨</u>	<u>الكلفة الكلية</u>

مشاريع المنحة الكويتية (منفذ ومنسق)

قطاع الصحة		
مؤسسات صحية	١٩	المشاريع
<u>دولار</u>	<u>١٥,٠٠٠,٠٠٠</u>	<u>الكلفة الكلية</u>

مشاريع المنحة الصينية

	قطاع البلديات	
(تجهيزات ، مواد احتياطية، تدريب كوادر)	١	المشاريع
دولار	<u>٩,٢٠٠,٠٠٠</u>	<u>الكلفة الكلية</u>

مشاريع المنحة التشيكية

قطاع الصحة	قطاع الكهرباء	
٤	٧	المشاريع
دولار	<u>٤٥٨,٠٠٠</u>	<u>الكلفة الكلية</u>



الانبار

مشاريع محافظة الانبار

مشاريع محافظة الانبار
الخطة الاستثمارية

ت	المشروع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	تكلفة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	الاستحقاق المالي حسب نسبة الإنجاز الفعلي	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
1	ثانوية العلا للبنات / ١٨ صف الرمادي/الانبار	33 25 13.0N 43 18 28.2E	650	210	1,066,033,000	23/07/2017	06/08/2017	81%	81%	0%	863,486,730	271,643,800	توقف العمل بسبب تأخر صرف السلعة
2	ثانوية التواكب للبنات /ثانوية/ ١٨ صف/الرمادي/الانبار	33 ° 24 37.3N 43° 16 42.6E	450	190	1,070,000,000	24/07/2017	09/08/2017	85%	88%	0%	941,600,000	342,017,540	توقف العمل بسبب تأخر صرف السلعة
3	ثانوية دار السلام للبنين /ثانوية/ ١٨ صف /هيت /الانبار	33 39 03.0N 42 49 48.3E	650	190	1,144,525,000	30/07/2017	21/08/2017	90%	85%	0%	972,846,250	459,040,800	توقف العمل بسبب تأخر صرف السلعة
4	مدرسة أبو أيوب الأنصاري للبنين /ابتدائية/ ١٢ صف/ الترمه/الطوجة/ الانبار	33 23 31.4N 43 52 50.8E	450	160	659,631,000	30/07/2017	17/08/2017	80%	80%	0%	527,704,800	152,770,240	توقف العمل بسبب تأخر صرف السلعة
5	مدرسة صعدة الابتدائية المختلطة الابتدائية ١٢ صف/الترمه/الطوجة/ الانبار	33 33 14.7N 44 06 14.5E	450	170	585,985,000	31/07/2017	13/08/2017	75%	75%	0%	439,488,750	152,958,000	توقف العمل بسبب تأخر صرف السلعة
6	مدرسة الوفاء الابتدائية للبنين ١٢ صف /الرمادي / الانبار	33° 25 50.2N 43° 21 22.0E	450	165	598,000,000	02/08/2017	15/08/2017	85%	90%	0%	538,200,000	197,635,650	توقف العمل بسبب تأخر صرف السلعة
7	ثانوية الرضاه للبنين الثانوية ١٨ صف/ الترمه/الطوجة/ الانبار	33 23 57.2N 43 36 01.7E	650	210	1,093,229,000	02/08/2017	17/08/2017	43%	43%	0%	470,088,470	279,442,600	
8	مدرسة الاثنان الابتدائية للبنين ١٢ صف /جزيرة الرمادي / الانبار	33 28 03.5N 43 18 04.6E	450	180	611,468,000	02/08/2017	15/08/2017	90%	72%	18%	440,256,960	171,045,500	توقف العمل بسبب تأخر صرف السلعة
9	اعدادية حلينة السعيدة للبنات ١٢ صف /الرمادي / الانبار	33° 26' 00.0N 43° 22' 05.6E	450	180	599,981,000	03/08/2017	08/08/2017	85%	85%	0%	509,983,850	147,320,990	توقف العمل بسبب تأخر صرف السلعة
10	مدرسة الصمد الابتدائية ١٢ صف/ هيت/ الانبار	33 37 55.3N 42 50 26.8E	450	170	639,571,000	03/08/2017	21/08/2017	95%	92%	0%	588,405,320	196,550,040	توقف العمل بسبب تأخر صرف السلعة
11	متوسطة المأمون ١٨ صف /الرمادي/الانبار	33 25 17.0N 43 19 57.9E	650	210	1,266,865,000	03/08/2017	15/08/2017	76%	76%	0%	962,817,400	337,812,400	توقف العمل بسبب تأخر صرف السلعة
12	مدرسة مجلة الابتدائية للبنين ١٢ صف/ الرمادي / الانبار	33 25 39.2N 43 17 01.6E	450	170	592,525,000	03/08/2017	16/08/2017	82%	82%	0%	485,870,500	176,128,660	توقف العمل بسبب تأخر صرف السلعة
13	البيئية الابتدائية المختلطة ١٢ صف / الترمه/ الطوجة/ الانبار	33 29 46.6N 44 06 14.5E	450	160	614,777,000	03/08/2017	13/08/2017	34%	34%	0%	209,024,180	0	توقف العمل بسبب تأخر صرف السلعة
	المجموع		7100		10,542,590,000							2,884,366,220	

مشاريع محافظة الأنبار
الخطة الاستثمارية

ت	المشروع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	المبلغ المستحق حسب نسبة الإنجاز الفعلي	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
14	مدرسة الخضراء الابتدائية ١٢ صف / الصفاتوية/الطووجة/الأنبار	33 27 50.4N 43 36 27.3E	450	150	573,888,800	03/08/2017	25/10/2017	27%	27%	0%	154,949,976	0	تأخر المباشرة لوجود مطجرات في ارض المدرسة
15	مدرسة السلوى الابتدائية ١٨ صف/ الطووجة/ الأنبار	33 19 49.2N 43 47 49.5E	650	210	1,078,596,000	03/08/2017	15/08/2017	80%	80%	0%	862,876,800	271,120,000	
16	مدرسة أبي ذر الغفاري الابتدائية للبنات ١٢ صف /جزيرة الرمادي/ الأنبار	33 27 29.1N 43 16 17.7E	450	180	631,520,000	03/08/2017	09/08/2017	100%	100%	0%	631,520,000	212,861,000	المشروع منجز
17	مدرسة المروج الخضراء الابتدائية ١٢ صف/ الطووجة/ الأنبار	33 25 31.6N 43 10.7E	450	180	595,000,000	13/08/2017	23/08/2017	63%	63%	0%	374,850,000	150,142,480	توقف العمل بسبب عدم صرف السلعة
18	مدرسة عامر بن ربيعة ١٢ صف/ حديثة/ الأنبار	33 00 16.3N 42 26 13.6E	450	170	688,586,000	13/08/2017	05/09/2017	90%	90%	0%	619,727,400	203,161,060	
19	مدرسة الخالد الابتدائية ١٢ صف / الطووجة/ الأنبار	33 26 49.3N 43 44 37.4E	450	170	651,962,500	13/08/2017	10/09/2017	58%	58%	0%	378,138,250	169,579,400	توقف العمل بسبب عدم صرف السلعة
20	مدرسة الفتوة الابتدائية للبنين ١٢ صف/ الرمادي/ الأنبار	33 26 00.0N 43 22 05.6E	450	180	594,113,000	13/08/2017	23/08/2017	85%	85%	0%	504,996,050	148,562,221	توقف العمل بسبب عدم صرف السلعة
21	ثانوية جبة للبنين ١٢ صف / البغدادي/هيتا/ الأنبار	33 54 33.0N 42 33 04.6E	450	160	575,131,000	13/08/2017	23/08/2017	90%	80%	10%	460,104,800	191,179,000	
22	مدرسة دار العلم الابتدائية ١٢ صف / الرمادي/ الأنبار	33 24 44.5N 43 18 24.5E	450	170	611,635,000	13/08/2017	27/08/2017	75%	80%	0%	489,308,000	202,226,950	توقف العمل بسبب عدم صرف السلعة
23	متوسطة خالد بن الوليد ١٢ صف/ الترمه/ الطووجة/ الأنبار	33 42 17.7N 43 55 18.8E	450	180	669,928,000	13/08/2017	20/08/2017	58%	58%	0%	388,558,240	0	
24	ثانوية الصهايب للبنين ١٢ صف/ الطووجة/ الأنبار	33 23 02.4N 43 51 59.1E	450	160	672,513,500	13/08/2017	27/08/2017	58%	58%	0%	170,023,700	0	
25	ثانوية الرصدية للبنين ١٢ صف /الرمادي/ الأنبار	33 24 04.0N 43 19 58.1E	450	165	577,451,000	14/08/2017	06/09/2017	60%	65%	0%	161,036,000	0	توقف العمل بسبب عدم صرف السلعة
	المجموع		5600		7,920,324,800							1,548,832,111	

مشاريع محافظة الانبار
الحطة الاستثمارية

ت	المشروع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	المبلغ المستحق حسب نسبة الإنجاز الفعلي	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
26	مدرسة جنة الماوي الابتدائية للبنين ١٢ صف / الرمادي / الانبار	33 25 54.3N 43 12 40.1E	450	170	573,900,500	15/08/2017	06/09/2017	72%	80%	0%	459,120,400	151,742,300	توقف العمل بسبب عدم صرفها السلعة
27	متوسطة الشيماء للبنات ١٢ صف / هيت / الانبار	33 38 16.8N 42 49 34.1E	450	180	667,409,500	23/08/2017	23/08/2017	100%	100%	0%	667,409,500	211,580,140	تم انجاز المشروع
28	اعدادية صناعة الصفاوية ١٨ صف / الصفاوية / الطوجة / الانبار	33 24 02.3N 43 42 05.6E	650	180	1,195,056,000	24/08/2017	11/10/2017	25%	25%	0%	298,764,000	0	تأخر المباشرة بسبب وجود ترشحات متعددة سابقا في الموقع
29	مشروع ناظم التورار			570	7,038,189,000	07/11/2017	19/11/2017	7%	7%	0%	492,673,230		
30	اعادة اعمار ناظم سدة الرمادي على نهر الفرات		10,000,000	570	6,911,239,000	07/11/2017	19/11/2017	7%	8%	0%	552,899,120		
31	اعادة تاهيل جسر هيت الحديدي		200,000	180	1,983,315,000	07/12/2017	17/12/2017	10%	9%	0%	178,498,350		
	المجموع		10,201,550		36,832,023,800							363,322,440	

مشاريع محافظة الانبار
البرامج الخاصة

ت	المشروع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	المبلغ المستحق حسب نسبة الإنجاز الفعلي (الإنجاز المالي)	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
1	اصلاح وتاهيل طريق الرمادي- هيت/ الرمادي/ الانبار	33 25 36.6N 42 58 36.1E	400,000	145	285,000,000	30/07/2017	21/08/2017	100%	80%	20%	228,000,000	101,750,000	
2	إعادة انشاء القسم البلدي السادس/ الرمادي الانبار	33 24 46.0N 43 12 51.0E	100,000	180	220,575,000	02/08/2017	29/08/2017	100%	100%	0%	220,575,000	194,999,300	تم انجاز المشروع
3	تاهيل بداية الاتسام الداخلية في قضاء الطوجة/ الانبار			80	211,829,000	15/10/2017	29/10/2017	100%	97%	0%	0	106,359,000	
4	تاهيل المحطات الآروانية في جزيرة وشامية الرمادي/ الانبار			90	877,170,000	17/10/2017	29/10/2017	88%	88%	0%	771,909,600	275,560,000	
5	تاهيل محطات البزل في جزيرة وشامية الرمادي/ الانبار												
6	إعادة انشاء قنطرة في البوعينة												
7	إعادة انشاء السياج الأمني لقضاء هيت / الانبار				99,750,000	تنفيذ امانة	١	100%	100%	0%	99,750,000	99,750,000	تم انجاز المشروع
8	مجمع ماء الحميدية				100,000,000	تنفيذ امانة	١	100%	100%	0%	100,000,000	100,000,000	تم انجاز المشروع
9	مجمع ماء الصبيحات				36,800,000	تنفيذ امانة	١	100%	100%	0%	36,800,000	36,800,000	تم انجاز المشروع
10	تجهيز وتنفيذ وتنصيب محطة تحويل الحضرة ٣٣/١١ كي في ساعة ٣١.٥٢٢ ام في أي/ هيت/الانبار			90	361,000,000	18/10/2017	30/10/2017	65%	70%	0%	252,700,000	0	
11	تاهيل شارع المعارض التي تقاطع الفرسان في الرمادي/ الانبار			140	2,123,020,000	22/10/2017	05/11/2017	65%	43%	22%	912,898,600	482,636,250	عدم انجاز اعمال المجاري
12	تاهيل شارع من تقاطع الفرسان الي تقاطع شارع (٢٠) الرمادي/الانبار			140	967,828,000	22/10/2017	06/11/2017	56%	60%	0%	580,696,800	242,938,000	
13	تجهيز وتنصيب محطة تحويل الممثل ٣٣/١١ كي في /هيت/الانبار			140	472,473,000	22/10/2017	14/11/2017	45%	56%	0%	264,584,880	167,634,000	
	المجموع		0		5,755,445,000								

مشاريع محافظة الانبار
البرامج الخاصة

ت	المشروع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	المبلغ المستحق حسب نسبة الإنجاز الفعلي (الإنجاز المالي)	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
14	إعادة تاهيل خط كهرباء عرب بغداد - حديثة ٤٠٠ كي في عموم محافظة الانبار			140	2,710,350,000	25/10/2017	14/11/2017	25%	موقوف	موقوف			
15	تاهيل ابنية دائرة البلدية / القسم البلدي الثاني / الرمادي / الانبار			170	373,752,000	26/10/2017	06/11/2017	52%	52%	0%	194,351,040		
16	تاهيل ابنية دائرة البلدية القسم البلدي الرابع / الرمادي الانبار												
17	إعادة انشاء مديرية شرطة نموذجية في قضاء الفلوجة			150	974,585,000	30/10/2017	19/11/2017	46%	48%	0%	467,800,800		
18	الضارح الرابط بين تقاطع ضارح عشرين الى ضارح الملعب			120	983,270,000	12/11/2017	14/11/2017	65%	70%	0%	688,289,000	447,431,500	
19	العبارة النهريه في هيت (المانتونات)			30	194,400,000	14/11/2017	23/11/2017	100%	100%	0%	194,400,000	116,685,000	
20	تاهيل بداية قسمي الفيزياء والعربي في كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة الانبار			75	360,895,000	04/12/2017		55%	69%	0%	249,017,550		
21	تاهيل بداية القاعات الدراسية في كلية الزراعة / جامعة الانبار												
	المجموع		500,000		11,352,697,000								

مشاريع محافظة الانبار
البرامج الخاصة

ت	المشروع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	المبلغ المستحق حسب نسبة الإنجاز الفعلي (الإنجاز المالي)	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
14	إعادة تاهيل خط كهرباء عرب بغداد - حديثة ٤٠٠ كي في عموم محافظة الانبار			140	2,710,350,000	25/10/2017	14/11/2017	25%	موقوف	موقوف			
15	تاهيل ابنية دائرة البلدية / القسم البلدي الثاني/الرمادي/الانبار			170	373,752,000	26/10/2017	06/11/2017	52%	52%	0%	194,351,040		
16	تاهيل ابنية دائرة البلدية القسم البلدي الرابع / الرمادي الانبار												
17	إعادة انشاء مديرية شرطة نمونجية في قضاء الفلوجة			150	974,585,000	30/10/2017	19/11/2017	46%	48%	0%	467,800,800		
18	الضارح الرابط بين تقاطع ضارح عشرين الى ضارح الملعب			120	983,270,000	12/11/2017	14/11/2017	65%	70%	0%	688,289,000	447,431,500	
19	العبارة النهريه في هيت (البياتونيات)			30	194,400,000	14/11/2017	23/11/2017	100%	100%	0%	194,400,000	116,685,000	
20	تاهيل بداية قسمي الفيدياء والعربي في كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة الانبار			75	360,895,000	04/12/2017		55%	69%	0%	249,017,550		
21	تاهيل بداية القاعات الدراسية في كلية الزراعة / جامعة الانبار												
	المجموع		500,000		11,352,697,000								

مشاريع محافظة الاتبار

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Cost	Half 1	Half 2	Half 1	Half 2	Half 1	Half 2	Half 1
1	-	570 days	03/08/2017	09/10/2019	61%	IQD 48,184,720,800.00							
2	مشاريع الخططة الاستثمارية	570 days	03/08/2017	09/10/2019	59%	IQD 36,832,023,800.00							
3	حديقة العلاء للبنات / ١٨ صفه الرمادي/الاتبار	210 days	06/08/2017	24/05/2018	81%	IQD 1,066,033,000.00							
4	حديقة التوتاب للبنات /حديقة/١٨ صفه/الرمادي/الاتبار	190 days	09/08/2017	01/05/2018	88%	IQD 1,070,000,000.00							
5	حديقة دار السلام للبنين /حديقة/١٨ صفه /هيت /الاتبار	190 days	21/08/2017	11/05/2018	85%	IQD 1,144,525,000.00							
6	مدرسة ابو ايوب الانتصاري للبنين /البنائية/١٢ صفه/ الترميم/الطوجة/ الاتبار	160 days	17/08/2017	28/03/2018	80%	IQD 659,631,000.00							
7	مدرسة صعدة الابتدائية /المستطلة الابتدائية ١٢ صفه/الترميم/الطوجة/ الاتبار	170 days	13/08/2017	05/04/2018	75%	IQD 585,985,000.00							
8	مدرسة الوشاء الابتدائية للبنين ١٢ صفه /الرمادي / الاتبار	165 days	15/08/2017	02/04/2018	90%	IQD 598,000,000.00							
9	حديقة الرشاد للبنين /حديقة/١٨ صفه/ الترميم/الطوجة/ الاتبار	210 days	17/08/2017	06/06/2018	43%	IQD 1,093,229,000.00							
10	مدرسة الاثنان الابتدائية للبنين ١٢ صفه /جزيرة الرمادي / الاتبار	180 days	15/08/2017	23/04/2018	72%	IQD 611,468,000.00							
11	اعدانية حليلة السعيدة للبنات ١٢ صفه /الرمادي / الاتبار	180 days	08/08/2017	16/04/2018	85%	IQD 599,981,000.00							
12	مدرسة الصعد الابتدائية ١٢ صفه/ هيت/ الاتبار	170 days	21/08/2017	13/04/2018	92%	IQD 639,571,000.00							
13	مدرسة العامون ١٨ صفه /الرمادي/الاتبار	210 days	15/08/2017	04/06/2018	76%	IQD 1,266,865,000.00							

مشاريع محافظة الانبار

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Cost	Half 1	Half 2	Half 1	Half 2	Half 1	Half 2	Half 1
14	مدرسة مجلة الابتدائية للبنين ١٢ صف الرمادي / الانبار	170 days	16/08/2017	10/04/2018	82%	IQD 592,525,000.00							
15	السيولة الابتدائية المخططة ١٢ صف / الترمة/ الطوجة/ الانبار	160 days	13/08/2017	22/03/2018	34%	IQD 614,777,000.00							
16	مدرسة الخضراء الابتدائية ١٢ صف الصفوانية/الطوجة/الانبار	150 days	03/08/2017	28/02/2018	27%	IQD 573,888,800.00							
17	مدرسة السلوى الابتدائية ١٨ صف/ الطوجة/ الانبار	210 days	15/08/2017	04/06/2018	80%	IQD 1,078,596,000.00							
18	مدرسة ابن نر الطغاري الابتدائية للبنات ١٢ صف جزيرة الرمادي / الانبار	180 days	09/08/2017	17/04/2018	100%	IQD 631,520,000.00							
19	مدرسة العروج الخضراء الابتدائية ١٢ صف/ الطوجة/ الانبار	180 days	23/08/2017	01/05/2018	63%	IQD 595,000,000.00							
20	مدرسة عامر بن ربيعة ١٢ صف/ حبيشة/ الانبار	170 days	05/09/2017	30/04/2018	90%	IQD 688,586,000.00							
21	مدرسة خالد الابتدائية ١٢ صف /الطوجة/ الانبار	170 days	10/09/2017	03/05/2018	58%	IQD 651,962,500.00							
22	مدرسة الصفاة الابتدائية للبنين ١٢ صف/ الرمادي / الانبار	180 days	23/08/2017	01/05/2018	85%	IQD 594,113,000.00							
23	شعبية جبة للبنين ١٢ صف / البهادي/البيت/ الانبار	160 days	23/08/2017	03/04/2018	80%	IQD 575,131,000.00							
24	مدرسة دار العلم الابتدائية ١٢ صف / الرمادي / الانبار	170 days	27/08/2017	19/04/2018	80%	IQD 611,635,000.00							
25	مدرسة خالد بن الوليد ١٢ صف/ الترمة/ الطوجة/ الانبار	180 days	20/08/2017	26/04/2018	58%	IQD 669,928,000.00							

مشاريع محافظة الانبار

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Cost	Half 1	Half 2	Half 1	Half 2	Half 1	Half 2	Half 1
26	خفوية الصهايب للبنين ١٢ صف/ الطوجة/ الانبار	160 days	27/08/2017	05/04/2018	58%	IQD 672,513,500.00							
27	خفوية الرصينية للبنين ١٢ صف /الرمادي / الانبار	165 days	06/09/2017	24/04/2018	65%	IQD 577,451,000.00							
28	مدرسة جنة العاوي الابتدائية للبنين ١٢ صف الرمادي / الانبار	170 days	06/09/2017	01/05/2018	80%	IQD 573,900,500.00							
29	متوسطة الصيماء للبنات ١٢ صف/ هيتا/ الانبار	180 days	23/08/2017	01/05/2018	100%	IQD 667,409,500.00							
30	اعدادية صناعة الصفلاوية ١٨ صف/ الصفلاوية/الطوجة/ الانبار	180 days	24/08/2017	02/05/2018	25%	IQD 1,195,056,000.00							
31	مشروع ناظم الورد	570 days	03/08/2017	09/10/2019	7%	IQD 7,038,189,000.00							
32	اعادة اعمار ناظم سدة الرمادي على نهر الفرات	570 days	03/08/2017	09/10/2019	8%	IQD 6,911,239,000.00							
33	اعادة تاهيل جسر هيت الحديدي	180 days	03/08/2017	11/04/2018	9%	IQD 1,983,315,000.00							
34	البرامج الخاصة	186 days	21/08/2017	07/05/2018	67%	IQD 11,352,697,000.00							
35	اصلاح وتاهيل طريق الرمادي-هيت	145 days	21/08/2017	09/03/2018	100%	IQD 285,000,000.00							
36	إعادة انشاء القسم البلدي الساس	180 days	29/08/2017	07/05/2018	100%	IQD 220,575,000.00							
37	تاهيل بنية الاتسام الداخلية في قضاء الطوجة	80 days	21/08/2017	08/12/2017	100%	IQD 211,829,000.00							
38	تاهيل المحطات الأروانية وتاهيل محطات البرول في جزيرة وشامية الرمادي واعادة انشاء شفاط في اليوحينة	90 days	21/08/2017	22/12/2017	88%	IQD 877,170,000.00							

مشاريع محافظة الانبار

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Cost	Half 1		Half 2		Half 1		Half 2		Half 1	
39	إعادة انشاء السياج الامني لقضاء هيئ	30 days	21/08/2017	29/09/2017	100%	IQD 99,750,000.00										
40	مجمع ماء الصيفية	30 days	21/08/2017	29/09/2017	100%	IQD 100,000,000.00										
41	مجمع ماء الصيحات	30 days	21/08/2017	29/09/2017	100%	IQD 36,800,000.00										
42	تجهيز وتنفيذ وتصيب محطة تحويل الحضرة ٣٣/١١ كي في ساعة ٣١.٥*٢ أم في أي /هت/الانبار	90 days	21/08/2017	22/12/2017	70%	IQD 361,000,000.00										
43	تاهيل شارع المعارض الى تقاطع الفرسان في الرمادي / الانبار	140 days	21/08/2017	02/03/2018	43%	IQD 2,123,020,000.00										
44	تاهيل شارع من تقاطع الفرسان الى تقاطع شارع (٢٠) الرمادي/الانبار	140 days	21/08/2017	02/03/2018	60%	IQD 967,828,000.00										
45	تجهيز ونصب محطة تحويل المضط ٣٣/١١ كي في هيت/الانبار	140 days	21/08/2017	02/03/2018	56%	IQD 472,473,000.00										
46	إعادة تاهيل خط كهرباء عرب بغداد - حديثة ٤٠٠ كي في /عموم محافظة الانبار	140 days	21/08/2017	02/03/2018	0%	IQD 2,710,350,000.00										
47	تاهيل ابنية دائرة البلدية /القسم البلدي (الثاني والرابع) /الرمادي/الانبار	170 days	21/08/2017	13/04/2018	52%	IQD 373,752,000.00										
48	إعادة انشاء مديرية شرطة تموينية في قضاء الفلوجة	150 days	21/08/2017	16/03/2018	48%	IQD 974,585,000.00										
49	الشارع الرابط بين تقاطع شارع عشرين الى شارع الملعب	120 days	21/08/2017	02/02/2018	70%	IQD 983,270,000.00										
50	العبارة النهرية في هيت (البساتينات)	30 days	21/08/2017	29/09/2017	100%	IQD 194,400,000.00										

مشاريع محافظة الانبار

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Cost	Half 1	Half 2	Half 1	Half 2	Half 1	Half 2	Half 1
51	تأهيل بنىة قسمي الفيزياء والعربي في كلية التربية وبنىة القاعات الدراسية في كلية الزراعة/ جامعة الانبار	75 days	21/08/2017	01/12/2017	69%	IQD 360,895,000.00							



تأهيل مستشفى هیت العام/ الانبار

تأهيل مستشفى هیت العام/ الانبار



مدرسة الشیماء/ هیت/ الانبار

مدرسة الشیماء/ هیت/ الانبار



العبرة / مشروع مؤقت لحين اكمال تأهيل الجسر



تأهيل جسر هيت الحديدي / الانبار





القسم البلدي السادس / الرمادي / الانبار



القسم البلدي السادس / الرمادي / الانبار



مدرسة الفتوة الابتدائية/الرمادي/الانبار



مدرسة الفتوة الابتدائية/الرمادي/الانبار



سدة الرمادي على نهر الفرات/الرمادي/الانبار



سدة الرمادي على نهر الفرات/الرمادي/الانبار



محطة المشتل الثانوية ٣٣/١١ كي في /هيت/الانبار



محطة المشتل الثانوية ٣٣/١١ كي في /هيت/الانبار



الشارع الرابط بين تقاطع الفرسان إلى تقاطع شارع عشرين



مدرسة دار السلام / الانبار



مدرسة دار السلام / الانبار (صعوبة نقل مواد البناء)



مدرسة دار السلام / الانبار




(طريق الرمادي - هيت / انفجار لغم ارضي)



(طريق الرمادي - هيت / انفجار لغم ارضي)



(طريق الرمادي - هيت)

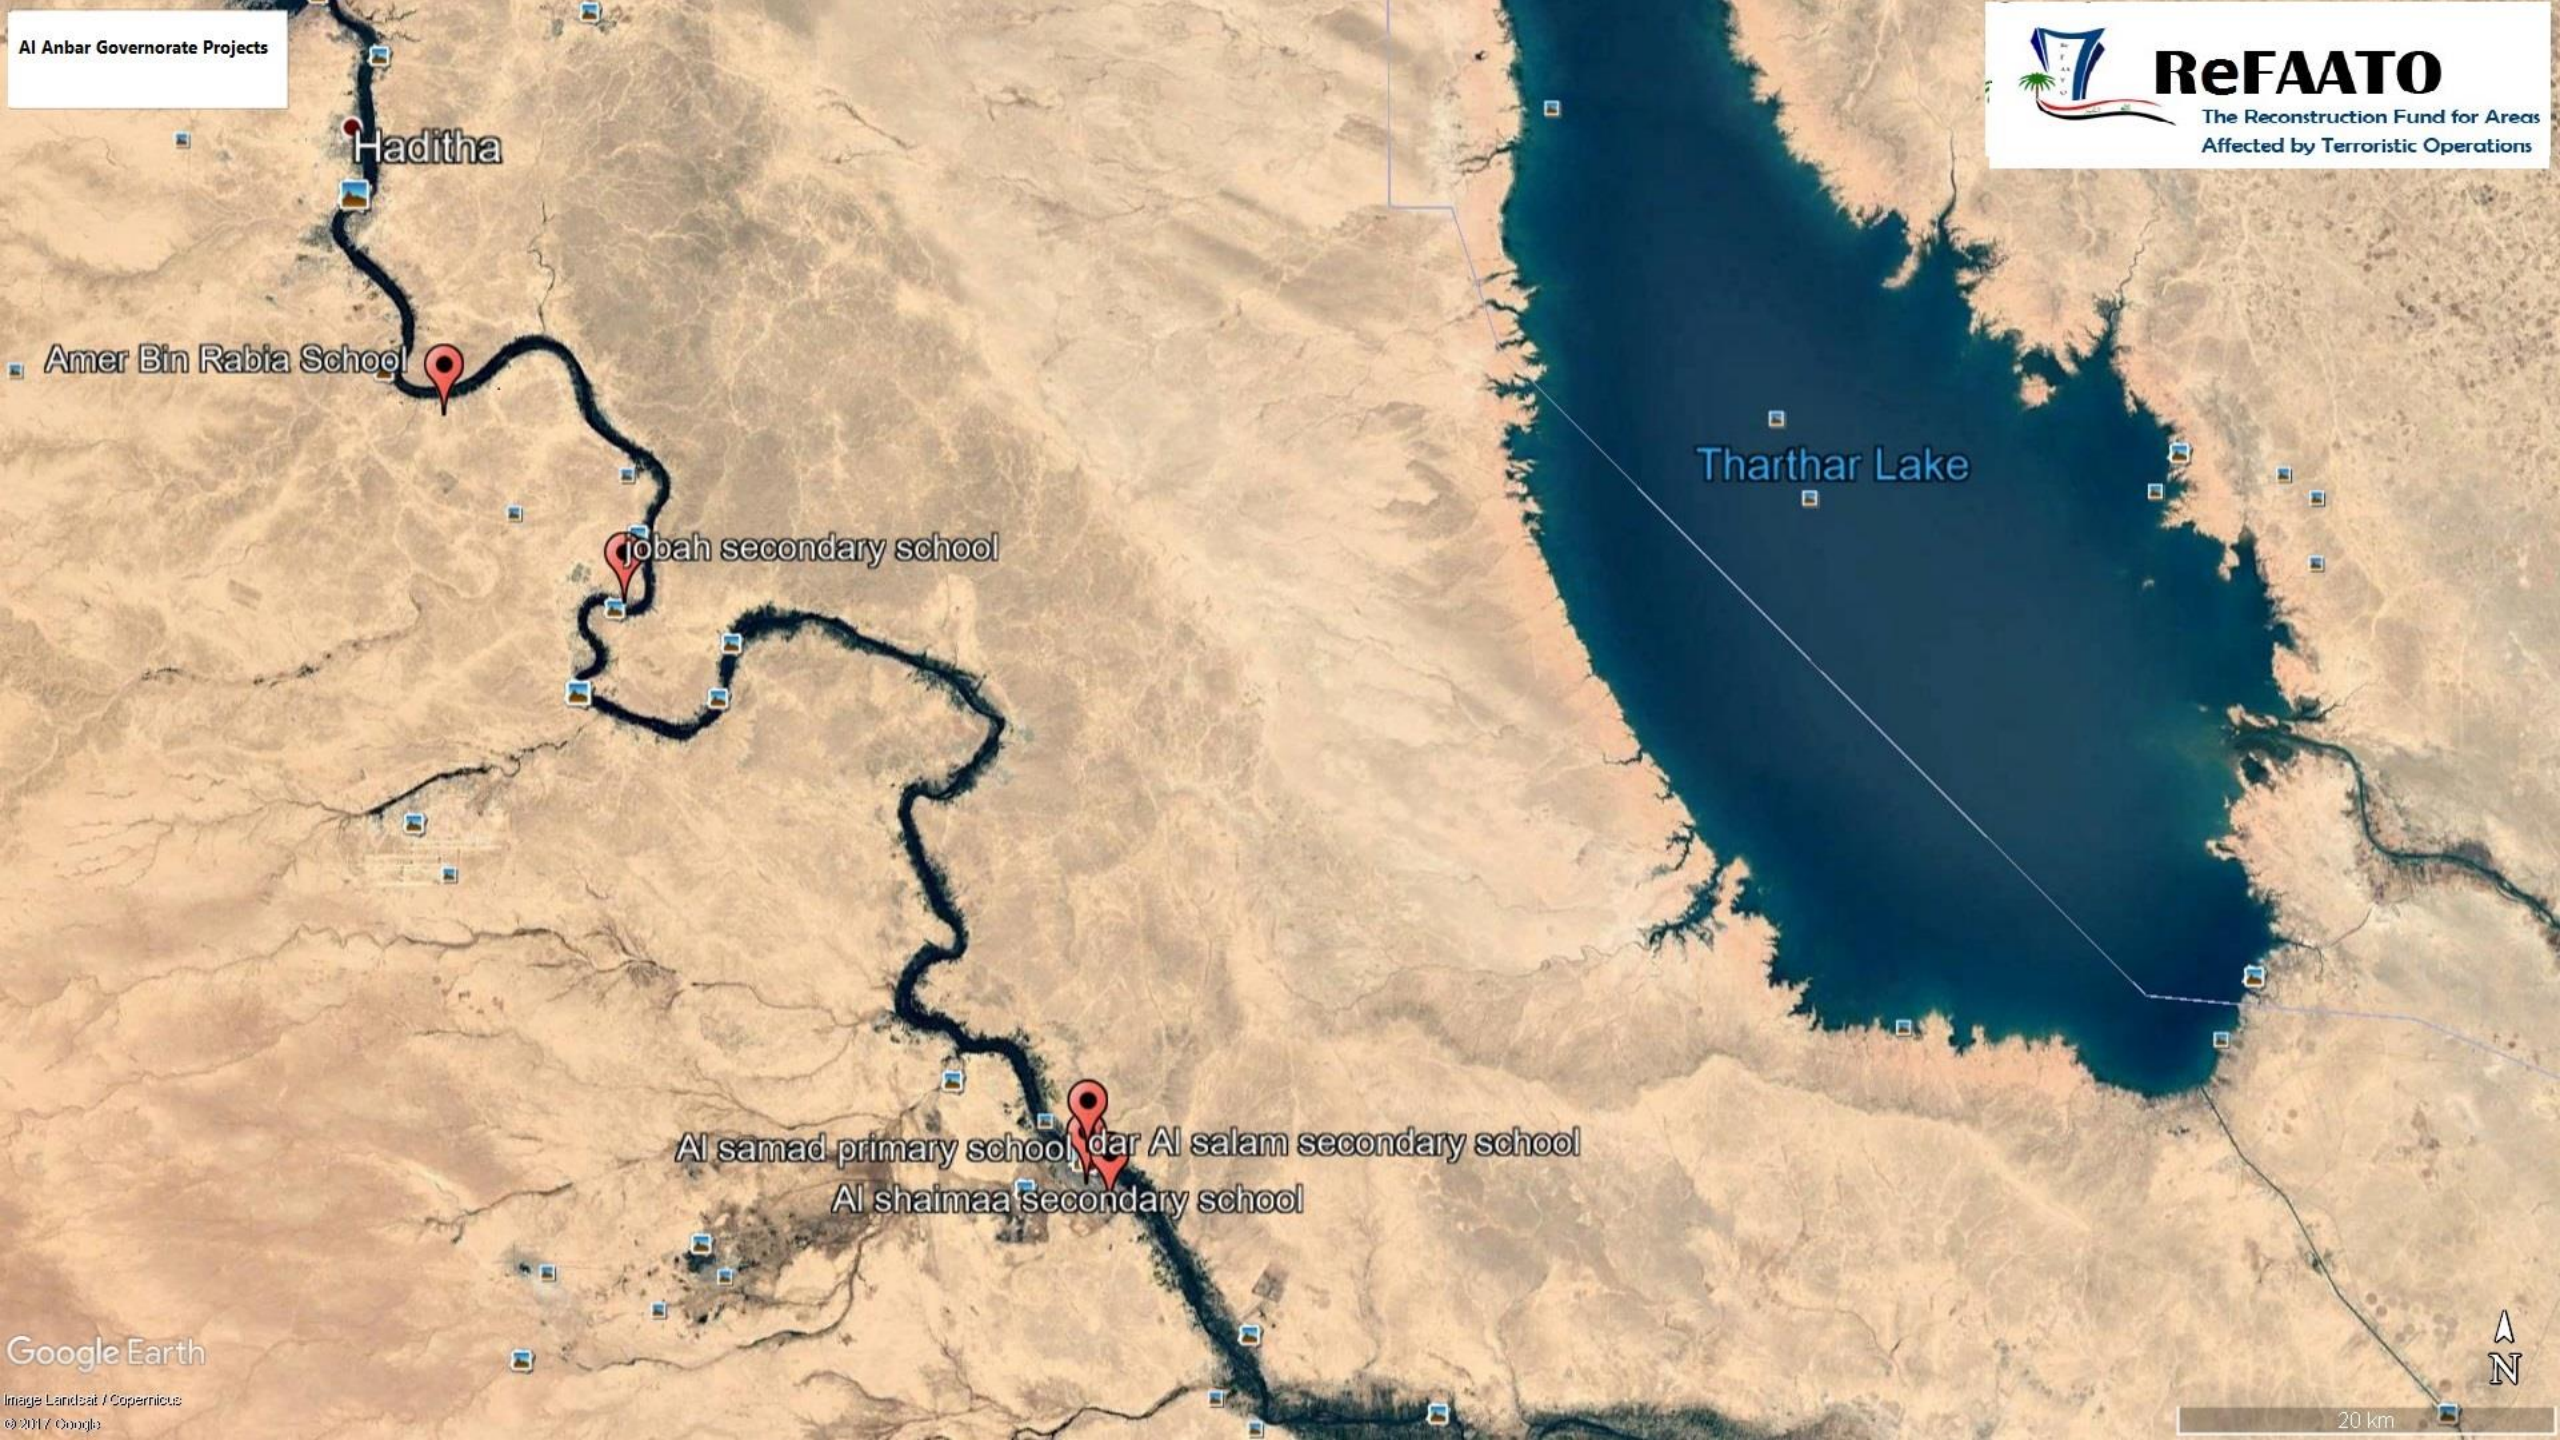

Haditha

Amer Bin Rabia School

Jobah secondary school

Al samad primary school

dar Al salam secondary school

Al shaimaa secondary school

Tharthar Lake



dar Al salam secondary school

primary school
Al shaimaa secondary school

Repair and rehabilitation of Ramadi-Hit street

Re-establishment of the municipal section VI

AbiDhar al - Ghafari
al afnan school

janat al maawa school Al - Fatwa Primary School Halima al Saadia school

Al maamoon secondary school al oula secondary school

dijla school daar al ilm school

Al Wafaa Primary School







ربيعة

زمار

بعشيقة

سنجار

تلعفر

الموصل

مشاريع محافظة نينوى

تل عبطة

الحضر

مشاريع محافظة نينوى
الخطة الاستثمارية

ت	المشروع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	الاستحقاق المالي حسب نسبة الإنجاز الفعلي	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
1	مدرسة العموري الابتدائية ١٢ صفاء / الفجيرة / نينوى	35° 59'43.8"N 43° 13'18.5"E	600	170	715,512,000	02/08/2017	16/08/2017	100%	70%	30%	500,858,400	0	الانحراف نتيجة التوقف للحصول على مواثقة توصيات المختبر
2	اعدادية الفجيرة للبنين ١٢ صفاء / الفجيرة / نينوى	35° 47'23.1"N 43° 17'23.4"E	600	180	687,989,900	02/08/2017	16/08/2017	100%	75%	25%	515,992,425	0	الانحراف نتيجة التوقف للحصول على مواثقة توصيات المختبر
3	ثانوية العموري للبنين ١٢ صفاء / الفجيرة / نينوى	36° 00'03.8"N 43° 13'36.0"E	600	170	750,236,000	02/08/2017	07/09/2017	88%	80%	8%	600,188,800	0	انتظار المواثقة على امر الفجيرة ومنح مدة إضافية عن التوقف بسبب تحوصات التربة
4	مدرسة اجطة الابتدائية للبنين ١٢ صفاء / الفجيرة / نينوى	35° 42'31.9"N 43° 17'58.5"E	600	160	737,710,000	02/08/2017	13/08/2017	100%	75%	25%	553,282,500	0	الانحراف نتيجة التوقف للحصول على مواثقة توصيات المختبر
5	تاهيل ابنية كلية الآداب / جامعة الموصل / نينوى		4000	140	1,414,930,000	02/08/2017	08/10/2017	63%	47%	16%	665,017,100	0	
6	تاهيل ابنية كلية التقانات وعلوم البيئة / جامعة الموصل / نينوى	36° 23.126"N 43° 8.471"E											
7	تاهيل ابنية كلية التمريض / جامعة الموصل / نينوى	36° 22.574"N 43° 8.948"E	4000	140	1,627,784,000	25/09/2017	03/10/2017	78%	68%	0%	1,106,893,120	0	تأخر السرعة في تنفيذ الاعمال
8	تاهيل ابنية كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل / نينوى	36° 22.696"N 43° 8.696"E											
9	تاهيل كلية طب الأسنان / جامعة الموصل / نينوى	36° 23.197"N 43° 8.919"E	2500	140	1,464,915,000	15/10/2017	29/10/2017	63%	75%	0%	1,098,686,250	0	
10	تاهيل كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى	36° 22.491"N 43° 8.637"E											
11	تاهيل بداية قسم الاعمار والمشاريع / جامعة الموصل / نينوى	36° 22.552"N 43° 8.762"E	4250	105	1,624,462,000	28/09/2017	11/10/2017	100%	40%	60%	649,784,800	0	تأخر السرعة المنفذة ، ومع توجيه كتاب الناز
12	تاهيل ابنية كلية العلوم / جامعة الموصل / نينوى	36° 22.557"N 43° 8.579"E											
13	تاهيل ابنية المراکز البحثية / جامعة الموصل / نينوى												
	المجموع		21400		10,595,488,900						0		

مشاريع محافظة نينوى
الخطة الاستثمارية

ت	المشروع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	الاستحقاق المالي حسب نسبة الإنجاز الفعلي	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
14	تاهيل ابنية كلية التربية / جامعة الموصل		4250	110	1,571,950,000	30/10/2017	14/11/2017	65%	82%	0%	1,288,999,000	0	
15	تاهيل ابنية كلية الهندسة / جامعة الموصل												
16	تاهيل سوارع وصنع القوالب في الصورة												
17	إعادة تاهيل واتساع سوارع رئيسية في حمام العليل												
18	تصنف أعمال تاهيل و اتساع سوارع مطرقة في مرتر ناحية الفيارة												
19	تاهيل واتساع سوارع مطرقة في مرتر ناحية الفيارة		400,000	70	1,484,600,000	05/11/2017	30/11/2017	100%	46%	54%	682,916,000	0	صيانة الامطار ، تأخر صرف السلعة الأولى، تأخر المصادقة على العدة الإضائية واوامر العيار
20	إعادة تاهيل المدخل الجنوبي للقصبية (سارع الصلاحية) مع تحويل العارض (أنبوب الماء) الموجود في وسط السارع في ناحية حمام العليل/ المرحلة الأولى												
21	إتساع سوارع داخل ناحية الصورة												
22	إتساع طرق داخلية في ناحية بعطيفة												
23	صيانة سوارع مطرقة في ناحية بعطيفة												
24	بناء القوالب الجانبية وصب الارصفة والقضبان في برطلة												
25	تثبيت مسارات شبكة مجاري في برطلة												
26	تاهيل محطة كهرباء باب البيض في الساحل الايمن	36 20 02 68N 43 07 32 57E			4,278,200,000		قيد التحليل	0%	0%	0%	0	0	قيد التحليل
	المجموع		404250		8,280,730,000								

مشاريع محافظة نينوى
الخطة الاستثمارية

ت	المشروع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	تكلفة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	الاستحقاق المالي حسب نسبة الإنجاز الفعلي	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
27	تاهيل محطة كهرباء النسيج في الساحل الايمن	36 19 11 05N 43 06 57 06E			4,042,351,000	قيد التحليل		0%	0%	0%	0	قيد التحليل	
28	تجهيز ونقل محولات قدرة سعة ١٦ mva نوع ONAN عدد (٣) + محولات توزيع سعة KVA ٢٥٠,٤٠٠	36 21 06 25N 43 12 46 82E			1,760,000,000	قيد التحليل		0%	0%	0%	0	قيد التحليل	
29	تاهيل محطة كهرباء الدواسة في الساحل الايمن	36 19 23 31N 43 08 05 83E			4,278,200,000	قيد التحليل		0%	0%	0%	0	قيد التحليل	
30	المعدات المطلوبة لورشة فحص وتصليح المحولات في الجانب الايمن	36 21 34 05N 43 01 34 28E			483,500,000	قيد التحليل		0%	0%	0%	0	قيد التحليل	
31	صب ارضة وبناء القوالب الجانبية للضارح الرئيسي في حي النصر وبربوش وصيانة الحفر التحصينات في مناطق متفرقة / مركز قضاء سنجار				217,372,000	قيد الإحالة		0%	0%	0%	0	قيد الإحالة	
	المجموع		17150		15,019,802,000								

مشاريع محافظة نينوى
البرامج الخاصة

ت	المشروع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الإنحراف	الاستحقاق المالي حسب نسبة الإنجاز الفعلي	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
1	صيانة وتأهيل ابنية كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل/ نينوى	36 22.897°N 43 8.592°E	2000	140	900,000,000	02/08/2017	20/08/2017	100%	85%	15%	765,000,000	205,145,000	اصفال الجهة المستفيدة لبدء قسم المحاسبة
2	تأهيل هيئات الكهرباء / الموصل	36 21 34 05N 43 01 34 28E		30	731,600,000	18/10/2017	قيد التنفيذ	0%	0%	0%	0	146,320,000	
3	تأهيل وصيانة طرق في قضاء الحمديّة وناحية السمرود			50	275,016,500	02/11/2017	16/11/2017	95%	70%	25%	192,511,550	107,075,000	تعلق الطرق وصعوبة دخول المواد والآليات
4	تأهيل بداية مركز خريطة الوقاص			50	303,428,000	20/11/2017	04/12/2017	100%	55%	45%	0	0	عدم المصافحة على امر الجيار
5	تأهيل بداية مركز خريطة اليرموك												بالكفورات المحنونة والمحننة
6	تأهيل بداية مركز التفاح المدني			50	224,352,000	21/11/2017	03/12/2017	100%	100%	0%	0	0	
7	تأهيل بداية مديرية خريطة النصر												
8	اعادة اعمار وتأهيل مدارس		قيد الدراسة واعداد الكهوفات		3,600,000,000		قيد الدراسة واعداد الكهوفات	0%	0%	0%	0	0	قيد الدراسة واعداد الكهوفات
9	اعادة اعمار وتأهيل مدارس		قيد الدراسة واعداد الكهوفات				قيد الدراسة واعداد الكهوفات	0%	0%	0%	0	0	قيد الدراسة واعداد الكهوفات
#	اعادة اعمار وتأهيل مدارس		قيد الدراسة واعداد الكهوفات				قيد الدراسة واعداد الكهوفات	0%	0%	0%	0	0	قيد الدراسة واعداد الكهوفات
11	اعادة اعمار وتأهيل مدارس		قيد الدراسة واعداد الكهوفات				قيد الدراسة واعداد الكهوفات	0%	0%	0%	0	0	قيد الدراسة واعداد الكهوفات
#	اعادة اعمار وتأهيل مدارس		قيد الدراسة واعداد الكهوفات				قيد الدراسة واعداد الكهوفات	0%	0%	0%	0	0	قيد الدراسة واعداد الكهوفات
#	تجهيز جهاز الرنين المغناطيسي عدد ١					3,200,000,000			0%	0%	0%	0	0
#	تجهيز جهاز لثابت الحصى عدد ٢				1,200,000,000			0%	0%	0%	0	0	تم ترخيصها ضمن المنحة الثانية المقترحة من قبل جمهورية الصين الشعبية
			0		10,434,396,500								

مشاريع محافظة نينوى
البرامج الخاصة

ت	المشروع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	الاستحقاق المالي حسب نسبة الإنجاز الفعلي	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
#	تجهيز جهاز التصوير المعطي عدد ١				2,000,000,000			0%	0%	0%	0	تم ترديدها ضمن المنحة الثانية المقترحة من قبل جمهورية الصين الشعبية	
#	تجهيز اتايب ومعدات تسليم لمبيرة مجازي نينوى المركز والاقتصادية والنواحي				1,449,750,000			0%	0%	0%	0	تم ترديدها ضمن المنحة الثانية المقترحة من قبل جمهورية الصين الشعبية	
			0		24,318,543,000								

مشاريع محافظة نينوى

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Cost	Timeline					
							Qtr 2, 2017	Qtr 3, 2017	Qtr 4, 2017	Qtr 1, 2018	Qtr 2, 2018	Qtr 3, 2018
1	مشاريع محافظة نينوى	199 days	13/08/2017	16/05/2018	69%	IQD 15,460,465,400.00						
2	مشاريع الخططة الاستثمارية	198 days	13/08/2017	16/05/2018	68%	IQD 13,026,068,900.00						
3	مدرسة الصوري الابتدائية ١٢ صف/الفيلافة/نينوى	170 days	16/08/2017	10/04/2018	70%	IQD 715,512,000.00						
4	اعدادية الفيلافة للبنين ١٢ صف/الفيلافة/نينوى	180 days	16/08/2017	24/04/2018	75%	IQD 687,989,900.00						
5	ثانوية الصوري للبنين ١٢ صف/الفيلافة/نينوى	180 days	07/09/2017	16/05/2018	80%	IQD 750,236,000.00						
6	مدرسة اجحة الابتدائية للبنين ١٢ صف/الفيلافة/نينوى	160 days	13/08/2017	22/03/2018	75%	IQD 737,710,000.00						
7	تأهيل مباني كلية الآداب وإعادة تأهيل مباني قسم التكنولوجيا والعلوم البنينة بتكليه العلوم / جامعة الموصل / نينوى	140 days	08/10/2017	19/04/2018	47%	IQD 1,414,930,000.00						
8	تأهيل ابنية كلية التمريض وتأهيل ابنية تكليه التربية الرياضية/جامعة الموصل/نينوى	140 days	03/10/2017	16/04/2018	68%	IQD 1,627,784,000.00						
9	تأهيل ابنية كلية طب الاسنان وتأهيل ابنية كلية التصيد/جامعة الموصل/نينوى	140 days	29/10/2017	10/05/2018	75%	IQD 1,464,915,000.00						
10	تأهيل ابنية كلية العلوم وتأهيل بنائية قسم الاعمار والمسرح وتأهيل ابنية المراكز البحثية/جامعة الموصل/نينوى	105 days	11/10/2017	06/03/2018	40%	IQD 1,624,462,000.00						
11	تأهيل ابنية كلية التربية وكلية الهندسة / جامعة الموصل	110 days	13/08/2017	11/01/2018	82%	IQD 1,571,950,000.00						

مشاريع محافظة نينوى

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Cost	Progress by Quarter						
							Qtr 2, 2017	Qtr 3, 2017	Qtr 4, 2017	Qtr 1, 2018	Qtr 2, 2018	Qtr 3, 2018	
12	تأهيل شوارع وصنع القوالب في الشورة و إعادة تأهيل وأكساء شوارع رئيسية في حمام العليل و كشف أعمال تأهيل و أكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية الغفيرة	70 days	13/08/2017	16/11/2017	46%	IQD 1,484,600,000.00							
13	اكساء وصيانة شوارع متفرقة في ناحية بعشيقة وصب قوالب جاتبية وشبكة المجاري في بعشيقة	65 days	13/08/2017	09/11/2017	68%	IQD 945,980,000.00							
14	مشاريع البرامج الخاصة	139 days	20/08/2017	01/03/2018	72%	IQD 2,434,396,500.00							
15	صيانة وتأهيل ابنية تلبية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل/نينوى	140 days	20/08/2017	01/03/2018	85%	IQD 900,000,000.00							
16	تأهيل صيحات التهرياء / الموصل	30 days	20/08/2017	28/09/2017	0%	IQD 731,600,000.00							
17	تأهيل وصيانة طرق في قضاء الحمدانية وناحية التمروود	50 days	20/08/2017	26/10/2017	70%	IQD 275,016,500.00							
18	تأهيل بناية مركز شرطة الوقاص ومركز شرطة اليرموك	50 days	04/12/2017	09/02/2018	55%	IQD 303,428,000.00							
19	تأهيل ابنية مركز الدجاج المدني بالجزائر وبنية مديرية شرطة النصر	50 days	03/12/2017	08/02/2018	100%	IQD 224,352,000.00							



كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل / نينوى



كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل / نينوى



كلية الآداب / جامعة الموصل / نينوى



كلية الآداب / جامعة الموصل / نينوى



كلية طب الاسنان / جامعة الموصل / نينوى



كلية طب الاسنان / جامعة الموصل / نينوى



(تأهيل طرق (ناحية الشورى، القيارة، حمام العليل)



(تأهيل طرق (ناحية الشورى، القيارة، حمام العليل)



مدرسة الشورى الابتدائية/ القيارة/ نينوى




مدرسة الشورى الابتدائية/ القيارة/ نينوى



تأهيل طرق في الحمدانية/ نينوى



تأهيل طرق في الحمدانية/ نينوى

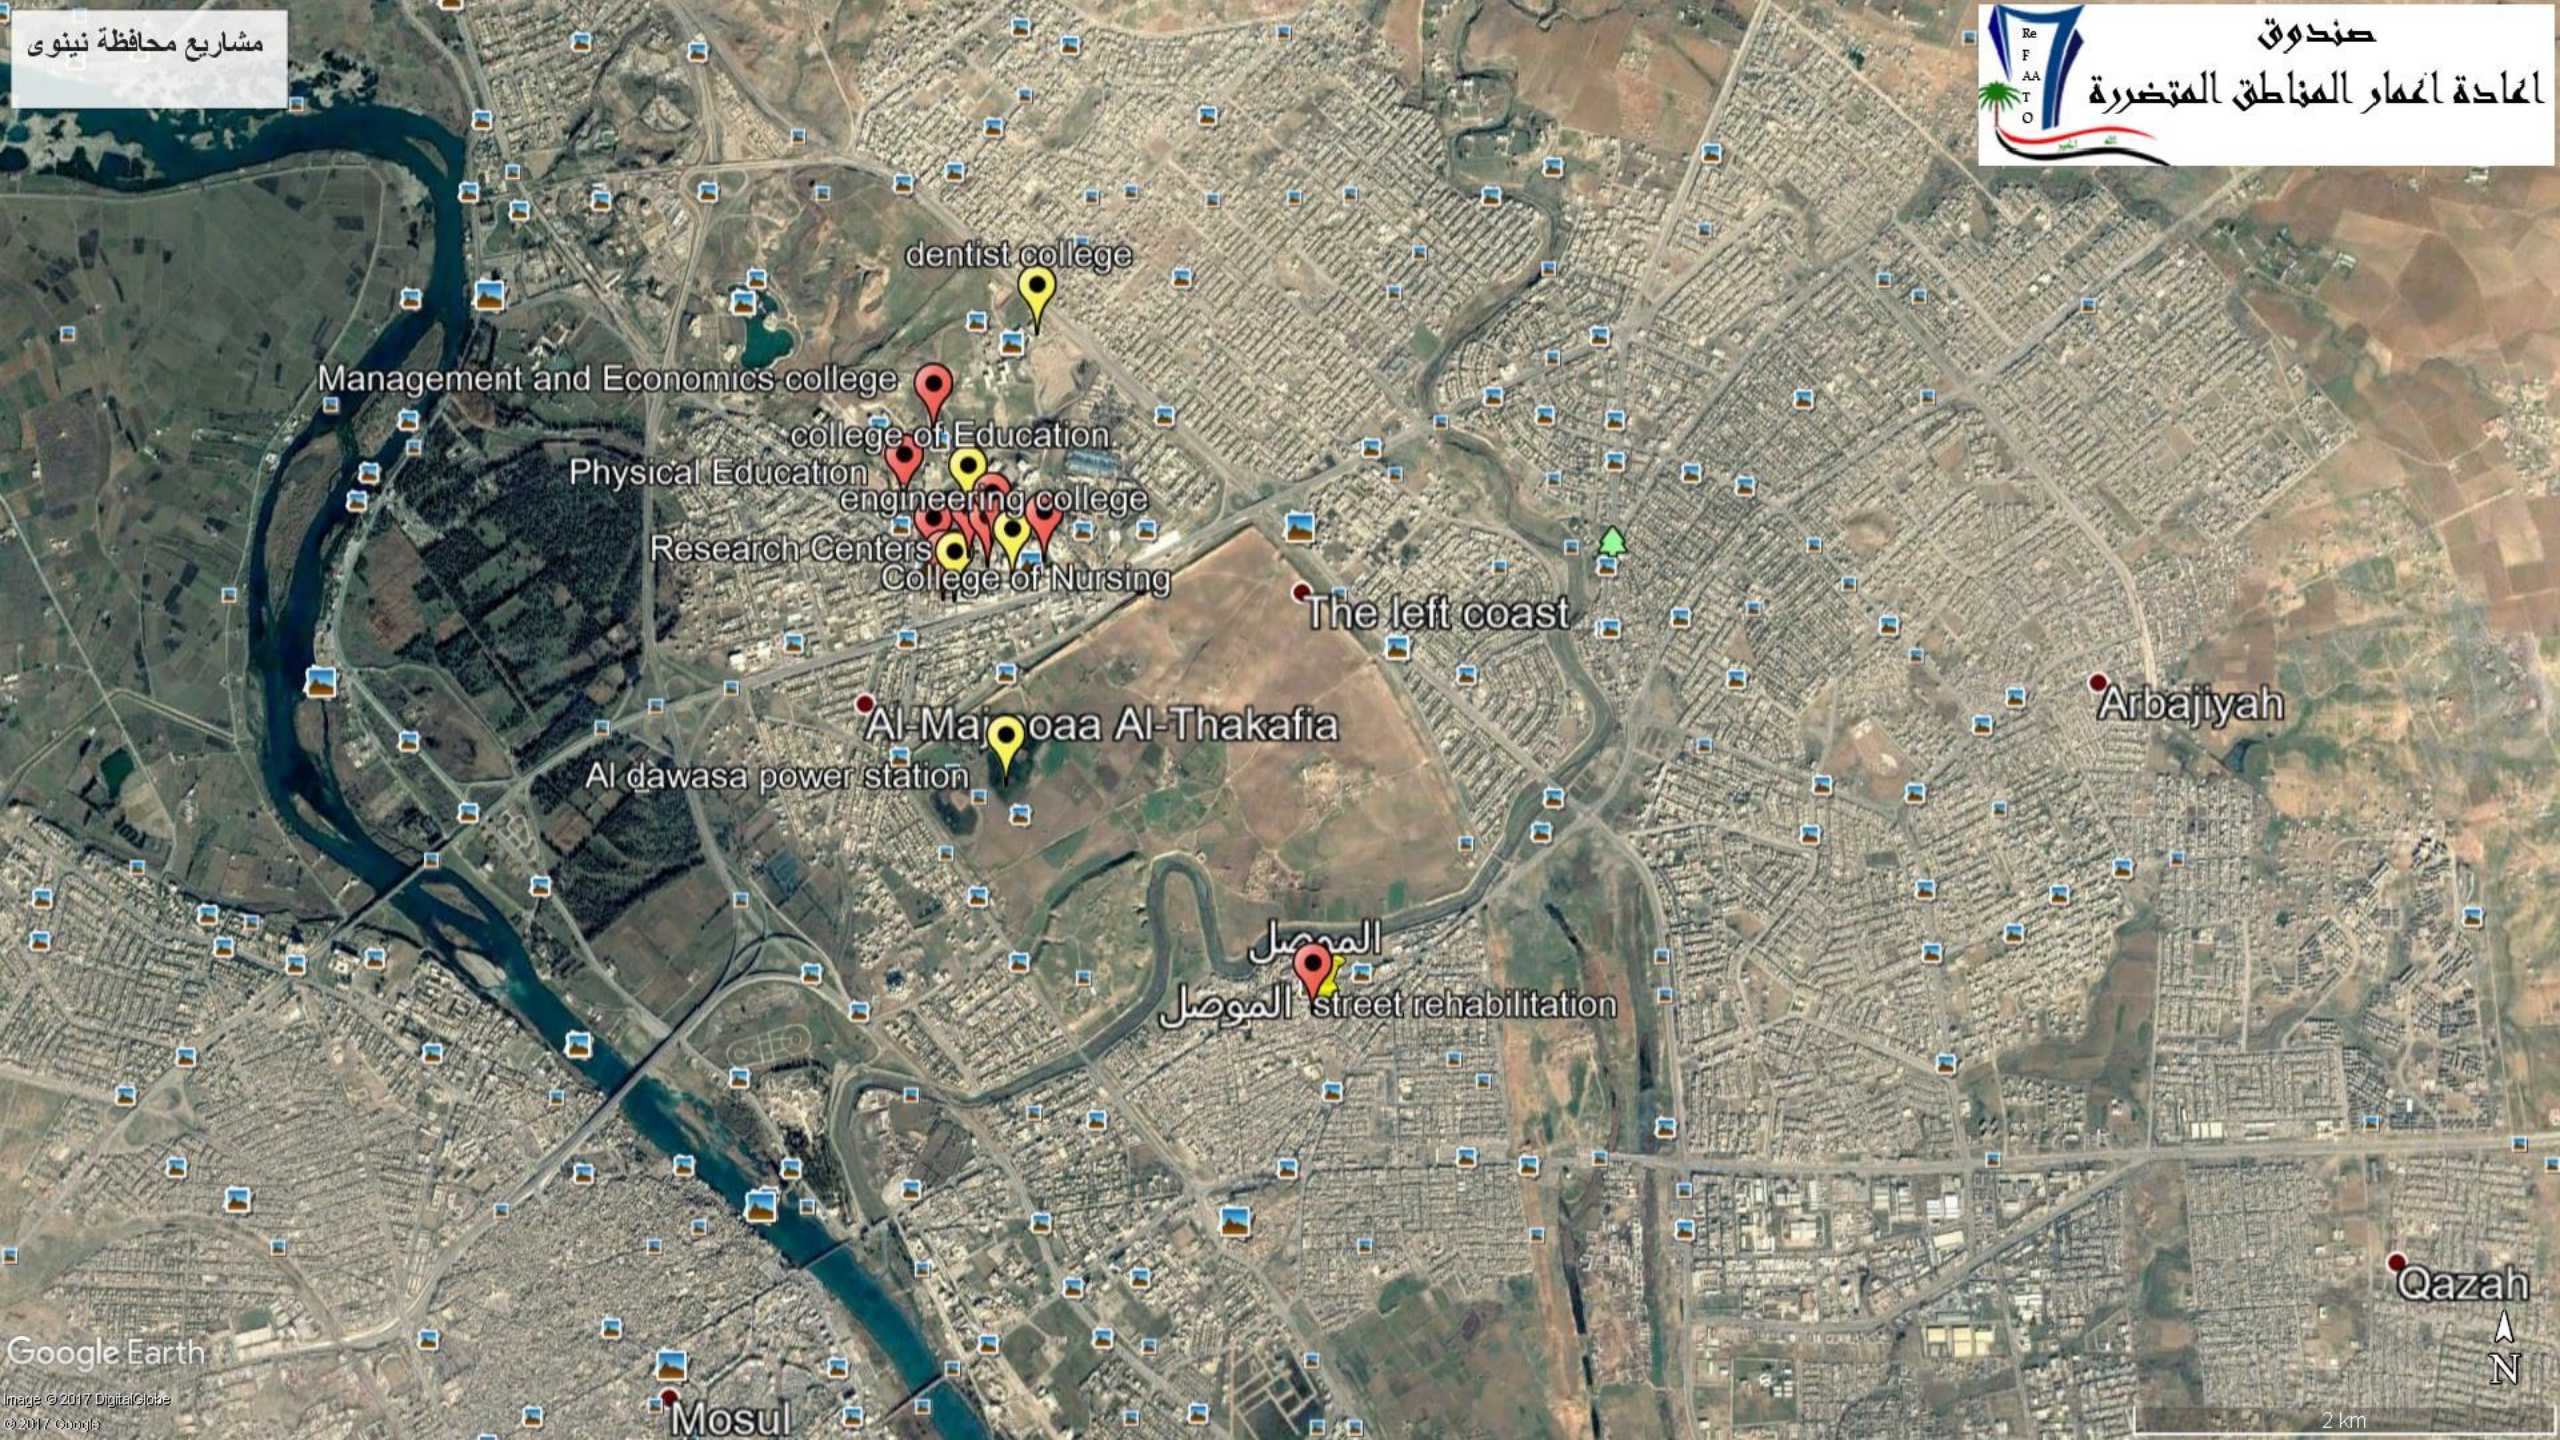

dentist college
 Management and Economics college
 college of Education
 Physical Education
 engineering college
 Research Centers
 College of Nursing

The left coast

Al-Majmoaa Al-Thakafia

Al dawasa power station

الموصل
 street rehabilitation
 الموصل

Arbajyah

Qazah

Mosul



Karemlesh

Bakhdida street rehabilitation

Kalb...

street paving

street paving

street rehabilitations

Al Khidhir

street rehabilitation





Al Shoura secondary school
street rehabilitation
street paving

Al Kuwayr

street rehabilitation1
Al qayyarah secondary school

street paving
street rehabilitation2

Ajhala Primary school

مشروع محافظة صلاح الدين



مشاريع محافظة صلاح الدين
الخطة الاستثمارية

ت	المشروع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الإنحراف	المبلغ المستحق حسب نسبة الإنجاز الفعلية	المبلغ المصروف	أسباب الإنحراف
1	مدرسة الدور الأولى للبنات ١٢ صف/ الدور - صلاح الدين	34 27 26.2N 47 47 18.5 E	450	180	716,944,000	25/07/2017	05/08/2017	64%	75%	0%	537,708,000	160,760,000	
2	ثانوية الفرغان ١٨ صف/ تريت /صلاح الدين	34 26 18.0N 43 40 35.5E	700	170	1,119,644,000	30/07/2017	28/08/2017	70%	72%	0%	806,143,680	265,505,000	
3	مدرسة حفص الدوري للبنين ٦ صف/ الدور / صلاح الدين	34 27 42.8N 43 50 31.3E	255	120	330,000,000	03/08/2017	21/08/2017	100%	89%	11%	293,700,000	84,092,000	تأخر العمل بسبب صرف مستحقات الشركات
4	مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية ٦ صف/تريت /صلاح الدين	34 26 42.9N 43 44 05.2E	250	180	303,645,000	13/08/2017	22/08/2017	71%	75%	0%	227,733,750	106,642,000	
5	روضة الفارس العربي ٤ صف/ تريت / صلاح الدين	34 36 06.9 N 43 40 32.9 E	350	180	417,595,000	13/08/2017	28/08/2017	72%	74%	0%	309,020,300	105,724,000	
6	مدرسة الأناضول للبنين ٩ صف/ ناحية مكيشيف/ تريت/	34 18 23.4N 43 46 59.1E	140	180	469,258,000	24/08/2017	11/09/2017	69%	65%	4%	305,017,700	148,086,500	تأخر العمل بسبب صرف مستحقات الشركات
7	تاهيل القسام داخلية للطالبات وقاعة التدري لمعهد الدور التقني /الدور -صلاح الدين	34 27 36N 43 48 34E	3000	150	484,140,000	25/09/2017	04/10/2017	88%	80%	8%	387,312,000	147,550,000	تم توجيه كتاب حث الى الشركة المنفذة
8	مد شبكة مياه تصريف الامطار واعمال الامارة والتبليط للطريق من مستشفى الحارث الى الوادي ويطول ١٨٠٠ م طول / الضلوعية - صلاح الدين	37 68 92N 42 77 17 E	25,000	150	994,050,000	26/09/2017	10/10/2017	60%	17%	43%	168,988,500	0	بسبب وجود كيبالات الاتصالات وانابيب ماء واعمدة كهربائية واوامر غير
	المجموع		30,145		4,835,276,000								

مشاريع محافظة صلاح الدين
الخطة الاستثمارية

ت	المشروع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	المبلغ المستحق حسب نسبة الإنجاز الفعلية	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
9	اعمال اعادة بناء السام داخلية للطلاب عدد/٤ جامعة تكريت	34° 40.717'N 43° 38.914'E	4,000	240	754,370,000	11/12/2017	20/12/2017	5%	11%	0%			
10	تجهيز قابلات واسلاك كهربائية لعموم المحافظة صلاح الدين				217,000,000	14/12/2017		قيد التنفيذ					
	تجهيز مواد لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم صلاح الدين (أعمدة)		50,000	20	144,600,000	14/12/2017		قيد التنفيذ					
	تجهيز مواد لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم صلاح الدين (محولات)			30	939,000,000	14/12/2017		قيد التنفيذ					
11	تجهيز محطات متقله (33/11 كي في) عدد ٣ في محافظة صلاح الدين		75,000		4,800,000,000	قيد الدراسات واعداد التمشوئات	قيد الدراسات واعداد التمشوئات					قيد الدراسات واعداد التمشوئات	
	المجموع		129,000		6,854,970,000								

مشاريع محافظة صلاح الدين
البرامج الخاصة

ت	المشروع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع	تكلفة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	المبلغ المستحق حسب نسبة الإنجاز الفعلية (الإنجاز المالي)	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
1	تاهيل وتشغيل وحدة ماء العينة سعة ٣٠٠م ^٣ /ساعة/الضرقاط /صلاح الدين	35 63 864N 43 24 181E	27,000	120	257900000	25/07/2017	06/08/2017	100%	100%	0%	257,900,000	77,928,250	انجاز العمل
2	تاهيل وتشغيل وحدة ماء الحجاج سعة ٣٠٠م ^٣ /ساعة/بيجي/صلاح الدين	34 85 308N 43 54 104E											
3	اكساء شارع معهد الدور في قضاء الدور/صلاح الدين	34 28 12N 43 47 38.16E	10,000	80	435,000,000	17/09/2017	26/09/2017	100%	100%	0%	435,000,000	364,000,000	تم انجاز العمل بالكامل
4	تاهيل واتمام بنياية شرطة الدور وميطرة العلم/العلم/صلاح الدين	21 49 34 .27N 26 76 43 47E	60,000	90	307,000,000	17/09/2017	01/10/2017	100%	100%	0%	307,000,000	221,620,000	
5	تاهيل مقرات مديريات (التدخل السريع (سوات) ومكافحة المتفجرات وانضباط الشرطة) وقاعة الشهيد صالح عويد/ تكريت/ صلاح الدين	3.21 34 37N 23.44 43 40E	7,000	85	455,595,000	25/09/2017	05/10/2017	100%	100%	0	455,595,000	356,722,000	تم انجاز العمل بالكامل
6	تاهيل الشارع الرابط بين شارع الزهور والشارع الحولي/ تكريت/ صلاح الدين	34 35 159N 43 40 425E	150,000	80	762,737,000	25/09/2017	02/10/2017	100%	88%	12%	671,208,560	201,451,500	إيقاف اعمال الاكساء طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة من قبل مديرية مرور صلاح الدين ، عندك هطول الامطار
7	إعادة تاهيل الشارع الممتد من تقاطع المجلس القديم باتجاه العادسية بطول ٦٨٠ م/ تكريت /صلاح الدين	37 68 92N 42 77 17 E											
	المجموع		254,000		2,218,232,000								

مشاريع محافظة صلاح الدين
البرامج الخاصة

ت	المشروع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع	تكلفة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	المبلغ المستحق حسب نسبة الإنجاز الفعلية (الإنجاز المالي)	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
8	تاهيل مبنى مختبر صلاح الدين الاتصالي/ تريت /صلاح الدين	43 40 58.16E 34 34 47.29N	180,000	84	872,881,000	03/10/2017	17/10/2017	100%	85%	15%	0%	125,538,500	تم توجيه كتاب حث وكتاب انذار للشرطة نصيحة التأخر بتنفيذ الاعمال
9	تاهيل مديرية كمارك صلاح الدين/ تريت /صلاح الدين	43 41 01.95E 34 35 11.93N											
10	تاهيل مديرية إحصاء صلاح الدين/ تريت / صلاح الدين	43 41 02.27E 34 35 13.79N											
11	تاهيل بلدية ناحية نجلة المتضررة من الاعمال الإرهابية/سامراء/صلاح الدين	43 44 11.1E 34 23 39.25N											
12	تاهيل مديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين	43 41 01.15E 34 35 00.27N											
13	تجهيز مولدة محطة السعات لمشاريع الماء	مناطق مطرقة	90	1,734,000,000	26/11/2017	قيود التنفيذ	0%	0%	0%	0%	0%	0	
14	تجهيز مولدة محطة السعات لمحطات الرفع والضخ لمشاريع الصرف الصحي												
15	تجهيز عوازل عدد 5 لمحطات ضخ مياه الامطار الاولى والثانية في قضاء النجيل - صلاح الدين			30	95,450,000	04/12/2017	قيود التنفيذ	100%	100%	0%	0%	0	
16	تجهيز عوازل نهريه ومنشآت الدفع لمحطات الماء في شاطئ الجدر وفيجل الكبير والقباض الثاني والمهيد احمد وسديرة الوسطي			45	187,250,000	10/12/2017	قيود التنفيذ	100%	100%	0%	0%	0	
					2,889,581,000								
			180,000										المجموع

مشاريع محافظة صلاح الدين
البرامج الخاصة

ت	المشروع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع	تكلفة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	المبلغ المستحق حسب نسبة الإنجاز الفعلية (الإنجاز المالي)	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
17	تجهيز مواد لصيانة شبكة كهرباء مركز قضاء الطوز والمرلي (أعمدة)			20	75,300,000	14/12/2017	قيد التنفيذ	0%	0%	0%	0		
	تجهيز مواد لصيانة شبكة كهرباء مركز قضاء الطوز والمرلي (محولات)			30	469,500,000	14/12/2017	قيد التنفيذ	0%	0%	0%	0		
	المجموع				544,800,000								

مشاريع محافظة صلاح الدين

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Cost	Qtr 2, 2d	Qtr 3, 2d	Qtr 4, 2d	Qtr 1, 2d	Qtr 2, 2d	Qtr 3, 2d	Qtr 4, 2d	Qtr 1, 2d
1	مشاريع محافظة صلاح الدين	331 days	05/08/2017	09/11/2018	69%	IQD 11,998,059,000.00								
2	مشاريع الخطة الاستثمارية	331 days	05/08/2017	09/11/2018	62%	IQD 6,890,246,000.00								
3	مدرسة الدور الأولى للبنات ١٢ صفا/النور/تفريت/صلاح الدين	180 days	28/08/2017	03/05/2018	64%	IQD 1,119,644,000.00								
4	كلوية العرقان ١٨ صفا/تفريت/صلاح الدين	120 days	05/08/2017	17/01/2018	70%	IQD 716,944,000.00								
5	مدرسة حفص النوري للبنين ٦ صفا/النور/صلاح الدين	120 days	21/08/2017	01/02/2018	100%	IQD 330,000,000.00								
6	مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية ٦ صفا/ثرية الطرابلس/تفريت/صلاح الدين	180 days	22/08/2017	27/04/2018	71%	IQD 303,645,000.00								
7	روضة العباس العربي ٤ صفا/تفريت/صلاح الدين	180 days	28/08/2017	03/05/2018	72%	IQD 417,595,000.00								
8	مدرسة الاماموس للبنين ٤ صفا/سامراء/صلاح الدين	180 days	11/09/2017	18/05/2018	69%	IQD 469,258,000.00								
9	تاهيل السام داخلية للطبقات وقاعة التدري لمعهد الدور التفريت/النور/صلاح الدين	150 days	05/08/2017	28/02/2018	88%	IQD 484,140,000.00								
10	مد شبكة مياه تصريف الامطار واعمال الانارة والصليب للطريق من مستطفي/الضلعوية/بند/صلاح الدين الحارت الى الوادي ويطول ١٨٠٠ م	150 days	10/10/2017	04/05/2018	60%	IQD 994,050,000.00								
11	اعمال اعادة بناء اقسام داخلية للطلاب عدد ٤/جامعة تكريت	240 days	11/12/2017	09/11/2018	11%	IQD 754,370,000.00								
12	تجهيز مواد لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم صلاح الدين (أعمدة+قابلات+محولات)	30 days	14/12/2017	24/01/2018	0%	IQD 1,300,600,000.00								
13	مشاريع البرامج الخاصة	170 days	06/08/2017	29/03/2018	84%	IQD 5,107,813,000.00								
14	تاهيل وتشغيل مجمع ماء بظافة (٢٠٠) م ٣/اساعة لمناطق (العينة/الشرقاظ) و(مجمع الحجاج)/صلاح الدين	120 days	06/08/2017	17/01/2018	100%	IQD 257,900,000.00								
15	اكساء شارع معهد الدور في قضاء الدور/النور/صلاح الدين	80 days	01/10/2017	18/01/2018	100%	IQD 435,000,000.00								

مشاريع محافظة صلاح الدين

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Cost	Qtr 2, 20	Qtr 3, 20	Qtr 4, 20	Qtr 1, 20	Qtr 2, 20	Qtr 3, 20	Qtr 4, 20	Qtr 1, 20
16	تاهيل واكمال بناية شرطة النور وسيطرة العلم/صلاح الدين	90 days	01/10/2017	31/01/2018	100%	IQD 307,000,000.00								
17	تاهيل مقرات مديريات (التدخل السريع (سوات) ومكافحة المتفجرات والضباط/تكريت/صلاح الدين الشرطة) وقاعة الشهيد صالح عويد	85 days	05/10/2017	30/01/2018	100%	IQD 455,595,000.00								
18	تاهيل (الشارح الرابط بين شارع الزهور والشارح الحولي والشارح الممتد من المجلس القديم باتجاه القاسية)	80 days	02/10/2017	19/01/2018	88%	IQD 762,737,000.00								
19	تاهيل أبنية مديريات (الكمارك والأحصاء والزراعة ومعالجة نجلة / مكشوفة) ومختبر صلاح الدين الأثري/تكريت/صلاح الدين	84 days	17/10/2017	09/02/2018	85%	IQD 872,881,000.00								
20	تجهيز مولدات كهربائية مختلفة السمات لمواقع محطات الماء والمجري	90 days	26/11/2017	29/03/2018	0%	IQD 1,734,000,000.00								
21	تجهيز عوازل عدد 5 لمحطات ضخ مياه الأمطار الأولى والثانية في قضاء الدجيل - صلاح الدين	30 days	06/08/2017	14/09/2017	100%	IQD 95,450,000.00								
22	تجهيز عوازل نهريّة ومضخات الدفع لمجمعات الماء في شاطئ الجسر وهيجل الكبير والقباض الثاني وشهيد احمد وسديرة الوسطى	45 days	06/08/2017	05/10/2017	100%	IQD 187,250,000.00								



قاعة الشهيد صالح عويد /صالح الدين



قاعة الشهيد صالح عويد /صالح الدين



مديرية التدخل السريع (سوات)/صالح الدين



مديرية التدخل السريع (سوات)/صالح الدين



بناية شرطة الدور/ الدور/ صلاح الدين



بناية شرطة الدور/ الدور/ صلاح الدين



ثانوية الفرقان/ صلاح الدين



ثانوية الفرقان/ صلاح الدين



بناية ناحية دجلة/ مكيشيفة/ صلاح الدين



بناية ناحية دجلة/ مكيشيفة/ صلاح الدين



بناية مديرية الزراعة/ صلاح الدين



بناية مديرية الزراعة/ صلاح الدين



الأقسام الداخلية للطالبات/معهد الدور التقني/الدور/صلاح الدين



الأقسام الداخلية للطالبات/معهد الدور التقني/الدور/صلاح الدين



شارع معهد الدور التقني/الدور/صلاح الدين




شارع معهد الدور التقني/الدور/صلاح الدين



محطة ماء الحجاج / الحجاج / صلاح الدين



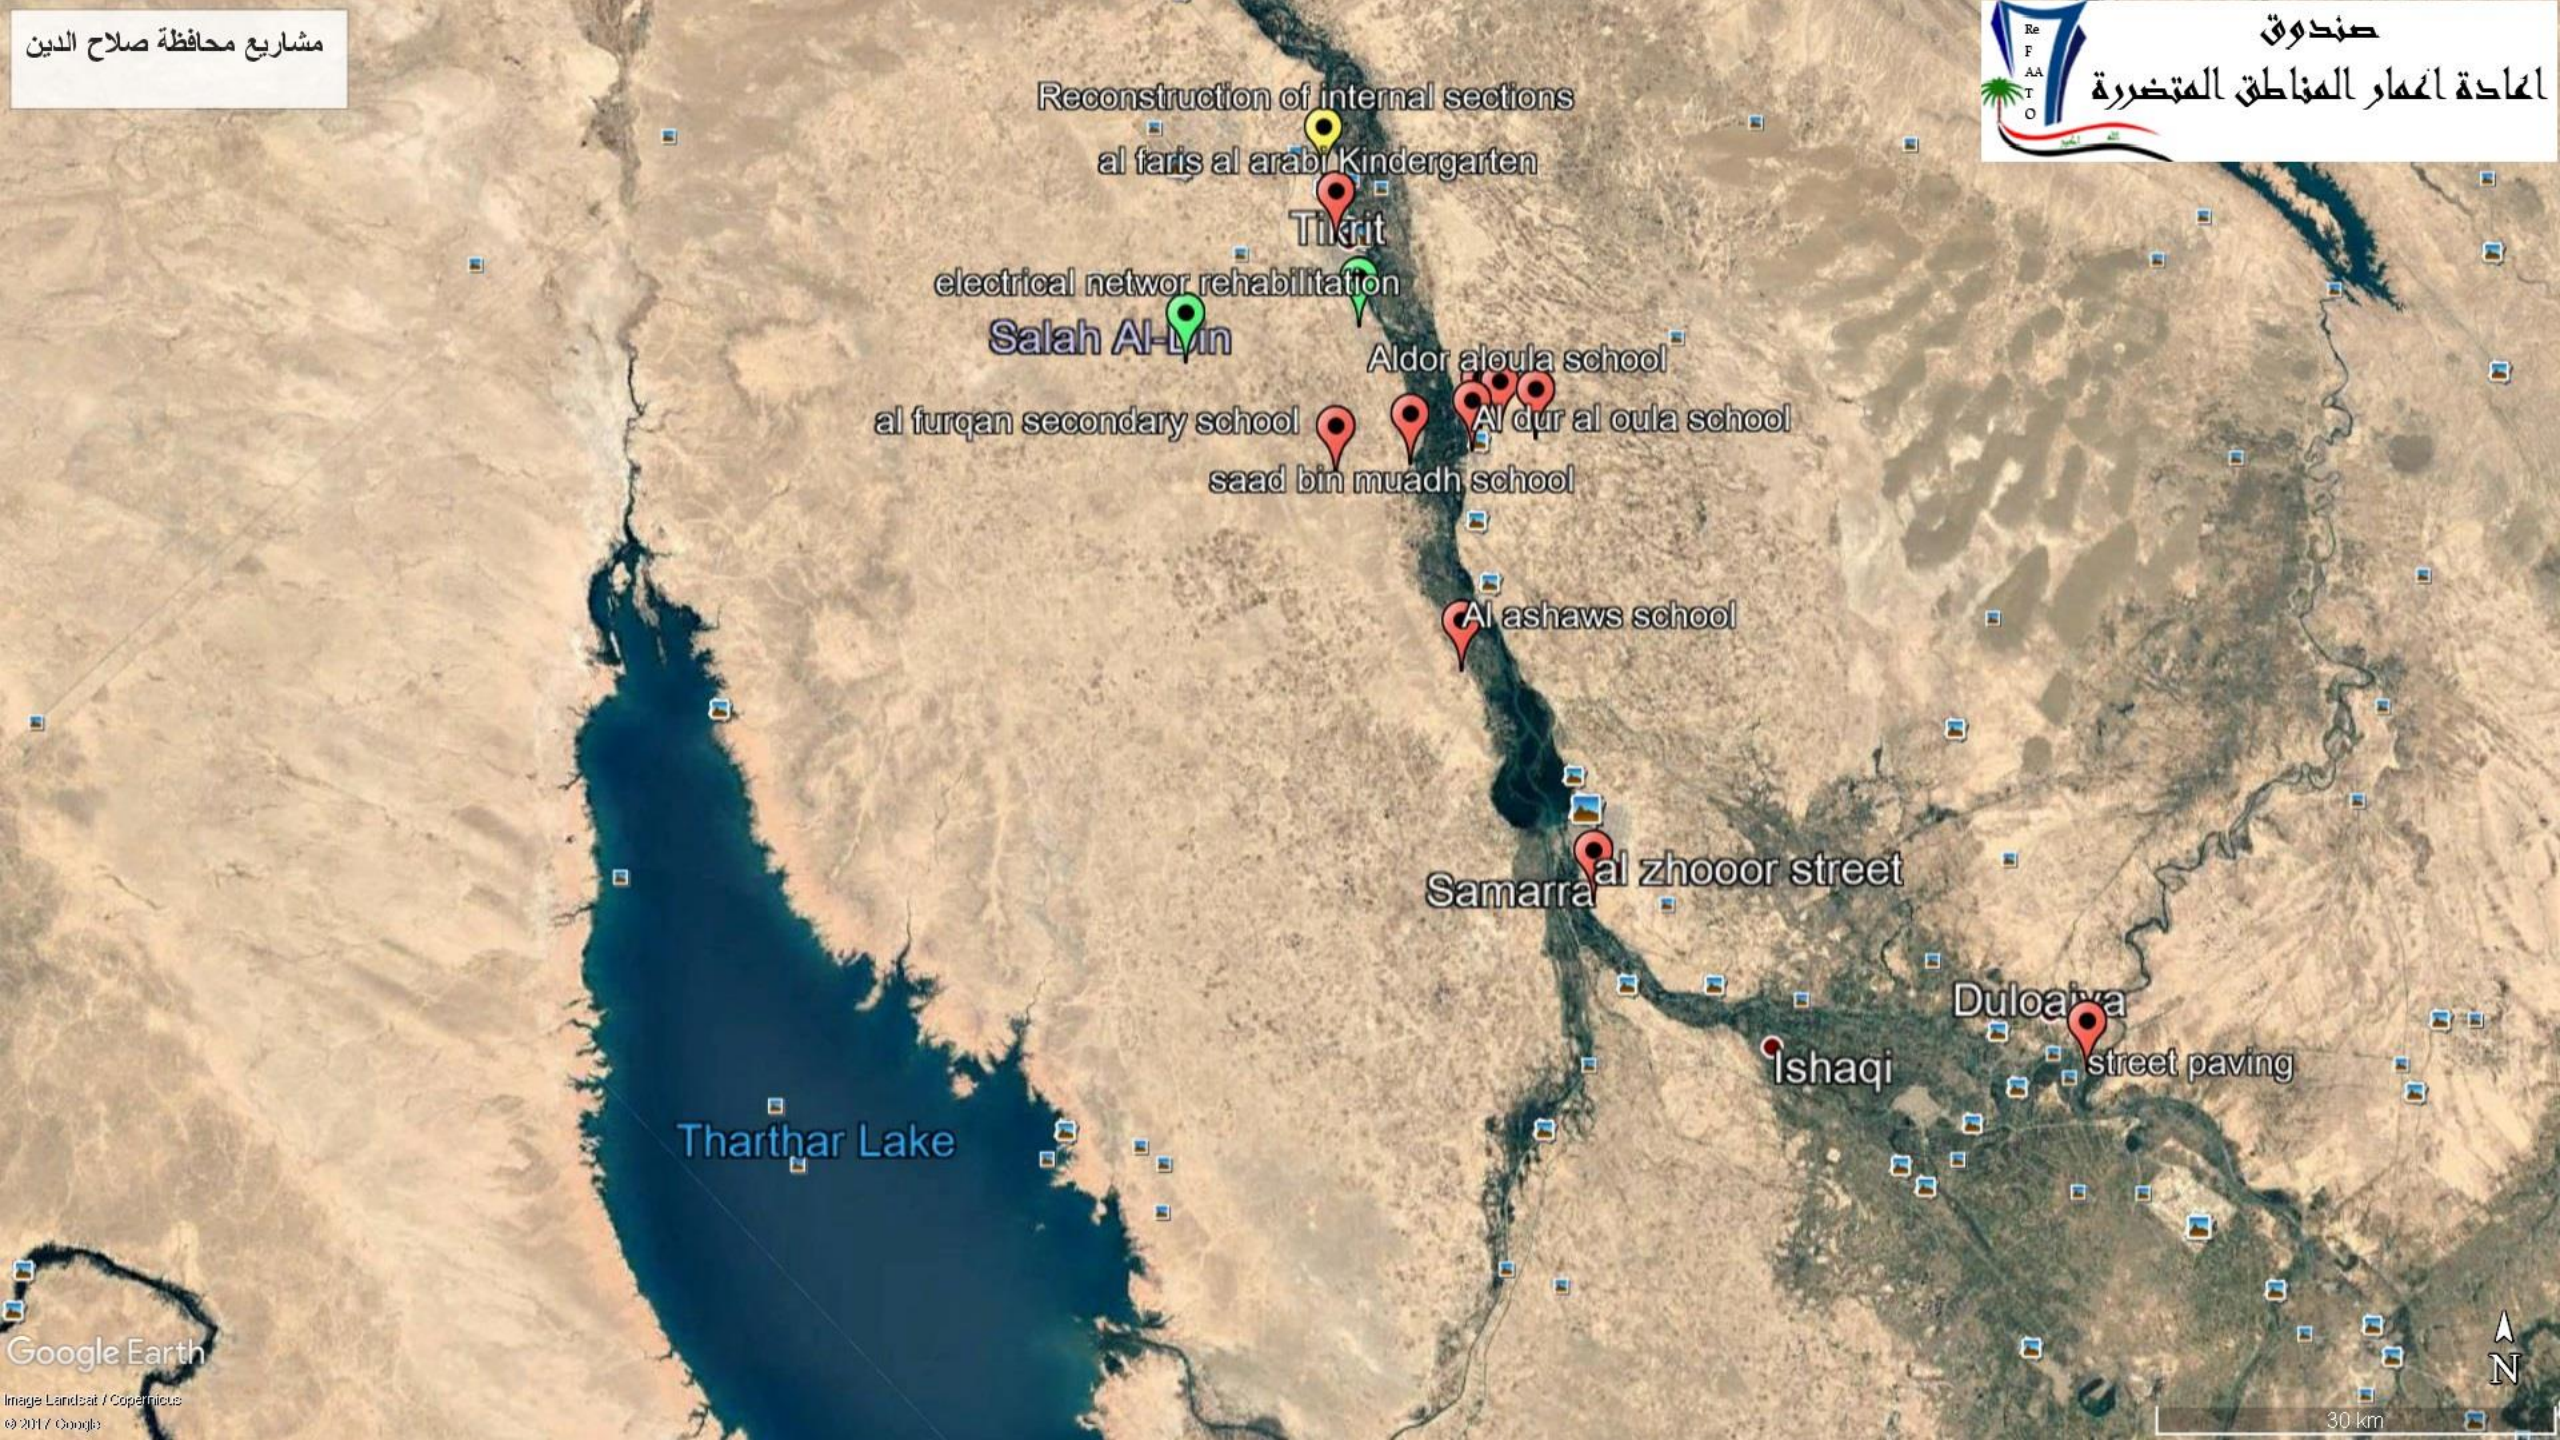

Reconstruction of internal sections
al faris al arabi Kindergarten

Tigris

electrical network rehabilitation

Salah Al-Din

Aldor aloula school

al furqan secondary school

Al dur al oula school

saad bin muadh school

Al ashaws school

Samarra

al zhoor street

Duloaiva

Ishaqi

street paving

Tharthar Lake





مشاريع محافظة كركوك

مشاريع محافظة كركوك
الخطة الاستثمارية

ت	المشروع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	الاستحقاق المالي حسب نسبة الإنجاز الفعلية	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
1	هدم وإعادة بناء مدرسة الشهيد الابتدائية ٦ صفا/كركوك	35 14.653N 44 16.121E	180	165	306,926,000	23/07/2017	03/08/2017	100%	100%	0%	306,926,000	78,436,000	
2	هدم وإعادة بناء مدرسة الامام حسن الابتدائية ٦ صفا/ كركوك	35 13.101N 44 16 .902E	180	165	306,926,000	23/07/2017	03/08/2017	75%	60%	15%	184,155,600	0	وجود تعديل على الأسس حسب توصيات المخبر الانشائي، وتحول المنطقة المجاورة التي كتبت عسكرية مؤقتة
	المجموع		360		613,852,000								

مشاريع محافظة كركوك
البرامج الخاصة

ت	المشروع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع (دينار)	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	الاستحقاق المالي حسب نسبة الإنجاز الفعلية	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
1	إعادة تاهيل الشبكات الكهربائية	35 27 .117N 44 11 .325E	5,200	30	153,734,000	31/07/2017	10/08/2017	100%	100%	0%	153,734,000	146,589,000	عم انجاز المشروع
2	إعادة تاهيل الشبكات الكهربائية في قرى ملا عبدالله وأمريس خبار وأمريس خزعل والهندية ١,٢/كركوك												
3	تاهيل وتشغيل مجمع ماء بطانة (٥٠) ساعة في قرية ترصبة ناحية بابجب/كركوك	35 24 .107N 44 21.151E	3,800	85	71,281,000	31/07/2017	03/08/2017	100%	100%	0%	71,281,000	71,281,000	عم انجاز المشروع
4	صيانة طريق الشمسية/كركوك	35 14 .511N 44 16.217E	4,000	55	189,340,000	03/08/2017	03/08/2017	100%	100%	0%	189,340,000	170,740,000	عم انجاز المشروع
5	تخليط شوارع داخلية بالكونكريت قرب مدرسة الوقف الشيعي في قصر البشير // كركوك												
6	تجهيز محولات الى قضاء الحويجة			30	1,689,000,000	14/12/2017		قيد التنفيذ					
7	ايصال الماء الى قرية الهندية الجديدة / ناحية الملتقى				55,600,000			100%	100%				تنفيذ امانة
8	تجهيز مواد صيانة للآبار الارتوازية والشبكات المائية للقرى المحررة في قضاء دالوق				66,395,000								قيد الإحالة
9	تجهيز مولدات لقطاع الماء/الحويجة				844,000,000								قيد الإحالة
10	تاهيل وتبليط طريق كركوك الحويجة قرب مجسر خالد				63,200,000				100%	100%			العمل منجز
11	تاهيل محطة ماء مزهر العاصي/ الحويجة				69,600,000				100%	100%			تنفيذ امانة
	المجموع		13,000		3,202,150,000								

مشاريع محافظة كركوك

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Comple	Cost	Qtr 2, 2017	Qtr 3, 2017	Qtr 4, 2017	Qtr 1, 2018	Qtr 2, 2018
1	مشاريع محافظة كركوك	165 days	03/08/2017	21/03/2018	85%	IQD 2,905,607,000.00					
2	مشاريع الخطة الاستثمارية	165 days	03/08/2017	21/03/2018	80%	IQD 613,852,000.00					
3	هدم وإعادة بناء مدرسة الشهيد الابتدائية ٦ صفاءكركوك	165 days	03/08/2017	21/03/2018	100%	IQD 306,926,000.00					
4	هدم وإعادة بناء مدرسة الامام حسن الابتدائية ٦ صفاءكركوك	165 days	03/08/2017	21/03/2018	60%	IQD 306,926,000.00					
5	مشاريع البرامج الخاصة	125 days	03/08/2017	24/01/2018	90%	IQD 2,291,755,000.00					
6	إعادة تاهيل الشبكات الكهربائية/كركوك	30 days	10/08/2017	20/09/2017	100%	IQD 153,734,000.00					
7	تاهيل وتشغيل مجمع ماء بطاقة (٥٠)م/ساعة في قرية - ناحية بايجي/كركوك	85 days	03/08/2017	29/11/2017	100%	IQD 71,281,000.00					
8	تبليط شوارع داخلية بالكونكريت قرب مدرسة الوقف الشيعي في قصر البشير (وصيانة طريق قرية الشمسية)/كركوك	55 days	03/08/2017	18/10/2017	100%	IQD 189,340,000.00					
9	تجهيز محولات الي قضاء الحويجة	30 days	14/12/2017	24/01/2018	0%	IQD 1,689,000,000.00					
10	ايصال الماء الي قرية الهندية الجديدة / ناحية الملتقى	30 days	03/08/2017	13/09/2017	100%	IQD 55,600,000.00					
11	تاهيل وتبليط طريق كركوك الحويجة قرب مجسر خالد	30 days	03/08/2017	13/09/2017	100%	IQD 63,200,000.00					
12	تاهيل محطة ماء مزهر العاصي / الحويجة	30 days	03/08/2017	13/09/2017	100%	IQD 69,600,000.00					



طريق كركوك - حويجة /قرب مجسر خالد



طريق كركوك - حويجة /قرب مجسر خالد



مجمع ماء مزهر العاصي / الحويجة/كركوك



مجمع ماء مزهر العاصي / الحويجة/كركوك



مجمع ماء مزهر العاصي / الحويجة/كركوك



مدرسة الشهيد / البشير / كركوك



مدرسة الشهيد / البشير / كركوك



شبكة ماء في قرية الهندية الجديدة/ الملتقى / كركوك



شبكة ماء في قرية الهندية الجديدة/ الملتقى / كركوك



شوارع في قرية البشير / كركوك



شوارع في قرية البشير / كركوك




شوارع في قرية البشير / كركوك



تأهيل شبكات الكهرباء / قرية ملا عبدالله / كركوك



تأهيل شبكات الكهرباء / قرية ملا عبدالله / كركوك

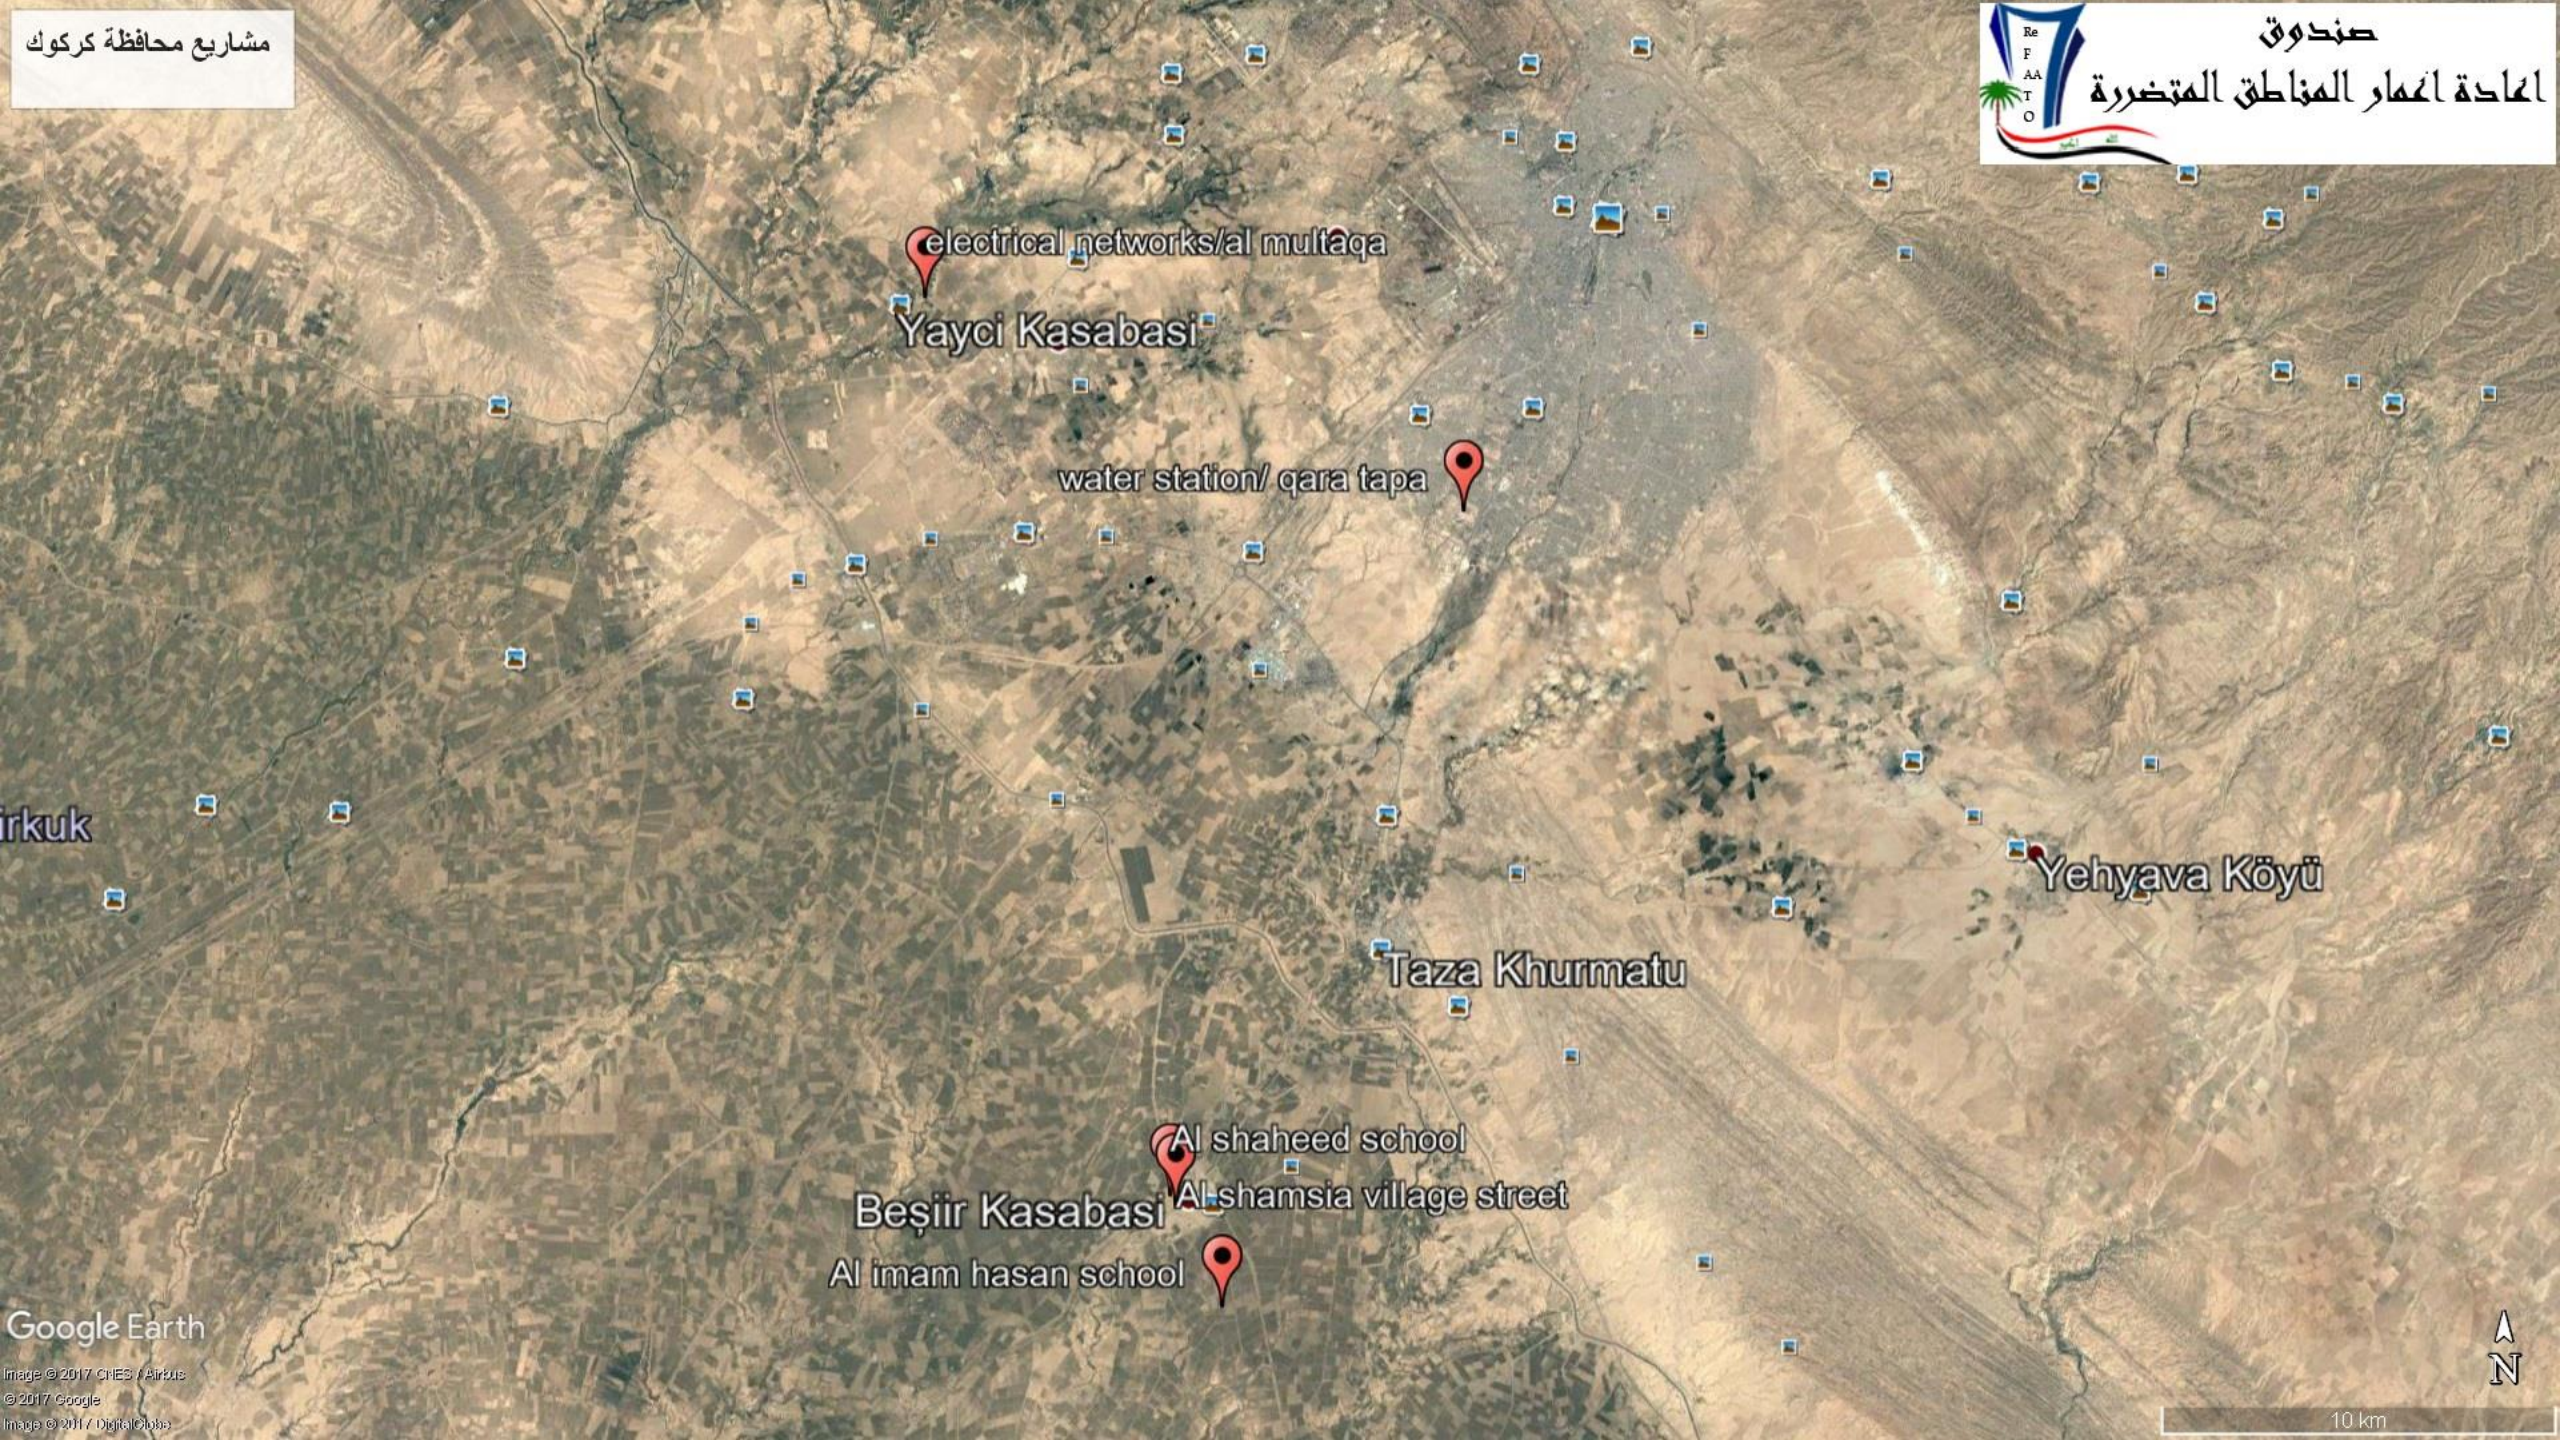

irkuk

مشاريع محافظة ديالى



مشاريع محافظة ديالى
الخطة الاستثمارية

ت	المشروع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كثافة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	المبلغ المستحق حسب نسبة الإنجاز الفعلي (الإنجاز المالي)	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
1	مدرسة المامون / ١٢ صف / العظيم/الخالص/ديالى	34.273507 N 44. 542155E	600	180	752,704,000	23/07/2017	26/09/2017	75%	50%	25%	376,352,000	0	الانحراف لصعوبة جلب الايدي العاملة بسبب الظروف الأمنية، عدم صرف السلعة
2	مدرسة الهديل / ٩ صف/الصدور/المقدادية/ديالى		450	168	461,667,000	25/07/2017	24/09/2017	65%	48%	17%	221,600,160	0	العمل متوقف من تاريخ ١٤/١/٢٠١٨ بسبب عدم صرف السلعة
3	مدرسة ابن زيون /المقدادية/ديالى		600	160	775,658,000	27/08/2017	24/10/2017	78%	0%	78%	0	0	العمل متوقف وتم التوجيه بسحب العمل من قبل معالي المتكبر
4	تخطيط فمارع من جسر محموه العطي الي جسر سراجي دلي عباس بطول (6 كم)			120	449,000,000	12/11/2017	29/11/2017	55%	44%	11%	197,560,000	0	
5	تخطيط واتساع فوارع في منطقة الخريفة والغربية في ناحية سد العظيم (تخطيط فوارع داخل حدود البلدية ناحية سد/العظيم)			60	390,420,000	13/11/2017	25/12/2017	28%	25%	3%	97,605,000	0	تأخر مباشرة الشركة المتقدمة
6	صب فوارع في الاسراء في السعدية	34 11 18.24N 45 07 08.5E	2,500	45	116,040,000	13/11/2017	04/12/2017	100%	100%	0%	116,040,000	0	
7	تخطيط طرق في المقدادية بطول (5 كم)			60	348,860,000	13/11/2017	13/12/2017	100%	100%	0%	348,860,000	0	
8	تأهيل الفارح العام لمدينة جلولاء الرئيسي			90	259,563,500	13/11/2017	02/01/2018	60%	35%	25%	90,847,225	0	تأخر وصول الامر الإداري الخاي بتشكيل دائرة المهندس المقدم
9	فرض خابط بطول (12 كم) من جسر سالتراق - قرية العباسية الي قرية العالي وزهاد الاسود			90	168,750,000	07/11/2017	19/11/2017	100%	100%	0%	168,750,000	0	
10	تخطيط فوارع داخل حدود البلدية لبلدية المنصورية بطول ١٦٥٠ م			40	469,205,000	22/11/2017	06/12/2017	100%	85%	15%	398,824,250	0	توقف العمل لمدة ١٥ يوم بسبب كسر في أنبوب المجاري
11	تخطيط فوارع في قرى شيروين بطول ٦,٥ كم / المنصورية شيروين/ ديالى			180	559,485,000	13/11/2017	19/11/2017	55%	42%	13%	234,983,700	0	تأخر مباشرة الشركة المتقدمة
	المجموع		1650		4,751,352,500								

مشاريع محافظة ديالى
الخطة الاستثمارية

ت	المشروع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	المبلغ المستحق حسب نسبة الإنجاز الفعلي (الإنجاز المالي)	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
12	تأهيل انارة سوارج ناحية قتلان في ديالى	33 41 545N 44 48 047E	5000		142,791,000		قيد الإحالة	0%	0%	0%	0	0	قيد الحالة
13	صيانة شارع ام العظام العثمانية / بعقوبة بطول ٢.١٥ كم	33 43 03.3N 44 36 58.6E	4000		291,669,000		قيد الإحالة	0%	0%	0%	0	0	قيد الإحالة
14	صيانة واتساء وعلبظ لقرى بلدروز (قرية عتبة ٧,٥ كم وقرية طعيقات ١,٥ كم) مقاطعة ١٧	33 40 39.6N 45 01 36.4E			1,289,840,000		قيد الإحالة	0%	0%	0%	0	0	قيد الإحالة
15	تجهيز محولات واسلاك وملفات نحاس وقابلوات ومعدنيات ومواد كهربائية وعدد واكات لمواثر الشهرباء التي تعرضت لانزهاب				2,000,000,000		قيد الدراسة	0%	0%	0%	0	0	قيد الدراسة
16	صيانة سوارج بطول ١,٨ كم لقرى خان بني سعد /بعقوبة/ ربيع عطشانة وعلبي الهادي والشيماء	33 34 14.4N 44 32 16.4E			229,936,000		قيد الإحالة	0%	0%	0%	0	0	قيد الإحالة
17	اتساء سوارج مظرقه في مركز ناحية قره عبة وقصبتها القديمة	34 25 45N 44 56 20E			460,000,000		قيد التحليل	0%	0%	0%	0	0	قيد التحليل
18	تأهيل شارع رقم ٢١ المرز ضمن المخطط ٣١١ و٣١٣ بطول ١,٤ كم للمقطع ما بين المنصوصف الصحي القديم واستدارة دور الجاهزة في حي التحرير /بعقوبة				228,620,000		قيد الإحالة	0%	0%	0%	0	0	قيد الإحالة
19	صيانة الشارع الرئيس داخل حدود بلدية السلام بطول ٥٥٠ متر	33 93 055 N 44 71 320E	30,000		145,475,000		قيد التحليل	0%	0%	0%	0	0	قيد التحليل
	المجموع		39,000		4,788,331,000								

مشاريع محافظة ديالى
البرامج الخاصة

ت	المشروع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	المبلغ المستحق حسب نسبة الإنجاز الفعلي (الإنجاز المالي)	المبلغ المصروف (دينار)	أسباب الانحراف
1	تاهيل مجمع ماء سويد وزحام والعالي وبسعة ٢٠٠ م ^٣ / ساعة/المقدادية/ ديالى	34 03 46 N 44 58 35 E	13,500	60	385,400,000	20/07/2017	27/08/2017	100%	100%	0%	385,400,000	379,900,000	انجاز المشروع
2	تاهيل مجمع ماء توكل والصدور والهارونية سعة ٢٠٠ م ^٣ / ساعة /المقدادية /ديالى	34 02 79.1N 44 58 54.3E											
3	تجهيز ونصب محطة تحلية بطاقة ٣٢٠٠ م ^٣ / ساعة قرية حد مزيد/ بعقوبة/ديالى	33 48 06 N 44 44 09 E											
4	تاهيل شارع السوق في ناحية السعدية/ديالى	30 11 23.01N 45 07 13.63E	35,000	35	106,750,000	31/07/2017	14/09/2017	100%	100%	0%	106,750,000	0	انجاز المشروع
5	صيانة واتساع مدخل طريق قرية زهيرت ويطول ٣ كم في ناحية ابي صيدة	33 55 16.3N 44 49 01.9E	5,000		370,300,000								قيود الإحالة
6	تجهيز الورشة الفنية في بلدية السعدية				10,476,500								تجهيز مباني
7	تليط طرق في ناحية السلام بطول ٦ كم	33 55 50N 44 42 48.2E			732,780,000								قيود الإحالة
8	تليط طرق في قرية خلوف بطول ٥ كم ناحية بني سعد	33 34 19.3N 44 31 40.1E	5,000		649,415,000								قيود الإحالة
9	تليط طريق في قرية الهامميات	33 43 37.5N 44 31 38.5E											
10	تليط واتساع سوارع متفرقة في مركز قضاء الخالص بطول ١٣ كم				1,197,644,000								قيود الإحالة
	المجموع		58,500		3,452,765,500								

مشاريع محافظة ديالى
البرامج الخاصة

ت	المشروع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	المبلغ المستحق حسب نسبة الإنجاز الفعلي (الإنجاز المالي)	المبلغ المصروف (دينار)	أسباب الانحراف	
11	قيد الإحالة	33 41 682N 45 03 888E	10,000		799,324,000									
		33 41 184N 45 03 895E												
		33 41 434N 45 03 287E												
14	قيد الإحالة	33 41 23.72N 45 03 09.74E	2,500		118,148,862									
16	قيد التحليل				159,950,625									
		33 41 515N 44 48 455E												
18	قيد التحليل	34 11 23.45N 45 07 16.57E	20,000		193,561,905									
		44.41 33 58N 21.82 44 55E												
	المجموع		32,500		1,270,985,392									

مشاريع محافظة ديالى

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Cost	Qtr 2, 201	Qtr 3, 201	Qtr 4, 201	Qtr 1, 201	Qtr 2, 201	Qtr 3, 201	Qtr 4, 201
1	مشاريع محافظة ديالى	239 days	27/08/2017	26/07/2018	49%	IQD 5,243,502,500.00							
2	مشاريع الخطة الاستثمارية	219 days	24/09/2017	26/07/2018	45%	IQD 4,751,352,500.00							
3	مدرسة المأمون / ١٢ صفات / العظيم/الخالص/ابيالى	180 days	26/09/2017	04/06/2018	45%	IQD 752,704,000.00							
4	مدرسة الهديل / ٩ / سد/الصور/المقدادية/ابيالى	168 days	24/09/2017	15/05/2018	48%	IQD 461,667,000.00							
5	مدرسة ابن زيدون /المقدادية/ابيالى	160 days	24/10/2017	تم تم المبصرة	0%	IQD 775,658,000.00							
6	تليط شارع من جسر محمود العلي الى جسر سراجق نلي عباس بطول (6 كم)	120 days	29/11/2017	15/05/2018	32%	IQD 449,000,000.00							
7	تليط واكساء شوارع في منطقة الشرقية والعربية في ناحية سد العظيم (تليط شوارع داخل حدود البلدية ناحية سد/العظيم)	60 days	25/12/2017	16/03/2018	25%	IQD 390,420,000.00							
8	صب شوارع حي الامراء في السعدية	45 days	04/12/2017	02/02/2018	100%	IQD 116,040,000.00							
9	تليط طرق في المقدادية بطول (5 كم	60 days	13/12/2017	06/03/2018	100%	IQD 348,860,000.00							
10	تأهيل الشارع العام لمدينة جلولاء الرئيسي	90 days	02/01/2018	07/05/2018	21%	IQD 259,563,500.00							
11	فرش حابط بطول (12 كم) من جسر شامراق - قرية العباسية الى قرية العالى وزحام الاسيود	90 days	19/11/2017	22/03/2018	100%	IQD 168,750,000.00							
12	تليط شوارع داخل حدود البلدية /بلدية المنصورية بطول	40 days	06/12/2017	30/01/2018	85%	IQD 469,205,000.00							

مشاريع محافظة ديالى

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Cost	Qtr 2, 201	Qtr 3, 201	Qtr 4, 201	Qtr 1, 201	Qtr 2, 201	Qtr 3, 201	Qtr 4, 201
13	تخطيط شوارع في قرى شيروين بطول ٦,٥ كم / المنصورية شيروين / ديالى	180 days	19/11/2017	26/07/2018	42%	IQD 559,485,000.00							
14	مشاريع البرامج الخاصة	59 days	27/08/2017	16/11/2017	100%	IQD 492,150,000.00							
15	تاهيل وتجهيل مجمع ماء بطاقة (٢٠٠) م ^٣ /ساعة لمناطق (نوثل، الصنور، الهارونية) (سويد، زحام، العلق) / ديالى	60 days	27/08/2017	16/11/2017	100%	IQD 385,400,000.00							
16	تاهيل شارع السوق في ناحية السعوية / ديالى	35 days	14/09/2017	01/11/2017	100%	IQD 106,750,000.00							



تأهيل شارع السوق /السعدية/ديالى



تأهيل شارع السوق /السعدية/ديالى



مدرسة المأمون/ ديالى



مدرسة المأمون/ ديالى



Al kasaba streets paving

street paving

Al salam villages streets

Al zuhairat village entrance

Diyālā Al hashimiat village street

Al Zuhairia village street

Baqubah

Baquba - Ottoman streets

Al dur- mandily street paving

khaloof village street

al rabee village streets paving

Kermanshah

Ilam



المسيب

المحاويل

مشاريع محافظة بابل / شمال بابل

الحلة

الهاشمية

مشاريع محافظة بابل / شمال بابل
الخطة الاستثمارية

ت	المشروع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	تكلفة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	المبلغ المستحق حسب نسبة الإنجاز الفعلي (الإنجاز المالي)	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
1	تجهيز وحصى وتفتيح محلات (0.4\11) في قطاع المصب / بابل				381,516,000		تيد التحليل	0%	0%	0%	0	تيد التحليل	
2	تجهيز وحصى وتفتيح خطوط جهد (11 في) في قطاع المصب / بابل			150	819,788,000	21/11/2017		0%	0%	0%	0		
	المجموع		0		1,201,304,000								

مشاريع محافظة بابل / شمال بابل
البرامج الخاصة

ت	المشروع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	تكلفة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	المبلغ المستحق حسب نسبة الإنجاز الفعلي (الإنجاز المالي)	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
1	صيانة طريق الحامية - صينديج بطول ٣,٥ كم/جرف النصر/شمال بابل	43 22 34 X 36 27 763 Y	12,500	40	287,125,000	30/07/2017	13/08/2017	100%	100%	0%	287,125,000	287,125,000	العمل منجز
2	مد واستبدال شبكة ماء مطرقة في حي المواطينين والحي العسكري/جرف النصر/شمال بابل	32 46 32.1N 44 15 48.3E											
3	مد واستبدال شبكة ماء الحامية/جرف النصر/شمال بابل	32 48 28.4 N 44 15 53.9 E	18,000	50	298,620,000	03/08/2017	14/08/2017	100%	100%	0%	298,620,000	298,620,000	العمل منجز
4	مد واستبدال شبكة ماء القاطع الشمالي ١ (الفاضلية ١)/جرف النصر /شمال بابل	33 00 53.5N 44 09 56.1 E											
5	مد واستبدال شبكة ماء القاطع الشمالي ٢ (الفاضلية ٢)/جرف النصر /شمال بابل	33 00 49.6N 44 08 36 E											
6	صيانة طريق الخضراء بمحاذاة نهر الفرات بطول ١٨ كيلو	43 46 70X 36 33 44 6Y	15,000	60	558,560,000	16/11/2017	19/11/2017	100%	100%	0%	440,700,000	440,700,000	0
	المجموع		45,500		1,144,305,000		1				1,026,445,000		

مشاريع محافظة بابل / شمال بابل

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Cost	Qtr 2, 2017	Qtr 3, 2017	Qtr 4, 2017	Qtr 1, 2018	Qtr 2, 2018
1	مشاريع محافظة بابل / شمال بابل	149 days	13/08/2017	08/03/2018	50%	IQD 1,964,093,000.00					
2	مشاريع الخطة الاستثمارية	149 days	13/08/2017	08/03/2018	0%	IQD 819,788,000.00					
3	تجهيز وحصى وتنفيذ خطوط جهد (11 كي.في) في قطاع المسيب /	150 days			0%	IQD 819,788,000.00					
4	مشاريع البرامج الخاصة	129 days	13/08/2017	08/02/2018	100%	IQD 1,144,305,000.00					
5	صيانة طريق الحامية - صنيح بطول ٣,٥ كم/جرف النصر / شمال بابل	40 days	13/08/2017	05/10/2017	100%	IQD 287,125,000.00					
6	مد واستبدال شبكات ماء في مناطق (الغاضبية ١-٢، الحامية، حي المواطنين، الحي العسكري/جرف النصر / شمال بابل	50 days	14/08/2017	20/10/2017	100%	IQD 298,620,000.00					
7	صيانة طريق الحضر بمحاذاة نهر القرات بطول ١٨ كيلو	60 days	19/11/2017	08/02/2018	100%	IQD 558,560,000.00					



(استبدال شبكات ماء / شمال بابل)



(استبدال شبكات ماء / شمال بابل)




(تأهيل طريق (الحامية - صنيديج) جرف النصر/ شمال بابل)



(تأهيل طريق (الحامية - صنيديج) جرف النصر/ شمال بابل)



صيانة طريق الخضبر/جرف النصر/شمال بابل

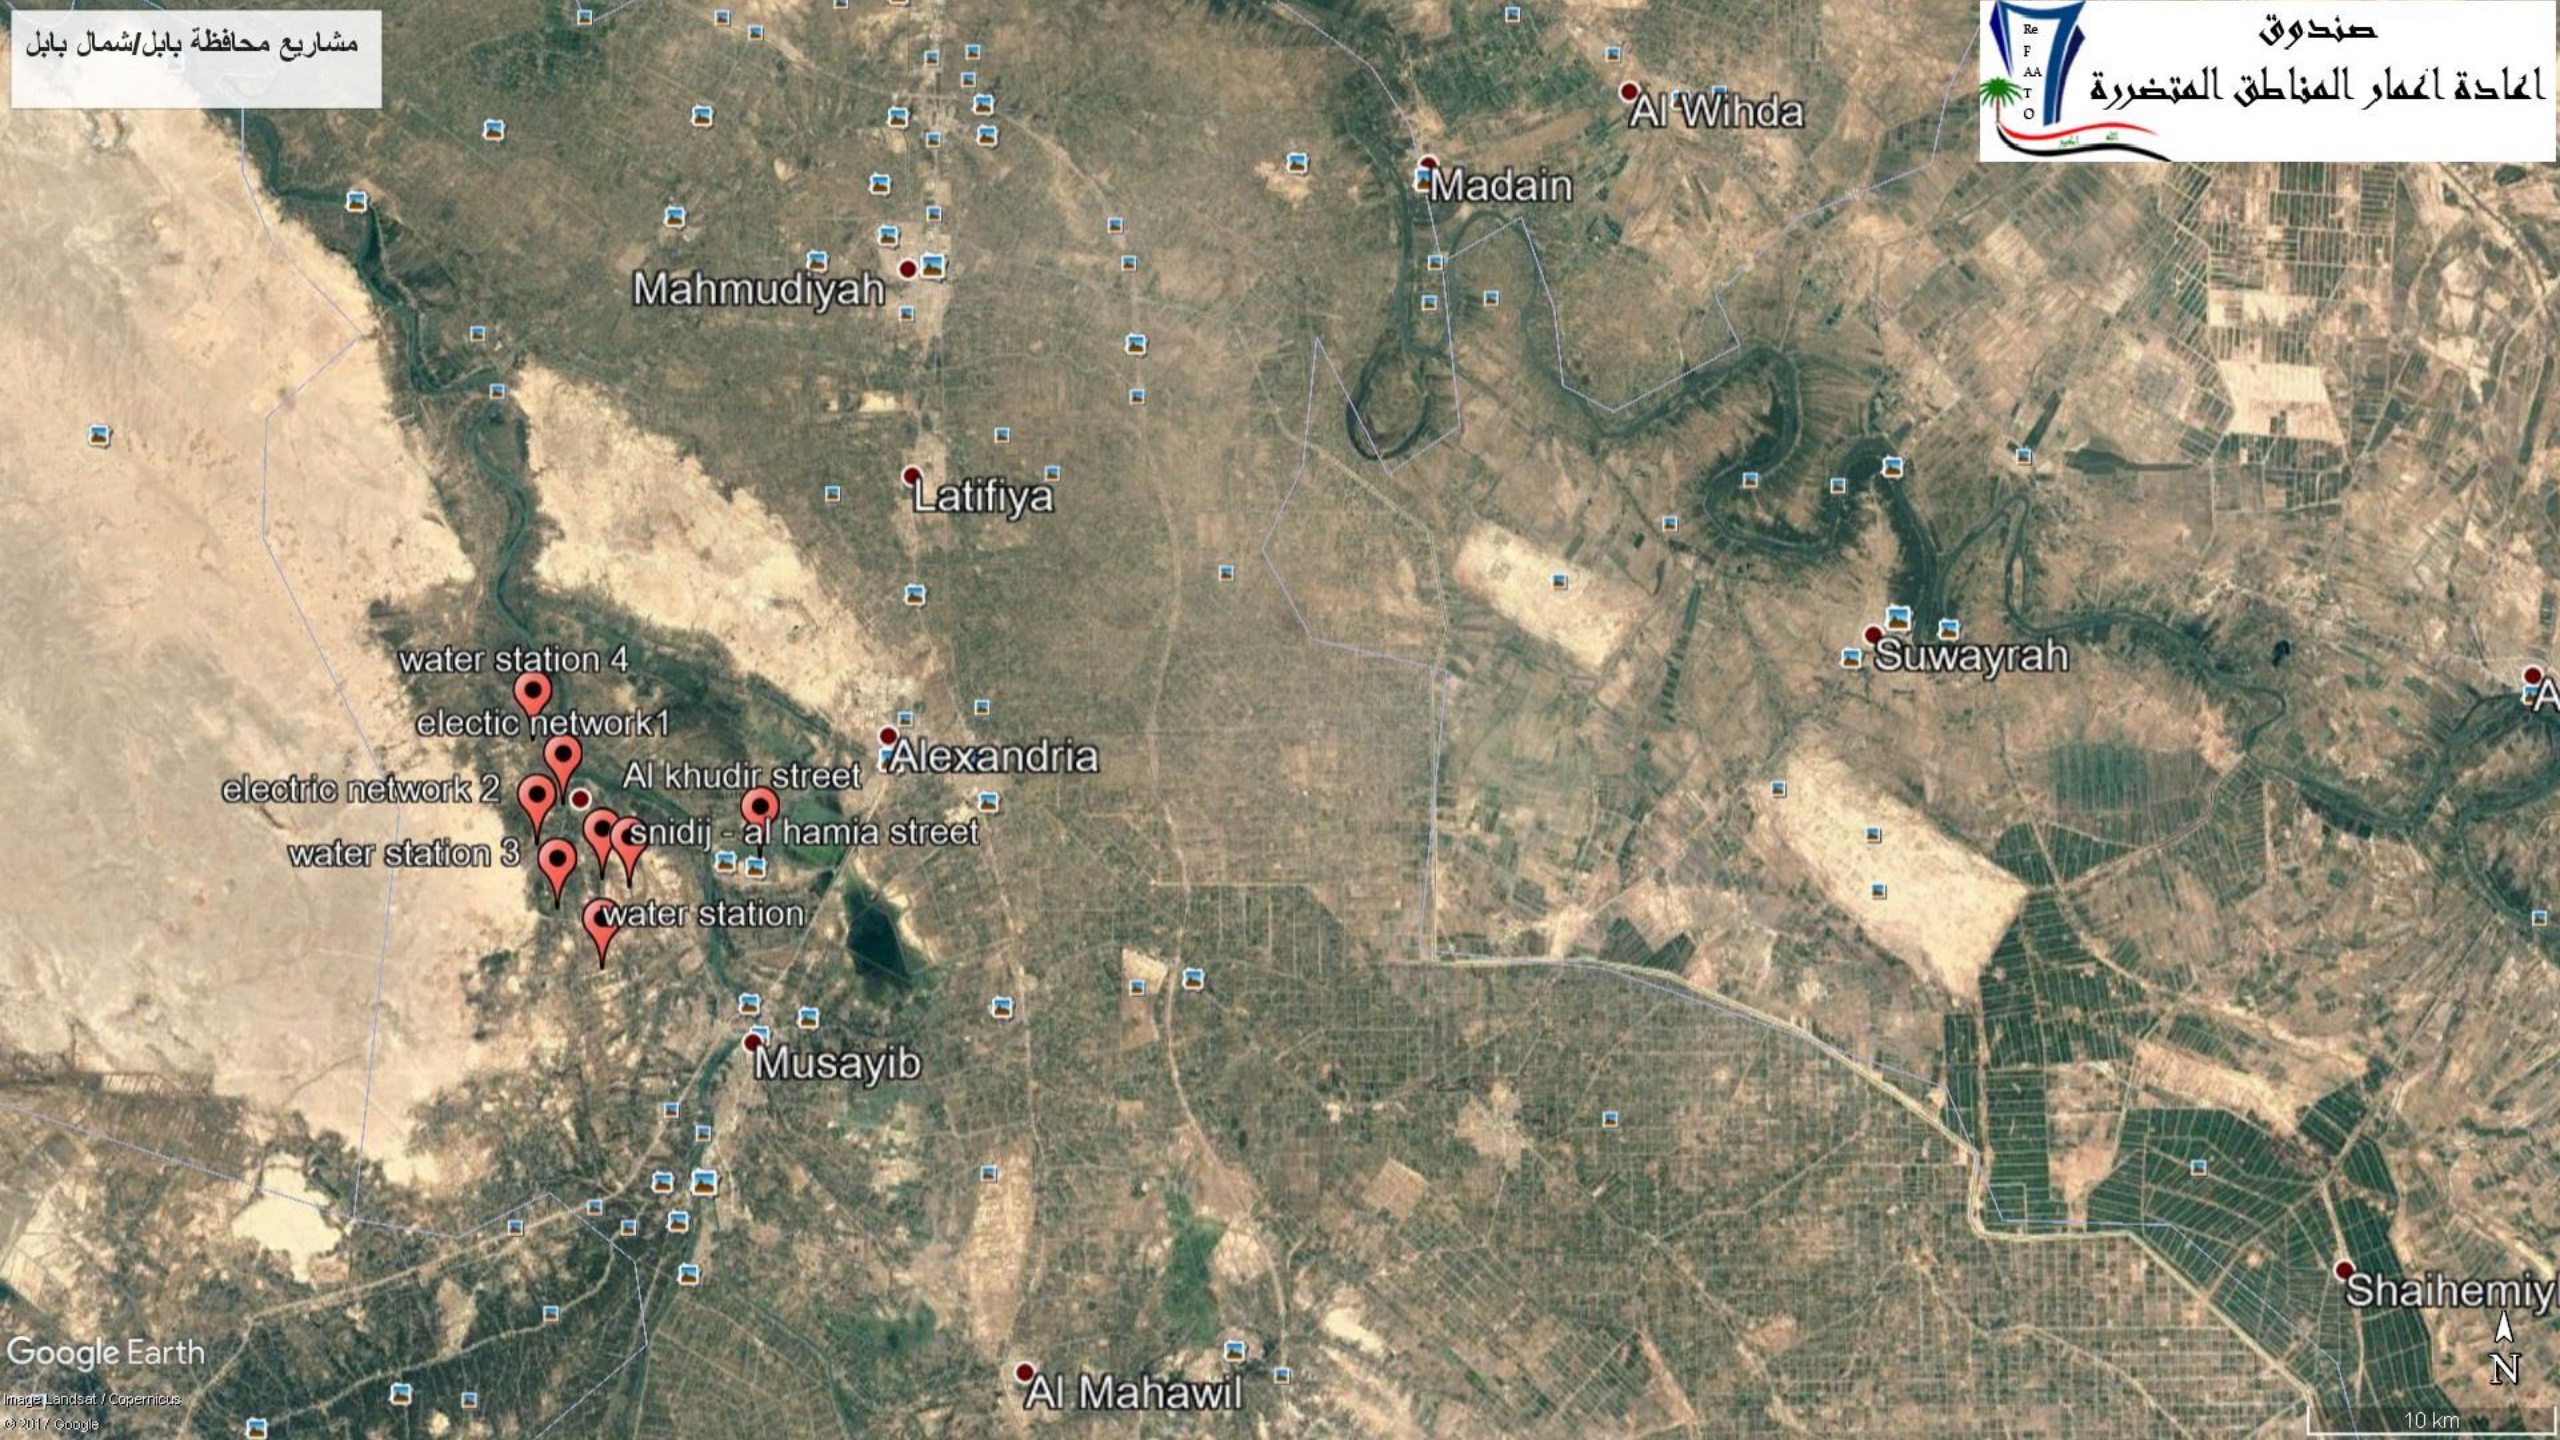

محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

مشاريع محافظة بغداد / حزام بغداد



واسط

مشاريع محافظة بغداد/ حزام بغداد
الخطة الاستثمارية

ت	المشروع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	المبلغ المستحق حسب الإنجاز الفعلي (المالي)	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
1	مدرسة حائل إبراهيم الابتدائية ٩ صفا/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	33 195 557N 43 968 712E	180	170	349,240,000	23/07/2017	11/09/2017	79%	72%	7%	251,452,800	134,650,000	
2	مدرسة المسجد الأقصى الابتدائية ٩ صفا/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	33 213 317N 43 892 967 E	300	170	479,647,000	26/07/2017	11/09/2017	79%	67%	12%	321,363,490	0	توقف العمل بسبب الوضع الأمني من تاريخ ٩/٢/٢٠١٨
3	مدرسة إبراهيم طوقان الابتدائية ٩ صفا/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	33 209 976N 43 930 087E	300	175	400,366,000	30/07/2017	11/09/2017	71%	67%	4%	268,245,220	0	توقف العمل بسبب الوضع الأمني من تاريخ ٩/٢/٢٠١٨
4	مدرسة عز الدين القسام الابتدائية ١٨ صفا/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	33 216 750 N 43 879 541 E	300	200	827,057,000	30/07/2017	11/09/2017	48%	30%	18%	248,117,100	0	توقف العمل بسبب الوضع الأمني من تاريخ ٩/٢/٢٠١٨
5	مدرسة أسماء بنت أبي بكر ٩ صفا/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	33 216 750 N 43 879 541 E	300	180	398,228,000	30/07/2017	11/09/2017	62%	65%	0%	258,848,200	133,233,200	
6	مدرسة الزخرف ٩ صفا/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	33 219 497 N 43 911 557E	300	190	1,024,768,500	02/08/2017	11/09/2017	65%	61%	4%	625,108,785	0	توقف العمل بسبب الوضع الأمني من تاريخ ٩/٢/٢٠١٨
7	مدرسة الخوارزمي الابتدائية ٩ صفا/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	33 394 093N 44 037 368E	300	180	425,137,000	03/08/2017	11/09/2017	69%	60%	9%	255,082,200	0	توقف العمل من قبل الشركة المنفذة لعدم صرف المستحقات المالية
8	تأهيل ناظم صدر أبو غريب والناظم القاطع في كبلو (٨) من القناة الموحدة والمنشآت الأخرى.			120	830,278,500	07/11/2017	20/11/2017	55%	35%	20%	290,597,475	0	تأخر الشركة المنفذة وتم توجيه كتاب تنشيف جهود
			1980		4,734,722,000								المجموع

مشاريع محافظة بغداد/ حزام بغداد
البرامج الخاصة

ت	المشروع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	المبلغ المستحق حسب الإنجاز الفعلي (الإنجاز المالي)	المبلغ المصروف	أسباب الانحراف
1	نصب شبكات تهرباء في منطقة الهيتاويين والعبادي لغري (العقاب، ماجد) المريج، المريج، الكبيشات، الهيتاوي بن، يوسف العرسان) النصر والسلام/ أبو عريب بغداد		2000	50	438,843,370	13/08/2017	24/08/2017	100%	99%	1%	434,454,936	175,466,434	انتهاء المدة العقدية ، تأخر التنفيذ من قبل الشركة المنفذة. تم توجيه انذار للشركة المنفذة
2	تاهيل شبكات تهرباء (تجهيز محولات) أبو عريب/حزام بغداد			15	255,600,000	18/10/2017	قيد التنفيذ				51,120,000	51,120,000	قيد التنفيذ
3	تاهيل شبكات التهرباء وخطوط التغذية الرئيسية في مناطق مطرقة / أبو عريب / اعمدة واسلاك				578,400,000		قيد التحليل						قيد التحليل
4	انشاء جسر عودة الضكر في الرشوش			30	88,225,000		تفذية امانة	100%					انجاز المشروع
5	تاهيل محطات ماء (السعدان، الهيتاويين، ذرع سنتر)		10,000		284,350,000		تفذية امانة	100%	100%				
6	تطوير موقع الصنوبر				100,000,000		20/11/2017	100%	100%				
7	تاهيل مجمعات وشبكات الماء				700,000,000		قيد الاحالة						قيد الاحالة
	المجموع		12000		2,445,418,370								

مشاريع محافظة بغداد / حزام بغداد

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Comple	Cost	Qtr 2, 2017	Qtr 3, 2017	Qtr 4, 2017	Qtr 1, 2018	Qtr 2, 2018	Qtr 3, 2018
1	مشاريع محافظة بغداد / حزام بغداد	212 days	24/08/2017	15/06/2018	47%	IQD 5,901,738,370.00						
2	مشاريع الخططة الاستثمارية	200 days	11/09/2017	15/06/2018	40%	IQD 4,734,720,000.00						
3	مدرسة حائط ابراهيم الابتدائية ٦ صفات/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	170 days	11/09/2017	04/05/2018	49%	IQD 349,240,000.00						
4	مدرسة المسجد الأقصى الابتدائية ٩ صفات/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	170 days	11/09/2017	04/05/2018	47%	IQD 479,647,000.00						
5	مدرسة ابراهيم طوقان الابتدائية ٩ صفات/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	175 days	11/09/2017	11/05/2018	36%	IQD 400,366,000.00						
6	مدرسة عز الدين القسام الابتدائية ١٨ صفات/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	200 days	11/09/2017	15/06/2018	19%	IQD 827,057,000.00						
7	مدرسة أسماء بنت أبي بكر ٩ صفات/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	180 days	11/09/2017	18/05/2018	47%	IQD 398,228,000.00						
8	مدرسة الزخرف ٩ صفات/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	190 days	11/09/2017	01/06/2018	45%	IQD 1,024,768,500.00						
9	مدرسة الخوارزمي الابتدائية ٩ صفات/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	180 days	11/09/2017	18/05/2018	45%	IQD 425,135,000.00						

مشاريع محافظة بغداد / حزام بغداد

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Comple	Cost	Qtr 2, 2017 Qtr 3, 2017 Qtr 4, 2017 Qtr 1, 2018 Qtr 2, 2018 Qtr 3, 2018						
10	تاهيل ناظم صدر ابو شريب والناظم القاطع في كبلو (٨) من القناة الموحدة والمنشآت الاخرى.	120 days	20/11/2017	04/05/2018	35%	IQD 830,278,500.00							
11	مشاريع البرامح الخاصة	126 days	24/08/2017	15/02/2018	92%	IQD 1,167,018,370.00							
12	نصب شبكات تهرباء في منطقة الهيتاوين والعبادي لقرى (العقاب، ماجد، الكبيشات، الهيتاوين، يوسف، الم ساء، النص، السلاء)	50 days	24/08/2017	01/11/2017	99%	IQD 438,843,370.00							
13	تاهيل شبكات تهرباء (تجهيز محولات) أبو شريب/حزام بغداد	15 days			0%	IQD 255,600,000.00							
14	انشاء جسر عودة الشكر في الرشوش	30 days	07/11/2017	18/12/2017	100%	IQD 88,225,000.00							
15	تطوير موقع الصندوق	45 days	20/11/2017	19/01/2018	100%	IQD 100,000,000.00							
16	تاهيل محطات ماء (السعدان، الهيتاوين، فرع شيفر)	60 days	24/11/2017	15/02/2018	100%	IQD 284,350,000.00							



مجسر عودة الشكر / أبو غريب / حزام بغداد



تأهيل شبكات كهرباء/قرى أبو غريب/حزام بغداد



تأهيل شبكات كهرباء/قرى أبو غريب/حزام بغداد



مدرسة المسجد الأقصى /أبو غريب / حزام بغداد



مدرسة المسجد الأقصى /أبو غريب / حزام بغداد



تأهيل محطة ماء السعدان/أبو غريب / حزام بغداد




تأهيل محطة ماء السعدان/أبو غريب / حزام بغداد



تأهيل محطة ماء الهيتاوين/أبو غريب / حزام بغداد



تأهيل محطة ماء الهيتاوين/أبو غريب / حزام بغداد

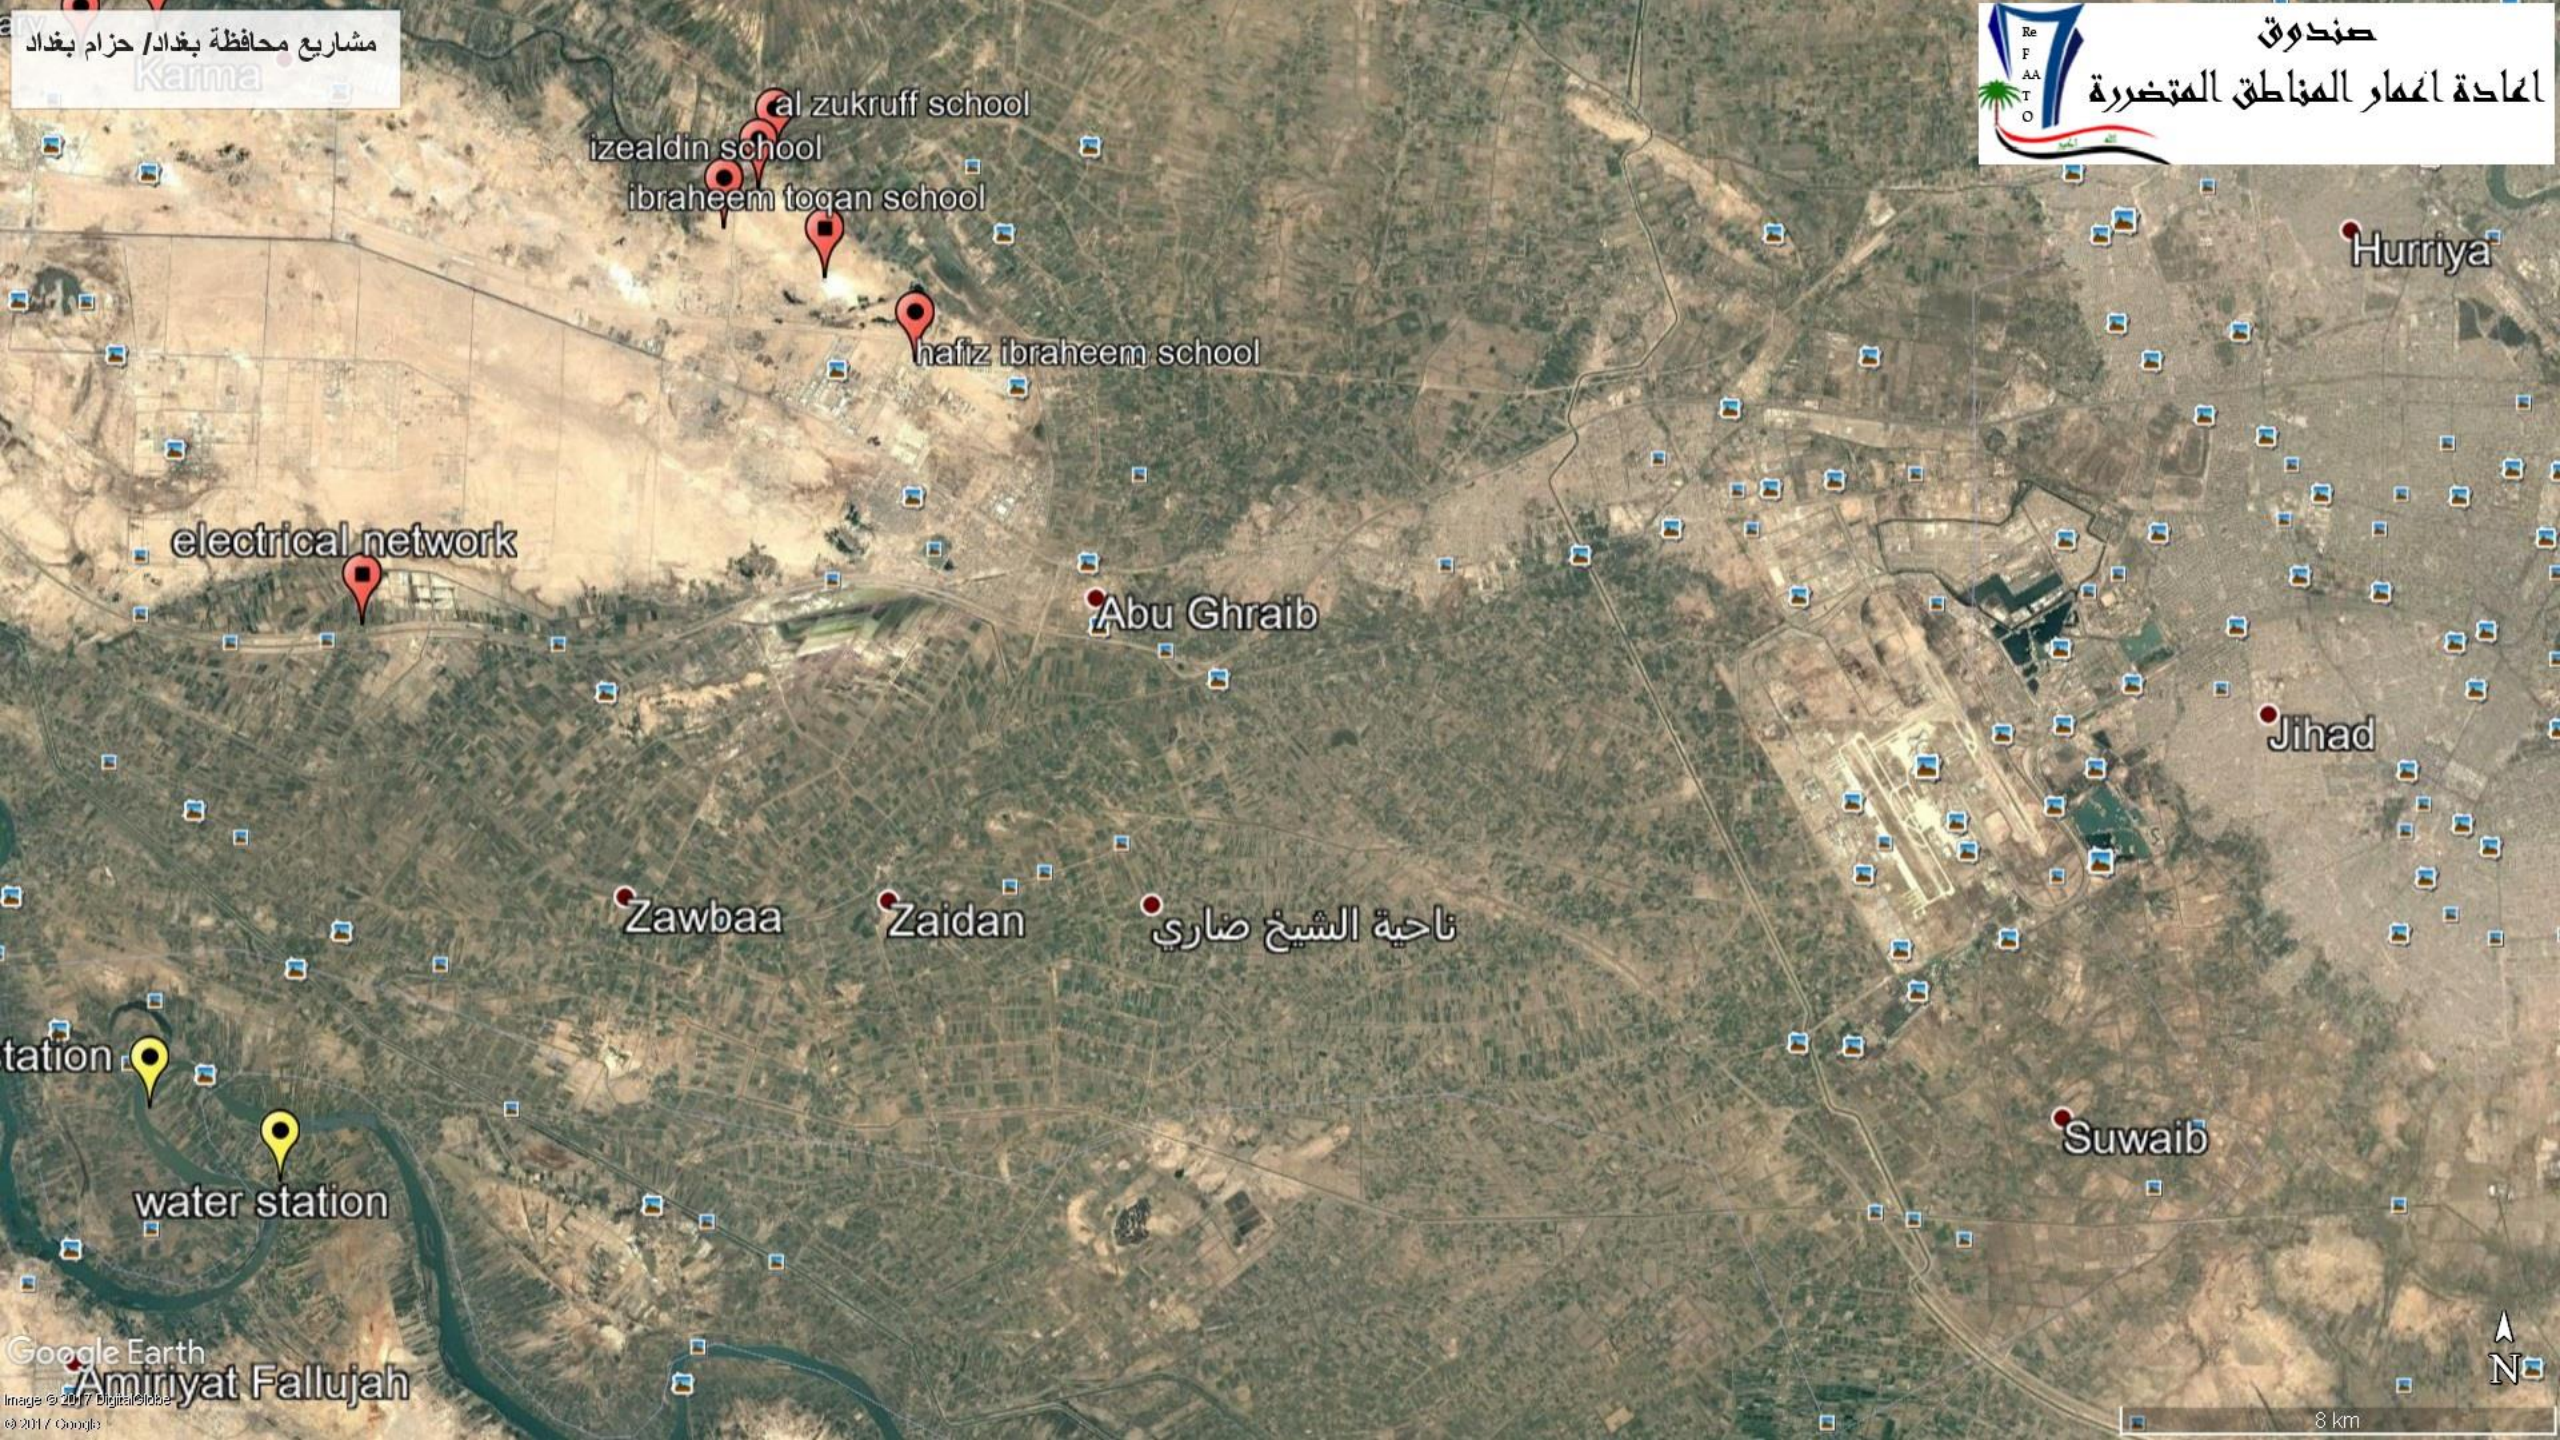



مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي

EODP

مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي لقطاع الطرق والجسور

المشاريع المنجزة	المشاريع المستمرة	عدد المشاريع	نوع المشروع
2	8	10	مشاريع الطرق
9	16	25	مشاريع الجسور
1	-	1	تجهيز جسور حديدية سريعة النصب Wagnar biro
		36	الإجمالي الكلي لعدد لمشاريع القرض الطارئ

مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي / الطرق / محافظة صلاح الدين

ت	اسم المشروع	الشركة المنفذة	تاريخ المباشرة	مدة المشروع يوم	كلفة المشروع (\$)	نسبة الانجاز المخطط %	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات
1	صيانة ٦٤ كم من طريق دجيل - سامراء و ٣٢.٥ كم من الطريق سامراء - ضلوعية	نفحات الراقدين	11/04/2017	240	1,118,900	91%	92%	
2	صيانة ١٠ كم بلد - تقاطع السيد محمد	عطاء الارض	09/05/2017	365	2,408,200	64%	90%	
3	إصلاح وصيانة طريق سامراء - تكريت (على طريق بغداد-موصل) ٤٥ كم	ابن يقطين	09/05/2017	270	2,403,550	75%	100%	
4	إعادة تأهيل طريق (سامراء - دور - العلم) ٤٥.٠٢ كم	حمورابي	31/08/2017	425	6,686,162	0,57%	1,1%	تعاقد مباشر مع شركة حمورابي
5	طريق امرلي ٦.٨ كم							قيد التحليل
	المجموع				12,616,812			

مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي / الجسور / محافظة صلاح الدين

ت	اسم المشروع	الشركة المنفذة	تاريخ المباشرة	مدة المشروع يوم	مبلغ العقد (\$)	نسبة الانجاز المخطط %	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات
1	تأهيل جسري الضلوعية كبيرة وصغيرة والمقتربات	القاو	18/04/2016	365	5,631,151,300	100%	100%	متجز
2	إعادة تأهيل جسر شيشين (الجانب الايسر والايمن)	المتعصم	18/04/2016	240	2,081,982,75	100%	100%	متجز
3	إعادة تأهيل جسر ششمال- سرحة الجانب اليسار واليمين والمقتربات	رياض الفراتين	16/02/2017	365	1,981,000	50%	65%	
4	إعادة تأهيل جسر تكريت (على طريق تكريت-علم)	القاو	31/08/2017	330	3,706,786	9,36%	6%	تعاقد مباشر مع شركة القاو
5	جسر تحويلة سامراء	ماء السماء الدولية	29/10/2017	545	9,929,064	%-	%-	
	المجموع				5,646,768,150			

مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي / الطرق / محافظة ديالى

ت	اسم المشروع	الشركة المنفذة	تاريخ المباشرة	مدة المشروع يوم	مبلغ العقد (\$)	نسبة الانجاز المخطط %	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات
1	صيانة ٢٠ كم طريق من خاتقين - نطق خانة	اشور	19/04/2016	365	8,831,000	100%	100%	متجز
2	صيانة ٤٢,٥ كم من طريق نطق خانة - منتلي	حمورابي	18/04/2016	365	9,043,188	100%	93%	متجز
3	صيانة ٥١,٢ كم من طريق قررة تبة- المنصورية (ديلي عباس)	عطاء الارض	28/09/2017	365	7,729,720	8%	4%	
4	إعادة تأهيل طريق منتلي - بلد روز (أ) 15,5 كم	درع الجزيرة	28/09/2017	365	2,151,520	1,1%	0,76%	
5	إعادة تأهيل طريق منتلي - بلد روز (ب) 25,5 كم	اشور	٢١/٠٨/٢٠١٧	330	6,670,167	5,322	5,45	تقاعد مباشر مع شركة اشور
	المجموع				34,425,595			

مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي / الجسور / محافظة ديالى

ت	اسم المشروع	الشركة المنفذة	تاريخ المباشرة	مدة المشروع	مبلغ العقد (\$)	نسبة الانجاز المخطط %	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات
1	تأهيل جسري المارونية الجديد والقدم	اشور	18/04/2016	150	933,275	100%	100%	متجز
2	إعادة التأهيل جسور امام ويس (٤) و (٧)	القاو	18/04/2016	240	1,870,817	100%	100%	متجز
3	إعادة تأهيل جسري الحديد والخرساني على وادي تارين	حمورابي	18/04/2016	180	1,590,417	100%	100%	متجز
4	إعادة تأهيل جسر الصنوبر	المتصم	18/04/2016	180	935,250	100%	100%	متجز
5	إعادة تأهيل جسر وادي العوسج	المتصم	31/08/2017	180	916,875	40%	23%	تقاعد مباشر مع شركة المتصم
6	إعادة تأهيل جسر عرب جمان							تم استحصال موافقة البنك للتقاعد بطريقة fast NCB حسب اجتماع بيروت اب ٢٠١٧/
7	إعادة تأهيل جسور المخطات (10 كم + ٢٠٠) و (٠ + ٣٠٤)							قيد التحليل
	المجموع				6,246,634			

مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي /الجسور/ محافظة الانبار

ت	اسم المشروع	الشركة المنفذة	تاريخ المباشرة	مدة المشروع	مبلغ العقد (\$)	نسبة الانجاز المخطط %	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات
1	تأهيل جسر وادي المحمدي	اشور	08/02/2017	60	165,834	100%	100%	منجز
2	جسر فلسطين على طريق المرور السريع	مديرية المحافظة	-	-	تم تسليم الروافد الحديدية للمحافظة وتم دفع نفقات الجسر من قبل المحافظة	100%	100%	منجز
3	تأهيل جسر القاسم	الاء العراق	16/02/2017	240	800,000	74%	81,31%	
4	تأهيل جسر البوفراج	الرملة البيضاء+ اسوار الاقصى	16/02/2017	365	2,278,050	37,5%	43,6%	
5	تأهيل جسر عمربن عبد العزيز	نبض الراقدين	16/02/2017	300	1,279,750	58%	65%	
6	جسر عودة الشكر والرفوش							قيد التحليل
7	تأهيل جسر العناز الكونكريتي			365				تم الاعلان في ١٣/١١/٢٠١٧
8	تأهيل جسر الصقلاوية الكونكريتي			300				تم الاعلان في ١٣/١١/٢٠١٧
9	تأهيل جسري الحلوة وذراع دجلة			365				تم الاعلان في ١٣/١١/٢٠١٧
	المجموع				4,523,634			

مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي /الجسور/ محافظة بغداد

ت	اسم المشروع	الشركة المنفذة	تاريخ المباشرة	مدة المشروع	مبلغ العقد (\$)	نسبة الانجاز المخطط %	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات
1	جسر المتني (جسر شمال بغداد)	المعصم	14/08/2016	210	4,174,880	100%	100%	منجز
	المجموع				4,174,880			

مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي /الجسور/ محافظة نينوى

ت	اسم المشروع	الشركة المنفذة	تاريخ المباشرة	مدة المشروع	مبلغ العقد (\$)	نسبة الانجاز المخطط %	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات
1	جسر الموصل الاول	شركة سعد	27/08/2017	180	2,483,584	26,66%	17%	تعاقد مباشر
2	جسر المتني الثاني	اشور	27/08/2017	60	219,584	100%	100%	منجز
3	جسر الموصل الرابع	القاو	27/08/2017	120	870,010	67,8%	65%	تعاقد مباشر
	المجموع				7,748,058			

مشاريع نقل الطاقة/ قطاع الكهرباء

#	المشروع	الكلفة (\$)	رقم العقد	تاريخ العقد	الملاحظات
1	تجهيز معدات لتاهيل محطات ثانوية (132 كي في) في ديبالى . صلاح الدين	4,904,625	EODP-MOE/T.E/G1.	22-Jan-17	تم التوقيع على ملحق تمديد مدة العقد 130 يوم بسبب التأخير في الموافقة على التصاميم بتاريخ 2017/7/27..
2	تجهيز معدات لتاهيل محطات ثانوية (132 كي في) في الانبار. نينوى	4,783,423	EODP-MOE/T.E/G1-1	17-Aug-17	
3	تجهيز أبراج في ديبالى. صلاح الدين	3,873,471	EODP-MOE/T.E/G2-Lot 1	09-Mar-17	
4	تجهيز خطوط نقل الطاقة (132 . 400) كي في مع الملحقات في ديبالى . صلاح الدين	1,351,154	EODP-MOE/T.E/G2-Lot 2,3	12-Jan-17	وقعت إضافة لتمديد فترة العقد لمدة 37 يوما إضافية بسبب التأخير في الموافقة على التصاميم..
5	تجهيز محطات ثانوية متنقلة (132/33) كي في 31,5 ام في أي و (132/11) كي في 25 ام في أي مع مواد احتياطية (ديبالى . صلاح الدين)	9,785,978	EODP-MOE/T.E/G3	27-Oct-16	قررت وزارة الكهرباء زيادة عدد المحطات الثانوية المتنقلة من 7 إلى 10 وحدات (اثنتان منها في الأنبار). وبناء على ذلك وافق البنك الدولي في 11 أكتوبر لزيادة المبلغ الإجمالي من 6.843.501 إلى 9.785.978 دولار. وتمت الموافقة على التمديد مدة (15) يوما وتوقع في أقرب وقت ممكن
6	تجهيز محطات ثانوية متنقلة (132/33) كي في 31,5 ام في أي و (132/11) كي في 25 ام في أي مع مواد احتياطية في نينوى	6,470,700	EODP-MOE/T.E/G3-B	28-May-17	
7	تجهيز محولات قدرة (132/33/11) كي في 63 ام في أي (ديبالى . صلاح الدين)	4,067,777	EODP-MOE/T.E/G4	06-Sep-16	قررت وزارة الكهرباء زيادة عدد محولات الطاقة من 4 إلى 7 وحدات. وبناء على ذلك وافق البنك الدولي في 1 أغسطس على زيادة المبلغ الإجمالي من 2.324.444 \$ إلى 4.067.777 دولار. وطلب المقاول تمديدا بسبب التأخير في التخليص الجمركي.
8	تجهيز محولات قدرة (132/33/11) كي في 63 ام في أي في نينوى	4,067,777	EODP-MOE/T.E/G4-1	13-Aug-17	
9	تجهيز مواد احتياطية للمحطات الثانوية المتنقلة 132/11 كي في (ديبالى . صلاح الدين. الانبار)	2,841,980	EODP-MOE/T.E/G11	04-Jul-17	

مشروع نقل الطاقة / قطاع الكهرباء

#	المشروع	الكلفة (\$)	رقم العقد	تاريخ العقد	الملاحظات
10	تجهيز قابلووات . قواطع دورة ١٣٢ كي في (نينوى . الانبار)	750,000	EODP-MOE/T.E/G14	not contracted	
11	تنصيب خط نقل الطاقة ١٣٢ كي في (محطة كهرباء سامراء - جنوب تكريت) وخط ١٣٢ كي في (مجة ديزلات سامراء - جنوب تكريت)	5,000,000	EODP-MOE/T.E/W1		
12	تنصيب خط نقل الطاقة ١٣٢ (محطة كهرباء سامراء - جنوب سامراء) وخط ١٣٢ كي في (محطة كهرباء سامراء - ديزلات سامراء) وخط ١٣٢ كي في (بلد - ديزلات سامراء) وخط ١٣٢ كي في (غرب بغداد - بيحي)	2,833,829	EODP-MOE/T.E/W2		
13	إعادة تاهيل محطة كهرباء هيت الثانوية ١٣٢ كي في	350,000	EODP-MOE/T.E/W3		
14	تنصيب خط نقل الطاقة (١٣٢ & ٤٠٠) كي في مع الأبراج والملحقات (ديالى . صلاح الدين)	1,000,000	EODP-MOE/T.E/W5-Lot 1,2		
15	تحريات التربة لتنفيذ العقود w1 & w2 في سامراء - تكريت . بغداد	73,750	C2	42962	تم الإنجاز

مشاريع توزيع الطاقة

#	المشروع	الكلفة (\$)	رقم العقد	تاريخ العقد	الملاحظات
1	تجهيز محولات توزيع (٤٠٠.٢٥٠.٦٣٠) كي في أي (ديالى . صلاح الدين)	3,716,010	EODP-MOE/D.E/G5	22-Dec-16	قررت وزارة الكهرباء زيادة عدد محولات التوزيع من ٥٦٧ إلى ٦٥١ وحدة (١٥٪). وبالتالي ارتفع المبلغ الإجمالي من ٣.٢٣٧.١٥٠ إلى ٣.٧١٦.٠١٠ دولار
2	تجهيز محولات توزيع (٤٠٠.٢٥٠) كي في . في الانبار	8,494,121	EODP-MOE/D.E/G5-1	25-Jun-17	
3	تجهيز أعمدة (ديالى . صلاح بالدين)	769,368	EODP-MOE/D.E/G6	01-Sep-16	قررت وزارة الكهرباء زيادة مبلغ العقد إلى ١٠٪ من العطاء الأصلي . وبناء على ذلك وافق البنك الدولي في ٣١ أغسطس لزيادة المبلغ الإجمالي من ٦٩٩.٤٢٥ \$ إلى ٧٦٩.٣٦٧,٥ \$ (تم الانتهاء من العقد ١٠٠٪)
4	تجهيز أعمدة في الانبار	664,300	EODP-MOE/D.E/G6-1	07-May-17	
5	تجهيز محطات ثانوية متنقلة ٣٣/١١ كي في أي ٣١,٥ ام في أي في صلاح الدين	4,860,000	EODP-MOE/D.E/G7-Lot 1	04-Jul-17	
6	تجهيز (L.V switch gear) في صلاح الدين	392,000	EODP-MOE/D.E/G7-Lot 2	09-Mar-17	
7	تجهيز شاحنة مع رافعة ١٠ طن في صلاح الدين	660,000	EODP-MOE/D.E/G8-1	01-Sep-16	
8	تجهيز مثقاب ارضي في صلاح الدين	490,500	EODP-MOE/D.E/G8-2	01-Sep-16	العقد منجز ١٠٠٪
9	تجهيز شاحنة ٢ طن في صلاح الدين	306,650	EODP-MOE/D.E/G8-3	08-Sep-16	تم التوقيع على الملحق لفترة تمديد المشروع إلى ٤٥ يوما بسبب التأخر في إصدار دفعات وإصدار خطاب تمهيد من قبل وزارة الكهرباء
10	تجهيز قابلات واسلاك (ديالى . صلاح الدين)	2,098,631	EODP-MOE/D.E/G9-Lot 1,2,3	11-Jan-17	
11	تجهيز قابلات واسلاك (الانبار)	367,500	EODP-MOE/D.E/G9-1	03-Jul-17	
12	تجهيز ملحقات شبكات توزيع (ديالى . صلاح الدين)	780,500	EODP-MOE/D.E/G10 Lot 1	24-Jul-17	

مشاريع توزيع الطاقة

الملاحظات	تاريخ العقد	رقم العقد	الكلفة (\$)	المشروع	#
تمديد لفترة ٤٥ يوم	15-Mar-17	EODP-MOE/D.E/G10 Lot 4	455,400	تجهيز (L.V switch gear) في ديبال	13
	05-Jun-17	EODP-MOE/D.E/G12	291,486,49	تجهيز زيت محولات (الاتيار)	14
	21-Jun-17	EODP-MOE/D.E/G13	150,000	تجهيز فلتر زيت ٦٠٠٠L/H (الاتيار)	15
اعداد المناقصة		EODP-MOE/D.E/W9	3,000,000	إعادة تاهيل مركز الأنظمة ومركز البحوث	16
			67,101,864	Total	

مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي لقطاع البلديات

ت	المشروع	رمز المشروع	الكلفة	الناحية/القضاء/المحافظة	الملاحظات
1	إعادة تأهيل مشروع ماء العوجة-عينات ١٠٠٠ م ^٣ /ساعة	W01	1,639,092.50	قضاء تكريت- صلاح الدين	قيد التنفيذ ونسبة الإنجاز الفعلية للمشروع ١٥%.
2	تأهيل وحدات تصفية الماء المجمعة لـ المجزم ٢٠٠ م ^٣ /ساعة حماد شهاب ٢٠٠ م ^٣ /ساعة الصقور ٢٠٠ م ^٣ /ساعة الختك ٥٠ م ^٣ /ساعة	W02		قضاء تكريت- صلاح الدين	تم إحالة العمل وفي طور توقيع العقد.
3	تجهيز وتأهيل وحدات تصفية الماء المجمعة لـ الهروان ٢٠٠ م ^٣ /ساعة اليوهيازع ٢٠٠ م ^٣ /ساعة اليوشفيدخ ٢٠٠ م ^٣ /ساعة السادة ٢٠٠ م ^٣ /ساعة الحوايح ٢٠٠ م ^٣ /ساعة العرب الكبيرة ٢٠٠ م ^٣ /ساعة جيوان ٢٠٠ م ^٣ /ساعة	W03		قضاء تكريت- صلاح الدين	قيد الدراسة والتحليل.
4	تجهيز وتأهيل وحدات تصفية الماء المجمعة لـ الدور الجنوبي- دواجن ١٠٠ م ^٣ /ساعة الدور الجنوبي الجديد ٢٠٠ م ^٣ /ساعة الدور الغربية ٢٠٠ م ^٣ /ساعة اليودلف ٢٠٠ م ^٣ /ساعة	W04		ناحية الدور - صلاح الدين	قيد الدراسة والتحليل.

مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي لقطاع البلديات

ت	المشروع	رمز المشروع	الكلفة	الناحية/القضاء/المحافظة	الملاحظات
5	تجهيز وتأهيل الوحدات المجمع لتصفية مياه الشرب ل كيبية ٢٠٠ م ^٣ /ساعة انشاء وتجهيز وتصيب وحدات الماء المجمع ل ☐ مشروع ماء الضلوعية القديم ٢٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ مجمع مركز الناحية الاول ٢٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ مجمع ماء الحردانية الثالث ٢٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ مجمع ماء الداودية ٢٠٠ م ^٣ /ساعة	W05		ناحية الضلوعية - صلاح الدين	في طور إعادة الإعلان للمناقصة.
6	تأهيل مشروع ماء ل ☐ الرواشد القديم ٤٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ الرواشد الجديد ٦٠٠ م ^٣ /ساعة	W06		ناحية الضلوعية - صلاح الدين	قيد الدراسة والتحليل
7	تأهيل مشروع تصفية ماء جلولاء القديم ٢٠٠ م ^٣ /ساعة والوحدة المجمع ل ☐ حي الوحدة ٢٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ حي التجنيد ٥٠ م ^٣ /ساعة ☐ العروبة ٢٠٠ م ^٣ /ساعة ومحطة التقوية ل ☐ المهايف ٦٠ م ^٣ /ساعة	W07	893,059.00	ناحية جلولاء- ديالى	تم توقيع العقد بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٧

مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي لقطاع البلديات

ت	المشروع	رمز المشروع	الكلفة	الناحية/القضاء/المحافظة	الملاحظات
8	تأهيل المحطات الرئيسية لتجميع وضخ المجاري في منطقة شيشين ١٠٠٠ م ^٣ / ساعة وفي منطقة الزهور ٢٥٠ م ^٣ / ساعة مع محطات الرقع الثانوية في احياء □ المستشفى ٢٥٠ م ^٣ / ساعة □ الجسر ٢٥٠ م ^٣ / ساعة □ الشيشين ٢٥٠ م ^٣ / ساعة □ الفندق ٢٥٠ م ^٣ / ساعة □ البلديات ٢٥٠ م ^٣ / ساعة □ شارع ٤٠ ١٥٠ م ^٣ / ساعة □ البوعبيد ٢٥٠ م ^٣ / ساعة □ العصري ٢٥٠ م ^٣ / ساعة □ الزهور ٢٥٠ م ^٣ / ساعة وايضا اعادة تأهيل بتايي مركز مجاري صلاح الدين ودائرة الخدمات والصيانة	W 08		مدينة تكريت - صلاح الدين	في طور توقيع العقد
9	تأهيل وحدة تصفية الماء المجمعة وتوصيلات شبكة التوزيع في العظيم ٢٠٠ م ^٣ / ساعة	W 10 A		محافظة دبال	في طور توقيع العقد
10	تنفيذ خط انبوي بقطر ٤٠٠ ملم واعادة تأهيل محطة سحب الزركانية ٢٠٠ م ^٣ / ساعة	W 10 B	2,672,445.00	محافظة دبال	باشرت الشركة المتنفذة اعمالها في المشروع بتاريخ ٦/١٢/٢٠١٧
11	تأهيل محطة ضخ مياه الامطار في السعدية بطاقة ١٨٠٠ م ^٣ / ساعة وشبكات مياه الامطار في ناحيتي السعدية وجولواء ومركز مجاري السعدية	W 11		محافظة دبال	في طور توقيع العقد

مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي لقطاع البلديات

ت	المشروع	رمز المشروع	الكلفة	الناحية/القضاء/المحافظة	الملاحظات
12	تجهيز وتأهيل الوحدات المجمعنة لتصفية مياه الشرب لـ ☐ العلم القديم ٢٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ العالي ٢٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ باسم زريج ٢٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ السمرة ٢٠٠ م ^٣ /ساعة	W 12 A		ناحية العلم – صلاح الدين	قيد الدراسة والتحليل
13	تجهيز وتأهيل الوحدات المجمعنة لتصفية مياه الشرب لـ ☐ العساجرة والعكوز ٢٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ ربيضة ٢٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ الخزامية ٢٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ الجديدة ٢٠٠ م ^٣ /ساعة	W 12 B		ناحية العلم – صلاح الدين	قيد الدراسة والتحليل
14	تجهيز وتأهيل الوحدات المجمعنة لتصفية مياه الشرب لـ ☐ الجمعية ١٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ المزارع الاول ١٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ المزارع الثاني ٢٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ الاحباب الاول ١٠٠ م ^٣ /ساعة	W 13 A		صلاح الدين	قيد الدراسة والتحليل
15	تجهيز وتنفيذ الخط الناقل بطول ٨,٤ كم وبقطر ٤٠٠ ملم نوع دكتايل الى ناحية يثرب	W 13 B		صلاح الدين	في طور توقيع العقد

مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي لقطاع البلديات

ت	المشروع	رمز المشروع	الكلفة	الناحية/القضاء/المحافظة	الملاحظات
16	تجهيز وتأهيل الوحدات المجمعة لتصفية مياه الشرب لـ ☐ البوعطية ١٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ الجمسيرة ٢٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ ملة رحيم ١٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ البوجيلي الاول ١٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ الاحباب الثاني ١٠٠ م ^٣ /ساعة	W 13 C	1,604,992.00	صلاح الدين	تم توقيع العقد بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٧
17	تنفيذ خط انبوبي لـ امرلي بروشلي الى امرلي	W 14	730,500.00	صلاح الدين	باشرت الشركة المنفذة اعمالها في المشروع بتاريخ ٢/١/٢٠١٨
18	تأهيل مشروع تصفية الماء القديم في المقدادية مع محطة المسحب ٤٠٠ م ^٣ /ساعة وكذلك لوحدات تصفية الماء المجمعة في كل من، ☐ حميس ٢٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ شاقراق ٥٠ م ^٣ /ساعة ☐ توكل قزلجة ١٠٠ م ^٣ /ساعة	W 15 A		ناحية المقدادية – محافظة ديالى	تم إعادة الإعلان للمناقصة بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٧
19	تأهيل الوحدات المجمعة لتصفية مياه الشرب لـ ☐ الهارونية ٥٠ م ^٣ /ساعة ☐ نوفل الصدور ٢٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ اسبيود وزحام والعالي ٢٠٠ م ^٣ /ساعة ☐ مجمع توكل والطنيرة وابودهن ٢٠٠ م ^٣ /ساعة	W 15 B		ناحية المقدادية – محافظة ديالى	قيد الراسة والتحليل
20	اعادة تأهيل محطة الرفع الرئيسية للمجاري في الفلوجة	W 16	876,040	محافظة الاتبار	قيد التنفيذ ونسبة الإنجاز الفعلية للمشروع ٢٥%

مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي لقطاع البلديات / تجهيز اليات

ت	المشروع	رقم العقد	الكلفة (\$)	الشركة المنفذة	ديالى	صالح الدين	الانبار	نسبة الإنجاز	الملاحظات
1	تجهيز حفارات متعددة الاغراض عدد (١٤)	G01	١,٣٢٧,٥٦٤	الغدوة للوكالات التجارية	٦	٨		%١٠٠	
2	تجهيز حفارات متعددة الاغراض عدد (٥)	G01 A	٤٧٤,١٣٠	الغدوة للوكالات التجارية			٥	%٠	
3	تجهيز سيارات سحب مياه المجاري عدد (١٩)	G02	٤,١٣٧,١٥٥	النورية للوكالات التجارية	٤	١٥		%١٠٠	
4	تجهيز سيارات سحب مياه المجاري عدد (٢)	G02 A	٤٣٥,٣٥٢	النورية للوكالات التجارية			٢	%١٠٠	
5	تجهيز سيارات حوضية للماء الصافي عدد (٢٥)	G03	٤,٣٢٦,١٢٠	تكنولوجيا المكائن للتجارة العامة	١٧	٨		%١٠٠	
6	تجهيز سيارات حوضية للماء الصافي (٢)	G03 A	٤١١,٠٧٢	تكنولوجيا المكائن للتجارة العامة			٢	%١٠٠	
7	تجهيز سيارات كرين عدد (٨)	G04	١,٥٠٩,٧٢٠	نيع زمزم	٥	٣		%١٠٠	
8	تجهيز سيارات كرين عدد (٢)	G04 A		نيع زمزم				%٠	تم اضافته من ضمن الاليات التي ستجهز من وفر القرض
9	تجهيز (٥) سيارات صاروخية	G05	٨٢٦,١٦٤	تكنولوجيا المكائن للتجارة العامة.	٢	٣		%١٠٠	
10	تجهيز كابسات نفايات عدد (٦٦)	G06	٥,٩٦٥,٦٠٠	النورية للوكالات التجارية العامة	١٣	٥٣		%١٠٠	
11	تجهيز كابسات نفايات عدد (٢٧)	G06 A	٢,٢٧٦,٣٩٠	النورية للوكالات التجارية العامة			٢٧	%١٠٠	
12	تجهيز حاويات نفايات عدد (٣١٢٠)	G07	١,٤٤٤,٥٦٠	القاصد للوكالات التجارية	١٠٥٠	٢٠٧٠		%١٠٠	
13	تجهيز دنابر عدد (٤)	G08	٨٠,٠٠٠	الغدوة للوكالات التجارية	٢	٢		%١٠٠	

مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي لقطاع البلديات / تجهيز اليات

ت	المشروع	رقم العقد	الكلفة (\$)	الشركة المنفذة	ديالى	صالح الدين	الانبار	نسبة الإنجاز	الملاحظات
14	جهاز تركتر مع عرباتها عدد (٦) وكومبريسر هواء + كمسارة عدد (٢)	G09 -2017	٣١٤,٣٠٨	الغدوة للوكالات التجارية	٢ تركتر مع عربتها	٤ تركتر مع عربتها + ٢ كومبريسر مع الكمسارة		%٠	العقد في طور التجهيز
15	تجهيز الية صغيرة متعددة الاغراض (Skid Steer Loaders) عدد ٥	G 11	٢٢٣,٠٨٠	النورية للوكالات التجارية		٥		%١٠٠	
16	تجهيز الية صغيرة متعددة الاغراض (Skid Steer Loaders) عدد ٢	G11-A	٨٤,٧٧٠	النورية للوكالات التجارية			٢	%١٠٠	
17	تجهيز تنكرو قود سعة ١٦٠٠٠ لتر عدد ٣	G 12	٦٥٧,٧٥٠	النورية للوكالات التجارية			٣	%٠	- تاريخ توقيع العقد ٦/١١/٢٠١٧ - تاريخ انتهاء العقد في ٣/٢/٢٠١٨ - العقد في طور التجهيز

مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي لقطاع البلديات / تجهيز اليات

ت	المشروع	رقم العقد	الكلفة (\$)	الشركة المنفذة	ديالى	صالح الدين	الانبار	نسبة الإنجاز	الملاحظات
18	تجهيز لوري قلاب حمولة ٣ طن عدد / ٣ و سيارة حمل حمولة ٣ طن عدد / ٤	G 13	٢٩٠,٧٢٨	نيع زمزم			٣ لوري قلاب + ٤ سيارة حمل	%٠	- تاريخ توقيع العقد ١٩/١١/٢٠١٧ - تاريخ انتهاء العقد في ٢٧/٤/٢٠١٨ - العقد في طور التجهيز
19	تجهيز ماكينة لحام ديزل عدد / ٣	G 14					٣	%٠	تم الغاء العقد



جسر عمر بن عبد العزيز / الرمادي / الانبار



جسر عمر بن عبد العزيز / الرمادي / الانبار



جسر شيشن / صلاح الدين



جسر شيشن / صلاح الدين



تجهيز محطات ثانوية متنقلة للمحافظات المحررة



تجهيز اليات للمحافظات المحررة



تجهيز اليات للمحافظات المحررة





طريق نفط خانة - مندلي ٤٢,٥ كم



جسر القاسم / الرمادي / الانبار



الجسر الرابع / الموصل
(جسر مؤقت)

مشاريع القرض الألماني

مشاريع القرض الألماني / المرحلة الأولى (QW)

ت	القطاع	المشروع	المحافظة	الكلفة (دولار)	الملاحظات
1	الكهرباء	نقل الطاقة	تاهيل محطة عداية الثانوية ، تتضمن محولة عدد/١١ ٢/١٣٢/٢٣ كي في ٦٣ ام في أي	3,896,000	نينوى / الموصل
2	الكهرباء	نقل الطاقة	تاهيل محطة تلعفر الثانوية ، تتضمن محولة عدد/١١ ٢/١٣٢/٢٣ كي في ٦٣ ام في أي	4,784,000	نينوى / الموصل
3	الكهرباء	نقل الطاقة	تاهيل محطة التبادل الثانوية ، تتضمن محولة عدد/١١ ٣/١٣٢/٢٣ كي في ٦٣ ام في أي	4,591,000	نينوى / الموصل
4	الكهرباء	نقل الطاقة	تاهيل محطة تل عوينات الثانوية ، تتضمن محولة عدد/١١ ٢/١٣٢/٢٣ كي في ٦٣ ام في أي	2,754,000	نينوى / الموصل
5	الكهرباء	نقل الطاقة	تجهيز ثلاث محولات قدرة ١١/١٣٢ كي في ٦٣ ام في أي	1,800,000	نينوى / الموصل
6	الكهرباء	نقل الطاقة	تاهيل خط نقل الطاقة ١٣٢ كي في	2,875,000	نينوى / الموصل
7	الكهرباء	التوزيع	تجهيز محطة ثانوية متنقلة ١١/٢٣ كي في ٣١,٥ ام في أي ، عدد/٨	8,000,000	نينوى
8	الكهرباء	التوزيع	تجهيز محولات قدرة ١١/٢٣ كي في ٣١,٥ ام في أي عدد/٥	2,500,000	نينوى
9	الكهرباء	التوزيع	تجهيز محولات توزيع ٤,٠/١١ كي في مختلفة القدرات ، محولات توزيع نوع (KIOSK) مع ملحقاتها	14,437,000	نينوى
	/	خدمات استشارية		2,200,000	
	/	احتياط (طوارئ)		5,500,000	
				53,337,000	

مشاريع القرض الألماني / المرحلة الثانية

ت	القطاع	المشروع	المحافظة	الكلفة (يورو)	الملاحظات
1	الكهرباء	نقل الطاقة	محطة موصل الثانوية ٤٠٠ كي في (GIS) . إعادة اعمار المحطة الثانوية (GIS) ١١/١٣٢/٤٠٠ كي في ٤*٢٥٠ ام في أي	47,731,709	نينوى / الموصل
2	الكهرباء	نقل الطاقة	إعادة اعمار/ بناء جديد ١٣٢/٣٣ كي في ، ٣*٩٠ ام في أي ، محطة ثانوية نوع GIS مع مغذيات ١٣٢ كي في عدد ٦/ بدلا من محطة تكريت الثانوية القديمة	15,384,615	صلاح الدين / تكريت
3	الكهرباء	توزيع الطاقة	بناء محطة توزيع ثانوية ٣٣/١١ كي في ٢*٣١,٥ ام في أي ، بجانب محطة تكريت الثانوية الجديدة نوع GIS 132/33 كي في لربط خط التوزيع ١١ كي في	3,418,803	صلاح الدين / تكريت
4	الكهرباء	نقل الطاقة	إعادة بناء / بناء جديد محطة ثانوية نوع GIS 132/33/11 كي في ٣*٩٠ ام في أي ، مع مغذيات نقل ١٣٢ كي في عدد ٦	15,384,615	الانبار / الرمادي
5	الكهرباء	توزيع الطاقة	بناء محطة توزيع ثانوية ٣٣/١١ كي في ، ٢*٣١,٥ ام في أي . بجانب محطة الرمادي الثانوية الجديدة ١٣٢/٣٣ كي في نوع GIS	3,418,803	الانبار / الرمادي
6	الكهرباء	نقل الطاقة	تاهيل خط حديثة - القائم لنقل الطاقة ١٣٢ كي في	30,252,100	الانبار
				115,590,645	

المنحة الكويتية لقطاع الصحة

مشاريع المنحة الكويتية لقطاع الصحة / محافظة الانبار

ت	المحافظة	القضاء/ الناحية	اسم المشروع	عدد المستفيدين	الكلفة بالدولار
1	الانبار	الكرمة / السجر	هدم وانشاء وتجهيز مركز صحي نموذجي رئيسي م. ص. الكرمة	15000	874,875.75
2		الفلوجة	تأهيل وتجهيز بناية المركز التخصصي لطب الاسنان في الفلوجة	400000	495,670.21
3		الرمادي / ابو خليفة	هدم وانشاء وتجهيز مركز صحي فرعي مع دار سكن في منطقة الصراه	5500	333,651.04
4		هيت	تجهيز اجهزة طبية تخصصية لمستشفى هيت العام	150000	1,475,769.98
5		هيت / الفرات	هدم وانشاء وتجهيز مركز صحي نموذجي رئيسي الفرات	8000	874,875.75
6		جزيرة الخالدية	هدم وانشاء وتجهيز مركز صحي نموذجي رئيسي البوشهاب	7000	874,875.75
7		عامرية الصمود	هدم وانشاء وتجهيز مركز صحي نموذجي رئيسي الهوى	5250	874,875.75
8		الرمادي	هدم وانشاء مخازن الصيدلانية عدد 3 في قضاء الرمادي	1,500,00	565,192.25
			المجموع	590750	6,369,786.48

مشاريع المنحة الكويتية لقطاع الصحة / شمال بابل

ت	المحافظة	القضاء/ الناحية	اسم المشروع	عدد المستفيدين	الكلفة بالدولار
1	بابل	المسيب / جرف النصر	هدم وانشاء وتجهيز مركز صحي فرعي الباج الجنوبي	5000	451552.0333
			المجموع	5000	451,552.03

مشاريع المنحة الكويتية لقطاع الصحة / محافظة نينوى

ت	المحافظة	القضاء/ الناحية	اسم المشروع	عدد المستفيدين	الكلفة بالدولار
1	نينوى	الموصل	هدم وانشاء وتجهيز بناء مركز صحي رئيسي الموصل الجديدة	50,000	586,935
2		الموصل	تاهيل وتجهيز مختبر الصحة العامة	3,000,000	1,220,759
3		سنجار	تاهيل وتجهيز مركز صحي حي النصر	25,000	413,726
4		الموصل	هدم وانشاء وتجهيز مركز صحي رئيسي القاهرة	500,000	1,032,630
			المجموع	3,575,000	3,254,051

مشاريع المنحة الكويتية لقطاع الصحة لمحافظة صباح الدين

ت	المحافظة	القضاء / الناحية	المشروع	عدد المستفيدين	الكلفة بالدولار
1	صباح الدين	بلد- الضلوعية	هدم وإعادة بناء وتجهيز مركز صحي رئيسي / ابو جواري	12,000	827,506
2		الطوز	هدم وإعادة بناء وتجهيز بيت صحي قرية سرحا	12,000	20,460
3		بلد	هدم وإعادة بناء وتجهيز مركز صحي رئيسي / يثرب	11,000	827,506
4		تكريت	هدم وإعادة بناء وتجهيز مركز صحي رئيسي / ابو عجيل	7,000	827,506
5		العلم	هدم وإعادة بناء وتجهيز مركز صحي رئيسي / العلم	50,000	827,506
			المجموع	92,000	3,330,483

مشاريع المنحة الكويتية لقطاع الصحة / محافظة ديالى

ت	المحافظة	القضاء/ الناحية	اسم المشروع	عدد المستفيدين	الكلفة بالدولار
1	ديالى	المقدادية	تاهيل وتجهيز مستشفى الزهراء التعليمي	153,328	1,453,349
	المجموع				1,453,349

منحة جمهورية التشيك لقضاء
الحمداية

منحة جمهورية الجيك لقضاء الحمدانية (١٠,٠٠٠,٠٠٠) كورونا

ت	نوع المشروع	عدد المشاريع	الكلفة التخمينية (دولار)	الملاحظات
1	مشاريع قطاع الكهرباء	6	180,200	
2	مشاريع قطاع الصحة	4	265,000	
	المجموع	10	445,200	

منحة جمهورية الجيك لقضاء الحمدانية (١٠,٠٠٠,٠٠٠) كورونا / قطاع الكهرباء

#	المشروع	الكمية	الكلفة (دولار)	الملاحظات
1	محولة سعة ٤٠٠ كي في أي	5	28,000	
2	محولة سعة ٢٥٠ كي في أي	23	115,000	
3	سلك المنيوم ٩٥mm ²	20KM	24,000	
4	قابلو سلك احادي	1500m	7,800	
6	عازل ١١ كي في أي	500	3,000	
7	عازل بكرة	750	2,400	
	المجموع		180,200	

منحة جمهورية الجيك لقضاء الحمدانية (١٠,٠٠٠,٠٠٠) كورونا / أجهزة طبية

#	المشروع	الكمية	الكلفة (دولار)	الملاحظات
1	ناظور الجهاز الهضمي	1	75,000	
2	ناظور الجراحة العامة	1	75,000	
3	ناظور البطن	1	75,000	
4	كرسي اسنان مع كافة ملحقاته	1	40,000	
	المجموع		265,000	
