


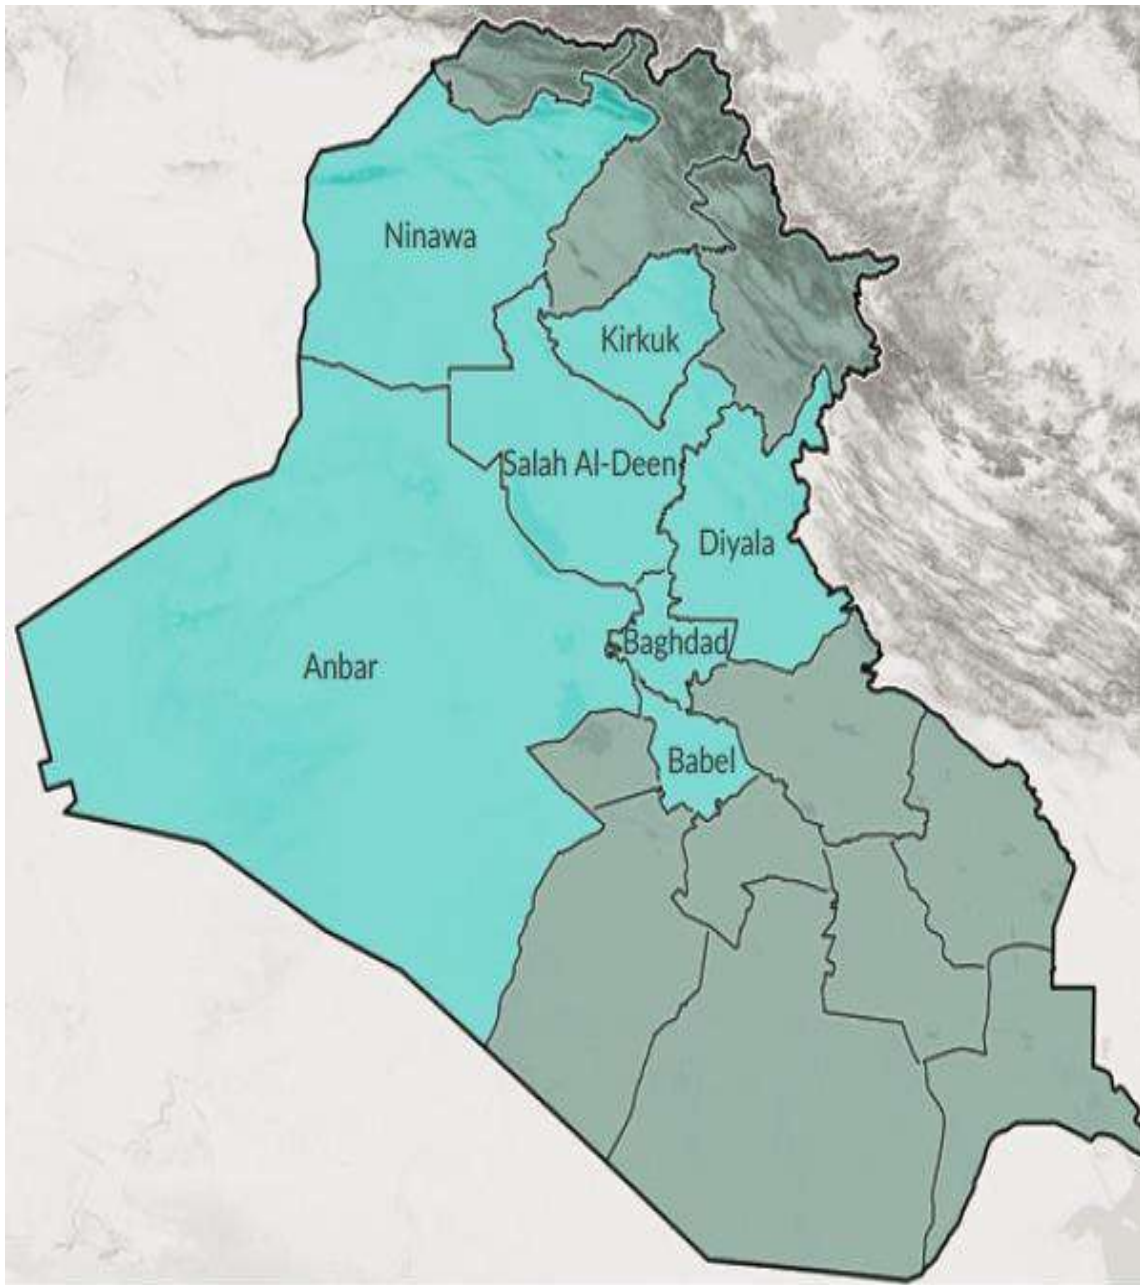

صندوق
إعادة اعمار المناطق المتضررة

التقرير الفني لمشاريع
صندوق إعادة الاعمار
منذ تأسيسه و لغاية
31/3/2022
الجزء (الثالث و الخمسون)
اذار 2022

المقدمة

- تأسس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وفق المادة (28) من قانون الموازنة الفدرالية العامة لعام 2015. أعقبه صدور نظام الصندوق رقم (2) لسنة 2015، وقد نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددها (4352) في 16/2/2015 وقد جاء فيها (يؤسس صندوق إعادة اعمار المناطق التي دمرها الإرهاب ويمول من المنح والمساعدات الدولية، ويخصص له مبلغ من الموازنة الاتحادية).
- وفي عام 2017 تم تعديل بعض فقرات النظام وحددت الهيكلية الإدارية وصدر النظام رقم (3) في جريدة الوقائع العراقية بعددها (4441).
- وقد حددت مناطق عمل الصندوق في المدن التي دمرها الإرهاب في كل من الانبار، ديالى، صلاح الدين، نينوى، شمال بابل، حزام بغداد (أبو غريب) وبعض المناطق الجنوبية من كركوك.
- هذا الكراس وهو تقريراً فنياً والذي يصدر كل شهر لمشاريع التي ينفذها الصندوق من الموازنة الفدرالية بشقيها الاستثماري والبرامج الخاصة، ويتم التوثيق بإحداثيات الـ (GPS) إضافة الى صور ومراحل الإنجاز بصورة دقيقة، كما ويحتوي هذا الكراس على المشاريع التي تنفذها الوزارات القطاعية كجزء من واجبات الصندوق في التدقيق المالي والفني التي يشرف عليها مدققون عالميون معينين من قبل الصندوق من خلال البنك الدولي والبنك الألماني.
- نأمل ان ترسم هذه السلسلة الشهرية من الكراسات خارطة إعادة الاعمار المرتقبة.
- والله ولي التوفيق.

هـدفه إنشاء الصندوق:-

- 1- إعادة اعمار وتأهيل المناطق التي دمرها الإرهاب وإزالة آثارها.
- 2- معالجة الاضرار الحاصلة في البنى التحتية.
- 3- تعويض الفرص التنموية.

آلية عمل الصندوق:

يعمل الصندوق كمنسق ومراقب على تنفيذ القروض التي تقدم للعراق مثل قرض البنك الدولي وقرض بنك التنمية الألماني والتي تنفذ من قبل الوزارات القطاعية او من خلال المنح (المنحة الكويتية للقطاع الصحي والمنحة الصينية لأليات البلديات والمنحة التشيكية).

كما ويعمل الصندوق كمنفذ للمشاريع التي تقدم له من المحافظات المتضررة من خلال المبالغ المرصودة من الموازنة الاتحادية

مهام صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وفق نظام رقم (3) لسنة 2017

- حسب المادة اولا من نظام صندوق إعادة الاعمار يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بشخصية معنوية وذات استقلال مالي واداري.

وفق المادة (5) يمارس الصندوق المهام الآتية:-

- التنسيق مع الجهات المعنية لوضع أولويات المشاريع في المحافظات المتضررة.
- السعي الى جلب المنح والهبات والمساعدات والقروض.
- القيام بإجراءات التعاقد ومتابعة تنفيذ المشاريع.
- متابعة تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار الممولة من المنح والقروض.
- تقديم الخطط اللازمة لإعادة الاعمار ووضع السياسات اللازمة لتحقيق اهداف الدولة.
- تنظيم ورعاية المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية المتعلقة بإعادة الاعمار وذلك سعيا لجلب المنح والهبات والمساعدات.

صندوق إعادة الاعمار

- الرؤيا:

بناء الثقة بين العراقيين والدولة من جهة وبين العراق والمجتمع الدولي من جهة أخرى.

- الرسالة:

إعادة بناء الانسان والجدران وادامة العجلة الاقتصادية في المدن المتضررة من العمليات الإرهابية.

وتتم من خلال الابعاد التالية:-

1- البعد الاجتماعي:

تجديد العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين على المصداقية والثقة في جهود إعادة

الاعمار.

2- البعد الاقتصادي:

ادامة العجلة الاقتصادية في المناطق المتضررة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة

3- البعد الفيزيائي وإعادة الخدمات:

إعادة اعمار المنشآت العامة والخاصة والمتضررة من العمليات الارهابية

القسم الأول

ملخص مشاريع الصندوق المنفذة على الموازنة الاتحادية للاعوام 2016 لغاية 2021

السنة	المبلغ المتعاقد عليه / مليار دينار	عدد المشاريع المخطط لها	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المستمرة	نسبة المشاريع المنجزة من المتعاقد عليها	الملاحظات
2016	19,784	150	150	150	—	100%	أنجزت المشاريع بالكامل
2017	97,432	163	160	160	0	100%	انجزت بالكامل مع سحب عمل من 3 مشاريع
2018	109,122	198	196	191	5	97%	مشروعين مؤجلة
2019	357,383	462	446	354	92	79%	16 مشروع لم يتم التعاقد عليها مؤجلة
2020	4,962	23	23	23	0	100%	جميع مشاريع خطة 2020 نفذت على خطة البرامج الخاصة
2021	778,900	647	647	127	520	20%	
المجموع	1,367,583	1643	1622	1005	617	62%	

جدول يمثل اعداد مشاريع صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة للموازنة الاتحادية حسب القطاعات منذ عام 2016 - 2021

المجموع		القطاعات																										المحافظة
		مباني حكومية		الموارد المائية		الماء والمجاري		الكهرباء		الطرق والجسور		الصحة		الشباب والرياضة		الزراعة		الداخلية		التعليم العالي		التربية		التجارة		البلدية و البلديات		
المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	
146	209	7	12	3	4	8	9	16	21	12	14	10	11	0	1	2	6	7	9	19	28	35	39	6	8	21	47	بغداد
73	111	1	3	2	3	0	0	11	15	5	5	1	2	0	1	1	3	0	2	5	14	29	29	2	4	16	30	استثماري
73	98	6	9	1	1	8	9	5	6	7	9	9	9	0	0	1	3	7	7	14	14	6	10	4	4	5	17	برامج خاصة
373	605	15	32	12	25	124	156	34	46	28	54	12	21	3	4	3	4	12	26	24	45	63	97	3	3	40	92	الأنبار
120	288	7	21	2	4	10	40	10	20	13	25	5	13	1	2		1	5	12	1	19	50	78			16	53	استثماري
253	317	8	11	10	21	114	116	24	26	15	29	7	8	2	2	3	3	7	14	23	26	13	19	3	3	24	39	برامج خاصة
81	166	6	9			9	17	3	5	13	23	2	4	1	1			10	13	2	5	13	20			22	69	صلاح الدين
34	64	2	4	0	0	0	5	1	1	6	7	1	3	0	0	0	0	0	2	2	4	13	20	0	0	9	18	استثماري
47	102	4	5	0	0	9	12	2	4	7	16	1	1	1	1	0	0	10	11	0	1	0	0	0	0	13	51	برامج خاصة
161	255		1			24	31	16	22	77	129	4	6	1	1			4	4			18	21			17	40	ديالى
88	137					6	10	9	15	45	63	3	4					3	3			12	14			10	28	استثماري
73	118		1			18	21	7	7	32	66	1	2	1	1			1	1			6	7			7	12	برامج خاصة
82	107	2	3	1	1	17	18	6	6	15	23	0	0			2	2	8	9	0	1	14	20	2	2	15	22	كركوك
50	62	1	2	0	0	8	8	3	3	10	12	0	0	0	0	2	2	1	1	0	1	14	20	0	0	11	13	استثماري
32	45	1	1	1	1	9	10	3	3	5	11	0	0	0	0	0	0	7	8	0	0	0	0	2	2	4	9	برامج خاصة
134	212	6	7	2	3	15	25	15	17	20	54	5	5					3	6			20	25			48	70	حزام بغداد
46	85	2	2	1	2	2	9	5	5	5	25	1	1									12	16			18	25	استثماري
88	127	4	5	1	1	13	16	10	12	15	29	4	4					3	6			8	9			30	45	برامج خاصة
25	84	0	0	0	0	17	23	0	1	7	50	0	0			0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	9	شمال بابل
1	8	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	استثماري
24	76	0	0	0	0	17	22	0	0	6	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	8	برامج خاصة
2	2							2	2																			عقد تجهيز محولات لكافة المحافظات 2016
0	2							0	2																			عقد تجهيز محولات لكافة المحافظات 2019
1	1							1	1																			عقد تجهيز محولات لكافة المحافظات 2021
1005	1643	36	64	18	33	214	279	93	123	172	347	33	47	5	7	7	12	44	67	45	79	164	223	11	13	163	349	الإجمالي الكلي

القسم الثاني

مشاريع المنح والقروض التي يعمل الصندوق كمشرف ومنسق لها

عدد المشاريع المخطط لها والمنفذة والمنجزة والمستمرة

نوع التمويل	المبلغ المخصص / دولار	عدد المشاريع المخطط لها	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المستمرة	نسبة المشاريع المنجزة
EODP قرض البنك الدولي الطارئ-	\$350,000,000	130	125	112	13	89%
قرض البنك الدولي الطارئ-الإضافي EODP	\$400,000,000	135	47	16	33	34%
المنحة الألمانية لجائحة كورونا	\$24,000,000	5	5	0	5	0%
القرض الألماني - GFCI	URE 500,000,000	50	28	2	26	7%
المنحة التشيكية	\$458,000,00	10	10	10	0	100%
المنحة الصينية (118) آلية	\$9,000,000	7	7	7	0	100%
المنحة الكويتية	\$100,000,000	55	المرحلة الأولى 18	17	37	31%
			المرحلة الثانية 36	0		

جدول يمثل اعداد مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات لعام 2016 / منجزة

الإجمالي الكلي	القطاعات											المحافظات
	الموارد المائية	المحافظة	الماء	الكهرباء	القضاء	الصحة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة	البلديات	
112	4	2	78	1	1	5	3	17			1	الانبار
13			13									بابل
6				6								بغداد
4							4					صلاح الدين
3			1				2					كركوك
10			2	2		2			2	1	1	نينوى
2				2								عقود محولات وقابلوات لجميع المحافظات
150	4	2	94	11	1	7	9	17	2	1	2	الإجمالي الكلي

جدول يمثل توزيع مبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية على المحافظات والقطاعات لعام 2016 / منجزة												
الإجمالي الكلي	القطاعات											المحافظات
	الموارد المائية	المحافظة	الماء	الكهرباء	القضاء	الصحة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة	البلديات	
9,306,587,480	328,310,000	199,349,990	6,248,522,000	93,306,000	79,550,000	499,601,000	169,248,000	1,621,700,490			67,000,000	الأنبار
1,083,000,000			1,083,000,000									بابل
599,591,000				599,591,000								بغداد
263,340,000							263,340,000					صلاح الدين
285,023,500			95,000,000				190,023,500					كركوك
542,971,250			121,000,000	39,078,500		27,000,000			63,142,750	98,000,000	194,750,000	نينوى
7,703,490,000				7,703,490,000								عقود محولات وقابلوات لجميع المحافظات
19,784,003,230	328,310,000	199,349,990	7,547,522,000	8,435,465,500	79,550,000	526,601,000	622,611,500	1,621,700,490	63,142,750	98,000,000	261,750,000	الإجمالي الكلي

جدول يمثل مشاريع الصندوق على الموازنة الفدرالية حسب المحافظات و القطاعات لعام 2017

المحافظة		قطاع البلديات		قطاع التربية		قطاع التعليم العالي		قطاع الداخلية		قطاع الطرق والجسور		قطاع الكهرباء		قطاع الماء		قطاع الموارد مائية		دوائر حكومية		المجموع	
		الكل	المنجز	الكل	المنجز	الكل	المنجز	الكل	المنجز	الكل	المنجز	الكل	المنجز	الكل	المنجز	الكل	الكل	المنجز	الكل	المنجز	الكل
بنوى		12	12	4	4	12	12	4	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	33	33
استثماري		11	11	4	4															15	15
تشغيلي		1	1			12	12	4	4			1	1							18	18
الإنبار		6	6	28	28	3	3	1	1	3	3	2	3	2	2	5	5	1	1	52	52
استثماري				28	28					1	1					2	2			31	31
تشغيلي		6	6			3	3	1	1	2	2	2	3	2	2	3	3	1	1	21	21
صلاح الدين		10	10	6	6	2	2	2	2	0	0	2	2	5	5	0	0	0	0	27	27
استثماري		1	1	6	6	2	2					1	1							10	10
تشغيلي		9	9					2	2			1	1	5	5					17	17
ديالى		1	1	3	3	0	0	0	0	12	12	1	1	3	3	0	0	0	0	20	20
استثماري				2	3					12	12	1	1							16	16
تشغيلي		1	1											3	3					4	4
كركوك		2	2	2	2	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	0	0	0	0	11	11
استثماري				2	2															2	2
تشغيلي		2	2					1	1	1	1	3	3	3	3					9	9
بغداد		0	0	7	7	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	13	13
استثماري				7	7											1	1			8	8
تشغيلي										1	1	2	2	1	1			1	1	5	5
بابل		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	4	4	0	0	0	0	7	7
استثماري								1												1	1
تشغيلي										2	2					4	4			6	6
المجموع الكلي		31	31	50	49	17	17	7	7	19	19	13	11	18	18	6	6	2	2	163	160

ملاحظة: الخلايا باللون الأصفر تعني تم سحب العمل من احد المشاريع .

جدول يمثل مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب القطاعات والمحافظات لخطة عام 2018

المجموع		القطاعــــــــــــــــات																								المحافظات				
		دوائر حكومية		الموارد المائية		الماء والمجاري		الكهرباء		الطرق والجسور		الصحة		الشباب والرياضة		الزراعة		الداخلية		التعليم العالي		التربية		التجارة			البلدية و البلديات			
المنجز	الكلي	المنجز	الكلي			المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي			المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي			
45	48	4	5			4	4	6	6	4	4	4	4			1	1	2	3	5	5	13	13	1	2	1	1		تقوى	
24	26	1	1					5	5	2	2	1	1					1	3	3	10	10	1	2	1	1		استثماري		
21	22	3	4			4	4	1	1	2	2	3	3			1	1	2	2	2	2	3	3						تشغيلي	
51	51					16	16	10	10	5	5	4	4			0	0	5	5	3	3	7	7	1	1	0	0		الاتيبار	
10	10									3	3	3	3					4	4										استثماري	
41	41					16	16	10	10	2	2	1	1					1	1	3	3	7	7	1	1				تشغيلي	
18	18							1	1	3	3	1	1					4	4			6	6			3	3		صلاح الدين	
8	8									2	2											6	6						استثماري	
10	10							1	1	1	1	1	1					4	4							3	3		تشغيلي	
33	34					4	4	3	3	18	18	1	1			0	0	0	0	0	0	5	6	0	0	2	2		ديالى	
16	16							2	2	12	12											2	2						استثماري	
17	18					4	4	1	1	6	6	1	1									3	4			2	2		تشغيلي	
25	28	1	1			6	6	1	1	4	5							3	4		1	6	6	2	2	2	2		كركوك	
15	16	1	1			2	2	1	1	4	4							1	1		1	6	6						استثماري	
10	12					4	4			1								2	3					2	2	2	2		تشغيلي	
18	18	2	2			4	4	2	2	1	1	1	1			0	0	2	2	0	0	3	3	0	0	3	3		حزام بغداد	
2	2																					2	2						استثماري	
16	16	2	2			4	4	2	2	1	1	1	1					2	2			1	1			3	3		تشغيلي	
1	1									1	1																		شمال بابل	
1	1									1	1																		استثماري	
																														تشغيلي
191	198	7	8			34	34	23	23	36	37	11	11			1	1	16	18	8	9	40	41	4	5	11	11		الإجمالي الكلي	

جدول يمثل توزيع مبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية على المحافظات والقطاعات لعام 2018

المحافظات	القطاعات											الإجمالي الكلي
	البلدية و البلديات	التجارة	التربية	التعليم العالي	الداخلية	الزراعة	الصحة	الطرق والجسور	الكهرباء	الماء والمجاري	دوائر حكومية	
الانبار		607,416,000	4,089,139,300	1,141,948,900	2,345,197,800		1,242,514,000	3,013,384,000	2,658,704,000	4,021,707,200		19,120,011,200
بابل								2,000,259,000				2,000,259,000
بغداد	680,815,000		1,753,555,600		400,036,000		19,750,000	205,980,000	1,016,109,900	817,903,100	300,000,000	5,194,149,600
ديالى	838,925,501		2,379,179,500				96,755,000	7,961,501,514	1,321,577,000	1,107,700,700		13,705,639,215
صلاح الدين	1,415,851,000		4,281,372,250		2,579,462,400		284,192,000	4,985,812,000	1,017,611,200			14,564,300,850
كركوك	344,502,400	576,140,000	2,398,886,000	864,570,000	1,678,050,400			2,278,434,000	467,952,500	2,248,862,005	362,528,000	11,219,925,305
نينوى	188,480,000	5,029,748,000	5,944,624,000	3,348,214,600	2,317,910,600	232,313,000	6,263,047,000	3,300,644,000	13,159,580,000	1,479,428,750	2,054,444,000	43,318,433,950
الإجمالي الكلي	3,468,573,901	6,213,304,000	20,846,756,650	5,354,733,500	9,320,657,200	232,313,000	7,906,258,000	23,746,014,514	19,641,534,600	9,675,601,755	2,716,972,000	109,122,719,120

جدول يمثل اعداد مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب القطاعات والمحافظات لخطة عام 2019

المحافظة		القطاعات																												نوع التمويل
		البلدية والبلديات		التجارة		التربية		التعليم العالي		الداخلية		الزراعة		الشباب والرياضة		الصحة		الطرق والجسور		الكهرباء		الماء والمجاري		الموارد المائية		مباني حكومية				
		الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية		
البنوي		6	4	5	4	20	16	34	25	6	1	3	2	2	3	3	0	1	4	4	5	5	12	7	2	1	3	1		
استثماري		6	4	15	15	2	9	3	1																					
تشغيلي				3	3			1	5																					
الانبار		19	16	2	2	34	25	30	22	5	1	2	1	1	3	3	2	2	3	3	11	9	17	16	25	3	11			
استثماري		13	12			4	3																							
تشغيلي		6	4	2	2	4	2	4	3	1	1	3	1	1	3	3	1	1	1	1	11	7	7	11	11	3	2			
صلاح الدين		9	9	0	0	8	1	2	1	2	0	0	1	1	0	0	0	2	0	2	1	3	0	0	1	7	6			
استثماري		8	8			8	1																							
تشغيلي		1	1																											
ديالى		18	10	0	0	11	10	9	8	0	0	3	3	1	1	0	0	3	3	21	14	11	15	14	0	0	87			
استثماري		18	10			9	6													20	9	14	6							
تشغيلي				2	2															1	1	5	5	8	8					
كركوك		12	11	0	0	10	6	10	6	0	0	3	3	0	0	2	2	3	3	10	2	2	7	7	1	1	48			
استثماري		12	11			10	6													6	6	2	2	6	6	1				
تشغيلي																				3	3			1	1					
بغداد		31	27	0	0	13	10	0	0	1	1	0	0	0	0	4	4	0	0	5	5	9	7	1	1	3	67			
استثماري		22	18			6	3									1	1			5	4	2	2			40				
تشغيلي		9	9			7	7									3	3				5	5	1	1	1	1	27			
بابل		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
استثماري																														
تشغيلي																											1			
عقد تجهيز محولات KVA 250 + 400KVA																											2			
الإجمالي الكلي		95	77	7	6	96	68	17	3	12	9	10	6	5	4	17	14	57	50	52	41	61	50	8	7	25	19			

ملاحظة: 1/ اللون الأصفر يعني وجود مشاريع لم تنفذ (مؤجلة).

2/ 16 مشروع مدرجة في وزارة التخطيط ولم يتم التعاقد عليها (مؤجلة).

3/ تم إضافة 28 مشروع للخطة (الإضافي الأول) لورود تأشيرتها من وزارة المالية بتاريخ 14/12/2020

كف مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية لعام 2019 موزعة حسب القطاعات والمحافظات

الإجمالي الكلي	القطاعات													المحافظة
	مباني حكومية	الموارد المائية	الماء والمجاري	الكهرباء	الطرق والجسور	الصحة	الشباب والرياضة	الزراعة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة	البلدية والبلديات	
105,832,527,134	5,408,799,800	731,329,600	13,378,678,200	6,311,006,334	14,639,315,200	2,826,389,800	1,133,000,000	1,093,879,000	4,933,227,700	7,678,840,000	22,397,589,400		25,300,472,100	الأنبار
197,190,000					197,190,000									بابل
22,437,696,150	250,000,000	284,972,000	1,885,424,000	1,941,297,500	12,866,938,000	1,230,226,000					3,728,838,650		250,000,000	بغداد
56,451,653,650			5,362,936,190	7,745,451,400	18,809,091,400	7,406,275,000			1,969,140,800		6,523,158,660		8,635,600,200	ديالى
37,025,090,702	5,472,100,900		1,135,174,400		11,014,512,000	2,698,634,400			1,085,670,400	920,492,000	5,000,335,600		9,698,171,002	صلاح الدين
27,686,252,641	3,098,129,600		4,171,735,000	1,175,735,040	7,679,450,000			2,131,577,600	461,959,000		2,369,721,600		6,597,944,801	كركوك
80,312,855,740	275,000,000	4,334,667,600	406,700,000	17,715,446,300	601,200,000	5,614,116,000	339,240,000	6,062,453,800		24,555,012,200	6,001,559,000	5,044,808,640	9,362,652,200	نينوى
				10,300,000,000										عقد تجهيز محولات KVA + 400KVA 250 لكافة المحافظات
340,243,266,017	14,504,030,300	5,350,969,200	26,340,647,790	45,188,936,574	65,807,696,600	19,775,641,200	1,472,240,000	9,287,910,400	8,449,997,900	33,154,344,200	46,021,202,910	5,044,808,640	59,844,840,303	الإجمالي الكلي

جدول يمثل اعداد مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب القطاعات والمحافظات لخطه عام 2020 / برامج خاصة - (تنفيذ امانة)																												
الإجمالي الكلي		القطاعــ																										

كلف مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية لعام 2020 موزعة حسب القطاعات والمحافظات / البرامج خاصة (تنفيذ امانة)								
	القطاعات							
المحافظات	البلدية	التربية	الداخلية	الشباب و الرياضة	الطرق	الماء	مباني حكومية	اجمالي كلفة المشاريع
الانبار	934,575,000		249,975,000	202,106,000				1,386,656,000
بابل		195,233,500						195,233,500
بغداد	853,704,000							853,704,000
ديالى		121,837,500			908,620,000			1,030,457,500
صلاح الدين					463,850,000	194,750,000		658,600,000
كركوك							179,547,500	179,547,500
نينوى	237,423,000		220,185,000		200,425,000			658,033,000
الإجمالي الكلي	2,025,702,000	317,071,000	470,160,000	202,106,000	1,572,895,000	194,750,000	179,547,500	4,962,231,500

خلاصة باعداد المشاريع للموازنة الاتحادية لعام 2021 موزعة حسب القطاعات والمحافظات

اجمالي المحافظات		القطاعات																						المحافظات			
		مباني حكومية		الموارد المائية		الماء والمجاري		الكهرباء		الطرق والجسور		الصحة		الشباب والرياضة		الزراعة		الداخلية		التعليم العالي		التربية				التجارة	
المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	نوع التمويل	
8	40	2	4	1	1	1	1			2	4		1					1	2					2	26	نينوى	
	16												1					1	2						12	استثماري	
8	24	2	4	1	1	1	1			2	4													2	14	برامج خاصة	
43	245	2	17		13	8	35	5	15	11	35	1	9		1		1		13		16	3	28		13	62	الانبار
7	150		12		2	1	26	1	10	1	11		7		1		1		6		14		20		4	40	استثماري
36	95	2	5		11	7	9	4	5	10	24	1	2						7		2	3	8		9	22	برامج خاصة
6	71		2			2	8		2	4	10								1		1					47	صلاح الدين
	14		1				4																			9	استثماري
6	57		1			2	4		2	4	10								1		1					38	برامج خاصة
31	109		1			3	9	1	4	22	73		2					1	1						4	19	ديالى
1	35						3		3	1	18		1													10	استثماري
30	74		1			3	6	1	1	21	55		1					1	1						4	9	برامج خاصة
	16						1				7											2				6	كركوك
	5										2											2				1	استثماري
	11						1				5															5	برامج خاصة
35	104		1		1	3	11		2	18	52								3			2			14	32	بغداد
5	35				1		5			5	25											1				3	استثماري
30	69		1			3	6		2	13	27								3			1			14	29	برامج خاصة
3	61						6			3	46															9	بابل
	6						1				4															1	استثماري
3	55						5			3	42															8	برامج خاصة
1	1							1	1																		عقد تجهيز محولات 250 KVA + 400KVA لكافة المحافظات
127	647	4	25	1	15	172	71	7	24	60	227	1	12		1		1	1	19		19	3	32		33	201	اجمالي القطاعات

كلف مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية لعام 2021 موزعة حسب القطاعات والمحافظات

المجموع	القطاعات												المحافظة
	مباني حكومية	الموارد المائية	الماء و المجاري	الكهرباء	الطرق والجسور	الصحة	الشباب والرياضة	الزراعة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	البلدية والبلديات	
312,096,979,799	14,379,323,700	15,675,854,500	45,993,763,000	12,100,515,500	42,929,287,500	9,727,567,500	629,667,000	320,950,000	18,072,708,000	14,132,972,130	30,554,476,000	107,579,894,969	الانبار
44,199,615,950			4,218,077,750		25,874,156,100							14,107,382,100	بابل
108,879,762,750	714,290,000	4,348,686,000	13,781,052,850	3,654,080,000	38,273,790,000				3,778,080,000		1,893,295,900	42,436,488,000	بغداد
108,119,807,900	785,336,000		9,486,914,000	2,480,584,200	70,647,169,200	1,643,642,000			208,769,000			22,867,393,500	ديالى
86,332,414,568	2,335,072,500		7,418,070,500	1,851,528,000	2,541,357,000				1,799,999,500	4,333,601,833		66,052,785,235	صلاح الدين
26,665,802,300			1,292,140,000		12,188,645,000						1,456,016,500	11,729,000,800	كركوك
88,756,325,133	856,492,000	242,973,000	142,710,000		820,250,000	579,850,000			2,036,837,833	7,221,145,000		76,856,067,300	نينوى
3,850,000,000				3,850,000,000									عقد تجهيز محولات 250 KVA لكافة المحافظات
778,900,708,400	19,070,514,200	20,267,513,500	82,332,728,100	23,936,707,700	193,274,654,800	11,951,059,500	629,667,000	320,950,000	25,896,394,333	25,687,718,963	33,903,788,400	341,629,011,904	المجموع

مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية حسب المحافظات لعام 2016

مشاريع محافظة الانبار

الانبار



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة الانبار

ت	القطاع	اسم المشروع	القضاء / الناحية	المبلغ
1	الماء	صيانة مجمع ماء الجبور / القرية العصرية سعة 100م ³ / ساعة + تأهيل مجمع زويغير سعة 200م ³ / ساعة	الرمادي	58,320,000
2	الماء	صيانة مجمع ماء زويغير الثاني سعة 200م ³ في الرمادي	الرمادي	69,525,000
3	الماء	صيانة مجمع ماء البوعيثة الخامس سعة 100م ³ + تأهيل مجمع ماء البوعيثة الرابع سعة 50م ³ / ساعة	الرمادي	55,534,000
4	الماء	تجهيز مولدة 150 كي في اي + مولدة 250 كي في اي لمشروعي ماء تل اسود (عبد مخيلف) وتل اسود (عبد مناور)	هيت / الفرات	86,000,000
5	الماء	صيانة مجمع ماء الحامضية القديم سعة 200م ³ / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	96,515,000
6	الماء	صيانة مجمع العدنان في قضاء الرمادي	الرمادي	76,570,000
7	الماء	تجهيز مولدة كهرياء 250 كي في اي لمجمع اليونسييف + تجهيز مولدة كهرياء لمجمع ماء زنكورة الثالث	الرمادي	90,000,000
8	الماء	تجهيز مولدة 250 كي في اي مع هيكل السحب لمجمع العدنان في قضاء الرمادي	الرمادي	66,000,000
9	الماء	صيانة مجمع ماء البوغضبان + تجهيز مولدة بيركنز 250 كي في اي	الرمادي	81,167,000
10	الماء	صيانة ماء طوي البوجراد	الرمادي	72,500,000
11	الماء	صيانة مجمع ابو طيبان / صعب الحردان القصر سعة 200م ³ / ساعة + تأهيل مجمع ماء زنكورة الاول سعة 200م ³ / ساعة	الرمادي	75,850,000
12	الماء	صيانة مجمع ماء البوعبيد الجديد سعة 200م ³ / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	84,960,000
13	الماء	صيانة مجمع ماء ابو كاطع + تجهيز مولدة 250 كي في اي لمجمع ماء البوذياب الحويجة	الرمادي	93,000,000
14	الماء	صيانة مجمع ماء البوعبيد (طالب عفات) + تأهيل مجمع ماء البوذياب القصر سعة 200م ³ / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	73,280,000
15	الماء	تجهيز مولدة قدرة 250 كي في اي لمجمع ماء المداليس + تجهيز مولدة 250 كي في اي في البوذياب الجنابيين	الرمادي	90,000,000
16	الماء	صيانة مجمع ماء الحامضية الجديد سعة 200م ³ / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	42,890,000
17	الماء	استبدال الانابيب الواقعة في منطقة الحوز شارع النهر الشارع الرابط بين جسر الحوز ومجسر الزيوت الجانب الايمن في الرمادي	الرمادي	68,495,000
18	الماء	استبدال الانابيب الواقعة في منطقة الحوز شارع النهر الشارع الرابط بين جسر الحوز ومجسر الزيوت الجانب الايسر في الرمادي	الرمادي	66,295,000
19	الماء	صيانة مجمعات اليونسييف / الدوار في قضاء الرمادي	الرمادي	72,960,000
20	البلديات	تأهيل الشارع الرابط بين شارع البو ذويب وجسر الحوز في الرمادي	الرمادي	67,000,000

21	الداخلية	تأهيل الجناح الإداري والواجهة الخارجية لمديرية جنسية محافظة الانبار	الرمادي	82,778,000
22	الداخلية	ترميم وتأهيل جنسية واحوال الرمادي	الرمادي	40,950,000
23	الماء	صيانة مجمع ماء الدوار / عبد الصالح	الرمادي	82,120,000
24	الماء	صيانة مجمع ماء البو شعبان قرب مدرسة سمية + صيانة مجمع ماء البو شعبان 2	الرمادي	75,493,000
25	الماء	إيصال التيار الكهربائي المغذي لمحطات ضخ الماء في الموقع الجامعي لجامعة الانبار	الرمادي	51,800,000
26	التعليم العالي	تأهيل مبنى كلية الإدارة والاقتصاد - القاعات الدراسية لجامعة الانبار	الرمادي	99,325,000
27	الموارد المائية	تأهيل محطة ري البوذياب المساعدة (البوهايس)	الرمادي	45,800,000
28	الموارد المائية	تجهيز محولات KVA 630 في محطة ري القطنية المساعدة ومحطة ري بزايز ابو طيبان	الرمادي	86,810,000
29	التعليم العالي	صيانة وتأهيل محطة تصفية وتعقيم ماء الجامعة ومحطات الضخ لجامعة الانبار	الرمادي	97,235,000
30	التعليم العالي	تأهيل مبنى شؤون الطلبة لجامعة الانبار	الرمادي	87,740,000
31	التعليم العالي	إعادة تأهيل بناية الأقسام الإدارية في المحافظة	الرمادي	99,999,990
32	الداخلية	إعادة تأهيل بناية دائرة حماية المنشأة في الرمادي	الرمادي	45,520,000
33	المحافظة	إعادة تأهيل بناية الإشراف الهندسي	الرمادي	99,350,000
34	الماء	صيانة مجمع ماء البو عيثة الأول بسعة 200م ³ في قضاء الرمادي	الرمادي	83,660,000
35	الموارد المائية	تأهيل القناة الناقلة لشارع أربعين في الرمادي	الرمادي	99,500,000
36	المحافظة	إعادة تأهيل بناية الأقسام الفنية في المحافظة	الرمادي	99,999,990
37	الموارد المائية	تأهيل المحطة المساعدة الغربية لمحطة ري البو ذياب	الرمادي	96,200,000
38	الماء	صيانة مجمع ماء البو كريطي	الفلوجة	19,638,000
39	الماء	تجهيز ونصب وتشغيل مولد 250 كي في اي لمجمع ماء ابو سديرة القديم	الفلوجة	44,930,000
40	الماء	تجهيز مواد لصيانة مشاريع وشبكات للمجمعات المائية في الفلوجة	الفلوجة	96,500,000

41	الماء	صيانة مجمع ماء جبيل سعة 200م ³ /ساعة	هيت / الفرات	58,405,000
42	الماء	صيانة مجمع ماء البوعبد الحسن في الفلوجة	الفلوجة	94,650,000
43	الماء	تاهيل مجمع ماء الشهداء القديم سعة 200م ² /ساعة في قضاء الفلوجة	الفلوجة	78,500,000
44	الماء	صيانة مجمع ماء الفلاحات وصبيحات القديم والهيثاويين في الفلوجة	الفلوجة	73,000,000
45	الماء	صيانة مجمع الفلاحات الجفة في قضاء الفلوجة	الفلوجة	86,950,000
46	الماء	تاهيل مجمع ماء البوخميس سعة 200م ³ /ساعة+تاهيل مجمع ماء البو يوسف	الفلوجة	97,760,000
47	الماء	صيانة مجمعات ماء البو عزام والفلاحات الجفة والبوذياب في قضاء الفلوجة	الفلوجة	67,195,000
48	الماء	صيانة مجمع ماء البوشمخان الحلابسة والبشويش الحلابسة والشيخ نعيم والبوعلون 1 في الفلوجة	الفلوجة	75,180,000
49	التعليم العالي	تجهيز الاجهزة الطبية لكلية الطب والطب البيطري لجامعة الفلوجة	الفلوجة	99,900,000
50	القضاء	تاهيل وترميم بناية محكمة الفلوجة	الفلوجة	79,550,000
51	التعليم العالي	تجهيز مولدات عدد (2) اثنان لكلية الطب والطب البيطري جامعة الفلوجة	الفلوجة	90,000,000
52	الماء	مجمع ماء تل اسود المكاشير وعودة الرجب	هيت	55,905,000
53	الماء	مد الخط الناقل لاهياء الحلبسية وقرات وسيطرة ماجد في هيت	هيت	43,200,000
54	الماء	اعادة تأهيل وصيانة مجمع ماء المحمدي القديم سعة 200م ³ /ساعة	هيت	84,505,000
55	الكهرباء	تجهيز وتنصيب مواد صيانة الكهرباء لناحية المحمدي مركز المدينة	هيت	93,306,000
56	الماء	صيانة مجمع ماء البو مانع سعة 200م ³ /ساعة	هيت / الفرات	67,000,000
57	الماء	صيانة مجمع ماء حي البكر الشرقي سعة 200م ³	هيت	58,405,000
58	الماء	تاهيل مشروع ماء المؤسسة	هيت	42,000,000
59	الماء	تاهيل مشروع ماء قرى هيت	هيت	97,500,000
60	الماء	صيانة مجمع ماء زوية الشرقية + مجمع ماء بكرة البو غانم	هيت / الفرات	90,350,000

61	الماء	صيانة مولدة مشروع ماء هيت- كبيسة الموحد قدرة 1100 كي في اي	هيت	84,810,000
62	الماء	تجهيز مواد صيانة شبكات لمركز ماء هيت	هيت	92,620,000
63	الماء	صيانة مجمع ماء تل اسود (مخلف المحل) + صيانة مجمع ماء تل اسود (عبد مناور)	هيت / الفرات	99,080,000
64	الماء	صيانة المجمعات المائية في ناحية البغدادى + تجهيز ونصب مضخة قدرة 250 م ³ /ساعة * 80 م ومد خط ناقل قطر 160 ملم لمنطقة شرق البغداداي قرب مدرسة الثواب في قضاء هيت	هيت	95,700,000
65	الصحة	اعادة تأهيل ردهات الاطفال في مستشفى هيت	هيت	99,877,000
66	الصحة	اعادة تاهيل صالة العمليات الكبرى في مستشفى هيت العام	هيت	99,928,000
67	الصحة	اعادة تاهيل جناح الطوارئ في مستشفى هيت العام	هيت	99,972,000
68	الصحة	اعادة تاهيل صالة عمليات الولادة والاطفال في مستشفى هيت العام	هيت	99,947,000
69	الصحة	اعادة تاهيل ردهات الرجالية في مستشفى هيت العام	هيت	99,877,000
70	الماء	تاهيل مشروع ماء هيت /كبيسة الموحد سعة 1000م ³ /ساعة	هيت	96,500,000
71	الماء	صيانة ماء الغرير سعة 50م ³ /ساعة	هيت / الفرات	86,240,000
72	التعليم العالي	صيانة واعادة تأهيل بناية كلية العلوم التطبيقية / جامعة الانبار في هيت	هيت	84,769,000
73	الماء	اعادة تأهيل وصيانة مجمع ماء المحمدي الجديد سعة 200م ³ / ساعة	هيت	93,210,000
74	الماء	تجهيز مضخات ومحركات لمشاريع ومجمعات حديثة ونواحيها	حديثة	97,000,000
75	الماء	تجهيز مضخات ومحركات لمحطة توزيع مشروع حديثة / حقلانية الموحد	حديثة	97,500,000
76	الماء	تاهيل مشروع ماء البوحيات الشرقي سعة 50م ³ /ساعة	حديثة	93,800,000
77	الماء	تاهيل مشروع ماء البوحيات الوسطي بطاقة 50م ³ /ساعة	حديثة	75,780,000
78	الماء	تاهيل مجمع ماء الخسفة	حديثة	80,750,000
79	الماء	اعادة تاهيل مجمع ماء البوحيات الغربي 50م ³ /ساعة	حديثة	80,650,000
80	الماء	تاهيل مجمع ماء الشاعي سعة 100م ³ /ساعة	حديثة	76,250,000

81	التعليم العالي	تأهيل بناية القاعات الدراسية لكلية التربية الاساسية حديثة / الخدمات والتابعة لجامعة الانبار	حديثة	95,445,000
82	الماء	صيانة مجمع ماء البو تايه سعة 200م ³ في الكرمة	الكرمة	87,685,000
83	الماء	صيانة مجمع ماء اللهب 2	الكرمة	87,685,000
84	الماء	صيانة مجمع ماء اللهب 1 بسعة 100م ³	الكرمة	98,260,000
85	الماء	صيانة مجمع ماء الغرير سعة 200م ³ في الكرمة	الكرمة	87,685,000
86	الماء	صيانة مجمع ماء المصالحة سعة 200م ³	الكرمة	87,685,000
87	الماء	صيانة مجمع ماء ذراع دجلة سعة 200م ³	الكرمة	87,685,000
88	الماء	صيانة مجمع ماء البودخيل	الكرمة	87,685,000
89	الماء	صيانة مجمع ماء بني زيد الاول	الكرمة	87,685,000
90	الماء	صيانة مجمع البوبالي رقم 3 مع تجهيز مولدة 250 كي في اي في قضاء الرمادي	الخالدية	94,750,000
91	الماء	صيانة مجمع ماء ابو زعيان في الخالدية	الخالدية	95,650,000
92	الماء	صيانة مجمع ماء البوشهاب + تجهيز مولدة بيركنز 250 كي في اي	الخالدية	99,800,000
93	الماء	تجهيز مولدة كهرباء نوع بيركنز 500 كي في اي وبورد كهربائي لمشروع قرى الحباتية في قضاء الخالدية	الخالدية	91,750,000
94	الماء	صيانة مولدة 250 كي في اي لمجمع ماء البو شعبان 1 + صيانة مجمع ماء البو عبد المحسن + تجهيز ونصب مولدة 250 كي في اي	الخالدية	96,700,000
95	الماء	صيانة مجمع ماء البوبالي الاول في الخالدية	الخالدية	90,400,000
96	الماء	صيانة مجمع ماء الكرابلة+تجهيز ونصب مولدة بيركنز 250 كي في اي	الخالدية	99,700,000
97	الماء	صيانة مجمع ماء سن الذبان سعة 200م ³ /ساعة	الخالدية	63,520,000
98	الماء	صيانة مجمع ماء الملاحمة + تجهيز ونصب مولدة بيركنز 250 كي في اي	الخالدية	87,200,000
99	الماء	صيانة مجمع البوبالي الثاني في الخالدية	الخالدية	93,300,000
100	الماء	تجهيز طواقم ضخ عمودية خاصة بالابار لمركز ماء الرطبة والوليد ومركز ماء النخيب ومركز ماء عرعر	الرطبة	95,000,000

101	الماء	صيانة الفلاتر في المحطة الرئيسية لمشروع ماء الصحراء الغربية في الرطبة	الرطبة	84,000,000
102	الماء	تأهيل وجدة التحلية رقم (3) في مركز ماء طريبيل الرئيسي	طريبيل	53,800,000
103	الماء	استخراج البئر الساقط في منفذ طريبيل الحدودي وبعمق 450 متر	طريبيل	96,500,000
104	التعليم العالي	تأهيل بناية الاقسام العلمية ومختبرات القسم المدني في المعهد التقني	الصقلاوية	82,175,000
105	التعليم العالي	تجهيز المتطلبات المهمة لضخ وتصفية وتوزيع الماء في المعهد التقني	الصقلاوية	88,700,000
106	التعليم العالي	انشاء مجموعتي حمامات للطلبة + انشاء ملحق قاعة دراسية سندويج بئل في المعهد التقني	الصقلاوية	90,334,000
107	التعليم العالي	تأهيل قسم الكهرباء والقسم المدني في المعهد التقني	الصقلاوية	87,455,000
108	التعليم العالي	اعادة ربط الكهرباء الوطنية لموقع المعهد التقني	الصقلاوية	70,900,000
109	التعليم العالي	توليد وايصال وتوزيع الكهرباء لموقع المعهد التقني	الصقلاوية	97,060,000
110	التعليم العالي	انشاء مسقف استراحة الطلاب في المعهد التقني	الصقلاوية	93,180,000
111	التعليم العالي	تأهيل وانشاء قاعة دراسية مرسم المعهد التقني	الصقلاوية	66,622,500
112	التعليم العالي	عزل المواقع الغير مؤمنة في المعهد + تأهيل بناية قاعات قسم الكهرباء والورش الهندسية في المعهد التقني	الصقلاوية	93,860,000
113	التعليم العالي	تجهيز الاثاث المدرسي المطلوب لابنية موقع المعهد التقني	الصقلاوية	97,000,000
		المجموع		9,306,587,480

مشاريع محافظة نينوى



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة نينوى					
ت	اسم المشروع	القضاء	القطاع	المبلغ	
1	اعمار البئر الارتوازي في ناحية الشمال	سنجار	الماء	22,000,000	
2	اعمار مدرسة (برجاية لة ك) في ناحية شنكال	سنجار	التربية	45,886,000	
3	اعمار مستوصف في مركز ناحية الشمال	سنجار	الصحة	8,000,000	
4	اعمار القنطرة الصندوقية في وادي سنجار	سنجار	البلديات	95,000,000	
5	اعمار مستوصف مجمع دوكري في ناحية الشمال	سنجار	الصحة	19,000,000	
6	اعمار سايلو سنجار	سنجار	التجارة	98,000,000	
7	محطة كهرباء الشمال في ناحية الشمال	سنجار	الكهرباء	19,078,500	
8	اعمار مركز تشغيل ماء سنجار	سنجار	الماء	99,000,000	
9	بناية دائرة كهرباء الشمال في ناحية الشمال	سنجار	الكهرباء	20,000,000	
10	اعمار مدرسة كوهبة في ناحية الشمال	سنجار	التربية	17,256,750	
	المجموع			542,971,250	

مشاريع محافظة صلاح الدين



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة صلاح الدين				
ت	القطاع	اسم المشروع	القضاء	المبلغ
1	الداخلية	تأهيل وصيانة قسم شرطة الاسحاقي ومركز شرطة السجلة	الدجيل	79,120,000
2	الداخلية	اعادة تأهيل وصيانة مقر فوج طوارئ الدجيل	الدجيل	61,820,000
3	الداخلية	اعادة تأهيل وصيانة قسم الكلاب البوليسية وقسم مكافحة الاجرام وقسم شؤون الميرة	تكريت	56,200,000
4	الداخلية	اعادة تأهيل وصيانة قسم الادلة الجنائية ومركز شرطة تكريت	تكريت	66,200,000
المجموع				263,340,000



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة كركوك				
ت	القطاع	اسم المشروع	اسم المنطقة	المبلغ
1	الداخلية	اعمار مركز شرطة البشير في ناحية تازة	تازة	92,310,500
2	الماء	اعمار شبكة ماء البشير في ناحية تازة	تازة	95,000,000
3	الداخلية	اعمار مركز شرطة ناحية الملتقى	الملتقى	97,713,000
المجموع				285,023,500

مشاريع محافظة بابل

Babil Governorate projects



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة بابل				
ت	القطاع	اسم المشروع	اسم المنطقة	المبلغ
1	الماء	تأهيل مجمعات ماء الدوريين 14م ³ / ساعة	الاسكندرية	70,500,000
2	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الغربية)	الاسكندرية	82,500,000
3	الماء	تأهيل مجمع ماء الشيحة 14م ³ / ساعة	الاسكندرية	76,500,000
4	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الشرقية)	الاسكندرية	79,200,000
5	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الشمالية)	الاسكندرية	88,000,000
6	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الجنوبية)	الاسكندرية	80,300,000
7	الماء	تأهيل مجمعات ماء الحويجة 14م ³ / ساعة	الاسكندرية	70,500,000
8	الماء	تأهيل مجمع ماء ابو شمسي سعة 200م ³ / ساعة	الاسكندرية	92,000,000
9	الماء	تأهيل مجمع ماء الخضر سعة 200م ³ / ساعة	الاسكندرية	92,000,000
10	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (3) سعة 50م ³ / ساعة	جرف النصر	88,000,000
11	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (2) سعة 50م ³ / ساعة	جرف النصر	88,000,000
12	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (4) سعة 50م ³ / ساعة	جرف النصر	88,000,000
13	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (1) سعة 50م ³ / ساعة	جرف النصر	87,500,000
المجموع				1,083,000,000

محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

Baghdad Governorate Projects

الانبار



واسط



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / حزام بغداد

ت	القطاع	اسم المشروع	اسم المنطقة	المبلغ
1	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية السعدان (1)	النصر والسلام	99,962,500
2	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية السعدان (2)	النصر والسلام	99,956,000
3	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العجاج	النصر والسلام	99,881,000
4	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العزاز (1)	النصر والسلام	99,950,500
5	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العزاز (2)	النصر والسلام	99,915,500
6	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية عودة الشكر	النصر والسلام	99,925,500
المجموع				599,591,000

مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية حسب المحافظات لعام 2017

مشاريع محافظة نينوى



مشاريع محافظة نينوى على الموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017														
ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة الشورة الابتدائية 12 صف/ القيارة / نينوى	التربية	35° 59'43.8"N 43° 13'18.5"E	600	38+170	715,512,000	716,492,000	2017-08-02	2017-08-16	7/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	اعدادية القيارة للبنين 12 صف / القيارة / نينوى	التربية	35° 47'23.1"N 43° 17'23.4"E	600	28+180	687,989,900	684,563,900	2017-08-02	2017-08-16	5/12/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	ثانوية الشورة للبنين 12 صف/ القيارة / نينوى	التربية	36° 00'03.8"N 43° 13'36.0"E	600	18+170	750,236,000	748,708,000	2017-08-02	2017-08-16	18/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة اجلة الابتدائية للبنين 12 صف/ القيارة/ نينوى	التربية	35° 42'31.9"N 43° 17'58.5"E	600	28+160	737,710,000	735,904,000	2017-08-02	2017-08-13	5/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	صب ارسفة وبناء القوالب الجانبية للشارع الرئيسي / حي النصر وبربوش /مركز قضاء سنجار/نينوى	البلديات			60	188,480,000	188,480,000	2018-05-06	25L6L2016	16/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	تأهيل شوارع وصيغ القوالب في الشورة	البلديات												
7	إعادة تأهيل وأكساء شوارع رئيسية في حمام العليل	البلديات												
8	كشف أعمال تأهيل وأكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية القيارة	البلديات												
9	تأهيل وإكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية القيارة	البلديات												
10	إعادة تأهيل المدخل الجنوبي للقصبة (شارع الصلاحية) مع تحويل العارض (أنبوب الماء) الموجود في وسط الشارع في ناحية حمام العليل/ المرحلة الاولى	البلديات												
11	إكساء شوارع داخل ناحية الشورة	البلديات												
12	إكساء طرق داخلية في ناحية بعشيقه													
13	صيانة شوارع متفرقة في ناحية بعشيقه													
14	بناء القوالب الجانبية وصب الارصفة والقسالس في برطلة	البلديات												
15	تبليط مسارات شبكة مجاري في برطلة													
	المجموع			552400		5,553,547,900	5,638,612,900							

مشاريع محافظة نينوى على الموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017													
ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	أسباب الانحراف
1	صيانة وتأهيل ابنية كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36 22.897'N 43 8.592'E	2000	45+140	900,000,000	985,290,000	2017-08-02	2017-08-20		100%	100%	انجاز العمل
2	تاهيل شبكات الكهرباء / الموصل	الكهرباء	36 21 34 05N 43 01 34 28E	25,000	30	731,600,000	731,600,000	2017-10-18	منجز		100%	100%	انجاز العمل
3	تاهيل وصيانة طرق في قضاء الحمدانية وناحية النمرود	البلديات		85,000	4+50	275,016,500	275,012,500	2017-11-02	2017-11-16	29/1/2018	100%	100%	انجاز العمل
4	تاهيل بناية مركز شرطة الوقاص	الداخلية		150000	12+50	303428000	327096500	2017-11-20	2017-12-04		100%	100%	انجاز العمل
5	تاهيل بناية مركز شرطة اليرموك	الداخلية											
6	تاهيل بناية مركز الدفاع المدني الجزائر	الداخلية		200000	12+50	175316000	192830000	2017-11-21	2017-12-03	2/11/2018	100%	100%	انجاز العمل
7	تاهيل بناية مديرية شرطة النصر	الداخلية											
8	تاهيل ابنية كلية الاداب / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي		4000	40+154	1,414,930,000	1,539,455,000	2017-08-02	2017-10-08	16/5/2018	100%	100%	انجاز العمل
9	تاهيل ابنية كلية التقانات وعلوم البيئة / جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي	36° 23.126'N 43° 8.471'E										
10	تاهيل ابنية كلية التمريض / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36° 22.574'N 43° 8.948'E	4000	34+140	1,627,784,000	1,785,149,550	2017-09-25	2017-10-03	منجز	100%	100%	انجاز العمل
11	تاهيل ابنية كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36° 22.696'N 43° 8.696'E										
12	تاهيل كلية طب الاسنان/جامعة الموصل /نينوى	التعليم العالي	36° 23.197'N 43° 8.919'E	2500	28+140	1,464,915,000	1,611,067,000	2017-10-15	2017-10-29	26/4/2018	100%	100%	انجاز العمل
13	تاهيل كلية الصيدلة/ جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي	36° 22.491'N 43° 8.637'E										
14	تاهيل بناية قسم الاعمار والمشاريع/جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي	36° 22.552'N 43° 8.762'E	4250	45+105	1,624,462,000	1,784,852,000	2017-09-28	2017-10-11	منجز	100%	100%	انجاز العمل
15	تاهيل ابنية كلية العلوم/جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36° 22.557'N 43° 8.579'E										
16	تاهيل ابنية المراكز البحثية/ جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي											
17	تاهيل ابنية كلية التربية / جامعة الموصل	التعليم العالي		4250	61+110	1,571,950,000	1,712,226,000	2017-10-30	2017-11-14	منجز	100%	100%	انجاز العمل
18	تاهيل ابنية كلية الهندسة / جامعة الموصل	التعليم العالي											
				481000		10089401500	10,944,578,550				43		



ثانوية الشورة / الشورة / نينوى



اعدادية القيارة / القيارة / نينوى



كلية طب الأسنان / جامعة الموصل / نينوى



كلية طب الأسنان / جامعة الموصل / نينوى



إعادة تأهيل طرق الحمدانية والنمرود / نينوى



تأهيل مديرية شرطة النصر / نينوى



تاهيل وتبليط مسارات شبكة مجاري في برطلة و بعشيقه



إعادة تأهيل الطرق في ناحية (الشورى ، القيارة ، حمام العليل)



كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى

كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى



كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى



كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل / نينوى





تجهيز محولات إلى الجانب الأيمن / الموصل

مشاريع محافظة الانبار

الانبار



مشاريع محافظة الانبار للموازنة الاستثمارية / الخطة الاستثمارية 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	ثانوية العلا للبنات / 18 صف الرمادي/الانبار	التربية	33 25 13.0N 43 18 28.2E	650	95+210	1,066,033,000	2017-07-23	2017-08-06	18/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	ثانوية الكواكب للبنات /ثانوية/18 صف/الرمادي/الانبار	التربية	33 ° 24 37.3N 43° 16 42.6E	450	80+190	1,070,000,000	2017-07-24	2017-08-09	26/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	ثانوية دار السلام للبنين /ثانوية/18 صف /هيت /الانبار	التربية	33 39 03.0N 42 49 48.3E	650	78+190	1,144,525,000	2017-07-30	2017-08-21	15/5/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة أبو أيوب الاتصاري للبنين /ابتدائية/12 صف/الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 23 31.4N 43 52 50.8E	450	177+160	659,631,000	2017-07-30	2017-08-17	2018-07-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	مدرسة صعدة الابتدائية المختلطة الابتدائية 12 صف/الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 33 14.7N 44 06 14.5E	450	166+170	585,985,000	2017-07-31	2017-08-13	18/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	مدرسة الوفاء الابتدائية للبنين 12 صف /الرمادي/ الانبار	التربية	33° 25 50.2N 43° 21 22.0E	450	83+165	598,000,000	2017-08-02	2017-08-15	2018-10-05	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	ثانوية الرشاد للبنين الثانوية 18 صف/الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 23 57.2N 43 36 01.7E	650	96+210	1,093,229,000	2017-08-02	2017-08-17	2/1/2019	100%	100%	0	انجاز العمل
8	مدرسة الأفنان الابتدائية للبنين 12 صف /جزيرة الرمادي/ الانبار	التربية	33 28 03.5N 43 18 04.6E	450	153+180	611,468,000	2017-08-02	2017-08-15	2018-01-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	اعدادية حليلة السعدية للبنات 12 صف /الرمادي/ الانبار	التربية	33° 26' 00.0N 43° 22' 05.6E	450	103+180	599,981,000	2017-08-03	2017-08-08	30/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	مدرسة الصمد الابتدائية 12 صف/ هيت/ الانبار	التربية	33 37 55.3N 42 50 26.8E	450	63+170	639,571,000	2017-08-03	2017-08-21	2018-12-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	متوسطة المامون 18 صف /الرمادي/الانبار	التربية	33 25 17.0N 43 19 57.9E	650	29+210	1,266,865,000	2017-08-03	2017-08-15	2018-05-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	مدرسة دجلة الابتدائية للبنين 12 صف/ الرمادي/ الانبار	التربية	33 25 39.2N 43 17 01.6E	450	20+170	592,525,000	2017-08-03	2017-08-16	25/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
13	اشبيلية الابتدائية المختلطة 12 صف /الكرمة/ الفلوجة/ الانبار	التربية	33 29 46.6N 44 06 14.5E	450	143+160	614,777,000	2017-08-03	2017-08-13	20/12/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
14	مدرسة الخضر الابتدائية 12 صف /الصقلاوية/الفلوجة/الانبار	التربية	33 27 50.4N 43 36 27.3E	450	150+150	573,888,800	2017-08-03	2017-10-25	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
15	مدرسة السلوى الابتدائية 18 صف/ الفلوجة/ الانبار	التربية	33 19 49.2N 43 47 49.5E	650	161+210	1,078,596,000	2017-08-03	2017-08-15	19/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل

16	مدرسة ابي ذر الغفاري الابتدائية للبنات 12 صف /جزيرة الرمادي/ الانبار	التربية	33 27 29.1N 43 16 17.7E	450	93+180	631,520,000	2017-08-03	2017-08-09	2018-05-02	100%	100%	0%	انجاز العمل
17	مدرسة المروج الخضراء الابتدائية 12 صف/ الفلوجة/ الانبار	التربية	33 25 31.6N 43 43 10.7E	450	134+180	595,000,000	2017-08-13	2017-08-23	20/12/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
18	مدرسة عامر بن ربيعة 12 صف/ حديثة/ الانبار	التربية	33 00 16.3N 42 26 13.6E	450	15+170	688,586,000	2017-08-13	2017-09-05	20/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
19	مدرسة الخالد الابتدائية 12 صف /الفلوجة/ الانبار	التربية	33 26 49.3N 43 44 37.4E	450	129+170	651,962,500	2017-08-13	2017-09-10	14/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
20	مدرسة الفتوة الابتدائية للبنين 12 صف/ الرمادي/ الانبار	التربية	33 26 00.0N 43 22 05.6E	450	134+180	594,113,000	2017-08-13	2017-08-23	2018-01-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
21	ثانوية جبة للبنين 12 صف / البغدادى/ هيت/ الانبار	التربية	33 54 33.0N 42 33 04.6E	450	101+160	575,131,000	2017-08-13	2017-08-23	23/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
22	مدرسة دار العلم الابتدائية 12 صف / الرمادي/ الانبار	التربية	33 24 44.5N 43 18 24.5E	450	20+170	611,635,000	2017-08-13	2017-08-27	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
23	متوسطة خالد بن الوليد 12 صف/ الكرامة/ الفلوجة/ الانبار	التربية	33 42 17.7N 43 55 18.8E	450	114+180	669,928,000	2017-08-13	2017-08-20	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
24	ثانوية الشهابي للبنين 12 صف/ الفلوجة/ الانبار	التربية	33 23 02.4N 43 51 59.1E	450	145+160	672,513,500	2017-08-13	2017-08-27	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
25	ثانوية الرشيدية للبنين 12 صف /الرمادي/ الانبار	التربية	33 24 04.0N 43 19 58.1E	450	20+165	577,451,000	2017-08-14	2017-09-06	2018-09-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
26	مدرسة جنة الماوى الابتدائية للبنين 12 صف /الرمادي/ الانبار	التربية	33 25 54.3N 43 12 40.1E	450	71+170	573,900,500	2017-08-15	2017-09-06	25/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
27	متوسطة الشيماء للبنات 12 صف/ هيت/ الانبار	التربية	33 38 16.8N 42 49 34.1E	450	180	667,409,500	2017-08-23	2017-08-23	30/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
28	اعدادية صناعة الصقلاوية 18 صف/ الصقلاوية/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 24 02.3N 43 42 05.6E	650	162+180	1,195,056,000	2017-08-24	2017-10-11	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
29	مشروع ناظم الورار	موارد مائية	33° 26.057'N 43° 15.928'E	10,000,000	25+570	7,038,189,000	2017-11-07	2017-11-19	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
30	اعادة اعمار ناظم سدة الرمادي على نهر الفرات	موارد مائية	33° 26.444'N 43° 16.138'E	10,000,000	25+570	6,911,239,000	2017-11-07	2017-11-19	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
31	اعادة تاهيل جسر هيت الحديدي	طرق وجسور		200000	180	1,983,315,000	2017-12-07	2017-12-17	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			20,213,800		36,832,023,800							

مشاريع محافظة الانبار للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	اصلاح وتاهيل طريق الرمادي- هيت/ الرمادي/ الانبار	طرق وجسور	33 25 36.6N 42 58 36.1E	400,000	145	285,000,000	312,200,000	2017-07-30	2017-08-21	2018-03-01	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	إعادة انشاء القسم البلدي السادس/ الرمادي الانبار	البلديات	33 24 46.0N 43 12 51.0E	100,000	180	220,575,000	242,575,000	2017-08-02	2017-08-29	25/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	تاهيل بناية الاقسام الداخلية في قضاء الفلوجة/ الانبار	التعليم العالي		500.00	80	211,829,000	229,851,000	2017-10-15	2017-10-29	2018-05-02	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	تأهيل المحطات الاروانية في جزيرة وشامية الرمادي/ الانبار	موارد مائية												
5	تأهيل محطات البزل في جزيرة وشامية الرمادي / الانبار	موارد مائية			25+90	877,170,000	920,790,000	2017-10-17	2017-10-29	19/2/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	اعادة انشاء قناطر في البوعيثة	موارد مائية												
7	اعادة انشاء السياج الامني لقضاء هيت / الانبار	دوائر حكومية		150,000		99,750,000	99,750,000	تنفيذ امانة	\	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	مجمع ماء الحميدية	ماء		12000		100,000,000	100,000,000	تنفيذ امانة	\	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	مجمع ماء الصبيحات	ماء		10000		36,800,000	36,800,000	تنفيذ امانة	\	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تجهيز وتنفيذ وتنصيب محطة تحويل الحصرة 33/11 كي في سعة 31.5*2 ام في أي/ هيت/الانبار	كهرباء		200,000	25+90	361,000,000	396,779,980	2017-10-18	2017-10-30	17/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تاهيل شارع المعارض الى تقاطع الفرسان في الرمادي/ الانبار	البلدية		100,000	60+140	2,123,020,000	2,250,940,000	2017-10-22	2017-11-05	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	تاهيل شارع من تقاطع الفرسان الى تقاطع شارع (20) الرمادي/الانبار	البلدية		100,000	25+140	967,828,000	1,037,349,000	2017-10-22	2017-11-06	2018-04-06	100%	100%	0%	انجاز العمل

13	تجهيز ونصب محطة تحويل المشتل كهرباء 33/11 كي في /هيت/الانبار		150,000	25+140	472,473,000	507,653,000	2017-10-22	2017-11-14	14/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
14	إعادة تأهيل خط كهرباء غرب بغداد - حديثة 400 كي في /عموم محافظة الانبار	كهرباء	1,500,000	140	2,710,350,000	2,710,350,000	2017-10-25	2017-11-14		0%			سحب عمل من المقاول بموجب قرار محكمة
15	تأهيل ابنية دائرة البلدية /القسم البلدي الثاني/الرمادي/الانبار	البلديات	200,000	70+170	373,752,000	410,812,000	2017-10-26	2017-11-06	2018-05-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
16	تأهيل انية دائرة البلدية القسم البلدي الرابع/ الرمادي الانبار	البلديات											
17	إعادة انشاء مديرية شرطة نموذجية في قضاء الفلوجة	الداخلية	250,000	25+150	974,585,000	1,052,385,000	2017-10-30	2017-11-19	24/5/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
18	الشارع الرابط بين تقاطع شارع عشرين الى شارع الملعب	البلدية	100,000	30+120	983,270,000	1,081,365,125	2017-11-12	2017-11-14	19/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
19	العبارة النهريه في هيت (البانتونات)	طرق وجسور	75,000	30	194,400,000	211,900,000	2017-11-14	2017-11-23	23/12/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
20	تأهيل بناية قسمي الفيزياء والعربي في كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة الانبار	التعليم العالي	8,000	25+75	360,895,000	391,961,300	2017-12-04		2018-04-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
21	تأهيل بناية القاعات الدراسية في كلية الزراعة / جامعة الانبار	التعليم العالي											
	المجموع		3,355,500		11,352,697,000	11,993,461,405							



مدرسة دار السلام / هيت / الانبار

مدرسة دار السلام / هيت / الانبار (صعب نقل مواد البناء)

مدرسة دار السلام / هيت / (قبل الاعمار)



اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت⁵⁶

اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت (انفجار عبوة اثناء العمل)

اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت



مدرسة السلوى / الفلوجة الانبار



مدرسة جنة المأوى / الرمادي / الانبار



تاهيل مباني كلية الزراعة/جامعة الانبار/ الرماذي / الانبار



مدرسة ابي ذر الغفاري / الجزيرة / الرماذي / الانبار



مدرسة الصمد / هيت / الانبار



مدرسة المأمون / الرمادي / الانبار



إعادة تاهيل مستشفى هيت العام





إعادة تأهيل جسر هيت



العبرة (حل مؤقت أثناء إعادة تأهيل الجسر)



هدم وإعادة بناء القسم البلدي السادس / الرمادي / الأنبار



هدم وإعادة بناء مدرسة الفتوة / الأنبار



إعادة بناء سدة الرمادي على نهر الفرات / الرمادي / الأنبار



مشاريع محافظة صلاح الدين



مشاريع محافظة صلاح الدين للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة الدور الأولى للبنات 12 صف/ الدور - صلاح الدين	التربية	34 27 26.2N 47 47 18.5 E	450	92+180	716,944,000	729,733,400	2017-07-25	2017-08-05	2018-05-08	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	ثانوية الفرقان 18 صف/ تكريت /صلاح الدين	التربية	34 26 18.0N 43 40 35.5E	700	120+170	1,119,644,000	1,194,869,900	2017-07-30	2017-08-28	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	مدرسة حفص الدوري للبنين 6 صف/ الدور/ صلاح الدين	التربية	34 27 42.8N 43 50 31.3E	255	12+120	330,000,000	339,733,500	2017-08-03	2017-08-21	2018-07-03	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية 6 صف/تكريت صلاح الدين	التربية	34 26 42.9N 43 44 05.2E	250	33+180	303,645,000	303,645,000	2017-08-13	2017-08-22	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	روضة الفارس العربي 4 صف/ تكريت / صلاح الدين	التربية	34 36 06.9 N 43 40 32.9 E	350	96+180	417,595,000	417,595,000	2017-08-13	2017-08-28	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	مدرسة الاشاوس للبنين 9 صف/ ناحية مكيشيفة/ تكريت/	التربية	34 18 23.4N 43 46 59.1E	140	95+180	469,258,000	506,420,100	2017-08-24	2017-09-11	25/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	تاهيل اقسام داخلية للطالبات وقاعة الدري لمعهد الدور التقني /الدور -صلاح الدين	التعليم العالي	34 27 36N 43 48 34E	3000	10+150	484,140,000	484,140,000	2017-09-25	2017-10-04	2018-12-09	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	مد شبكة مياه تصريف الامطار واعمال الاتارة والتبليط للطريق من مستشفى الحارث الى الوادي وبطول 1800 م طول / الضلوعية - صلاح الدين	البلديات	37 68 92N 42 77 17 E	25,000	80+150	994,050,000	1,083,067,000	2017-09-26	2017-10-10	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	اعمال اعادة بناء اقسام داخلية للطلاب عدد/4 جامعة تكريت	التعليم العالي	34° 40.717'N 43° 38.914'E	4,000	78+240	754,370,000	730,462,000	2017-12-11	2017-12-20	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تجهيز مواد لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم صلاح الدين (أعمدة)	كهرباء		50,000	20	144,600,000	144,600,000	2017-12-14		منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	تجهيز مواد لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم صلاح الدين (محولات)	كهرباء		25,000	30	939,000,000	939,000,000	2017-12-14		منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			109,145		6,673,246,000	6,873,265,900							

مشاريع محافظة صلاح الدين للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تاهيل وتشغيل وحدة ماء العيثة سعة 200م3/ساعة/ الشرقا	ماء	35 63 864N 43 24 181E	27,000	120	257900000	257900000	2017-07-25	2017-08-06	17/12/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	تاهيل وتشغيل وحدة ماء الحجاج سعة 200م3/ساعة/بيجي/ صلاح الدين	ماء	34 85 308N 43 54 104E											
3	اكساء شارع معهد الدور في قضاء الدور/صلاح الدين	البلديات	34 28 12N 43 47 38.16E	10,000	80	435,000,000	435,000,000	2017-09-17	2017-09-26	منجز	100%	100%	0%	تجاز العمل
4	تاهيل واكمل بناية شرطة الدور وسيطرة العلم/العلم/ صلاح الدين	الداخلية	21 49 34 .27N 26 76 43 47E	40,000	10+90	307,000,000	324,387,000	2017-09-17	2017-10-01	16/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تاهيل مقرات مديريات (التدخل السريع (سوات) ومكافحة المتفجرات وانضباط الشرطة) وقاعة الشهيد صالح عويد/ تكريت/ صلاح الدين	الداخلية	3.21 34 37N 23.44 43 40E	30,000	85	455,595,000	455,595,000	2017-09-25	2017-10-05	20/12/2017	100%	100%	0	انجاز العمل
6	تاهيل الشارع الرابط بين شارع الزهور والشارع الحولي/ تكريت/ صلاح الدين	البلديات	34 35 159N 43 40 425E	150,000	20+80	762,737,000	767,215,000	2017-09-25	2017-10-02	26/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	إعادة تاهيل الشارع الممتد من تقاطع المجلس القديم باتجاه القادسية بطول 680 م/ تكريت /صلاح الدين	البلديات	37 68 92N 42 77 17 E											
8	تاهيل مبنى مختبر صلاح الدين الانشائي/ تكريت /صلاح الدين	البلديات	43 40 58.16E 34 34 47.29N											
9	تاهيل مديرية كمارك صلاح الدين/ تكريت /صلاح الدين	البلديات	43 41 01.95E 34 35 11.93N											
10	تاهيل مديرية إحصاء صلاح الدين/ تكريت / صلاح الدين	البلديات	43 41 02.27E 34 35 13.79N	180,000	84	872,881,000	872,881,000	2017-10-03	2017-10-17	15/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تاهيل بناية ناحية دجلة المتضررة من الاعمال الإرهابية/سامراء/صلاح الدين	البلديات	43 44 11.1E 34 23 39.25N											
12	تاهيل مديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين	البلديات	43 41 01.15E 34 35 00.27N											
13	تجهيز مولدة مختلفة السعات لمشاريع الماء	ماء	مناطق متفرقة	80,000	90	1,173,000,000	1,173,000,000	2017-11-26	منجز		100%	100%	0%	انجاز العمل
14	تجهيز مولدة مختلفة السعات لمحطات الرفع والضخ لمشاريع الصرف الصحي	البلديات	مناطق متفرقة			561,000,000								
15	تجهيز غواطس عدد 5 لمحطات ضخ مياه الامطار الأولى والثانية في قضاء الدجيل - صلاح الدين	ماء		75,000	30	95,450,000	95,450,000	2017-12-04	منجز	30/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
16	تجهيز غواطس نهريّة ومضخات الدفع لمجمعات الماء في شاطئ الجدر وهيجل الكبير والفياض الثاني وشهيد احمد وسديرة الوسطى	ماء		50,000	45	187,250,000	187,250,000	2017-12-10	منجز	22/2/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
17	تجهيز مواد لصيانة شبكة كهرباء مركز قضاء الطوز وامرلي (أعمدة)	كهرباء		50,000	20	75,300,000	75,300,000	2017-12-14	منجز		100%	100%	0%	انجاز العمل
	تجهيز مواد لصيانة شبكة كهرباء مركز قضاء الطوز وامرلي (محولات)	كهرباء		50,000	30	469,500,000	469,500,000	2017-12-14	منجز		100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			742,000		5,652,613,000	5,674,478,000							



مدرسة حفص الدوري / قرية أبي دلف / الدور / صلاح الدين



مدرسة الدور الأولى / الدور / صلاح الدين



قاعة الشهيد صالح عويد / تكريت / صلاح الدين



إعادة تأهيل مقر إدارة (سوات)



مركز شرطة الدور / صلاح الدين



ثانوية الفرقان / صلاح الدين



إعادة تأهيل بنائية ناحية دجلة / سامراء / صلاح الدين



تأهيل مديرية الزراعة / صلاح الدين



تأهيل الأقسام الداخلية للطالبات \ المعهد الفني / الدور / صلاح الدين



إعادة تأهيل شارع معهد الدور / صلاح الدين



محطة ماء الحويجة / تكريت / صلاح الدين



مشاريع محافظة كركوك للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	كلفة المشروع بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	هدم وإعادة بناء مدرسة الشهيد الابتدائية 6 صف/كركوك	التربية	35 14.653N 44 16.121E	180	165	306,926,000	306,926,000	2017-07-23	2017-08-03	29/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	هدم وإعادة بناء مدرسة الامام حسن الابتدائية 6 صف/ كركوك	التربية	35 13.101N 44 16.902E	180	165	306,926,000	309,656,000	2017-07-23	2017-08-03	27/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			360		613,852,000	616,582,000							

مشاريع محافظة كركوك للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	إعادة تاهيل الشبكات الكهربائية	كهرباء	35 27.117N 44 11.325E	5,200	30	153,734,000	153,734,000	2017-07-31	2017-08-10	31/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	إعادة تاهيل الشبكات الكهربائية في قرى ملا عبدالله وادريس خبار وادريس خزل والهندية 1,2/كركوك													
3	تاهيل وتشغيل مجمع ماء بطاقة (50)م3/ساعة في قرية قرنتية- ناحية بابجي/كركوك	ماء	35 24.107N 44 21.151E	3,800	85	71,281,000	71,281,000	2017-07-31	2017-08-03	14/11/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	صيانة طريق الشمسية/كركوك	البلديات	35 14.511N 44 16.217E	4,000	55	189,340,000	189,340,000	2017-08-03	2017-08-03	24/9/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تبليط شوارع داخلية بالكونكريت قرب مدرسة البلدية الوقف الشيعي في قصر البشير // كركوك	البلديات												
6	تجهيز محولات الى قضاء الحويجة	كهرباء		250,000	30	1,689,000,000	1,689,000,000	2017-12-14			100%	100%	0%	انجاز العمل
7	إيصال الماء الى قرية الهندية الجديدة / ناحية المتقي	ماء		20,000		55,600,000	55,600,000	تنفيذ امانة		15/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تاهيل وتبليط طريق كركوك الحويجة قرب مجسر خالد	طرق وجسور		75,000		63,200,000	63,200,000	تنفيذ امانة		24/12/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	تاهيل محطة ماء مزهر العاصي/ الحويجة	ماء		12,500		69,600,000	69,600,000	تنفيذ امانة		25/12/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			370,500		2,291,755,000	2,291,755,000							



إعادة تأهيل وتبليط طريق كركوك - الحويجة بالقرب من مجسر خالد



إعادة تأهيل محطة ماء مزهر العاصي / الحويجة



أعادة بناء مدرسة الشهيد الابتدائية / البشير / كركوك



تاهيل شبكة ماء قرية الهندية الجديدة / الملتقى / كركوك



4000 Ben

إعادة تأهيل وصب شوارع في قرية البشير / كركوك



5,200 Ben

إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في قرية الملا عبد الله / كركوك

مشاريع محافظة ديالى

Diyala Governorate Projects




مشاريع محافظة ديالى للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)+المدة الإضافية	تكلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة امر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة المامون / 12 صف/ العظيم/الخالص/ديالى	التربية	34.273507 N 44. 542155E	720	107+180	752,704,000	745,105,400	2017-07-23	2017-09-26		100%	100%	0%	انجاز العمل
2	مدرسة الهديل / 9 صف/الصدور/المقدادية/ديالى	التربية	34 03 44.1N 44 59 00.6E	600	168+63	461,667,000	505,058,200	2017-07-25	2017-09-24	2019-02-18	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	مدرسة ابن زيدون	التربية	34 01 30N 44 57 32.1E	600	160	775,658,000	775,658,000				0%	0%	0%	تم فسخ العقد رضائياً مع المقاول
4	تبليط شارع من جسر محمود العلي الى جسر سراجق دلي عباس بطول (6 كم)	الطرق	34 01 41.7N 44 45 17.4E	2,200	120	449,000,000	449,000,000	2017-11-12	2017-11-29	2018-04-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تبليط واكساء شوارع في منطقة الشرقية والغربية في ناحية سد العظيم (تبليط شوارع داخل حدود البلدية ناحية سد/العظيم)	الطرق		3800	60	390,420,000	390,420,000	2017-11-13	2017-12-25	13/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	صب شوارع حي الاسراء في السعدية	الطرق	34 11 18.24N 45 07 08.5E	2,500	45	116,040,000	116,040,000	2017-11-13	2017-12-04	17/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	تبليط طرق في المقدادية بطول (5 كم)	الطرق		10,000	60	348,860,000	348,860,000	2017-11-13	2017-12-13	28/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تأهيل الشارع العام لمدينة جلولاء الرئيسي	الطرق	34 15 41.59N 45 9 29.47E	200000	90	259,563,500	259,563,500	2017-11-13	2018-01-02	20/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	فرش خابط بطول (12 كم) من جسر شاقراق – قرية العباسية الى قرية العالي وزحام الاسيود	الطرق		2000	90	168,750,000	168,750,000	2017-11-07	2017-11-19	2018-08-02	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تبليط شوارع داخل حدود البلدية /بلدية المنصورية بطول 1650 م	الطرق		8000	40	375,373,250	375,373,250	2017-11-22	2017-12-06	25/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تبليط شوارع في قرى شيروين بطول 6,5 كم / المنصورية شيروين/ ديالى	الطرق	34 04 13 N 44 88 08E	10000	12+180	559,485,000	559,484,000	2017-11-13	2017-11-19	24/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	تاهيل الشارع رقم 21 المار ضمن م311 و 313 بطول 1,4 كم للمقطع ما بين المستوصف الصحي واستدارة الدور الجاهزة في حي التحرير/بعقوبة/ديالى	الطرق	46 82 27.411E 37 32 93 2.28N	4500	100	195,720,000	195,720,000	2018-05-06	20/6/2018	2019-02-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
13	مشروع تاهيل شبكة انارة شوارع ناحية كنعان- بعقوبة/ديالى	الكهرباء			45	111,220,000	111,220,000	2018-07-06	21/6/2018	29/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
14	مشروع صيانة واكساء وتبليط طرق وقرى بلد روز- قرية عتبة بطول 7,5 كم - قرية اطعيمات 1,5 قضاء بلدروز/ديالى	الطرق	33 40 39.7N 45 01 36.3E	8000	120	921,260,000	921,260,000	20/6/2018	2018-04-07	31/10/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
15	مشروع تبليط شارع ام العظام العثمانية بطول 2,15 كم قضاء بعقوبة/ديالى	الطرق	33 39 19N 44 44 37 35.7E	1000	75	227,020,000	227,020,000	25/6/2018	19/7/2018	2018-03-10	100%	100%	0%	انجاز العمل
16	مشروع تبليط شوارع بطول 1,8 كم لقرى خان بني سعد - بعقوبة (ربيع عطشانة وعلي الهادي والشيماء)/ديالى	الطرق	33 56 6 87N 44 44 54 89 57E	2500	30	185,040,000	185,040,000	25/6/2018	19/7/2018	2018-09-08	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			256420		6,297,780,750	6,333,572,350							

مشاريع محافظة ديالى للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تاهيل مجمع ماء سويد وزحام والعالي وبسعة 200 م3 / ساعة / المقدادية / ديالى	ماء	34 03 46 N 44 58 35 E	13,500	60	385,400,000	385,400,000	2017-07-20	2017-08-27	26/10/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	تاهيل مجمع ماء نوفل والصدور والهارونية سعة 200 م3 / ساعة / المقدادية / ديالى	ماء	34 02 79.1N 44 58 54.3E											
3	تجهيز ونصب محطة تحلية بطاقة 200م3 / ساعة قرية حد مزيد/ بعقوبة/ديالى	ماء	33 48 06 N 44 44 09 E											
4	تاهيل شارع السوق في ناحية السعدية/ديالى	البلديات	30 11 23.01N 45 07 13.63E	35,000	35	106,750,000	106,750,000	2017-07-31	2017-09-14	18/10/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			48,500		492,150,000	492,150,000							



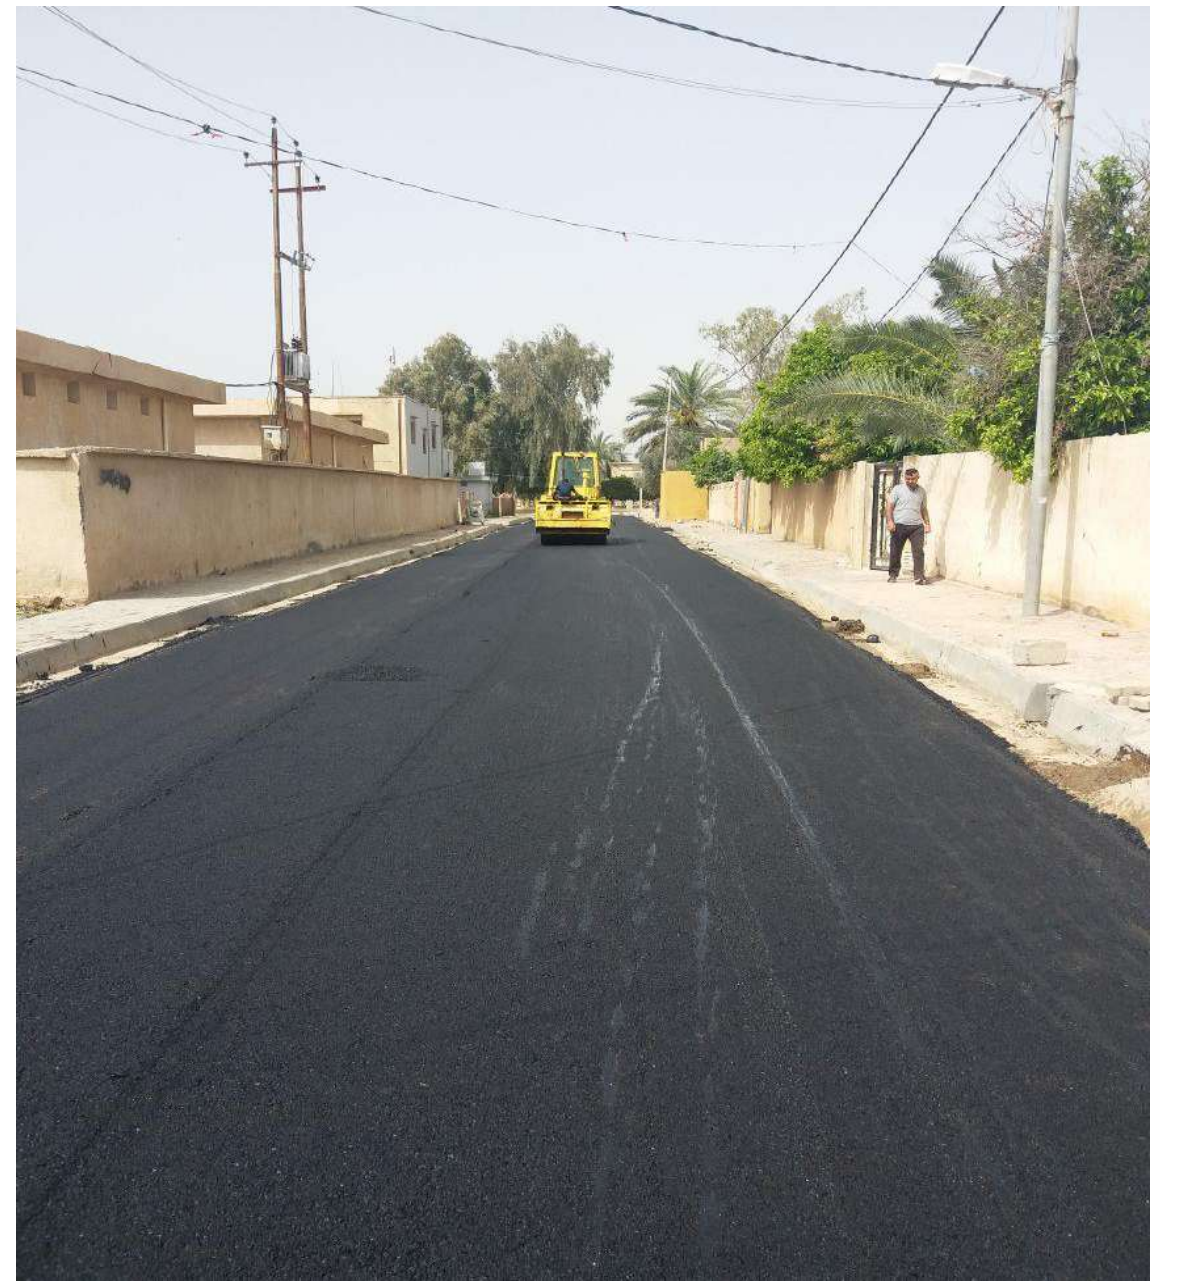

تبليط الشوارع وعمل أرصفة داخل الحدود البلدية بطول (1650 م) / المنصورية / ديالى





تأهيل وتبليط شارع السوق / السعدية / ديالى



مدرسة المأمون / ديالى

مشاريع محافظة بابل

المسيب

المحاويل

الحلة

الهاشمية



مشاريع محافظة بابل / شمال بابل للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017													ت
المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1 تجهيز وفحص وتنفيذ خطوط جهد (11 كي.في) في قطاع المسيب / بابل كهرباء			11,568	150	819,788,000	819,788,000	21-11-2017	26/11/2018		0%	0%	0%	تم فسخ العقد رضائياً مع المقاول
المجموع					819,788,000	819,788,000							
مشاريع محافظة بابل / شمال بابل للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017													ت
المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1 صيانة طريق الحامية - صنديج بطول 3,5 كم/جرف النصر/شمال بابل طرق وجسور		43 22 34 X 36 27 763 Y	12,500	40	287,125,000	287,125,000	13-08-2017	13-08-2017	09-05-2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
2 مد واستبدال شبكة ماء متفرقة في حي المواطنين والحي العسكري/جرف النصر/شمال بابل	ماء	32 46 32.1N 44 15 48.3E	18,000	50	298,620,000	298,620,000	13-08-2017	14-08-2017	10-04-2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
3 مد واستبدال شبكة ماء الحامية/جرف النصر/شمال بابل	ماء	32 48 28.4 N 44 15 53.9 E											
4 مد واستبدال شبكة ماء القاطع الشمالي 1 (الفاضلية 1)/جرف النصر /شمال بابل	ماء	33 00 53.5N 44 09 56.1 E											
5 مد واستبدال شبكة ماء القاطع الشمالي 2 (الفاضلية 2)/جرف النصر/شمال بابل	ماء	33 00 49.6N 44 08 36 E											
6 صيانة طريق الخضر بمحاذاة نهر الفرات بطول 18 كيلو طرق وجسور		43 46 70X 36 33 44 6Y	15,000	60	558,560,000	558,539,520	16-11-2017	19-11-2017	18/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
المجموع			45,500		1,144,305,000	1,144,284,520							



استبدال شبكة الماء / شمال بابل



إعادة تاهيل الطريق (الحامية - صنديج) / جرف النصر / بابل



تاهيل طريق الخضر على طول نهر الفرات لمسافة 18 كم

محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

Baghdad Governorate Projects

الانبار



واسط



مشاريع محافظة بغداد/ حزام بغداد للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة حافظ ابراهيم الابتدائية 6 صف/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 195 557N 43 968 712E	360	59+70	349,240,000	380,255,000	23-07-2017	11-09-2017	24/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	مدرسة المسجد الأقصى الابتدائية 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 213 317N 43 892 967 E	600	170124+170	479,647,000	513,436,400	26-07-2017	11-09-2017	08-05-2018	100%	100%	87%	انجاز العمل
3	مدرسة ابراهيم طوقان الابتدائية 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 209 976N 43 930 087E	600	51+175	400,366,000	440,344,000	30-07-2017	11-09-2017	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة عز الدين القسم الابتدائية 18 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 216 750 N 43 879 541 E	900	105+200	827,057,000	815,204,000	30-07-2017	11-09-2017	17/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	مدرسة أسماء بنت أبو بكر 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 216 750 N 43 879 541 E	600	111+180	398,228,000	437,960,200	30-07-2017	11-09-2017	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	مدرسة الزخرف 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 219 497 N 43 911 557E	600	126+190	1,024,768,500	1,073,136,960	02-08-2017	11-09-2017	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	مدرسة الخوارزمي الابتدائية 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 394 093N 44 037 368E	600	124+180	425,137,000	466,368,600	03-08-2017	11-09-2017	15/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تاهيل ناظم صدر ابو غريب والناظم القاطع في كيلو (8) من القناة الموحدة والمنشآت الاخرى.	الموارد المائية		2,000,000	100+120	830,278,500	899,346,750	07-11-2017	20-11-2017	14/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			2,004,260		4,734,722,000	5,026,051,910							

مشاريع محافظة بغداد/ حزام بغداد للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تجهيز وتنفيذ ونصب شبكات كهرباء في ناحية النصر والسلام/ أبو غريب/حزام	كهرباء		2000	50	438,843,370	13-08-2017	24-08-2017	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	تاهيل شبكات كهرباء (تجهيز محولات) أبو غريب/حزام بغداد	كهرباء		15000	15	255,600,000	18-10-2017	قيد التنفيذ	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	انشاء جسر عودة الشكر في الرفوش	الطرق والجسور		25000	30	88,225,000		تنفيذ امانة	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	تاهيل محطات ماء (السعدان, الهيتاويين, فرع شنيتر)	ماء		10,000		284,350,000		تنفيذ امانة	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تطوير موقع الصندوق	دوائر حكومية				100,000,000		20-11-2017	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			52000		1,167,018,370							



جسر عودة الشكر / حزام أبو غريب / بغداد



إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرى أبو غريب / حزام بغداد



مدرسة المسجد الأقصى الابتدائية / بغداد / حزام بغداد



(إعادة تأهيل محطة ماء السعدان / أبو غريب / حزام بغداد)



(إعادة تأهيل محطة ماء الهيتاويين / أبو غريب / حزام بغداد)

مشاريع صندوق إعادة الأعمار للموازنة الفيدرالية حسب المحافظات لعام 2018

مشاريع محافظة نينوى



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / نينوى



ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	اعادة تاهيل مستشفى تلعفر العام	تلعفر	الصحة	منجز	100%	12	13/11/2018	180	2018/11/27	1,038,672,000
2	صيانة واعادة تاهيل القنطرة الصندوقية السداسية الواقعة على طريق موصل بغداد في المحطة (32+000) على وادي القصب ولممري الذهاب والاياب بطول 65م	القيارة	الطرق والجسور	منجز	100%	16	18/11/2018	180	2018/11/27	830,406,000
3	اعادة اعمار بناية المركز الطلابي و وحدة الرياضة الجامعية في الكلية التقنية	الموصل	التعليم العالي	منجز	100%	140	31/12/2018	200	2019/01/14	553,100,000
4	ترميم بناية المجمع الاذاعي والتلفزيوني / الفيصلية	الموصل	شبكة الاعلام العراقي	منجز	100%	28	29/11/2018	150	2018/12/03	589,560,000
5	اعادة تاهيل سقائف لمخزن المواد الغذائية الكرامة (1)	الموصل	التجارة	منجز	100%	35	4/12/2018	240	2018/12/18	2,254,676,800
6	تاهيل ابنية الاقسام الداخلية – مجمع القادسية / جامعة الموصل	الموصل	التعليم العالي	منجز	100%	111	19/12/2018	220	2019/01/02	509,927,000
7	تاهيل وصيانة جسر الحضر والاجزاء المتضررة في الطريق الرابط بين طريق (موصل – بغداد) والمنطقة الاثرية في الحضر (المرحلة الاولى)	الحضر	الطرق والجسور	منجز	100%	99	18/12/2018	240	1/1/2019	1,501,358,000
8	اعادة تاهيل المشروع الوطني لمديرية المرور في الشلالات / المرحلة الاولى	الموصل	الداخلية	قيد التنفيذ	59%	132	30/12/2018	550	2019/01/10	1,961,520,000
9	تاهيل بناية كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل	الموصل	التعليم العالي	منجز	100%	41	4/12/2018	200	2018/12/18	1,537,540,000
10	هدم واعادة بناء ثانوية تل واعى للبنين 12 صف	حمام العليل	التربية	منجز	100%	44	5/12/2018	240	2018/12/13	579,291,200
11	هدم واعادة بناء ثانوية فافيل 12 صف	تلكيف	التربية	منجز	100%	51	5/12/2018	240	2018/12/13	579,291,200
12	هدم واعادة بناء متوسطة علي بن ابي طالب للبنين 12 صف	الأيمن	التربية	منجز	100%	45	5/12/2018	240	2018/12/13	579,291,200

13	هدم واعادة بناء متوسطة المسعودي 12 صف	الايسر	التربية	منجز	100%	36	4/12/2018	240	2018-12-16	579,291,200
14	هدم واعادة بناء مدرسة كركافر 12 صف	تلعفر	التربية	منجز	100%	76	13/12/2018	220	2018-12-27	511,028,000
15	هدم واعادة بناء مدرسة العامل للبنين 12 صف	الأيمن	التربية	منجز	100%	75	13/12/2018	220	2018-12-27	511,028,000
16	هدم واعادة بناء مدرسة الحدباء للبنين 12 صف	الأيمن	التربية	منجز	100%	74	13/12/2018	220	2018-12-27	511,028,000
17	هدم واعادة بناء مدرسة العطاء للبنات 12 صف	الايسر	التربية	منجز	100%	73	13/12/2018	220	2018-12-27	511,028,000
18	هدم واعادة بناء مدرسة القدس الابتدائية للبنين 12 صف	الأيمن	التربية	منجز	100%	88	13/12/2018	220	2018-12-27	511,028,000
19	هدم واعادة بناء مدرسة ابن رشد للبنين 12 صف	الايسر	التربية	منجز	100%	126	26/12/2018	220	2018-12-27	511,028,000
20	تاهيل مجمع مخازن الحرية وتاهيل مباني الشركة العامة لتصنيع الحبوب	الموصل	التجارة	قيد التنفيذ	88%	125	26/12/2018	450	2019-01-23	2,775,071,200
21	تجهيز محولات قدرة 16 MVA لمحطات جهد 33/11 كف ومحولات توزيع جهد 0,4/11 كف		الكهرباء	منجز	100%	8	23/10/2018	45	2018-10-23	1,530,000,000
22	تجهيز محولات توزيع سعة KVA250			منجز	100%	7	23/10/2018	45		177,500,000
23	تاهيل محطة كهرباء النسيج في الساحل الايمن	الموصل	الكهرباء	منجز	100%	135	30/12/2018	360	2019-01-12	2,988,297,000
24	تاهيل محطة كهرباء الدواسه في الساحل الايمن	الموصل	الكهرباء	منجز	100%	39	4/12/2018	360	2018-12-17	3,381,299,000
25	تأهيل محطة كهرباء باب البيض في الساحل الايمن	الموصل	الكهرباء	منجز	100%	38	4/12/2018	360	2018-12-17	3,281,763,000
26	المعدات المطلوبة لورشة فحص وتصلح المحولات في الجانب الايمن	الأيمن	الكهرباء	منجز	100%	134	30/12/2018	100	2018-11-27	382,221,000
27	صب ارسفة وبناء القوالب الجانبية للشارع الرئيسي في حي النصر وبريوش وصيانة الحفر والتخسفات في مناطق متفرقة / مركز قضاء سنجار	سنجار	البلديات	منجز	100%	2	5/6/2018	60	2018-06-19	188,480,000
	المجموع									30,864,723,800


الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / نينوى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تجهيز جهاز التصوير المقطعي عدد 2	الموصل	الصحة	منجز	100%	104	180	2019-01-02		1,700,000,000
2	تجهيز جهاز الرنين المغناطيسي عدد 2	الموصل	الصحة	منجز	100%	105	180	2019-01-02		2,560,000,000
3	تجهيز جهاز كرسي أسنان متكامل عدد(50)	عدة اقضية	الصحة	منجز	100%	110	180	2019-01-02		964,375,000
4	إعادة تأهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق حي الخضراء	الموصل	المجاري	منجز	100%	72	160	27/12/2018	2018-12-27	336,068,750
5	تاهيل المجرى الصندوقي في باب البيض	الموصل	الماء والمجاري	تنفيذ امانة / منجز	100%	تنفيذ امانة	60		2019-01-26	122,870,000
6	تاهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق اليرموك	الموصل	المجاري	منجز	100%	71	150	27/12/2018	2019-01-02	422,670,000
7	تاهيل بناية مخازن مديرية المجاري مع انشاء مسقفات عدد/3 في وادي عكاب	الموصل	المجاري	منجز	100%	42	180	18/12/2018	2018-12-18	597,820,000
8	تاهيل بناية الهيئة العامة للضرائب في محافظة نينوى/ الجانب الايمن (عمارة التامين على الحياة)	الموصل	الادارة المحلية	تنفيذ امانة / الغي - مؤجل للعام القادم		تنفيذ امانة	60			197,495,000
9	تاهيل مخازن مركز تكنولوجيا البذور/ موقع الموصل	الموصل	العلوم والتكنولوجيا	تنفيذ امانة / منجز	100%	تنفيذ امانة	60		2019-01-03	221,525,000
10	اعادة تأهيل قسم بحوث نينوى		الزراعة	منجز	100%	47	100	19/12/2018	2018-12-19	232,313,000
11	إعادة اعمار بناية المعهد التقني نينوى		التعليم العالي	منجز	100%	13	180	27/11/2018	2018-11-26	747,647,600
12	اعادة اعمار بناية المختبرات العلمية في الكلية التقنية الزراعية / الموصل		التعليم العالي	منجز	100%	13				

322,399,200	2018-12-27	27/12/2018	150	87	100%	منجز	التربية	الموصل	تاهيل ابنية مدرسية في الموصل / الجانب الأيمن (البتول والمواهب)	13
574,228,000	2019-01-03	5/1/2019	180	114	100%	منجز	رئاسة الوزراء		تأهيل بناية مديرية المخابرات في نينوى	14
356,390,600	2019-01-10	2/1/2019	120	101	100%	منجز	الداخلية		إعادة تاهيل مراكز شرطة (اليرموك , الوقاص , النصر) المرحلة الثانية	15
				101	100%	منجز	الداخلية		تاهيل بناية الغرامات والحاسبة لمرور نينوى	16
471,636,000	2018-12-30	30/12/2018	180	90	100%	منجز	دوائر حكومية		أعادة بناء بناية مديرية مختبر نينوى الانشائي	17
598,800,000	2018-12-27	27/12/2018	180	89	100%	منجز	الطرق والجسور	تلعفر	صيانة و تاهيل جسر وادي المر على طريق (كسك - ربيعة)	18
370,080,000	2018-12-27	27/12/2018	100	83	100%	منجز	الطرق والجسور	تلعفر	تاهيل طرق ناحية العياضية	19
1,418,500,000	2018-12-23	من تاريخ استلام الدفعة المقدمة	45	117	100%	منجز	الكهرباء		تجهيز محولات كهربائية (تجهيز محولات سعة 400,250 kva عدد 185) محولة لمخزن الكرامة)	20
118,654,000	2019-01-03	3/1/2019	60	تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امانة / منجز	التربية	سنجار	تاهيل ابنية مدرسية في قضاء سنجار (مدرسة كوجو)	21
120,238,000	2019-01-21	18/11/2018	60	تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امانة / منجز	التربية	تلعفر	تاهيل ابنية مدرسية في قضاء تلعفر مدرسة (اميرة الجنة و المنتظر و الجزيرة)	22
12,453,710,150									المجموع	

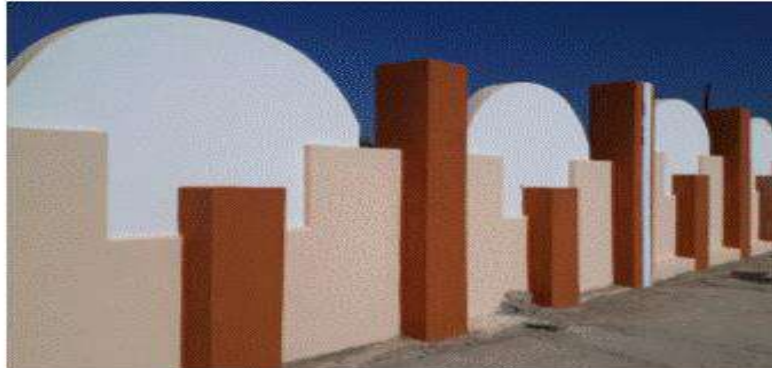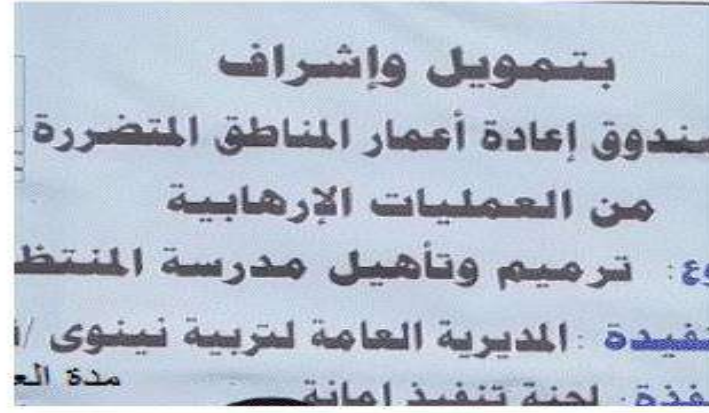


تأهيل الأبنية المدرسية
لـ (مدرسة اميرة الجنة
- الجزيرة -المنتظر)
قام صندوق إعادة اعمار
المناطق المتضررة من
العمليات الإرهابية بإعادة
اعمار مشروع تأهيل الأبنية
المدرسية وهو ضمن خطة
مشاريع عام 2018 مدة
العمل مشروع 75 يوم وقد
تم إنجاز العمل 100%
وحسب التوقيتات
الموضوعة في العقد

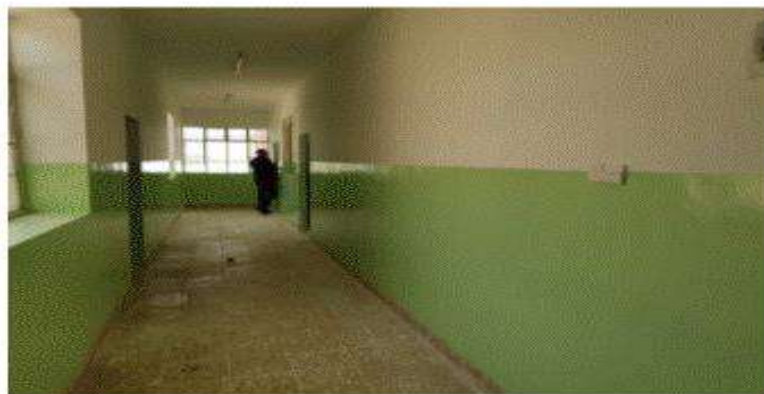

تأهيل مدرسة كوجو في قضاء سنجار



قام صندوق إعادة اعمار
المناطق المتضررة من
العمليات الإرهابية بإعادة
اعمار مشروع تأهيل
مدرسة كوجو وهو ضمن
خطة مشاريع عام 2018
مدة العمل مشروع 60 يوم
مستمر حالياً علماً ان نسبة
الإنجاز الفعلي 100%

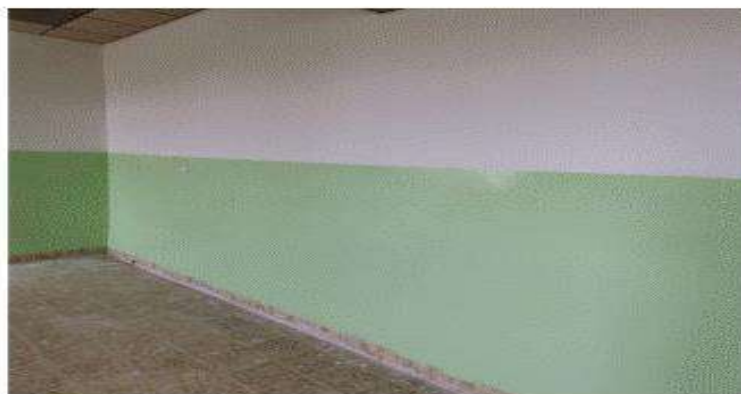



إعادة تأهيل مراكز الشرطة وأبنية مرور نينوى

قام صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بإعادة اعمار مشروع إعادة تأهيل مراكز الشرطة وأبنية مرور نينوى وهو ضمن خطة مشاريع عام 2018 مدة العمل مشروع 120 يوم ومستمر به العمل حالياً علماً ان نسبة الإنجاز الفعلي 100%

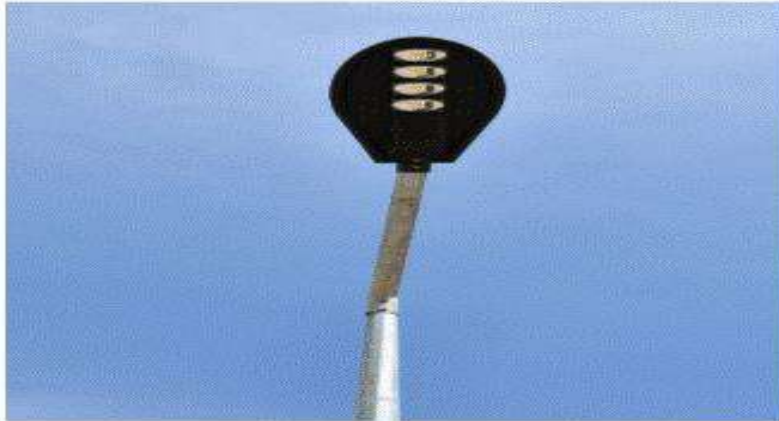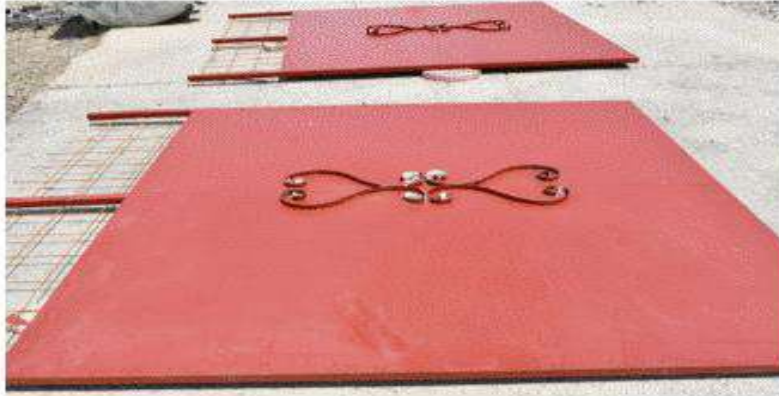

تأهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق اليرموك

قام صندوق إعادة اعمار
المناطق المتضررة من
العمليات الارهابية بإعادة
اعمار مشروع معالجة
المياه الثقيلة لشقق
الخضراء وهو ضمن خطة
مشاريع عام 2018 مدة
العمل مشروع 150 يوم
ومستمر به العمل حالياً
علماً ان نسبة الإنجاز
الفعلي 100%

مشاريع محافظة الانبار

الانبار



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	هدم وإعادة بناء مركز صحي ودار سكن البوزعيان	الخالدية	الصحة	منجز	100%	124	26/12/2018	200	8/1/2019	1,150,824,000
2	هدم وإعادة بناء مركز صحي المضيق	الخالدية	الصحة	منجز	100%	124				
3	هدم وإعادة بناء مركز صحي في البوبالي مع دار سكن	الخالدية	الصحة	منجز	100%	124				
4	هدم وإعادة بناء جنسية راوه	راوه	الداخلية	منجز	100%	136	30/12/2018	180	12/1/2019	907,329,600
5	هدم وإعادة بناء جنسية عنه	عنه	الداخلية	منجز	100%	136		180		
6	هدم وإعادة بناء البطاقة الوطنية في القائم	القائم	الداخلية	منجز	100%	138	30/12/2018	150	13/1/2019	579,545,000
7	تاهيل دائرة البطاقة الوطنية في العبيدي		الداخلية	منجز	100%	138		150		
8	إعادة اعمار جسر وادي الفحيمي الاول	عنه	الطرق والجسور	منجز	100%	130	27/12/2018	180	7/1/2019	633,920,000
9	إعادة اعمار جسر وادي زغيدان	حديثه	الطرق والجسور	منجز	100%	122	26/12/2018	180	7/1/2019	467,200,000
10	إعادة اعمار جسر البغدادى العائم بطول 420متر		الطرق والجسور	منجز	100%	131	30/12/2018	360	12/1/2019	1,301,888,000
	المجموع									5,040,706,600

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	صيانة مجمع ماء البوسودة سعة (200م3/سا)	الخالدية	الماء والمجاري	منجز	100%	19	22/11/2018	90	16/12/2018	560,392,000
2	تجهيز ونصب وحدة مجمعة تقوية سعة 200م3/ساعة حي القدس والشهداء	الخالدية	الماء والمجاري	منجز	100%	19				
3	تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 100م3/ساعة (النساف/البوعنوان /البوراشد)	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56	6/12/2018	120	20/12/2018	1,003,847,500
4	تأهيل مجمع ماء الاسباني/ الشهداء النعيمية	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56				
5	تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 200م3/ساعة لمناطق الصبيحات	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56				
6	صيانة وتأهيل مجمع ماء بني زيد سعة (200م3/س)	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56				
7	تاهيل مجمع ماء سويحل و النهضة الشرقية/ القائم	القائم	الماء والمجاري	منجز	100%	50	5/12/2018	55	2/1/2019	130,640,000
8	صيانة مجمع ماء الصروح سعة 300 م3/ساعة	هيت	الماء والمجاري	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	19/12/2018	125,670,000
9	تجهيز ونصب وحدة تقوية سعة مليون غالون لمجمع ماء الخسفة	حديثة	الماء والمجاري	منجز	100%	52	5/12/2018	90	3/1/2019	699,079,000
10	تاهيل مشروع ماء حديثة - حقلائية الموحد	حديثة	الماء والمجاري	منجز	100%	52				
11	تاهيل مجمع ماء حي الشرطة لناحية بروانة	حديثة	الماء والمجاري	منجز	100%	52				
12	صيانة مشروع ماء الجزيرة في الرمادي	الرمادي	الماء والمجاري	منجز	100%	62	11/12/2018	150	24/12/2018	743,927,500
13	مد شبكة ماء في الاحياء الجنوبية لمدينة الفلوجة	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	29	29/11/2018	80		560,939,200
14	تنفيذ خط دكتايل من ناقل الخزان الى الحي العسكري	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	29			24/12/2018	
15	مد شبكة ماء في حي الجمهورية وحي الشهداء	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	29				
16	أنشاء خزان كونكريتي سعة (750) م3 في قضاء الرطبة	الرطبة	الماء والمجاري	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	14/12/2018	197,212,000
17	تاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء حديثة	حديثة	الكهرباء	منجز	100%	100	18/12/2018	180	5/1/2019	529,287,500
18	تاهيل الشبكة الكهربائية في ناحية حصيبة الشرقية / قضاء الخالدية	الخالدية	الكهرباء	منجز	100%	30	29/11/2018	150	23/12/2018	202,198,000
19	تأهيل الشبكة الكهربائية في زوية غراب	الخالدية	الكهرباء	منجز	100%	30				
20	تاهيل الشبكات الكهربائية في قضاء الرطبة	الرطبة	الكهرباء	منجز	100%			60	26/12/2018	248,715,000

21	تاهيل الشبكة الكهربائية الهوائية المتضررة في قضاء الكرمة	الكرمة	الكهرباء	منجز	100%	46	5/12/2018	120	17/12/2018	794,233,500
22	تجهيز مولد كهرباء / قانمقامية القانم	القانم	الكهرباء	شراء مباشر / منجز	100%					22,000,000
23	تجهيز مولد كهرباء / تربية القانم	القانم	الكهرباء	شراء مباشر / منجز	100%					28,000,000
24	اعادة اعمار جسر البغدادي الخرساني على طريق رمادي-حديثة	البغدادي	الطرق والجسور	منجز	100%	33	2/12/2018	150	11/12/2018	407,976,000
25	أعادة أعمار جسر الجعفي فوق سكة القطار/ الفلوجة	الفلوجة	الطرق والجسور	منجز	100%	61	11/12/2018	90	20/12/2018	202,400,000
26	ترميم وصيانة مخازن عدد 6/ في سابلو الرمادي	الرمادي	التجارة	منجز	100%	25	27/11/2018	120	9/12/2018	607,416,000
27	هدم واعادة بناء مدرسة الداء/12 صف	الرمادي	التربية والتعليم	منجز	100%	112	20/12/2018	180	2/1/2019	573,888,800
28	تاهيل الورش لاعدادية صناعة عنة	عنه	التربية والتعليم	منجز	100%	91	16/12/2018	160	28/12/2018	552,765,000
29	هدم واعادة بناء مدرسة الفداء /12 صف	الكرمة	التربية والتعليم	منجز	100%	40	4/12/2018	180	16/12/2018	581,613,500
30	هدم وإعادة بناء مدرسة المواهب للبنين 12 صف	راوه	التربية والتعليم	منجز	100%	113	20/12/2018	180	10/1/2019	1,190,436,000
31	هدم وإعادة بناء مدرسة ذو البجادين للبنين 12 صف	راوه	التربية والتعليم	منجز	100%	113				
32	هدم وإعادة بناء مدرسة شط العرب للبنين 12 صف	القانم	التربية والتعليم	منجز	100%	109	19/12/2018	180	2/1/2019	1,190,436,000
33	هدم وإعادة بناء مدرسة النهضة الشرقية للبنين 12 صف	القانم	التربية والتعليم	منجز	100%	109				
34	تاهيل الشقق السكنية للتدريسيين في جامعة الفلوجة	الفلوجة	التربية والتعليم	منجز	100%	69	13/12/2018	90	27/12/2018	694,910,500
35	تاهيل قسم السدود والكهرباء جامعة الانبار	الرمادي	التربية والتعليم	منجز	100%	69				
36	هدم و اعادة بناء بناية العمادة/ المعهد التقني في الصقلاوية	الصقلاوية	التربية والتعليم	منجز	100%	66	11/12/2018	180	3/1/2019	447,038,400
37	هدم وإعادة بناء مديرية شرطة الرمادي	الرمادي	الداخلية	منجز	100%	85	13/12/2018	180	27/12/2018	858,323,200
38	تجهيز محولات كهرباء		الكهرباء	منجز	100%	116	23/12/2018	45	30/1/2019	691,500,000
39	ترميم بناية الردهة المشتركة في مستشفى القانم العام	القانم	الصحة	منجز	100%			60	26/12/2018	91,690,000
40	تاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء راوة مع تاهيل بناية كهرباء راوه	راوه	الكهرباء	منجز	100%			60	23/12/2018	142,770,000
41	تاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء هيت	هيت	الكهرباء	منجز	100%					
	المجموع							108		14,079,304,600

مشاريع محافظة صلاح الدين



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / صلاح الدين										
ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	اعادة تاهيل جسر الشرفا ط الكونكريتي ومقترباته في محافظة صلاح الدين	الشرفا ط	الطرق والجسور	منجز	100%	17	21/11/2018	360	2018-12-12	3,948,780,000
2	هدم واعادة بناء مدرسة العليا الابتدائية للبنات 12 صف	بلد	التربية	منجز	100%	54	5/12/2018	180	2019-01-15	610,965,000
3	هدم واعادة بناء ثانوية جمال عبدالناصر 12صف	بلد	التربية	منجز	100%	43	4/12/2018	180	2019-01-15	528,360,000
4	هدم واعادة بناء مدرسة المحزم الابتدائية للبنين 12 صف	تكريت	التربية	منجز	100%	67	12/12/2018	180	2018-12-25	607,200,000
5	هدم واعادة بناء ثانوية الاريج للبنات 12صف	بيجي	التربية	منجز	100%	37	4/12/2018	180	2019-01-20	573,400,000
6	اعادة تاهيل جسر البوجواري ورفع انقاض جسر سكة القطار المتضرر في قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين	بيجي	الطرق والجسور	منجز	100%	20	22/11/2018	150	2018-12-08	579,632,000
7	هدم واعادة بناء ثانوية بيجي للبنات 18 صف	بيجي	التربية	منجز	100%	80	13/12/2018	180	2019-01-20	980,658,750
8	هدم واعادة بناء ثانوية الخضراء للبنين 18 صف	يثر ب	التربية	منجز	100%	64	11/12/2018	180	2019-01-14	980,788,500
	المجموع									8,809,784,250

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / صلاح الدين										
ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
1	توسعة مركز صحي في الساحل الأيسر/ قضاء الشرفا	الشرفا	الصحة	منجز	100%	55	5/12/2018	150	2018-12-18	284,192,000
2	هدم و إعادة بناء مديرية بلدية سليمان بيك	سليمان بيك	البلدية	منجز	100%	103	19/12/2018	120	2019-01-02	467,699,000
3	أكساء شوارع متفرقة في قضاء سامراء	سامراء	البلدية	منجز	100%	49	5/12/2018	120	2018-12-23	548,060,000
4	هدم و إعادة بناء مديرية بلدية يثرب	يثرب	البلدية	منجز	100%	65	11/12/2018	160	2018-12-24	400,092,000
5	هدم و إعادة بناء مركز شرطة سليمان بيك	سليمان بيك	الداخلية	منجز	100%	58	11/12/2018	180	2018-12-27	563,272,900
6	هدم و إعادة بناء مديرية شرطة يثرب	يثرب	الداخلية	منجز	100%	34	2/12/2018	180	2018-12-20	834,784,000
7	هدم و إعادة بناء مركز شرطة المعتصم	المعتصم	الداخلية	منجز	100%	18	22/11/2018	180	2018-12-16	591,548,000
8	هدم و إعادة بناء مركز شرطة دجلة	دجلة	الداخلية	منجز	100%	23	27/11/2018	180	2018-12-24	589,857,500
9	إعادة تأهيل 4 جسور للمحطة (700+ 16) كم و المحطة (17+115) كم على طريق تكريت - بيجي	بيجي	الطرق والجسور	منجز	100%	77	13/12/2018	150	2018-12-26	457,400,000
10	تأهيل كهرباء محطات التوزيع الرئيسية A - B / جامعة تكريت	تكريت	الكهرباء	منجز	100%	106	19/12/2018	140	2019-01-03	1,017,611,200
	المجموع									5,754,516,600

الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / كركوك										
ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	هدم وإعادة بناء مدرسة الاسكندرونة 12صف في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	منجز	100%	15	18/11/2018	210	2018-11-19	557,435,000
2	تاهيل خطوط ابراج مغذي 33كف لتغذية محطة الرياض من محطة ملاعبالله	الحويجة	الكهرباء	منجز	100%	22	26/11/2018	160	2018-12-09	467,952,500
3	اعادة انشاء الجسر الكونكريتي على طريق (كركوك - تكريت)		الطرق والجسور	منجز	100%	21	26/11/2018	360	2018-12-06	1,249,294,000
4	صيانة جسور باني حسن		الطرق والجسور	منجز	100%	26	27/11/2018	180	2018-12-09	391,990,000
5	إعادة اعمار بنايات المعهد التقني - الحويجة (بناية العمادة, المركز الثقافي, ورش تدريب الطلاب)	الحويجة	التعليم العالي	قيد التنفيذ	88%	108	19/12/2018	150	2018-12-30	864,570,000
6	إعادة ترميم محكمة بداءة الرياض	الرياض	وزارة العدل	منجز	100%	115	23/12/2018	150	2019-01-03	362,528,000
7	إعادة انشاء بناية مركز شرطة الزاب	الزاب	الداخلية	منجز	100%	121	23/12/2018	150	2019-05-19	380,882,400
8	إعادة تاهيل ثانوية الاوس في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	منجز	100%	84	13/12/2018	240	2018-12-27	401,301,000
9	تاهيل مشروع ماء تل علي القديم (400 م3/ساعة - قضاء الحويجة	الحويجة	الماء	منجز	100%	92	16/12/2018	180	2018-12-30	706,112,001
10	إعادة اعمار محطات الدفع العالي لمشاريع ماء (غريب وشجرة) ناحية العباسي	العباسي	الماء	منجز	100%	98	18/12/2018	150	2018-12-30	264,000,000
11	هدم وإعادة بناء مدرسة البونجم 12 صف في داقوق	داقوق	التربية	منجز	100%	82	13/12/2018	300	2018-12-27	557,408,000
12	هدم وإعادة بناء مدرسة ام البنين في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	منجز	100%	96	17/12/2018	300	2018-12-31	557,410,000
13	هدم وإعادة بناء مدرسة البوبتير 6 صف في ناحية الملتقى	الملتقى	التربية	منجز	100%	95	17/12/2018	200	2018-12-31	325,332,000
14	هدم وإعادة بناء مدرسة المرة 6 صف في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	منجز	100%	95			2018-12-31	
15	صيانة الشارع الرابط بين كيوان وناحية الملتقى	الملتقى	الطرق والجسور	منجز	100%	143	31/12/2018	60	10/1/2019	280,000,000
16	إعادة اكساء الطريق الرابط بين ناحية الرياض وقضاء الحويجة	الرياض	الطرق والجسور	منجز	100%	128	27/12/2018	60	2019-01-08	286,350,000
	المجموع									7,652,564,901

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / كركوك										
ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
1	تبديل رمل و حصي للفلاتر لمشروع ماء الحويجة الحديث	الحويجة	الماء	منجز / تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امانة		60	27/12/2018	162,250,000
2	تاهيل مجمع ماء جديدة السادة	الحويجة	الماء	منجز / تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امانة				
3	هدم واعادة بناء مركز الدفاع المدني في قضاء الحويجة	الحويجة	الداخلية	قيد التنفيذ / أسباب الانحراف 1- تأخر تحريات التربة 2- شدة الامطار 3- امر غيار 4- تلوؤ الشركة	93%	93	16/12/2018	180	30/12/2018	535,403,200
4	تجهيز مضخات لمحطات الماء في المناطق المحررة/ الحويجة	الحويجة	الماء	منجز	100%	94	17/12/2018	50	31/12/2018	368,000,004
5	هدم واعادة بناء مركز شرطة الرياض	الرياض	الداخلية	منجز	100%	11	4/11/2018	180	18/11/2018	380,882,400
6	هدم واعادة بناء مركز شرطة الرشاد	الرشاد	الداخلية	منجز	100%	10	4/11/2018	180	16/12/2018	380,882,400
7	تجهيز مولدات لمشاريع الماء في المناطق المحررة / كركوك		الماء	منجز	100%	142	31/12/2018	60	31/1/2019	748,500,000
8	هدم وإعادة بناء بناية بلدية مجاري ناحية الرياض	الرياض	البلدية	منجز	100%	81	13/12/2018	150	26/12/2018	344,502,400
9	هدم وإعادة بناء بناية بلدية مجاري ناحية الزاب	الحويجة	البلدية		100%	81	13/12/2018	150	26/12/2018	
10	تاهيل سايلو حبوب في قضاء الحويجة	الحويجة	التجارة	منجز	100%	78	13/12/2018	183	26/12/2018	576,140,000
11	تاهيل سايلو حبوب في ناحية الرياض	الرياض	التجارة	منجز	100%	78				
12	رفع الصبات الكونكريتية / سدة كركوك الحديثة		الطرق والجسور	لم ينفذ / تم تحويله الى خطة عام 2019		تنفيذ امانة		25		70,800,000
	المجموع									3,567,360,404

مشاريع محافظة ديالى

Diyala Governorate Projects



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
1	تبليط واكساء شوارع متفرقة في مركز قضاء الخالص	الخالص	الطرق والجسور	منجز	100%	14	14/11/2018	90	21/11/2018	1,009,317,500
2	تجهيز مواد ومعدات لصيانة الشبكة الكهربائية في ناحية العظيم	العظيم	الكهرباء	منجز	100%	60	11/12/2018	60	28/1/2019	631,352,500
3	صيانة واكساء وتثبيت اكناف طريق الصدور - ناحية المنصورية بطول 13,500 كم		الطرق والجسور	منجز	100%	97	18/12/2018	120	2/1/2019	908,000,000
4	هدم واعادة بناء مدرسة شجرة الیقطين 12 صف في جلولاء	جلولاء	التربية	منجز	100%	123	26/12/2018	180	4/2/2019	540,411,500
5	اعادة تاهيل طريق قرية الجبل بطول 4 كم في ناحية بهرز باعتبار المحطة (صفر+صفر) هي الشارع الرئيسي لطريق بعقوبة - النهروان	بعقوبة	الطرق والجسور	منجز	100%	119	23/12/2018	120	8/1/2019	404,240,000
6	اعادة تاهيل طرق (الزركانية - العودة - سفيط - دراويش) مع الطريق الفرعي لقرية الزركانية في الخالص من المحطة (صفر + صفر) سيطرة الجيش الى (100+3)	الخالص	الطرق والجسور	منجز	100%	120	23/12/2018	90	23/1/2019	308,040,000
7	صيانة واكساء الطريق الرابط لقرى الجبل الصاعد بطول 6 كم من المحطة (صفر+صفر) الى (6+صفر) / ناحية بهرز	بهرز	الطرق والجسور	منجز	100%	139	31/12/2018	100	14/1/2019	518,640,000
8	إعادة تاهيل طريق التحويلة والقرى المحاذية لها		الطرق والجسور	منجز	100%	137	30/12/2018	120	13/1/2019	709,840,000
9	هدم واعدة بناء روضة اطفال السعدية النموذجية	السعدية	التربية	منجز	100%	133	30/12/2018	180	17/1/2019	426,670,000
10	صيانة واكساء وتبليط لقرى بلدروز (قرية عتبة 7.5 كم وقرية طعيمات 1.5 كم) مقاطعة 17	بلدروز	الطرق	منجز	100%	4	20/6/2018	120	3/7/2018	921,260,000
11	اكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية قرنة تبة و قصبتها القديمة		الطرق	منجز	100%	9	28/10/2018	60	25/11/2018	320,000,000
12	تبليط شارع ام العظام العثمانية / بعقوبة بطول 2.15 كم	بعقوبة	الطرق	منجز	100%	5	25/6/2018	75	19/7/2018	227,020,000
13	تبليط شوارع بطول 11.8 كم لقرى خان بني سعد / بعقوبة / ربيع عطشاته / وعلي الهادي والشيماء	بعقوبة	الطرق	منجز	100%	6	25/6/2018	30	19/7/2018	185,040,000
14	تأهيل الشارع رقم 21 المار ضمن المحلة 311 و 313 بطول 1.4 كم للمقطع ما بين المستوصف الصحي القديم واستدارة دور الجاهزة في حي التحرير / بعقوبة	بعقوبة	الطرق	منجز	100%	1	5/6/2018	100	20/6/2018	195,720,000
15	تبليط الشارع الرئيسي داخل حدود بلدية السلام بطول 550 م	السلام	الطرق	منجز	100%	53	5/12/2018	75	13/1/2019	96,184,000
16	تأهيل انارة شوارع ناحية كنعان في ديالى	بعقوبة	الكهرباء	منجز	100%	3	7/6/2018	45	21/6/2018	111,220,000
	المجموع									7,512,955,500

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلية	كلفة العقد الأصلي
1	تبليط طرق في قضاء بلدروز	بلدروز	البلدية	منجز	100%	129	27/12/2018	90	28/1/2019	448,757,500
2	اكساء الشوارع الرئيسية - هيب		البلدية	منجز	100%	24	27/11/2018	90	27/12/2018	390,168,001
3	صيانة واكساء طريق جيزاني الجول-الخالص	الخالص	الطرق	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	24/12/2018	216,000,000
4	صيانة جسر يعقوبة الثالث		الطرق	منجز	100%	31	29/11/2018	90	11/12/2018	193,240,000
5	صيانة و اكساء مدخل قرية الزهيرات بطول 3 كم / ابو صيدا		الطرق	منجز	100%	48	5/12/2018	60	3/1/2019	257,600,000
6	صيانة واكساء و تثبيت اكتاف طريق قرة تبة/ ناحية جبارة		الطرق	منجز	100%	32	2/12/2018	90	16/12/2018	692,320,014
7	تبليط طريق ناحية السلام		الطرق	منجز	100%	59	11/12/2018	120	9/1/2019	412,320,000
8	تجهيز مواد لتاهيل شبكة كهرباء احياء (الرمادية-الحرية-الجزيرة-النضال-ابو الدهن)	المقدادية	الكهرباء	منجز	100%					579,004,500
	أ- تجهيز قابلات واسلاك كهربائية / كهرباء المقدادية	المقدادية	الكهرباء	منجز	100%	107	19/12/2018	30	9/1/2019	87,796,000
	ب- تجهيز محولات كهرباء / كهرباء المقدادية	المقدادية	الكهرباء	منجز	100%	118	23/12/2018	45	21/1/2019	184,000,000
9	تبدیل الخط الناقل المغذي من محطة تقوية ماء سيف سعد الى هيب قطر 315 ملم	الخالص	الماء	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	26/12/2018	167,800,000
10	تجهيز و نصب مجمع ماء الشاخة في قضاء المقدادية	المقدادية	الماء	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	30/12/2018	159,237,700
11	تاهيل مجمع ماء الشهيد غازي سعة 100 م3/ساعة مع تنفيذ خط ناقل سعة 250 ملم		الماء	منجز	100%	27	29/11/2018	120	9/12/2018	559,663,000
12	هدم و اعادة بناء مدرسة الرابطة (6) صف	خاتقين	التربية	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	26/12/2018	239,487,000
13	تجهيز مولدة لمستشفى جلولاء		الصحة	منجز	100%	141			31/1/2019	96,755,000
14	تبليط طريق كشول الصغير و الكبير		الطرق	منجز	100%	86	13/12/2018	90	16/1/2019	386,900,000
15	هدم وإعادة بناء مدرسة ابن الهيثم 12 صف	الخالص	التربية	منجز	100%	79	13/12/2018	180		1,097,486,000
16	هدم وإعادة بناء مدرسة الاصاله 12 صف	الخالص	التربية	منجز	100%	79			4/2/2019	
17	تاهيل مجمع ماء السادة سعة 200م3/ساعة	بعقوبة	الماء	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	30/12/2018	221,429,100
18	هدم وإعادة بناء السياج الخارجي لمدرسة اعدادية مندلي	مندلي	التربية	تنفيذ امانة / منجز	100%			40	24/12/2018	75,125,000
	المجموع									6,465,088,815

مشاريع محافظة بابل

المسيب

المحاويل

الحلة

الهاشمية



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / شمال بابل												
ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	صيانة طريق مسيب - جرف النصر على اعتبار المحطة (صفر+صفر) تقاطع التحرير	جرف النصر	الطرق والجسور	2,860,369,360	انجز بتاريخ 8/8/2019	%100	68	12/12/2018	150	26/12/2018	27/12/2018	2,000,259,000
	المجموع			2,860,369,360								2,000,259,000

محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

Baghdad Governorate Projects

الانبار



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / حزام بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	هدم وإعادة بناء مدرسة بن غازي الابتدائية 18 صف	الطارمية	التربية	1,207,253,080	منجز	100%	102	19/12/2018	240	2/1/2019	27/12/2018	840,178,000
2	هدم وإعادة بناء مدرسة ابن النفيس الابتدائية 18 صف	المشاهدة	التربية	1,207,253,080	منجز	100%	127	26/12/2018	240	8/1/2019	8/1/2019	840,177,600
	المجموع			2,414,506,160								1,680,355,600

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تاهيل خط كهرباء (33 كي في) محطة الصمود/ مستودعات نفط المشاهدة	المشاهدة	الكهرباء	512,502,848	منجز	100%	57	9/12/2018	120	23/12/2018	507,471,500
2	ايرصال الماء الصافي الى قرية المزرفة في التاجي		الماء	99,800,000	تنفيذ اماتة / منجز	100%			25	21/10/2018	99,800,000
3	مجمع ماء الحركاوي الجنوبي سعة 200م3/س	اليوسفية	الماء	792,511,290	منجز	100%	70	13/12/2018	120	27/12/2018	718,103,100
4	تأهيل مجمع ماء عودة المفرجي سعة 200م3/س	اليوسفية	الماء		منجز	100%	70				
5	تأهيل مجمع ماء هور ابو فاضل سعة 200م3/س	اليوسفية	الماء		منجز	100%	70				
6	تبليط الشارع الرئيسي في حي الجزائر/ قضاء المحمودية	المحمودية	الطرق والجسور	230,270,000	تنفيذ اماتة / منجز	100%			45	24/12/2018	205,980,000
7	تاهيل خطوط تغذية الشبكة الكهربائية لمناطق الزيدان دولية/ قضاء ابو غريب		الكهرباء	561,344,763	منجز	100%	63	11/12/2018	60	25/12/2018	508,638,400
8	انشاء كرفان دار مبيت اطباء سيع البور		الصحة	17,437,235	لجنة مشتريات / منجز	100%					19,750,000
9	إعادة تاهيل طريق الشاحنات / سيطرة بغداد - كوت	الرستمية	الداخلية	249,485,000	تنفيذ اماتة / منجز	100%			50	23/12/2018	200,332,000
10	إعادة تاهيل طريق الشاحنات / سيطرة بغداد - الشعب	الشعب	الداخلية	248,676,000	تنفيذ اماتة / منجز	100%			50	23/12/2018	199,704,000
11	تاهيل طريق قرية البوذياب واطراف الحماميات	التاجي	البلدية	250,000,000	تنفيذ اماتة / منجز	100%			45	24/12/2018	210,000,000
12	تاهيل طريق حنون	الشعب	البلدية	262,075,000	تنفيذ اماتة / منجز	100%			45	24/12/2018	229,915,000
13	تاهيل طريق السدة المحاذي لنهر دجلة / جسر ذراع دجلة لغاية جامع نور المصطفى / مقاطعة مزرفة وحصيو	التاجي	البلدية	286,350,000	تنفيذ اماتة / منجز	100%			45	24/12/2018	240,900,000
14	ترميم ابنية مدرسية (مدرسة الامام الصادق وعظماء العرب)	النهروان	التربية	73,200,000	تنفيذ اماتة / منجز	100%			45	27/12/2018	73,200,000
15	توسعة مقر الصندوق		مباني حكومية	500,000,000	تنفيذ اماتة / منجز	100%			60	27/12/2018	250,000,000
16	توسعة القسم الهندسي / مقر الصندوق		مباني حكومية	50,000,000	لجنة مشتريات / منجز	100%			60		50,000,000
	المجموع			4,133,652,136							3,513,794,000

مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية حسب المحافظات لعام 2019

مشاريع محافظة نينوى



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / نينوى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفعلي	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
1	اعادة تاهيل ابنية الاقسام الداخلية في مجمع الفاروق / الساحل الأيمن / جامعة الموصل	الجانب الأيمن	التعليم العالي	منجز	100%	23	365	2019-09-02	2,969,285,600
2	تجهيز المعدات المطلوبة لورشة فحص وتصليح المحولات في قضاء تلعفر	تلعفر	الكهرباء	فسخ عقد	40%	37	180	2019-09-03	445,851,000
3	تاهيل بناية ادارة الدراسات والتصاميم الهندسية في الموصل	الجانب الأيمن	الموارد المائية	منجز	100%	45	270	2019-10-06	606,156,800
4	اعادة انشاء كلية هندسة الكهرباء	الموصل	التعليم العالي	قيد التنفيذ / تلكو الشركة	60%	55	500	2019-10-30	5,444,672,000
5	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 3 / طب الموصل	الموصل	التعليم العالي	قيد التنفيذ	59%	66	380	2019-11-18	2,416,492,800
6	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 2 / طب الموصل	الموصل	التعليم العالي	قيد التنفيذ / تلكو الشركة	33%	84	380	2019-12-22	2,416,202,800
7	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 4 / طب الموصل	الموصل	التعليم العالي	فسخ العقد رضائيا	0%	90	380	2019-12-24	2,355,423,000
8	اعادة انشاء عمادة كلية الطب جامعة الموصل	الموصل	التعليم العالي	فسخ العقد رضائيا	0%	93	380	2019-12-24	2,349,894,000
9	اعادة انشاء بناية مديرية بلديات نينوى	الموصل	البلديات	قيد التنفيذ	78%	98	360	2019-12-22	2,965,872,000
10	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 1 / طب الموصل	الموصل	التعليم العالي	قيد التنفيذ / تلكو الشركة	45%	103	380	2020-01-01	2,750,000,000
11	تبليط وفرش اكتاف الطريق الرابط من مشروع ري الجزيرة الشمالي الى قرية حردان بطول 12,5 كم	سنجار	الطرق والجسور	منجز	100%	105	180	2020-01-01	1,148,480,000
12	انشاء وتبليط وإكساء شوارع داخلية متفرقة في قضاء تلعفر	تلعفر / تركمانية	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ / تلكو الشركة	75%	113	180	2020-01-07	1,284,315,200
13	اعادة تاهيل المسقفات وبناية الادارة لسايلو تلعفر	تلعفر / تركمانية	التجارة	قيد التنفيذ / تلكو الشركة	75%	113	180	2020-01-07	
14	هدم واعادة بناء شعبة الموارد المائية في الموصل	الموصل	الموارد المائية	منجز	100%	117	210	2020-01-08	536,110,800
15	اعادة انشاء بناية المقر الرئيسي لمديرية زراعة نينوى	الموصل	الزراعة	قيد التنفيذ / تلكو الشركة	46%	130	400	2020-01-19	3,990,968,000
16	هدم و إعادة إنشاء مدرسة الأعدادية المركزية 24 صف الموصل/ الجانب الأيمن	الموصل / الجانب الأيمن	التربية	منجز	100%	139	240	2020-01-20	1,123,049,200
17	اعادة تاهيل مطبعة جامعة الموصل	الموصل	التعليم العالي	منجز	100%	142	200	2020-01-08	651,606,000
18	هدم واعادة بناء متوسطة العقيدة للبنين 12 صف	الموصل	التربية	منجز	100%	147	210	2020-01-20	1,001,593,200
19	هدم واعادة بناء روضة الاريح 4 صف	الموصل	التربية	منجز	100%	147	210	2020-01-20	
20	اعادة تاهيل المستشفى البيطري في باب سنجار- الجانب الأيمن	الجانب الأيمن	الزراعة	قيد التنفيذ	93%	160	210	2020-01-08	963,860,800
21	هدم واعادة بناء مدرسة عبدالرحمن الداخل 12 صف	الموصل	التربية	منجز	100%	161	210	2020-01-08	558,717,200
22	هدم واعادة بناء مجمع الكرامة 2/	الموصل	التجارة	منجز	100%	165	320	2020-01-27	3,472,866,240
23	تجهيز مواد لتاهيل واعمار وصيانة الشبكة الكهربائية - الجانب الأيسر	الجانب الأيسر	الكهرباء	منجز	100%	171	150	2019-12-30	1,515,000,000
24	هدم واعادة بناء محطة الشفاء الثانوية (11/33) kv الجانب الأيمن	الموصل	الكهرباء	منجز	100%	178	360	2020-02-02	2,700,319,000

25	ترميم متوسطة تلغفر للبنين / تركمانية	تلغفر / تركمانية	التربية	منجز	100%	179	90	2020-01-23	809,862,000
26	ترميم مدرسة المجد الابتدائية / تركمانية	تلغفر / تركمانية	التربية	منجز	100%	179	90	2020-01-23	
27	ترميم مدرسة اليمامة للبنات / تركمانية	تلغفر / تركمانية	التربية	منجز	100%	179	90	2020-01-23	
28	ترميم مدرسة سكيئة بنت الحسين الابتدائية للبنين / تركمانية	تلغفر / تركمانية	التربية	منجز	100%	179	90	2020-01-23	
29	ترميم مدرسة ام القرى الابتدائية للبنين / تركمانية	تلغفر / تركمانية	التربية	منجز	100%	179	90	2020-01-23	
30	ترميم اعدادية تلغفر للبنين / تركمانية	تلغفر / تركمانية	التربية	منجز	100%	179	90	2020-01-23	
31	ترميم مدرسة العزة للبنات / تركمانية	تلغفر / تركمانية	التربية	منجز	100%	179	90	2020-01-23	
32	بناء جناح إدارة في متوسطة اسيا / تركمانية	تلغفر / تركمانية	التربية	منجز	100%	179	90	2020-01-23	
33	ترميم مدرسة تبوك للبنين / تركمانية	تلغفر / تركمانية	التربية	منجز	100%	179	90	2020-01-23	
34	ترميم مدرسة الفضائل للبنين / تركمانية	تلغفر / تركمانية	التربية	منجز	100%	179	90	2020-01-23	
35	هدم وإعادة بناء اعدادية اسماعيل طالب /ناحية القبروان- 12 صف	سنجار	التربية	منجز	100%	180	220	2020-02-13	824,975,000
36	تجهيز وتنفيذ مصادر جهد (33) kvالمحطة كهرباء باب عشتار الثانوية من المحطة الرئيسية	الموصل	الكهرباء	منجز	100%	181	150	2020-02-03	922,000,000
37	اعادة تأهيل بناية بلدية القبروان	سنجار	البلدية والبلديات	منجز	100%	202	210	2020-01-27	261,985,000
38	اعادة تأهيل مخازن كهرباء الكرامة	الموصل	الكهرباء	قيد التنفيذ	66%	203	400	2020-02-02	4,525,160,000
39	تبليط وتأهيل وصيانة واكساء شوارع متفرقة داخل قضاء تلغفر	تلغفر	البلدية والبلديات	منجز	100%	211	210	2020-01-21	2,210,000,000
40	تأهيل وتبديل القوالب الجانبية لشارع السوق من دورة القلعة الى دورة رأس الجادة في تلغفر مع تبليط شوارع بطول 1525م	تلغفر	الطرق والجسور	منجز	100%	211	210	2020-01-21	
41	ترميم منتدى شباب تلغفر / تركمانية	تلغفر / تركمانية	الشباب والرياضة	قيد التنفيذ	94%	218	80	2020-01-27	339,240,000
42	اعادة تأهيل ملعب جامعة الموصل	الموصل	التعليم العالي	قيد التنفيذ	50%	221	360	2020-01-26	3,201,436,000
43	اعادة اعمار وتأهيل جسر موقع سد بادوش الحديدي	تلكيف	الموارد المائية	قيد التنفيذ / تلكو الشركة	96%	225	320	2020-01-20	3,192,400,000
44	تبليط واكساء شوارع متفرقة في مركز قضاء تلكيف	تلكيف	البلدية والبلديات	منجز	100%	227	220	2020-01-24	1,492,000,000
45	اعادة بناء شعبة زراعة العياضية / قضاء تلغفر / تركمانية	تلغفر + العياضية / تركمانية	الزراعة	منجز	100%	228	80	2020-01-22	459,497,000
46	تجهيز محولات (400 KVA)لدائرة توزيع كهرباء تلغفر/ بعدد (100) محولة	تلغفر / تركمانية	الكهرباء	منجز	100%	234	90	2019-12-31	2,886,905,000
47	تجهيز مواد الشبكة الكهربائية لأعادة تأهيل كهرباء قضاء تلغفر والقرى التابعة لها	تلغفر + العياضية / تركمانية	الكهرباء	منجز	100%	234	90	2019-12-31	
48	اعادة تأهيل مغذي 11 كي في حي الخضراء والجزيرة من محطة تلغفر الجديدة 33/11 كي في وبطول 5 كم	تلغفر / تركمانية	الكهرباء	منجز	100%	234	90	2019-12-31	
49	اعادة تأهيل محطة كهرباء القبروان	سنجار	الكهرباء	قيد التنفيذ / تلكو الشركة	47%	235	180	2020-02-08	1,830,835,000
50	اعادة تأهيل محطة كهرباء البعاج سعة 16*2 مفا	البعاج	الكهرباء	قيد التنفيذ / تلكو الشركة	47%	238	180	2020-02-08	1,888,570,000
51	تأهيل بناية شعبة احصاء تلغفر	تلغفر	مباني حكومية	مؤجل / لم يوقع عقد			محال - مؤجل		
52	تأهيل قاعة القانمقامية قضاء تلغفر مع بناء قاعة	تلغفر / تركمانية	مباني حكومية	مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط					

72,451,179,240

الإضافي الأول

1	تبليط وتأهيل شوارع في حي الكفاح وحي الجزيرة وحي العسكري والصناعة الجنوبي داخل قسبة تلغفر / إضافي 1	تلغفر	البلديات	منجز	100%	226	260	2020-12-24	3,431,828,600
2	صيانة واكساء طريق تل زلط - المولي	تلغفر	الطرق والجسور	منجز	100%	213	150	2020-12-24	507,750,000

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / نينوى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	إعادة إنشاء مركز صحي الوحدة	الموصل	الصحة	منجز	100%	12	180	2019-08-05	455,116,000
2	إعادة تاهيل جسر الصابونية على طريق موصل - كسك	تلعفر	الجسور	منجز	100%	17	150	2019-08-19	601,200,000
3	إعادة تاهيل جسر المفري (حنكة - زمار)	زمار	الجسور	منجز	100%	17	150	2019-08-19	
4	هدم و إعادة بناء ثانوية زمار للبنات 12 صف	زمار	التربية	منجز	78%	25	180	2019-09-02	739,203,600
5	تأهيل مدرسة ابو خشب /ناحية ربيعة مع بناء جناح (6) صف طابقين مع وحدات صحية عدد (4)	ناحية ربيعة	التربية	قيد التنفيذ / تلتك الشركة بسبب عدم صرف المستحقات المالية	90%	25	180	2019-09-02	
6	إعادة إنشاء ورشة فحص المحولات في تلعفر	تلعفر	الكهرباء	قيد التنفيذ / تلتك الشركة	85%	26	210	2019-09-02	860,206,300
7	إعادة بناء مركز صيانة كهرباء القاطع الجنوبي / تلعفر	تلعفر	الكهرباء	منجز	100%	26	210	2019-09-02	
8	إعادة بناء القاطر في حي المامون	الموصل	المجاري	قيد التنفيذ / تم التاكيد على اكمال اجراءات امر التغيير في 26/8/2021	41%	40	150	2019-10-22	406,700,000
9	إعادة بناء القاطر في حي النجار	الموصل	المجاري	منجز	100%	40	150	2019-10-22	
10	هدم و إعادة بناء جناح (6صف) طابقين + (4صف) + مجموعة صحية /مدرسة عبد الله بن مسعود / سنجار	سنجار	التربية	قيد التنفيذ	27%	72	210	2019-12-07	944,158,800
11	هدم و إعادة بناء جناح (6صف) طابقين / مدرسة القيروان / سنجار	سنجار	التربية	قيد التنفيذ	10%	72	210	2019-12-07	
12	هدم و إعادة بناء مدرسة ام الشبايط - 12 صف/سنجار	سنجار	التربية	قيد التنفيذ	29%	72	210	2019-12-07	
13	تجهيز جهاز تفتيت الحصى عدد (2)	الموصل	الصحة	منجز	100%	78	180	2019-12-08	2,400,000,000
14	تاهيل مبنى الادارة و الجدار المحيطي لمعمل تنقية البذور	الموصل	الزراعة	قيد التنفيذ	59%	94	210	2019-12-24	648,128,000
15	تجهيز و نصب معمل تنقية البذور	الموصل	الزراعة	قيد التنفيذ	12%	94	210	2019-12-24	
16	تأهيل سايلو الموصل - وادي حجر لخزن الحبوب	الموصل	التجارة	منجز	100%	100	270	2019-12-30	1,571,942,400
17	تأهيل مجمع تل عبطة لخزن الحبوب	الموصل	التجارة	منجز	100%	100	270	2019-12-30	
18	صيانة وتاهيل ساحة الموصل لخزن الحبوب	الموصل	التجارة	منجز	100%	100	270	2019-12-30	
19	إعادة تأهيل جمعية الحدباء لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة	الموصل	مباني حكومية	منجز	100%	104	180	2020-01-01	275,000,000
20	تجهيز و تنصيب و تشغيل جهاز قسطرة عدد 1	الموصل	الصحة	منجز	100%	201	180	2019-12-31	2,324,000,000
21	تجهيز ونصب اجهزة طبية	الموصل	الصحة	منجز	100%	240	90	2019-12-31	435,000,000
									11,660,655,100




هدم واعادة بناء شعبة الموارد المائية في الموصل





اعادة تاهيل جسر المفري (حنكة - زمار)



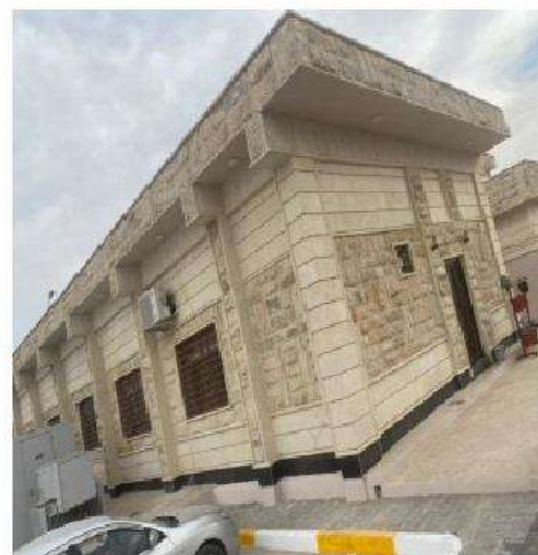

تأهيل محطة كهرباء باب البيض في الساحل الايمن

مشاريع محافظة الانبار

الانبار



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلية	كلفة العقد الأصلي
1	اكساء وتاهيل ارصفة في قضاء حديثة	حديثة	البلدية والبلديات	منجز	100%	16	200	2019-08-11	1,545,240,000
2	اعادة تاهيل طرق في عموم احياء وقرى البغدادي	هيت	البلدية والبلديات	منجز	100%	16	200	2019-08-11	
3	تاهيل شوارع حي الزيتون في منطقة 5 كيلو الرمادي	الرمادي	البلدية والبلديات	منجز	100%	21	360	2019-09-01	2,773,520,000
4	اعادة تاهيل طريق بين حي اليرموك وجسر التفاحة بطول 2900م	الفلوجة	البلدية والبلديات	منجز	100%	21	360	2019-09-01	
5	تاهيل طريق المدخل الشرقي للحي المدني (السي سي) من جهة حي العمال بطول اكم وعرض 25,5 متر	الحبانية	الطرق والجسور	منجز	100%	22	120	2019-08-22	1,289,200,000
6	تاهيل طريق أبو فليس الحولي المحاذي لقاعدة الحبانية بطول 3425 م وعرض 30 متر	الحبانية	الطرق والجسور	متوقف بسبب اعتراض قيادة قاعدة الحبانية وتم توجيه كتاب استبدال الى مقر الصندوق من ديوان المحافظة مديرية التخطيط والمتابعة ذي العدد 28999 في 16/12/2019		22	120	2019-08-22	
7	تاهيل وصيانة محطة الدفع (14p) التابعة الى مركز مجاري الفلوجة	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	24	210	2019-09-02	1,104,560,000
8	اعادة بناء هيئة استثمار الانبار	الرمادي	مباني حكومية	منجز	100%	36	360	2019-09-12	818,148,000
9	هدم واعادة بناء قطاع الرعاية الصحية الاولى في عنه	عنة	الصحة	منجز	100%	44	180	2019-10-14	443,448,000
10	هدم واعادة بناء مديرية شرطة الانبار	الرمادي	الداخلية	قيد التنفيذ	95%	46	730	2019-10-10	4,370,761,100
11	هدم واعادة انشاء محطة ماء الكرابلة /القائم	القائم	الماء والمجاري	منجز	100%	48	180	2019-10-13	789,244,000
12	اعادة اعمار جسور زنكورة الفوقاني كم (94+000) على طريق المرور السريع	الرمادي	الطرق والجسور	منجز	100%	57	200	2019-11-13	655,650,000
13	تاهيل محطة اسالة مياه الشرب ومحطة المعالجة الثقيلة في العامرية - مجمع الاخاء	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	62	240	2019-11-13	1,141,571,200
14	هدم واعادة بناء مدرسة التل الاخضر- الحميرة 12 صف	الرمادي	التربية	منجز	100%	69	180	2019-11-24	2,823,356,000
15	هدم و اعادة بناء مدرسة دار العلم الابتدائية 12 صف في الرمادي / المركز	الرمادي	التربية	منجز	100%	69	180	2019-11-24	
16	هدم و اعادة بناء مدرسة بغداد الابتدائية للبنين 12 صف	الرمادي	التربية	منجز	100%	69	180	2019-11-24	
17	هدم و اعادة بناء مدرسة الشقائق الابتدائية للبنات 12/ صف	الرمادي	التربية	منجز	100%	69	180	2019-11-24	
18	هدم واعادة بناء مدرسة الغر المحجلين الابتدائية المختلطة 12 صف	الكرمة	التربية	قيد التنفيذ	87%	70	180	2019-12-01	1,141,590,000
19	هدم واعادة بناء مدرسة الامين 12 صف- الفلوجة	الفلوجة	التربية	قيد التنفيذ	87%	70	180	2019-12-01	
20	هدم واعادة بناء ثانوية التهذيب للبنات 12 صف - هيت	هيت	التربية	منجز	100%	71	180	2019-11-30	2,271,912,000
21	هدم واعادة بناء مدرسة الحبوبى الابتدائية 12 صف في البغدادي	هيت	التربية	منجز	100%	71	180	2019-11-30	
22	هدم واعادة بناء مدرسة الاسكندرونة الابتدائية للبنين 12/ صف	هيت	التربية	منجز	100%	71	180	2019-11-30	
23	هدم و اعادة بناء مدرسة الاخاء الابتدائية المختلطة 12/ صف	هيت	التربية	منجز	100%	71	180	2019-11-30	
24	تاهيل مستشفى القائم العام	القائم	الصحة	منجز	100%	75	310	2019-12-22	1,994,886,800
25	تاهيل شارع نهر فليح من شارع المنجزات الى محطة الماء باتجاه النهر/ الفلوجة	الفلوجة	البلدية والبلديات	منجز	100%	77	360	2020-02-12	2,214,564,000
26	اعادة انشاء الشارع الخدمي في الخمسة كيلو في الرمادي	الرمادي	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	95%	79	180	2019-12-21	1,474,000,000
27	هدم واعادة بناء ثانوية الوطن للبنين 18 صف الكرمة	الكرمة	التربية	قيد التنفيذ	95%	80	300	2019-12-18	2,124,214,400
28	هدم واعادة بناء ثانوية الرشيد 18 صف	الخالدية	التربية	منجز	100%	80	300	2019-12-18	
29	تاهيل شوارع عدد 7 لمديرية بلدية الرطبة	الرطبة	البلدية والبلديات	منجز	100%	85	150	2019-12-23	599,928,800

30	تأهيل مغذي الصفرة ومغذي النخلة	القائم	الكهرباء	منجز	100%	86	150	2019-12-21	1,912,832,000
31	تأهيل مغذي جريجب من محطة القنيطرة	القائم	الكهرباء	منجز	100%	86	150	2019-12-21	
32	تأهيل مغذي الكرابلة من محطة سعدة	القائم	الكهرباء	منجز	100%	86	150	2019-12-21	
33	تأهيل الشبكة الكهربائية لقرى جريجب والفياضية والقنيطرة	القائم	الكهرباء	منجز	100%	86	150	2019-12-21	
34	اعادة اوصول التيار الكهربائي الى المجمع السكني التابع الى الشركة العامة للفوسفات	القائم	الكهرباء	منجز	100%	86	150	2019-12-21	
35	تأهيل مغذي سعده من محطة سعده	القائم	الكهرباء	منجز	100%	86	150	2019-12-21	
36	هدم واعادة بناء مدرسة سومر (الاحواز) الابتدائية / 12 صف	الرمادي	التربية	قيد التنفيذ / تم تغيير الاسم والموقع من سومر الى الاحواز بحسب كتاب الصندوق المرقم 1613 في 2020/6/30	92%	96	180	2019-12-24	2,385,056,000
37	هدم و اعادة بناء مدرسة التلاحم الابتدائية 12 صف	الرمادي	التربية	قيد التنفيذ	7776%	96	180	2019-12-24	
38	هدم و اعادة بناء مدرسة الوهج الابتدائية 12 صف في زنكورة	الرمادي	التربية	منجز	100%	96	180	2019-12-24	
39	هدم و اعادة بناء ثانوية ام سلمة 12 صف	الرمادي	التربية	منجز	100%	96	180	2019-12-24	
40	تأهيل بناية مديرية احصاء الانبار	الرمادي	مباني حكومية	منجز	100%	101	180	2019-12-26	524,432,000
41	اعادة بناء المجمع الحكومي في ناحية الرمانة	القائم	مباني حكومية	منجز	100%	102	200	2019-12-31	675,000,000
42	اعادة اعمار محطة تعبئة وقود ناحية الكرابلة/الانبار	القائم	مباني حكومية	منجز	100%	109	200	2020-01-02	439,555,000
43	هدم واعادة بناء ثانوية الامالي للبنين 18 صف - القائم	القائم	التربية	منجز	100%	112	300	2020-01-04	3,186,564,000
44	هدم واعادة بناء مدرسة الجماهير الابتدائية للبنين / 18 صف	القائم	التربية	منجز	100%	112	300	2020-01-04	
45	هدم واعادة بناء مدرسة المهدي الابتدائية للبنين/18 صف	القائم	التربية	منجز	100%	112	300	2020-01-04	
46	هدم و اعادة بناء ثانوية الناظم للبنين 18 صف		التربية	منجز	100%	118	300	2020-01-08	1,062,188,000
47	اعادة انشاء مديرية كهرباء الانبار مع مخزن	الرمادي	الكهرباء	منجز	100%	122	270	2020-01-09	1,189,108,800
48	تأهيل مغذي كهرباء المعسكر	هيت	الكهرباء	منجز	100%	123	150	2020-01-08	1,099,946,750
49	هدم واعادة بناء مدرسة الشعلة الابتدائية 12 صف - راوه	راوة	التربية	منجز	100%	125	180	2020-01-08	2,271,912,000
50	هدم واعادة بناء ثانوية الرحاب للبنات 12 صف - القائم	القائم	التربية	منجز	100%	125	180	2020-01-08	
51	هدم واعادة بناء مدرسة الفلاح الابتدائية للبنين / 12 صف	القائم	التربية	منجز	100%	125	180	2020-01-08	
52	هدم واعادة بناء مدرسة حلب الابتدائية للبنين/ 12 صف	القائم	التربية	منجز	100%	125	180	2020-01-08	
53	تأهيل سدة جوية باتجاه النسايف بطول 3كم من المحطة 11+000 الى المحطة 14+000 باعتبار (صفر+صفر) جسر النافورة	الرمادي	الطرق والجسور	منجز	100%	126	300	2020-01-08	2,398,284,000
54	هدم واعادة بناء قاطع مرور الرمادي	الرمادي	الداخلية	منجز	100%	129	210	2020-01-08	425,981,600
55	اعادة انشاء مركز صحي فرعي /العبيدي	القائم	الصحة	لم يباشر / وجود مخاطبات بين الصندوق ووزارة التخطيط حول تغيير الموقع		131	120		388,055,000
56	تأهيل الطريق الرابط بين جسر المخازن الى نهاية الجسر المؤدي الى منطقة البوعينة	الرمادي	الطرق والجسور	منجز	100%	133	120	2020-01-08	596,160,000
57	هدم و اعادة بناء مدرسة فاطمة البرناوي للبنات 18 صف في هيت/ كبيسة	هيت	التربية	منجز	100%	134	300	2020-01-08	2,124,376,000
58	هدم واعادة بناء اعدادية حليلة السعدية (ابن الاثير) للبنات /18 صف	الرمادي	التربية	منجز	100%	134	300	2020-01-08	
59	ترميم وتأهيل مبنى الدوائر الحكومية في عنه	عنه	مباني حكومية	منجز	100%	150	180	2020-01-08	536,652,000

60	تاهيل وتوسيع مجمع ماء النهضة الشرقية مع اضافة خط ناقل بطول 3500 متر	القائم	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	98%	151	200	2020-01-07	1,222,113,600
61	تاهيل وتوسيع مشروع الماء المركزي في القائم	القائم	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	98%	151	200	2020-01-07	
62	اعادة تاهيل مقطع من الطريق العام حديثة-عنه	عنة	الطرق والجسور	منجز	100%	153	120	2020-01-08	950,060,000
63	اعادة تاهيل قنطرة صندوقية ثلاثية على طريق حصي -جباب وقنطرة عبدة الحدارية على طريق الشارع العام /قضاء عنة	عنة	الطرق والجسور	منجز	100%	153	120	2020-01-08	
64	تاهيل مشروع ماء ال 5 كيلو في الرمادي	الرمادي	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	98%	162	300	2020-01-14	2,165,133,600
65	تاهيل الشوارع الشريانية في حي الضباط /قضاء الفلوجة	الفلوجة	البلدية والبلديات	منجز	100%	163	200	2020-01-09	4,477,492,000
66	تاهيل الشوارع الشريانية في حي الشرطة والجيفي/قضاء الفلوجة	الفلوجة	البلدية والبلديات	منجز	100%	163	200	2020-01-09	
67	تاهيل شارع المحيط الفاصل بين الحي العسكري وحي الشركة /قضاء الفلوجة	الفلوجة	البلدية والبلديات	منجز	100%	163	200	2020-01-09	
68	هدم واعادة انشاء القسم البلدي في ناحية الوفاء	الرمادي	البلدية والبلديات	منجز	100%	169	240	2020-01-12	745,647,200
69	هدم واعادة بناء مديرية ناحية الصقلاوية	الفلوجة	مباني حكومية	منجز	100%	169	240	2020-01-12	
70	اعادة تاهيل منتدى شباب هيت	هيت	الشباب والرياضة	منجز	100%	173	90	2020-01-14	566,500,000
71	هدم و اعادة بناء قسم تربية راوة	راوة	التربية	قيد التنفيذ	91%	174	220	2020-01-13	812,784,000
72	هدم واعادة انشاء مدرسة الصالح الامين (12) صف / الانبار	الكرمة	التربية	منجز	100%	175	180	2020-01-13	567,978,000
73	اعادة تاهيل كورنيش الورار من جهة التاميم الرابط بين جسر الحوز الى جسر القاسم	الرمادي	البلدية والبلديات	منجز	100%	176	240	2020-01-12	5,335,640,000
74	هدم و اعادة بناء بناية قائممقامية الرطبة	الرطبة	مباني حكومية	منجز	100%	182	270	2020-01-31	1,484,752,000
75	هدم واعادة بناء بناية الاقسام العظمى /كلية التربية في القائم	القائم	التعليم العالي	قيد التنفيذ	97%	187	360	2020-01-13	4,256,696,000
76	اعادة انشاء بناية الاقسام الداخلية للطلاب لكلية التربية في القائم	القائم	التعليم العالي	قيد التنفيذ	97%	187	360	2020-01-13	
77	صيانة وتاهيل محطات الدفع لمشروع ماء الصحراء الغربية - هيت B1,B2,B3,B4	هيت	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	70%	189	300	2020-01-13	1,382,400,000
78	هدم و اعادة بناء قسم تربية الفلوجة	الفلوجة	التربية	متوقف / تلكتو الشركة وتم توجيه كتاب انذار لها	8%	193	220	2020-01-13	812,784,000
79	تجهيز ونصب مجمع ماء السعيد_ سعة 100 م3/ساعة	الكرمة	الماء والمجاري	منجز	100%	198	120	2020-01-13	462,000,000
80	الغاء ميزل الحفرية بمد خط دفع لمحطة مجاري الاحتقالات والمخبرات / الرمادي	الرمادي	الماء والمجاري	منجز	100%	199	150	2020-01-13	613,200,000
81	تاهيل وتوسيع مجمع ماء سعدة مع اضافة وحدة مجمعة 200م3/ساعة مع خط ناقل بطول 1500 متر	القائم	الماء والمجاري	منجز	100%	200	200	2020-01-10	1,142,160,000
82	تاهيل وتوسيع مشروع ماء الشرب للمدينة السكنية في القائم / العبيدي	القائم	الماء والمجاري	منجز	100%	200	200	2020-01-10	
83	استبدال نواقل رئيسية لمغذي المدينة السكنية / العبيدي	القائم	الماء والمجاري	منجز	100%	200	200	2020-01-10	
84	هدم واعادة بناء بناية كهرباء هيت مع ورشة الصيانة	هيت	الكهرباء	منجز	100%	204	240	2020-01-13	459,746,784
85	اعادة تاهيل طريق محطة البزل الرئيسية في المضيق باتجاه نهر الفرات مع طريق داخلي	الخالدية	الطرق والجسور	منجز	100%	205	240	2020-01-13	2,093,401,200
86	صيانة وتاهيل جسر الخالدية الكونكريتي / قضاء الحبيانية	الحبيانية	الطرق والجسور	منجز	100%	212	270	2020-01-13	2,255,600,000
87	تاهيل كلية العلوم الانسلامية / جامعة الفلوجة	الفلوجة	التعليم العالي	منجز	100%	219	140	2020-01-14	588,930,000
88	تاهيل وصيانة محطة (p10الغاو (امطار)	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	229	220	2020-01-13	881,490,000
89	تاهيل بنائتي عمادة كلية التربية لعلوم الصرفة وعمادة كلية التربية للعلوم الانسانية	الرمادي	التعليم العالي	قيد التنفيذ	97%	230	270	2020-01-13	2,020,430,000
90	تاهيل عمادة كلية التربية الرياضية/بنائة المساعد العلمي	الرمادي	التعليم العالي	قيد التنفيذ	97%	230	270	2020-01-13	
91	اعادة انشاء مبنى المجلس المحلي / قضاء القائم	القائم	مباني حكومية	متوقف بسبب ملكية الأرض		132	180		703,530,800
92	تاهيل شارع الثرثار الحولي من تقاطع النافورة الى شارع المحيط / الفلوجة	الفلوجة	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	98%	243	300	2020-02-17	4,400,960,000
93	تاهيل الطريق الخدمي في الكرابلة - سعدة سايدين - المرحلة الثانية	القائم	البلدية والبلديات	منجز	100%	245	270	2020-06-22	3,974,340,000
94	اعادة انشاء بناية المجلس المحلي لقضاء هيت	هيت	مباني حكومية	مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط					
95	هدم واعادة انشاء مدرسة اغاثير للبنين 12 صف / الانبار		التربية	مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط					
96	تجهيز مواد لدعم وتاهيل الشبكات الكهربائية لفرع توزيع كهرباء مركز الانبار في اقصية (الرمادي الخالدية هيت الرطبة)	اقصية متعددة	الكهرباء	مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط					
97	تجهيز ونصب وحدة مجمعة سعة 100م3/س في قرية بني زيد في الكرمة / الانبار	الكرمة	الماء والمجاري	مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط					95,167,666,634

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الانجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
1	تاهيل الشبكة الكهربائية في جزيرة الخالدية	الخالدية	الكهرباء	منجز / تم استلام المشروع اوليا	100%	1	150	2019-08-01	1,649,372,000
2	فك اختناق مغذيات احياء العسكري والزراشة والحي القديم	الزراشية	الكهرباء	منجز / تم استلام المشروع اوليا	100%	1	150	2019-08-01	
3	تاهيل جزء من شبكة مغذي الزراشية	راوه	الكهرباء	منجز / تم استلام المشروع اوليا	100%	1	150	2019-08-01	
4	تاهيل جزء من مغذي راوه القديمة	راوه	الكهرباء	منجز / تم استلام المشروع اوليا	100%	1	150	2019-08-01	
5	تاهيل جزء من شبكة مغذي الحي العسكري	رمادي	الكهرباء	منجز / تم استلام المشروع اوليا	100%	1	150	2019-08-01	
6	تاهيل شبكات الضغط العالي والواطيء في مركز الكرمه	الكرمة	الكهرباء	منجز / تم استلام المشروع اوليا	100%	1	150	2019-08-01	
7	اعادة اعمار محطة كهرباء جنوب الفلوجة	الفلوجة	الكهرباء	منجز / تم استلام المشروع اوليا	100%	1	150	2019-08-01	
8	اعادة اعمار محطة الدفع (p4)لتصريف مياه الامطار في الفلوجة	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	3	120	2019-08-03	
9	تاهيل مجمع ماء رميلة القديم سعة 50 م3/ساعة	فلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	3	120	2019-08-03	2,474,805,800
10	تاهيل مجمع ماء البوعينة البونجرس 200م3/ساعة	رمادي	الماء والمجاري	منجز	100%	3	120	2019-08-03	
11	تاهيل مجمع ماء سعة 250 غالون في الخفاجية	حديثه	الماء والمجاري	منجز	100%	3	120	2019-08-03	
12	استبدال الاتابيب الخاصة بمجمع ماء الزنكورة التاسع	رمادي	الماء والمجاري	منجز	100%	3	120	2019-08-03	
13	تاهيل مجمع ماء الدواية سعة 200م3/ساعة	فلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	3	120	2019-08-03	
14	تاهيل مجمع ماء الزغاريت الصقلاوية	فلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	3	120	2019-08-03	
15	تاهيل شبكات الماء في قضاء الكرمه	الكرمة	الماء والمجاري	منجز	100%	3	120	2019-08-03	
16	تاهيل مجمع ماء الزاوية 200م3/ساعة	حديثه	الماء والمجاري	منجز	100%	3	120	2019-08-03	
17	صيانة مجمعات الماء في العامرية	العامرية	الماء والمجاري	منجز	100%	3	120	2019-08-03	
18	اعادة تاهيل مجمع ماء البوشلال 200م3/ساعة في هيت	هيت	الماء والمجاري	منجز	100%	3	120	2019-08-03	
19	اعادة تبليط شوارع في حي العروبة قضاء الكرمه	الكرمة	البلديات	منجز	100%	7	120	2019-08-04	849,935,000
20	مشروع اكساء مدخل ناحية النخيب من ثلاث محاور (كيلو 160 و كربلاء و الرطبة)	الرطبة	الطرق	منجز	100%	7	120	2019-08-04	

21	تاهيل الشارع من السوق القديم الى دائرة الكهرباء مع شوارع متفرقة - كبيسه	هيئة	البلديات	منجز	100%	7	120	2019-08-04	
22	اعادة انشاء شوارع في حي السلام في ناحية المحمدي	هيئة	البلديات	منجز	100%	7	120	2019-08-04	
23	اعادة انشاء شعبة الزراعة في الرمانة	القائم	الزراعة	منجز	100%	9	180	2019-08-05	1,093,879,000
24	اعادة انشاء مخازن كونكريتية عدد 3 في موقع سايلو الرمادي	الرمادي	التجارة	منجز	100%	9	180	2019-08-05	
25	هدم واعادة بناء شعبة زراعة الرطبة	الرطبة	الزراعة	منجز	100%	9	180	2019-08-05	
26	اعادة انشاء بناية الرقابة التجارية و المالية - فرع الانبار	رمادي	التجارة	منجز / بانتظار امر غيار	100%	9	180	2019-08-05	
27	تاهيل بناية شعبة زراعة راوه	راوه	الزراعة	منجز / بانتظار امر غيار	100%	9	180	2019-08-05	
28	انشاء شعبة الموارد المائية في راوه	راوه	الموارد المائية	منجز / بانتظار امر غيار	100%	14	210	2019-08-10	731,329,600
29	اعادة انشاء القناطر المتفجرة للمشاريع الاروانية	رمادي	الموارد المائية	منجز / بانتظار امر غيار	100%	14	210	2019-08-10	
30	هدم واعادة بناء شعبة الموارد المائية في القائم	القائم	الموارد المائية	منجز / بانتظار امر غيار	100%	14	210	2019-08-10	
31	هدم واعادة بناء مدرسة المكاسب الابتدائية للبنين	الرطبة	التربية	منجز	100%	59	180	2019-11-14	567,981,000
32	انشاء طريق قرية ز غيدان بطول 1800 م و عرض 9م	الصفلاوية	البلديات	منجز	100%	120	180	2020-01-08	311,191,000
33	اعادة انشاء ملحق لمديرية ناحية الحقلانية	الحقلانية	مباني حكومية	منجز	100%	120	180	2020-01-08	
34	هدم واعادة بناء مديرية بلدية القائم	القائم	البلديات	قيد التنفيذ	83%	121	180	2020-01-09	998,974,100
35	تاهيل الاقسام الداخلية في قضاء هيت	هيئة	التعليم العالي	قيد التنفيذ	15%	121	180	2020-01-09	
36	اعادة بناء الجناح الاداري المهدم مع تاهيل الاجزاء المتضررة في مدرسة المسار /هيت	هيئة	التربية	قيد التنفيذ	100%	121	180	2020-01-09	
37	تاهيل المجمع الحكومي لناحية العبيدي في القائم	القائم	البلديات	قيد التنفيذ	90%	121	180	2020-01-09	
38	هدم واعادة انشاء مدرسة الخليج العربي (12) صف / الانبار	الخالدية	التربية	قيد التنفيذ	68%	154	180	2020-01-08	567,978,000
39	اعادة بناء الجزء المتضرر للبناية مع القاعة الامامية في اعدادية هيت للبنات	هيئة	التربية	منجز	100%	185	90	2020-01-14	489,700,000
40	اعادة تاهيل بناية شبكة الاعلام العراقي	الرمادي	مباني حكومية	منجز	100%	186	90	2020-01-13	226,730,000
41	اعادة بناء الطابق الاول لدائرة الجنسية في قضاء هيت	هيئة	الداخلية	منجز /تنفيذ امانة	100%	الامر الاداري المرقم 1250	75	2019-01-02	136,485,000
42	تاهيل قاعة في منتدى شباب هيت	هيئة	الشباب والرياضة	منجز /تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امانة			72,880,000
	المجموع						136		10,171,240,500



تأهيل مستشفى القائم / الانبار





تأهيل عمادة كلية
التربية الرياضية /
جامعة الانبار





إعادة إنشاء مديرية كهرباء الانبار مع مخزن



مشاريع محافظة صلاح الدين



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / صلاح الدين

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
1	إعادة تاهيل طريق تكريت - بيجي بطول 45 كم	عموم المحافظة	الطرق والجسور	منجز	100%	35	26/8/2019	360	2019-09-07	3,289,200,000
2	هدم وإعادة بناء مركز شرطة المحطة في قضاء بلد	بلد	الداخلية	قيد التنفيذ	92%	39	2019-09-02	220	2019-09-16	1,085,670,400
3	هدم وإعادة بناء مركز شرطة الركة	سامراء	الداخلية	قيد التنفيذ	80%	39	2019-09-02	220	2019-09-16	
4	هدم وإعادة بناء مدرسة 12 صف ثانوية قتيبة المختلطة	بلد	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	78%	51	14/10/2019	210	2019-10-28	2,038,806,000
5	هدم وإعادة بناء مدرسة 12 صف التحدي الابتدائية	بلد	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	82%	51	14/10/2019	210	2019-10-28	
6	هدم وإعادة بناء مدرسة لبنان الابتدائية 12 صف	بلد	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	47%	51	14/10/2019	210	2019-10-28	
7	تاهيل وصيانة البنى التحتية لجامعة تكريت (كيوسكات) مع قابلوآت الضغط الواطى	تكريت	التربية والتعليم	قيد التنفيذ / لم يقدم برنامج تقدم عمل	50%	53	2019-10-17	150	2019-10-30	920,492,000
8	تاهيل وصيانة الصرف الصحي وشبكة تصريف مياه الامطار لجامعة تكريت	تكريت	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	50%	53	2019-10-17	150	2019-10-30	
9	هدم وإعادة بناء مركز صحي رئيس عزيز بلد	بيجي	الصحة	منجز	100%	54	17/10/2019	220	2019-10-30	2,698,634,400
10	هدم وإعادة بناء مركز صحي نموذجي بيجي	بيجي	الصحة	قيد التنفيذ	76%	54	17/10/2019	220	2019-10-30	
11	هدم وإعادة بناء مركز صحي نموذجي الحجاج	بيجي	الصحة	قيد التنفيذ	76%	54	17/10/2019	220	2019-10-30	
12	صيانة وتاهيل محطة تقوية الصينية سعة 500م3/ساعة	الصينية	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	83%	124	26/12/2019	120	2020-01-08	430,000,000
13	إعادة تاهيل قطار عدد 7 على طريق بيجي - الشرقاط	الشرقاط	الطرق والجسور	منجز	100%	67	2019-11-14	150	2019-11-27	1,285,004,000
14	إعادة تاهيل جسور صغيرة عدد 3 (جسري كبان والسيد غريب وجسر حاوي البور) في محافظة صلاح الدين	تكريت	الطرق والجسور	منجز	100%	67	2019-11-14	150	27/11/2019	
15	هدم وإعادة بناء دار القضاء في الدور	الدور	مباني حكومية	قيد التنفيذ	21%	88	12/11/2019	220	22/12/2019	899,918,400
16	هدم وإعادة بناء دار القضاء في الضلوعية	الضلوعية	مباني حكومية	قيد التنفيذ	100%	95	12/11/2019	220	24/12/2019	1,799,836,800
17	هدم وإعادة بناء دار القضاء في يثرب	يثرب	مباني حكومية	منجز	100%	95	12/11/2019	220	24/12/2019	
18	هدم وإعادة بناء مدرسة 12 صف سليمان بيك الابتدائية	الطوز	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	91%	156	26/12/2019	180	2020-01-14	2,675,000,000
19	هدم وإعادة بناء مدرسة 12 صف بيجي الابتدائية للبنات	بيجي	التربية والتعليم	منجز	100%	156	26/12/2019	180	2020-01-14	
20	هدم وإعادة بناء مدرسة 12 صف الخلفاء الابتدائية	سامراء	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	88%	156	26/12/2019	180	2020-01-14	
21	هدم وإعادة بناء مدرسة الفياض للبنين 12 صف	يثرب	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	80%	156	26/12/2019	180	2020-01-14	
22	هدم وإعادة بناء مدرسة الوادي الخصب 6 صف	الشرقاط	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	57%	192	31/12/2019	170	2020-01-14	286,529,600
23	تبليط الشوارع المجاورة لسابلو طوز في منطقة 77/قضاء الطوز	الطوز	البلدية والبلديات	منجز	100%	128	26/12/2019	120	2020-01-08	1,755,200,000
24	عمال الارصف الجانبية واكساء الشوارع في حي الطيار	الطوز	البلدية والبلديات	منجز	100%	128	26/12/2019	120	2020-01-08	
25	إعادة تأهيل طريق كفري - سليمان بيك بطول 14.8 كم / صلاح الدين		الطرق والجسور	قيد التنفيذ	60%	135	26/12/2019	240	2020-01-08	2,254,560,000
26	تبليط طريق بيجي - مفرق الشرقاط المرحلة الاولى	بيجي	الطرق والجسور	منجز	100%	158	26/12/2019	300	2020-01-08	2,673,348,000
27	صيانة واكساء طريق سامراء بين جسر الثرثار وجسر العباسية / صلاح الدين	سامراء	البلدية والبلديات	منجز	100%	224	2019-12-31	300	2020-01-13	4,004,200,000
28	إعادة تأهيل الشوارع المتضررة من جراء العمليات الارهابية في مركز آمرلي / تركمانية	امرلي	البلدية والبلديات	منجز	100%	97	2019-12-15	200 +55	2019-12-29	3,746,771,002
29	صب طرق داخلية في قرى آمرلي / تركمانية	امرلي	البلدية والبلديات	منجز	100%	97	2019-12-15	201 +55	2019-12-29	
30	إعادة تاهيل الشوارع الداخلية المتضررة في آمرلي / تركمانية	امرلي	البلدية والبلديات	منجز	100%	97	2019-12-15	202 +55	2019-12-29	
31	صب الشوارع والطرق الضيقة بالكونكريت المسلح ب(B.R.C.في قضاء الطوز / تركمانية	الطوز	البلدية والبلديات	منجز	100%	97	2019-12-15	203 +55	2019-12-29	
32	صب شوارع وطرق بالكونكريت المسلح داخل ناحية ينكجة / قضاء الدوز / تركمانية	الطوز	البلدية والبلديات	منجز	100%	210	2019-12-31	90	2020-01-30	192,000,000
										32,035,170,602

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / صلاح الدين

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	مشروع معالجة و اكساء طريق (المدخل الشمالي) بطول 1700 م لمركز قضاء امرلي	امرلي	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	%85	20	2019-08-18	150	2019-09-01	905,440,000
2	اعادة تأهيل الشوارع الداخلية المتضررة من جراء العمليات الارهابية في قضاء امرلي	امرلي	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	%85	20	2019-08-18	150	2019-09-01	
3	هدم واعادة بناء بناية ناحية المعتصم	ناحية المعتصم	مباني حكومية	منجز	%100	10	2019-07-23	180	2019-08-05	782,609,500
4	تأهيل و صيانة منتدى شباب و رياضة بلد	بلد	الشباب والرياضة	منجز	%100	10	2019-07-23	180	2019-08-05	
5	هدم و اعادة بناء بناية ناحية مكحول	مكحول	مباني حكومية	منجز	%100	34	2019-08-26	220	2019-09-07	1,989,736,200
6	هدم و اعادة بناء بناية ناحية الصينية	الصينية	مباني حكومية	منجز	%100	34	2019-08-26	220	2019-09-07	
7	هدم و اعادة بناء مديرية بلدية الصينية	الصينية	البلدية والبلديات	منجز	%100	34	2019-08-26	220	2019-09-07	
8	هدم واعادة بناء بناية ناحية سليمان بيك	الطوز	مباني حكومية	منجز	%100	34	2019-08-26	220	2019-09-07	
9	اعادة تأهيل طريق الشهيدة امية الجبارة	العلم	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	%86	41	2019-09-03	120	2019-09-16	606,960,000
10	هدم و اعادة بناء بناية مركز ماء يثرب	يثرب	الماء والمجاري	منجز	%100	127	26/12/2019	170	2020-01-08	705,174,400
11	هدم واعادة بناء بناية مركز ماء بيجي	بيجي	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	%80	127	26/12/2019	170	2020-01-08	
										4,989,920,100



مشروع هدم وإعادة بناء دار القضاء في يثرب / محافظة صلاح الدين



هدم وإعادة بناء مدرسة بيجي
الابتدائية للبنات 12 صف /
محافظة صلاح الدين





الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / كركوك

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	صيانة واكساء وتبليط الشوارع الداخلية في ناحية الرياض	الرياض	البلديات	منجز	%100	13	2019-07-25	100	2019-08-18	333,646,000
2	هدم واعادة بناء مدرسة اشبيلية 12 صف - مركز الحويجة	الحويجة	التربية	قيد التنفيذ	%85	15	2019-07-30	270	2019-08-22	2,369,721,600
3	هدم واعادة بناء مدرسة الربيع 12 صف- دافوق -قرية الصمود	دافوق	التربية	منجز	%100	15	2019-07-30	270	2019-08-22	
4	هدم واعادة بناء مدرسة كواز عرب الابتدائية 6 صف - ناحية الملتقى	الملتقى	التربية	منجز	%100	15	2019-07-30	270	2019-08-22	
5	هدم واعادة بناء مدرسة زمزم الابتدائية 6 صف - دافوق -طويلعة	دافوق	التربية	منجز	%100	15	2019-07-30	270	2019-08-22	
6	هدم واعادة بناء مدرسة تل الجول 6 صف - تازة	تازة	التربية	منجز	%100	15	2019-07-30	270	2019-08-22	
7	هدم واعادة بناء مدرسة الخندق 6 صف - الملتقى	الملتقى	التربية	منجز	%100	15	2019-07-30	270	2019-08-22	
8	هدم واعادة بناء مدرسة الزيتون الابتدائية 6 صف - الدبس	الدبس	التربية	قيد التنفيذ	%95	15	2019-07-30	270	2019-08-22	
9	هدم واعادة بناء مدرسة المصطافية الابتدائية المختلطة 6 صف - الحويجة - المصطافية	الحويجة	التربية	قيد التنفيذ	%13	15	2019-07-30	270	2019-08-22	
10	هدم واعادة بناء مدرسة اسماعيل اوة الابتدائية المختلطة 6 صف - الدبس- اسماعيل اوة	الدبس	التربية	منجز	%100	15	2019-07-30	270	2019-08-22	
11	هدم واعادة بناء مدرسة كواز كرد الابتدائية المختلطة 6 صف - الملتقى	الملتقى	التربية	قيد التنفيذ	%15	15	2019-07-30	270	2019-08-22	
12	تاهيل مجاري حي حطين في قضاء الحويجة	الحويجة	المجاري	منجز	%100	27	20/8/2019	330	2019-08-25	3,339,335,000
13	تاهيل مجاري حي النصر في قضاء الحويجة	الحويجة	المجاري	منجز	%100	27	20/8/2019	330	2019-08-25	
14	تاهيل مجاري حي النداء في قضاء الحويجة	الحويجة	المجاري	منجز	%100	27	20/8/2019	330	2019-08-25	
15	تاهيل شوارع حي النصر في قضاء الحويجة	الحويجة	البلديات	منجز	%100	27	20/8/2019	330	2019-08-25	
16	تاهيل شوارع حي حطين في قضاء الحويجة	الحويجة	البلديات	منجز	%100	27	20/8/2019	330	2019-08-25	
17	تاهيل شوارع حي النداء في قضاء الحويجة	الحويجة	البلديات	منجز	%100	27	20/8/2019	330	2019-08-25	
18	تاهيل شوارع القطاع الثالث في قضاء الحويجة	الحويجة	البلديات	منجز	%100	31	21/8/2019	220	2019-09-05	1,998,406,800
19	تاهيل السوق الصغير وجزء من حي اليرموك	الحويجة	البلديات	منجز	%100	31	21/8/2019	220	2019-09-05	
20	هدم واعادة بناء ورشة مركزية لبلدية الحويجة	الحويجة	البلديات	قيد التنفيذ	%86	31	21/8/2019	220	2019-09-05	
21	تاهيل مجاري القطاع الثالث في قضاء الحويجة	الحويجة	المجاري	منجز	%100	31	21/8/2019	220	2019-09-05	

22	صب الشوارع الداخلية بالكونكريت مع المجاري واسالة الماء قرب جامع الثقلين في مركز ناحية تازة / تركمانية	تازة	البلديات	منجز	%100	63		200	2019-12-24	1,458,892,001
23	تبليط الشوارع الداخلية في مناطق متفرقة في قرية البشير في ناحية تازة / تركمانية	تازة	البلديات	منجز	%100	63		200	2019-12-24	
24	تبليط الشوارع الداخلية خلف مركز الشباب مع الفروع قرب حسينية علي الاكبر في ناحية تازة / تركمانية	تازة	البلديات	منجز	%100	63		200	2019-12-24	
25	تجهيز محولات مع ملحقات و مواد تاهيل في قضاء الحويجة	الحويجة	الكهرباء	منجز	%100	74	24-11-2019	45		289,100,000
26	اعادة تاهيل الطريق الرابط بين قضاء الحويجة ومفرق الصفرة	الحويجة	الطرق والجسور	منجز	%100	106	2019-12-19	200	2019-12-31	3,250,000,000
27	تاهيل وصيانة الطرق الخارجية الرابطة بين الاقضية والمدن التابعة للمحافظة		الطرق والجسور	منجز	%100	106	2019-12-19	200	2019-12-31	
28	هدم واعادة بناء شعبة احصاء الحويجة	الحويجة	مباني حكومية	قيد التنفيذ	%86	110	19-12-2019	180	2020-02-18	406,845,600
29	تاهيل مدخل المنزل والاحياء المجاورة	الحويجة	البلديات	منجز	%100	114	25-12-2019	180	2020-01-28	2,807,000,000
30	تاهيل مشروع مجاري مدخل المنزل والاحياء المجاورة	الحويجة	البلديات	منجز	%100	114	25-12-2019	180	2020-01-28	
31	صيانة جسر زغيتون على طريق كركوك - تكريت		الطرق والجسور	منجز	%100	116	26-12-2019	360	2020-01-05	1,269,760,000
32	تاهيل جسر التون كوبري	كركوك	الطرق والجسور	منجز	%100	137	2019-12-26	240	2020-01-05	692,200,000
33	تجهيز مضخات ومعدات لمشاريع الماء للمناطق المحررة في كركوك	الحويجة	الماء	منجز	%100	143	26-12-2019	60	2020-01-09	462,400,000
34	صيانة الطريق الرابط بين الشلالات وقرى النكرات	الحويجة	الطرق والجسور	منجز	%100	157	26-12-2019	180	2020-01-08	2,400,000,000
35	اعادة تاهيل الطريق الرابط بين تل علي قرية مصطفى العباسي والقرية الغازية بطول 10 كم	الحويجة	الطرق والجسور	منجز	%100	157	26-12-2019	180	2020-01-08	
36	بناء دائرة ومركز جباية ماء قضاء الحويجة مع تاهيل المخزن	الحويجة	الماء والمجاري	منجز	%100	166	26-12-2019	210	2020-01-28	780,884,000
37	تاهيل شبكات كهرباء في قرى متفرقة ومغذيات 11كف - السلام وباجوان مع تنفيذ مغذي جديد من محطة الطابوق في ناحية الملتقى	الحويجة	الكهرباء	منجز	%100	188	2019-12-31	120	2020-01-21	886,635,040
38	هدم واعادة بناء مخازن عدد 9 في قضاء الحويجة مع بناية الشعبة الزراعية والقاعة الارشادية	الحويجة	الزراعة	منجز	%100	244	2019-12-31	220	2020-02-10	2,131,577,600
39	اعادة تاهيل منشأة محطة بستانة الحويجة	الحويجة	الزراعة	منجز	%100	244	2019-12-31	220	2020-02-10	
										24,876,403,641

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / كركوك										
ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
1	رفع الصبات الكونكريتية الجاهزة و المخلفات الحربية على كتف القناة الرئيسية ري كركوك و نقلها الى مطار كركوك	الحويجة	الموارد المائية	منجز	%100	4	2019-07-21	180	2019-08-05	1,910,400,000
2	صيانة واكساء طريق الحويجة - العباسي	الحويجة	الطرق والجسور	منجز	%100	4	2019-07-21	180	2019-08-05	
3	اكساء شوارع قرى (ابو الجيس - الرشيدية - النعيمية)	الحويجة	الطرق والجسور	منجز	%100	4	2019-07-21	180	2019-08-05	
4	صيانة طريق كركوك - تكريت	الحويجة	الطرق والجسور	منجز	%100	4	2019-07-21	180	2019-08-05	
5	هدم واعادة بناء مركز شرطة الماحوز - الحويجة	الحويجة	الداخلية	منجز	%100	8	23/7/2019	150	2019-09-02	461,959,000
6	هدم واعادة بناء مركز شرطة الشعب	الحويجة	الداخلية	منجز	%100	8	23/7/2019	150	2019-09-02	
7	هدم واعادة بناء قسم مكافحة الاجرام	الحويجة	الداخلية	منجز	%100	8	23/7/2019	13	2019-09-02	
8	تاهيل شارع القراغول في قضاء الحويجة	الحويجة	الطرق والجسور	منجز	%100	تنفيذ امانة		45	2019-12-22	67,490,000
9	تجهيز مواد احتياطية لمحطات الضخ الكبرى في محافظة كركوك	كركوك	الموارد المائية	منجز / معدات استيرادية	%100	215	2019-12-31	180	2020-01-28	370,000,000
										2,809,849,000



تأهيل جسر التون کوپري / کرکوک

تبليط الشوارع الداخلية في
مناطق متفرقة في قرية البشير
في ناحية تازة / كركوك



إعادة اعمار وصيانة جسر زغيتون على طريق كركوك - تكريت



مشاريع محافظة ديالى

Diyala Governorate Projects



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الانجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	صيانة واكساء وتبليط طرق في قرى الخالص (منصورية الشط بطول 5كم , الجيزاني الامام بطول 1,5كم , السندية بطول 1,4كم , النوبالي بطول 1,5كم)	الخالص	الطرق والجسور	منجز	100%	2	210	2019-08-04	881,920,000
2	تبليط شوارع في قرية سنسل (عدنان اللهيبي) وتبليط افرع الحسابية والحي العسكري وتبليط قرى الوسط وحمبس وجرخي اسيدو وصيانة طريق الوجيهية	المقدادية	الطرق والجسور	منجز	100%	32	180	2019-09-02	1,792,062,000
3	اكساء شوارع في ناحية ابي صيدا في قضاء المقدادية	المقدادية	البلدية والبلديات	منجز	100%	33	240	2019-10-02	1,789,146,400
4	اعادة تاهيل تبليط شوارع في حي المعلمين في قضاء المقدادية	المقدادية	البلدية والبلديات	منجز	100%	33	240	2019-10-02	
5	تاهيل شوارع في قضاء المقدادية (حي التاميم - حي اشور - الحي العصري - حي التحرير)	المقدادية	البلدية والبلديات	منجز	100%	33	240	2019-10-02	
6	صيانة واكساء طريق اشتوكان وعرجان وتبليط طرق البكالي وسيف سعد في ناحية جبارة وقره تبه	خاتقين	الطرق والجسور	منجز	100%	38	210	2019-09-15	1,010,560,000
7	تبليط طرق في ناحية جديدة الشط والقرى التابعة لها وناحية بني سعد والقرى التابعة لها وتبليط طرق في قضاء الخالص وقرها وقضاء بعقوبة وقرها	الخالص	الطرق والجسور	منجز	100%	47	210	2019-10-09	1,511,600,000
8	تجهيز مواد لتاهيل وتحسين وفك اختناق الشبكة الكهربائية لناحية ابي صيدا وقرها	المقدادية	الكهرباء	منجز	100%	49	90	2019-10-13	1,709,140,000
9	تجهيز مواد لتاهيل وتحسين وفك اختناق الشبكة الكهربائية في مناطق متفرقة في المقدادية	المقدادية	الكهرباء	منجز	100%	49	90	2019-10-13	
10	تاهيل خط جهد 33 كي في وتحويله الى خط دبل سركت باستخدام اعمدة 14 م من محطة الغربية الى محطة جديدة الشط بطول 22 كم	الخالص	الكهرباء	متوقف / تم المباشرة بالمشروع 23/6/2020 بعد حل المشاكل العالقة بين الطرق والجسور و مديرية الكهرباء وفقرة الاعدة لم تحل لحد هذا التاريخ وتم توجيه كتاب حث 1 للشركة بتاريخ 29/9/2020 و ينتظر كتاب الصناعات الفولانية بخصوص اسعار الاعدة 17/11/2020	0%	50	180	2020-06-23	1,184,010,000
11	اعادة تاهيل الجزيرة الوسطية طريق بغداد - كركوك في ناحية سد العظيم وتبليط شوارع في الجهة الشرقية والغربية للناحية	الخالص	البلدية والبلديات	منجز	100%	52	120	2020-02-05	771,600,800
12	صيانة وتاهيل طرق في محافظة ديالى (رعد الفرج رطامي , بني ويس , زركوش عسكارة)	المقدادية	الطرق والجسور	منجز / قيد الاستلام	100%	56	180	2019-11-07	1,425,158,000
13	اعادة تاهيل شارع سايدين مع سايدين خدمي لمدخل قره تبة مع اكساء شوارع متفرقة لاحياء(الصدر - الشرطة - الشهداء - المشروع)	خاتقين	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ/ تلتك الشركة وتم توجيه كتاب حث عدد2/ وتوجيه اذار بتاريخ 29/9/2020	84%	61	240	2019-11-14	1,947,480,000
14	اعادة تاهيل الشارع امام المجلس المحلي والشوارع المحيطة به مع اكمال كافة المتطلبات الخاصة به	خاتقين	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ/ تلتك الشركة وتم توجيه كتاب حث عدد2/ وتوجيه اذار بتاريخ 29/9/2021	84%	61	240	2019-11-14	
15	اعادة تاهيل شوارع في حي (الزهور والزهرء- المصطفى -الرسول والنور)قضاء بعقوبة بلدروز	بعقوبة	البلدية والبلديات	منجز	100%	64	180	2020-01-16	1,266,747,000
16	اعادة تاهيل شوارع (الافرازاات -شوارع خلف محطة الغازفي الحي العسكري -شوارع حي المعلمين)	المقدادية	البلدية والبلديات	شوارع حي المعلمين منجزة بتاريخ 20/2/2020 والافرازاات والحي العسكري	100%	73	100	2019-12-16	957,746,000
17	هدم واعادة بناء مركز شرطة جلولاء	السعدية	الداخلية	منجز	100%	83	360	2020-01-19	1,519,200,800
18	هدم واعادة بناء مركز شرطة المنصورية	الخالص	الداخلية	منجز	100%	83	360	2020-01-19	
19	تجهيز مواد لتاهيل وتشبيد خط 33كف دبل سركت 33كف دبل سركت اعمدة 14م من محطة بلدروز 33/11كف الى محطة مندلي 11/33ك ك بطول 45 كم	خاتقين	الكهرباء	منجز	100%	87	100	2020-01-26	1,599,006,400
20	تاهيل مستشفى بعقوبة التعليمي	بعقوبة	الصحة	منجز	100%	91	180	2020-01-08	2,851,339,000
21	هدم واعادة بناء مدرسة الحليمة الابتدائية 12 صف	السعدية	التربية	منجز	100%	92	180	2019-12-26	576,050,000
22	هدم واعادة بناء مدرسة الزهراوي 12 صف	خاتقين	التربية	منجز	100%	99	210	2020-02-03	1,620,712,160
23	هدم واعادة بناء مدرسة الفراهدي 12 صف	خاتقين	التربية	منجز	100%	99	210	2020-02-03	
24	تاهيل مستشفى البنول التعليمي للنسائية والاطفال	بعقوبة	الصحة	منجز	100%	107	210	2020-02-03	4,125,000,000
25	صب الازقة وتبليط الشارع الحولي في القصبة القديمة قره تبه / تركمانية	قره تبة	البلدية والبلديات	منجز / قيد الاستلام	100%	111	120	2020-01-08	466,640,000
26	اعادة تاهيل وصب الازقة القديمة بالكونكريت في محلة العروبة - جلولاء / تركمانية	جلولاء	البلدية والبلديات	منجز / قيد الاستلام	100%	111	120	2020-01-08	
27	تاهيل وتطوير طريق بعقوبة من تقاطع القدس الى مجسر الغالبية لممرى الذهب والاياب	بعقوبة	الطرق والجسور	منجز	100%	140	210	2020-01-09	2,790,800,000
28	تاهيل طريق الزركاتية سفيط , العودة (الدرايش), المرحلة الثانية 5كم / قضاء الخالص	الخالص	البلدية والبلديات	منجز / قيد الاستلام	100%	141	100	2020-01-09	728,000,000
29	تاهيل طرق الداينية	الخالص	الطرق والجسور	منجز / قيد الاستلام	100%	141	100	2020-01-09	

30	صيانة طريق سليمان بيك - كفري /مقطع محافظة ديالى	خاتقين	الطرق والجسور	منجز / قيد الاستلام	100%	145	200	2020-01-06	1,235,060,000
31	تاهيل وتبليط شوارع في بلدروز	بلدروز	الطرق والجسور	منجز	100%	148	180	2020-01-29	613,560,000
32	اعادة تاهيل الشارع الرئيسي لحى الضباط في جلولا	خاتقين	الطرق والجسور	منجز / قيد الاستلام	100%	149	180	2020-01-09	2,410,955,400
33	اعادة تاهيل الشوارع في حي السلام الثاني في جلولا	خاتقين	الطرق والجسور	منجز / قيد الاستلام	100%	149	180	2020-01-09	
34	اعادة تاهيل الشوارع الاربعة خلف مركز الشباب في جلولا	خاتقين	الطرق والجسور	منجز / قيد الاستلام	100%	149	180	2020-01-09	
35	تاهيل طريق التحويلة من المحطة (صفر+صفر) تقاطع سيطرة ابو نخل المحطة (700+3)	الخالص	الطرق والجسور	قيد التنفيذ / قيد اصدار امر غيار	100%	152	200	2020-01-08	1,656,448,000
36	تاهيل شوارع قرية شيروين/ قضاء الخالص	الخالص	الطرق والجسور	قيد التنفيذ / قيد اصدار امر غيار	100%	152	200	2020-01-08	
37	تاهيل طرق سراجق العزبان والمحاذي لنهر الخالص والحي العسكري/ المنصورية	الخالص	الطرق والجسور	قيد التنفيذ / قيد اصدار امر غيار	100%	152	200	2020-01-08	
38	هدم واعادة بناء مدرسة التجنيد(12 صف)في ناحية جلولا.	جلولا	التربية	قيد التنفيذ	100%	155	210	2020-02-18	1,767,181,600
39	هدم واعادة بناء مدرسة هاشم بن عتبة في قضاء خاتقين	خاتقين	التربية	قيد التنفيذ	100%	155	210	2020-02-18	
40	هدم واعادة مدرسة العلوم6 صف	جلولا	التربية	منجز	100%	155	210	2020-02-18	
41	هدم واعادة مدرسة الفرات6 صف	جلولا	التربية	منجز	100%	155	210	2020-02-18	
42	اعادة تاهيل انارة الشوارع في مدينة جلولا / ديالى / تركمانية	جلولا	الكهرباء	منجز	100%	159	90	2020-01-26	300,300,000
43	هدم واعادة بناء قسم الاعداد والتدريب للتربية	بعقوبة	التربية	قيد التنفيذ	83%	170	300	2020-02-15	969,442,400
44	تاهيل مشروع ماء خاتقين	خاتقين	الماء والمجاري	منجز	100%	172	120	2020-01-14	1,171,138,000
45	تاهيل مشروع ماء المنصورية الموحد	الخالص	الماء والمجاري	منجز	100%	172	120	2020-01-14	
46	الخط الناقل قطره (225) ملم لمنطقة جلوة واعفا وخليفة مع مضخة الرفع		الماء والمجاري	قيد التنفيذ	100%	172	120	2020-01-14	
47	تاهيل الطريق الريفي لقرية خان الغرفة بطول 7.5 كم ولقرية الشيخ شنيف بطول 1.5 كم / ناحية العظيم	العظيم	البلدية والبلديات	منجز	100%	183	150	2020-01-14	708,240,000
48	تاهيل محطة ضخ السعدية التابعة لمشروع سد حمزين (يوجد فرق بين مبلغ العقد والكشف التخميني) / تركمانية	السعدية	الماء والمجاري	منجز / قيد الاستلام	100%	195	90	2020-02-09	766,000,000
49	تاهيل بناية مديرية الاحوال المدنية و الجوازات و الإقامة	بعقوبة	الداخلية	منجز / قيد الاستلام	100%	197	180	2020-01-14	449,940,000
50	تاهيل مركز صحي الشهيد حسين الشاجي وتحويله من مركز صحي فرعي الى مركز صحي رئيسي	المقدادية	الصحة	قيد التنفيذ	100%	206	180	2020-01-27	429,936,000
51	مشروع ماء خان القرعة/العظيم	العظيم	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	100%	207	180	2020-02-11	900,000,000
52	تجهيز محولات واسلاك واعدة لقرى ناحية بني سعد وتاهيل وتغيير مسار مغذي القرى 11 كف في ناحية كتعان	السعدية	الكهرباء	منجز / قيد الاستلام	100%	214	180	2020-02-02	981,985,000
53	تاهيل طريق الدوربين في ناحية العبارة /قضاء بعقوبة	بعقوبة	الطرق والجسور	منجز	100%	220	150	2020-02-03	827,048,000
54	تاهيل طرق في بهرز(خميس - علي الحمود)	بعقوبة	الطرق والجسور	منجز	100%	220	150	2020-02-03	
55	تاهيل طريق منصورية الجبل والقتطرة الصندوقية في قرية نوفل وتبليط قرية المنصورية	الخالص	الطرق والجسور	منجز / قيد الاستلام	100%	231	180	2020-01-13	1,500,000,000
56	تبليط طريق قرية بلاط الكبير وبلاط الصغير في ناحية قره تبة / تركمانية	السعدية	الطرق والجسور	منجز / قيد الاستلام	100%	231	180	2020-01-13	
57	هدم واعادة ثانوية السهول 12 صف	العظيم	التربية	منجز / قيد الاستلام	100%	232	210	2020-02-24	888,000,000
58	اعادة تاهيل المدخل الشمالي لمدينة جلولا (مرحلة اولى)	خاتقين	الطرق والجسور	مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط					
59	تبليط طرق متفرقة في قره تبة -جبارة / ديالى	قره تبة	البلدية والبلديات	مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط					
60	اعمار مزار السيد ابراهيم السمين في ناحية قره تبة / ديالى	قره تبة	البلدية والبلديات	مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط					

61	تبليط طرق في ناحية السعدية/ شوارع ربعة العساكرة الخضراء بني ويس	السعدية	الطرق والجسور	الإضافي الأول /منجز	100%	231	180	2020-12-27	
62	توسيع مجمع ماء اليرموك من 600 م/3س الى 800 م/3مع تبديل الخط الناقل للعمارات السكنية	الكاطون	الماء والمجاري	الإضافي الأول /منجز	100%	196	160	2020-12-30	921,000,000
63	تأهيل شبكة كهرباء قرية ربعة / السعدية	السعدية	الكهرباء	منجز	100%	214			
64	تأهيل مغذيات ال11كي في في المارة من مناطق الكاطون	الكاطون	الكهرباء	الإضافي الأول / فسخ عقد		236	160		563,213,000
65	اىصال التيار الكهربائي لمشروع ماء الهارجة		الكهرباء	الإضافي الأول / فسخ عقد		236	160		
66	تأهيل جزء من الشارع الثلاثيني بطول 1400 م خلف القنطرة مع اكساء بعض الشوارع الفرعية	الكاطون	البلدية والبلديات	الإضافي الأول / قيد التنفيذ	59%	241	180		3,135,626,560
67	اعادة تأهيل شارع مستشفى الرحمة للجزء المتبقي من السايذ الثاني وبطول 1200 م.ط مع المقتربات	الكاطون	البلدية والبلديات	الإضافي الأول / قيد التنفيذ	59%	241	180		
68	اعادة تأهيل شارع الصحفيين والشوارع الفرعية وبطول 10000 م. ط	الكاطون	البلدية والبلديات	الإضافي الأول / قيد التنفيذ	59%	241	180		
69	اعادة تأهيل السايذ الثاني لشارع الرازي من مدخل السيطرة وصولا الى امتداد شارع الحسينية وبطول 4000 م.ط	الكاطون	البلدية والبلديات	الإضافي الأول / قيد التنفيذ	59%	241	180		
70	تأهيل شبكات مجاري مياه الامطار	الكاطون	الماء والمجاري	الإضافي الأول / قيد التنفيذ	59%	241	180		
	المجموع								54,718,992,520

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / ديالى										
ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	ايصال الماء الصافي لقرية جبارة	ناحية بهرز	الماء والمجاري	منجز	%100	6	2019-07-22	120	2019-08-04	712,233,600
2	تجهيز ونصب محطة تحليلية سعة 3م50 ساعة في قرية الشيخ طامي / ناحية بهرز	ناحية بهرز	الماء والمجاري	منجز	%100	6	2019-07-22	120	2019-08-04	
3	تأهيل مشروع ماء الحويش - جديدة الشط	جديدة الشط	الماء والمجاري	منجز	%100	11	23/7/2019	200	2019-08-06	1,315,643,110
4	تأهيل وصيانة مجمع ماء عتبة بطاقة نصف مليون غالون - بلدروز	بلدروز	الماء والمجاري	منجز	%100	11	23/7/2019	200	2019-08-06	
5	تأهيل مشروع ماء ابي صيدا	ابي صيدا	الماء والمجاري	منجز	%100	11	23/7/2019	200	2019-08-06	
6	صيانة و تأهيل 4 كم من طريق السندية الرابط مع محافظة صلاح الدين	الخالص	طرق وجسور	منجز	%100	18	2019-08-08	180	2019-08-21	1,153,920,000
7	تجهيز اعمدة كهربائية مع الملحقات لقرى شمال المقدادية	المقدادية	الكهرباء	منجز	%100	58	2019-10-31	60	2019-10-31	510,000,000
8	تجهيز محولات جهد 0,4/11 كف سعة 250 KVI عدد 40 لتأهيل شبكة كهرباء احياء المفرق و حي المعلمين و الكاطون	بعقوبة - المقدادية	الكهرباء	منجز	%100	58	2019-10-31	60	2019-10-31	
9	اعادة اعمار و تأهيل الشبكة الكهربائية للقرى المتضررة في ناحية العظيم و ناحية دلي عباس و ناحية المنصورية	العظيم - دلي عباس - المنصورية	الكهرباء	منجز	%100	65	2019-11-11	120	2019-12-09	1,461,010,000
10	اعادة اعمار و تأهيل الشبكة الكهربائية لحياء (313 و 303) مع تأهيل شبكة انارة الشوارع الرئيسية في التحرير / بعقوبة	بعقوبة	الكهرباء	منجز	%100	65	2019-11-11	120	2019-12-09	
11	اعادة تأهيل و تحسين و فك اختناق الشبكة الكهربائية لمناطق ناحية جلولاء قرى (الشموخ ,شيخ بابا, جميلة,الاصلاح,امين الحبيب ,حي السلام,انارة الشارع بين القصبة القديمة و حي المشروع)	جلولاء	الكهرباء	منجز	%100	65	2019-11-11	120	2019-12-09	
12	اعادة تأهيل مدرسة صفية في قضاء الخالص	الخالص	التربية	منجز	%100	119	2019-12-26	200	2020-02-20	701,772,500
13	اعادة تأهيل ثانوية سعد الواقعة في قضاء الخالص	الخالص	التربية	منجز	%100	119	2019-12-26	200	2020-02-20	
14	اعادة تأهيل ساحة (11) لاعب بمساحة (70*100) م	الخالص	الشباب والرياضة	منجز	%100	119	2019-12-26	200	2020-02-20	
15	استبدال الخط الناقل الرئيسي العائد لمشروع ماء ابي صيدا 500ملم ذكتايل	المقدادية	الماء والمجاري	منجز	%100	82	2019-12-08	160	2020-02-03	497,921,480
16	صيانة مجمعات ماءسعة نصف مليون غالون /جلبي/ابي صيدا	المقدادية	الماء والمجاري	منجز	%100	82	2019-12-08	160	2020-02-03	
17	تأهيل مجمع ماء قرية شيخي سعة مليون غالون	المقدادية	الماء والمجاري	منجز	%100	82	2019-12-08	160	2020-02-03	
	المجموع							156		6,352,500,690



تبليط شوارع وافرع قرية الحساوية في قضاء المقدادية / ديالى

محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

Baghdad Governorate Projects

الانبار



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية أو القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
1	تأهيل مغذي 33 كي في (مغذي ماء الكرخ - طارمية قديمة /طارمية جديدة وينظام الدبل سيركت)	الطارمية	الكهرباء	منجز	100%	5	120	2019-08-08	1,051,360,000
2	نقل خزان وتنفيذ خط ناقل لمنطقة 9 نيسان / النهروان	النهروان	الماء	منجز	100%	237	150	2020-02-16	1,240,000,000
3	تصليح وصيانة طريق مرمرة وطريق البوصالح الاحمد بطول 8كم	الطارمية	البلدية والبلديات	منجز	100%	89	100	2019-12-25	2,273,600,000
4	تأهيل طريق تل طاسة وطريق الثائر الثانية الطارمية	الطارمية	البلدية والبلديات	منجز	100%	89	100	2019-12-25	
5	تأهيل طريق تل طاسة وطريق الثائر الاولى وطريق البوفراس 8كم	الطارمية	البلدية والبلديات	منجز	100%	89	100	2019-12-25	
6	تصليح واكساء طريق زملة حمدي في قضاء الطارمية بطول 14000م وعرض 6 متر	الطارمية	البلدية والبلديات	منجز	100%	89	100	2019-12-25	
7	قّلع وتوسيع واكساء طريق مدخل سجن التاجي المركزي من الشارع العام بغداد -موصل الى موقع السجن بطول 6000 متر وبعرض 8 م	التاجي	البلدية والبلديات	منجز	100%	146	100	2020-01-30	2,298,000,000
8	قّلع وتبليط طريق محطة الكهرباء الغازية ابتداءا من طريق بغداد - الموصل الى منطقة السدة التابعة الى قضاء التاجي بطول 5000 متر وعرض 6 متر	التاجي	البلدية والبلديات	منجز	100%	146	100	2020-01-30	
9	تصليح وتبليط واكساء طريق اللابن من سكة القطار الى سيطرة ام نجم ضمن مقاطعة 12 ضباعي التابعة الى مديرية ناحية التاجي الجديد بطول 10000متر وعرض 6 متر	التاجي	البلدية والبلديات	منجز	100%	146	100	2020-01-30	
10	قّلع واعادة تبليط مع انبوب تصريف مياه الامطار لشوارع هور الباشا	التاجي	البلدية والبلديات	منجز	100%	138	100	2020-01-02	2,663,000,000
11	تصليح واكساء طريق هور الباشا من شارع بغداد- موصل الى منطقة الشيخ عامر/قضاء التاجي	التاجي	البلدية والبلديات	منجز	100%	138	100	2020-02-12	
12	هدم واعادة بناء مدرسة البواسل 9 صف في قضاء الطارمية	الطارمية	التربية	منجز	100%	115	250	2020-02-09	329,420,000
13	تأهيل واكساء طريق قرية الضحي	الطارمية	البلدية والبلديات	منجز	100%	167	120	2020-01-03	272,400,000
14	صيانة واكساء الشارع الممتد من حي الباتورا الى شارع البنية بطول 23000 م وعرض 7	المدائن	البلدية والبلديات	منجز	100%	164	180	2020-01-25	1,976,000,000
15	تأهيل مركز صحي الخناسة	المدائن	الصحة	منجز	100%	223	120	2020-02-09	325,220,000
16	هدم واعادة بناء مدرسة الرواشد	المحمودية	التربية	قيد التنفيذ	80%	136	210	2020-02-13	1,636,111,350
17	هدم واعادة بناء مدرسة عباس بن فرناس	المحمودية	التربية	قيد التنفيذ	80%	136	210	2020-02-13	
18	هدم واعادة بناء مدرسة المنامة	المحمودية	التربية	قيد التنفيذ	80%	136	210	2020-02-13	
19	هدم واعادة بناء مدرسة الايثار الابتدائية 12 صف	الطارمية	التربية	منجز	100%	184	180	2020-02-11	689,183,500
20	اعادة تأهيل شبكات كهرباء في قضاء المدائن والقرى والنواحي	المدائن	الكهرباء	منجز	100%	216	90	2020-01-13	340,000,000
21	تأهيل طريق القرية الهولندية وطريق فيصل مريخ	النهروان	البلدية والبلديات	منجز	100%	144	210	2020-01-15	761,600,000
22	هدم واعادة بناء مدرسة العراق الجديد12 صف	اللطيفية	التربية	منجز	100%	208	180	2020-02-09	537,180,800
23	مشروع تأهيل انارة ابو غريب القديم	أبو غريب	الكهرباء	منجز	100%	191	100	2020-01-21	549,937,500
24	تصليح وصيانة طريق شيخ رافع حاتم والطرق المجاورة له بطول 7كم	الطارمية	البلدية والبلديات	مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط					
25	صيانة وتبليط طرق شاحة (1,2,3) / ناحية اللطيفية	اللطيفية	البلدية والبلديات	مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط					
26	صيانة وتصليح طريق الاسحافي والطرق المجاورة لها في ناحية المشاهدة بطول 7 كم وعرض 5م / قضاء الطارمية	الطارمية	البلدية والبلديات	مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط					
المجموع									16,943,013,150

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تبليط شوارع قرية المهجرين الثانية / النهروان	المدائن	البلدية والبلديات	منجز	100%	19	2019-08-08	90	2019-09-22	1,215,600,000
2	تبليط شوارع قرية المهجرين الاولى / النهروان	المدائن	البلدية والبلديات	منجز	100%	19	2019-08-08	90	2019-09-22	
3	تبليط طرق قرية الزيتية / النهروان	المدائن	البلدية والبلديات	منجز	100%	19	2019-08-08	90	2019-09-22	
4	تاهيل جسر السيارات المتضرر لناظم قاطع (8) كم وناظم صدر ابو غريب	ابو غريب	الموارد المائية	منجز	100%	42	2019-09-16	180	2019-10-28	284,972,000
5	تصليح الاضرار و مد شبكة امطار و صرف صحي في قرية الحرية	المدائن	الماء والمجاري	منجز	100%	60	2019-10-31	150	2019-11-23	1,056,200,000
6	تبليط شوارع قرية الامام الرضا (ع)	المدائن	البلدية والبلديات	منجز	100%	60	2019-10-31	150	2019-11-23	
7	تبليط طرق حي الصدرين خلف القرية النفطية و المفروشة بالسبيس عن طريق محافظة بغداد بطول (2500م) و بعرض (5م)	المدائن	البلدية والبلديات	منجز	100%	60	2019-10-31	150	2019-11-23	
8	اعادة تاهيل مدرسة ابن الارقم الابتدائية	ابو غريب	التربية والتعليم	منجز	100%	68	2019-11-14	60	2019-12-27	536,943,000
9	اعادة تاهيل مدرسة اعياد الربيع	ابو غريب	التربية والتعليم	منجز	100%	68	2019-11-14	60	2019-12-27	
10	اعادة تاهيل مدرسة الحضارة للبنات	ابو غريب	التربية والتعليم	منجز	100%	68	2019-11-14	60	2019-12-27	
11	اعادة تاهيل مدرسة نور العلم	ابو غريب	التربية والتعليم	منجز	100%	68	2019-11-14	60	2019-12-27	
12	اعادة تاهيل مدرسة القبة الزرقاء الابتدائية	ابو غريب	التربية والتعليم	منجز	100%	68	2019-11-14	60	2019-12-27	
13	اعادة تاهيل ثانوية ابي غريب للبنات	ابو غريب	التربية والتعليم	منجز	100%	68	2019-11-14	60	2019-12-27	
14	اعادة تاهيل مدرسة المنامة الابتدائية	ابو غريب	التربية والتعليم	منجز	100%	68	2019-11-14	60	2019-12-27	
15	تاهيل مركز صحي النصر و السلام	ابو غريب	الصحة	منجز	100%	81	2019-12-08	100	2020-01-20	905,006,000
16	تاهيل بناية الجوازات	ابو غريب	الداخلية	منجز	100%	81	2019-12-08	100	2020-01-20	
17	توسيع و تاهيل مركز صحي عكر كوف	ابو غريب	الصحة	منجز	100%	81	2019-12-08	100	2020-01-20	
18	توسيع و تاهيل مركز صحي الزيتون	ابو غريب	الصحة	منجز	100%	81	2019-12-08	100	2020-01-20	
19	تاهيل مجمع ماء صالح الاحمد 3م50/ساعة	المدائن	الماء والمجاري	منجز	100%	108	19/12/2019	150	2020-02-24	645,424,000
20	مشروع مد انبوب ناقل للماء الصالح للشرب في منطقة شاطيء التاجي و بطول (40000م) و قطر (8 انج) في ناحية الحماميات	التاجي/ الحماميات	الماء والمجاري	منجز	100%	108	19/12/2019	150	2020-02-24	
21	تاهيل مجمع ماء المشاهدة 3م200/ساعة	المشاهدة	الماء والمجاري	منجز	100%	108	19/12/2020	150	2020-02-24	
22	صيانة مجمعات ماء النهروان ومشروع التوسعة ومحطة الخام	المدائن	الماء والمجاري	منجز	100%	108	19/12/2021	150	2020-02-24	
23	تاهيل طريق قرية العفو بطول 3كم / ناحية النصر و السلام في قضاء ابو غريب	ابو غريب	البلدية والبلديات	منجز / تنفيذ امانة	100%		تنفيذ امانة			250,000,000
24	إضافة وحدة الارشفة في مقر الصندوق		مباني حكومية	منجز / تنفيذ امانة	100%		تنفيذ امانة			250,000,000
25	شراء انابيب لاكمال مشروع طريق حنون	التاجي	البلدية والبلديات	منجز / تنفيذ امانة	100%		تنفيذ امانة			9,288,000
26	تاهيل و اكساء طرق في قرية الامام السجاد خلف قرية المهجرين الثانية في ناحية النهروان بطول 2500 م	المدائن	البلدية والبلديات	منجز / تنفيذ امانة	100%		تنفيذ امانة			180,000,000
27	تاهيل و اكساء طرق في قرية الامام الصادق / ناحية النهروان - قضاء المدائن بطول 1500م	المدائن	البلدية والبلديات	منجز / تنفيذ امانة	100%		تنفيذ امانة			161,250,000
	المجموع							160		5,494,683,000

مشاريع محافظة بابل

المسيب

المحاويل

الحلة

الهاشمية



الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / بابل

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم المناقصة	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تاريخ الإنجاز الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تاهيل طريق المسيب - الصويرة	جرف النصر	الطرق والجسور	منجز	100%	تنفيذ امانة	تنفيذ امانة	75	2019-08-27	2019-11-10	197,190,000
	المجموع										197,190,000

مشاريع صندوق إعادة الأعمار للموازنة الفيدرالية حسب المحافظات لعام 2020

مشاريع محافظة نينوى



خطة البرامج الخاصة لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2020 / تنفيذ امانة – محافظة نينوى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة التنفيذ
1	معالجة الجزيرة الوسطية في مجسر الصحة الى مقتربات الجسر الثالث	الموصل	البلدية	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	237,423,000
2	تأهيل شوارع في حي التحرير مقابل جامع الزهراء	الموصل	الطرق	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	200,425,000
3	اعادة تاهيل مكتب معلومات الموصل الايمن	الموصل	الداخلية	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	220,185,000

658,033,000

مشاريع محافظة الانبار

الانبار



خطة البرامج الخاصة لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2020 / تنفيذ امانة – محافظة الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة التنفيذ
1	تأهيل الشارع الخدمي من الجسر الجديد الى تقاطع النفوس بطول 1500 م	الفلوجة	البلدية	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	248,900,000
2	تأهيل الشارع الخدمي من تقاطع شارع السد الى تقاطع مجسر الاردن	الفلوجة	البلدية	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	249,700,000
3	أنشاء طرق فرعية في منطقة رميلة ابو شجل المرحلة الاولى في الصقلاوية	الصقلاوية	البلدية	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	220,700,000
4	تأهيل شارع الحمام في هيت	هيت	البلدية	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	215,275,000
5	ترميم و تأهيل نادي حديثة الرياضي	حديثة	الشباب و الرياضة	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	202,106,000
6	منظومة جوازات عنه	عنه	الداخلية	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	249,975,000

1,386,656,000

مشاريع محافظة صلاح الدين



خطة البرامج الخاصة لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2020 / تنفيذ امانة – محافظة صلاح الدين

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة التنفيذ
1	تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 500م ³ /ساعة	تكريت / الدبسة	الماء	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	194,750,000
2	تأهيل طريق قرية السموم في سامراء	سامراء	الطرق	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	20-12-20	237,400,000
3	تأهيل و أكساء طريق داخلي مكيشيفة -سموم	سامراء	الطرق	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	20-12-20	226,450,000

658,600,000

مشاريع محافظة ديالى

Diyala Governorate Projects



خطة البرامج الخاصة لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2020 / تنفيذ امانة – محافظة ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة التنفيذ
1	تاهيل مدرسة ربيعة	السعدية	التربية	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	121,837,500
2	تبليط طريق حي الجامعة	بعقوبة	الطرق	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	246,400,000
3	تبليط طريق قرية العقود	المقدادية	الطرق	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	220,000,000
4	تأهيل طرق في جديدة الشط	الخالص	الطرق	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	244,720,000
5	تأهيل طريق قرية النصر في ناحية قره تبه	خاتكين	الطرق	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	197,500,000

1,030,457,500



خطة البرامج الخاصة لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2020 / تنفيذ امانة – محافظة كركوك

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة التنفيذ
1	بناية الدائرة الزراعية في قرية الماحوز	حويجة	مباني حكومية	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	179,547,500

179,547,500

محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

Baghdad Governorate Projects

الانبار



خطة البرامج الخاصة لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2020 / تنفيذ امانة – محافظة بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة التنفيذ
1	تأهيل بوابة مدخل قضاء ابو غريب	ابو غريب	البلدية	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	206,858,000
2	تبليط شارع السكلات في قضاء ابو غريب	ابو غريب	البلدية	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	196,075,000
3	تبليط مجموعة شوارع في حي مربع المدارس	ابو غريب	البلدية	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	223,196,000
4	تأهيل احياء في ابو غريب	ابو غريب	البلدية	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	21-12-20	227,575,000

853,704,000

مشاريع محافظة بابل

المسيب

المحاويل

الحلة

الهاشمية



خطة البرامج الخاصة لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2020 / تنفيذ امانة – محافظة بابل

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة التنفيذ
1	تأهيل مدرسة البوasl الابتدائية	المسيب	التربية	تشغيلي / تنفيذ امانة	منجز	100%	2020-12-15	195,233,500

195,233,500

مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية حسب المحافظات لعام 2021

مشاريع محافظة نينوى



مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 - محافظة نينوى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تاهيل شارع السايدين من نفق الجامعة الى نفق القصور	الموصل	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	12%	189	360	2021-12-12	4,315,912,500
2	تاهيل مركز صحي نموذجي في ختارة /تلكيف	تلكيف	الصحة	استثماري	قيد التنفيذ	29%	196	210		579,850,000
3	تطوير شارع الغابات من دورة الظلال الى دورة فندق نينوى اوبروي	الموصل	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	13%	197	360	2021-12-13	4,376,350,000
4	اعمال تطوير الشارع من تقاطع الجسر الرابع الى مستشفى الحميات	الموصل	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	16%	212	360	2021-12-13	4,165,750,000
5	تاهيل الجزرات الوسطية ومقتربات المجسرات من تقاطع السكر الى الجسر الثالث والجزرات المجاورة لها	الموصل	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	26%	227	330	2021-12-15	2,876,215,000
6	معالجة الشارع الممتد من دورة روضة النسور الى المتحف	الموصل	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	80%	232	180	2021-12-27	980,469,000
7	هدم واعادة انشاء عمادة كلية الطب / جامعة الموصل	الموصل	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	1%	256	330		3,677,219,000
8	تطوير الشارع من نفق القصور الى سايدين الرشيدية	الموصل	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	28%	264	300	2022-01-05	3,002,147,500
9	هدم واعادة انشاء بناية الأقسام العلمية 4 طب الموصل /جامعة الموصل	الموصل	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	2%	282	330	2022-02-02	3,543,926,000
10	ربط قرى المالحات وعية الوهبي بطول 3,5كم مع تبليط الطبقة الثانية (الباندر) لطرق بليج تل العرج بطول 14,5كم	الموصل	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	17%	301	300	2022-01-12	3,061,530,000
11	تاهيل بناية قطاع الحدياء	الموصل	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	7%	335	330		2,859,337,800
12	اعادة تاهيل بناية قطاع الربيع	الموصل	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	7%	335	330		
13	تاهيل بناية قطاع السلام	الموصل	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	7%	335	330		
14	تاهيل بناية قطاع الموصل الجديدة	الموصل	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	7%	335	330		
15	اعادة تاهيل بناية هندسة المرور	الموصل	الداخلية	استثماري		0%	356	300		2,036,837,833
16	اعادة تاهيل مع اكمال انشاء شارع كورنيش البلدية	الموصل	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	15%	377	270	2022-02-10	3,196,875,000
17	تطوير مدخل الموصل -ربيعة من نفق الصحة الى الهرمات	الموصل	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	86%	19	240	2021-08-09	4,260,567,500
18	تطوير مدخل مدينة الموصل بغداد من دورة المكعبات وبطول 3,5كم	الموصل	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	90%	24	240	2021-08-09	3,994,597,000
19	تطوير شارع اربيل من نهاية كوكجلي الى البوابة	الموصل	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	86%	26	240	2021-08-10	3,732,010,000
20	تاهيل شارع سايدين نينوى اوبري وسايدين السدة الى مستشفى ابن سينا في الرشيدية	الموصل	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	94%	28	240	2021-08-10	3,704,000,000

مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 - محافظة نينوى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
21	تاهيل شارع السايدين من تقاطع السكر الى الجسر الثالث	الموصل	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	96%	34	180	2021-08-17	3,202,550,000
22	تبليط طرق ابو خشب القيروان -قضاء سنجار	الموصل	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	42	240	2021-08-25	2,113,300,000
23	تاهيل شوارع في منطقة وادي حجر	الموصل	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	100%	43	240	2021-08-17	4,350,625,000
24	تاهيل الشوارع في منطقة الزنجيلي /الجانب الايمن	الموصل	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	92%	44	360	2021-08-22	2,614,525,000
25	تاهيل شوارع حي الثورة	الموصل	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	46	240	2021-08-22	3,290,070,000
26	معالجة واكساء شوارع متفرقة في مدينة الموصل الجانب الايسر والايمن	الموصل	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	100%	47	360	2021-08-23	3,002,147,500
27	تاهيل شوارع في منطقة اليابسات وحي الابار	الموصل	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	84%	50	210	2021-08-24	2,221,750,000
28	تطوير شارع كركوك من جسر وادي الشور الى سايدين يارمجة	الموصل	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	85%	54	360	2021-08-31	4,121,443,500
29	تاهيل شوارع في منطقة الصناعة القديمة	الموصل	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	85%	58	240	2021-08-29	3,060,375,000
30	تطوير شارع دهوك من سايدين الرشيدية الى سيطرة القوسيات	الموصل	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	89%	59	240	2021-09-06	4,353,520,000
31	تأهيل بناية ادارة الدراسات و التصاميم الهندسية و التابعة لوزارة الموارد المائية في الموصل	الموصل	موارد مانيه	برامج خاصة / تنفيذ اماته	منجز	100%				242,973,000
32	مد خط ناقل 250 ملم بولي اثيلين و بطول 1900 م و شبكة 110 ملم بولي اثيلين و بطول 1000م في قرية المنكوبة / ناحية القيارة (في محافظة نينوى	الموصل	الماء و المجاري	برامج خاصة / تنفيذ اماته	منجز	100%				142,710,000
33	تاهيل و تبليط و صب الطرق الداخلية لقرية الحود التابعة لناحية القيارة) في محافظة نينوى	الموصل	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ اماته	منجز	100%				239,250,000
34	تاهيل و تبليط الطريق الرابط من الشارع الرئيسي موصل -قيارة وصولا الى محلة الشهيد عبد المعين ذنون في قرية اللزاقة التابعة لناحية القيارة) في محافظة نينوى	الموصل	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ اماته	منجز	100%				104,500,000
35	تاهيل ملعب سباعي بابعد 30 * 50 م في موقع السماح	الموصل	مباني حكومية	برامج خاصة / تنفيذ اماته	منجز	100%				214,123,000
36	تاهيل ملعب سباعي بابعد 30 * 50 م في موقع الشلالات	تلكيف	مباني حكومية	برامج خاصة / تنفيذ اماته	منجز	100%				214,123,000
37	تاهيل ملعب سباعي بابعد 30 * 50 م في موقع تلعفر	تلعفر	مباني حكومية	برامج خاصة / تنفيذ اماته	قيد التنفيذ					214,123,000
38	تاهيل ملعب سباعي بابعد 30 * 50 م في موقع القيارة	الموصل	مباني حكومية	برامج خاصة / تنفيذ اماته	قيد التنفيذ					214,123,000
39	انشاء و تبليط طرق خارجية و داخلية لقرية البشار التابعة لناحية العياضة	تلعفر	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ اماته	قيد التنفيذ					233,500,000
40	تاهيل طريق قرية ابطخ مشيرفة التابعة لناحية ربيعه	تلعفر	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ اماته	قيد التنفيذ					243,000,000

مشاريع محافظة الانبار

الانبار



مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 - محافظة الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الانجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تبليط شوارع في النساف	الحبانية	البلدية والبلديات	استثماري	منجز	100%	51	270		1,153,999,000
2	تبليط شوارع القدس الحبانية	الحبانية	البلدية والبلديات	استثماري	منجز	100%	51	270		
3	هدم وإعادة بناء مدرسة اغادير للبنين 12 صف		التربية	استثماري	قيد المباشرة	0%	70			709,345,000
4	تجهيز ونصب وحدة مجمعة سعة 100م3/س في قرية بني زيد	الكرمة	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	17%	389			1,298,775,000
5	تأهيل الشارع القديم من تقاطع العباسي باتجاه الشارع العام في الفلوجة	الفلوجة	البلدية والبلديات	استثماري	قيد المباشرة	0%	242			2,164,050,000
6	توسعة وتأهيل طريق الرمثة الرئيسي المرحلة الثانية بطول 1700م وعرض 25م	القائم	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	38%	131			3,707,669,000
7	تأهيل شوارع داخلية في حي 12 ربيع الأول في قضاء القائم	القائم	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	35%	133			2,856,930,000
8	تأهيل شوارع داخلية في ناحية الكرايلة/ القائم	القائم	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	35%	133			
9	تأهيل وصيانة وحدة مجمع ماء سعة 200م3/ساعة منطقة النباعي قرية بني زيد واكمال النواقص في الجزيرة	الكرمة	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	90%	141			3,296,260,000
10	اكمل تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 200م3/ساعة لمنطقة تل الجبل (قرية كويج) جزيرة الكرمة	الكرمة	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	95%	141			
11	إعادة نصب مجمع ماء البو سودة والروفة سعة 200م3/ساعة في جزيرة الكرمة	الكرمة	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	95%	141			
12	تأهيل شارع معمل الحجر باتجاه مدخل حديثة الجنوبي في حي الشرطة	حديثة	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	61%	144	210 يوم		2,053,460,000
13	/ تأهيل وتبليط شوارع في (حي المعلمين وحي بني داهر) ضمن قضاء حديثة	حديثة	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	61%	144	210 يوم		
14	تأهيل شوارع حي الفنانين في الفلوجة	الفلوجة	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	50%	153			2,374,385,000
15	تأهيل شوارع حي الجعفي في الفلوجة	الفلوجة	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	25%	156			4,520,260,000
16	تأهيل الشوارع الخدمية لشارع 60 من تقاطع التقوى وصولاً الى النهر / الفلوجة	الفلوجة	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	25%	160			3,398,566,500
17	انشاء بوابة مدخل ناحية بروانة الشمالي	حديثة	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	28%	168			1,192,448,000
18	إعادة انشاء مديرية ناحية بروانة	حديثة	مباني حكومية	استثماري	قيد التنفيذ	28%	168			
19	تأهيل طرق في منطقة الرشد والهيب في قضاء الكرمة	الكرمة	البلدية والبلديات	استثماري	منجز	100%	171			2,347,000,000
20	تأهيل طريق ابو دمنة في ناحية حصيبة الشرقية بطول 7525م / الحبانية	الحبانية	الطرق والجسور	استثماري	منجز	100%	174	180 يوم		764,910,000
21	إعادة تأهيل جسر الشهيد وحيد ومقرباته على نهر الفرات في ناحية البغداد	البغداد	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	15%	175	720 يوم		7,054,956,750
22	إعادة تأهيل شارع الميثاق في الرمادي	الرمادي	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	2%	178			1,867,025,000
23	تأهيل طريق ابو حداد والبو عوسج بين نهر اللهبية ونهر التميمي	الكرمة	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	25%	179			2,773,520,000
24	تأهيل شوارع في حي اليرموك (المرحلة الرابعة) في الفلوجة	الفلوجة	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	31%	181			4,369,860,000
25	تأهيل شوارع ضمن حدود بلدية الحبانية	الحبانية	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	70%	184			4,368,000,000
26	تأهيل مجمع اتصالات الفلوجة	الفلوجة	مباني حكومية	استثماري	قيد التنفيذ	26%	185	270 يوم		602,910,000
27	هدم وإعادة بناء مديرية بلدية الصقلاوية	الصقلاوية	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	42%	188	300 يوم		930,940,000
28	تأهيل الطرق الواقعة بين شارع 20 وشارع التميمي في الكرمة	الكرمة	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	63%	191			1,824,845,000
29	هدم وإعادة بناء مدرسة الروفة 12 صف في قضاء الكرمة -12 صف الابتدائية للبنين في الرمادي	الكرمة	التربية	استثماري	قيد التنفيذ	49%	192	300 يوم		1,686,650,000
30	هدم وإعادة بناء مدرسة الامام الغزالي 12 صف الابتدائية للبنين في الرمادي	الرمادي	التربية	استثماري	لم يتم تسليم الموقع	0%	192	300 يوم		
31	تأهيل مغذي مزدوج 33كف بطول 8كم لتغذية محطة الخالدية 11/33 كف من محطة الملاحمة 11/33 كف / الحبانية	الحبانية	الكهرباء	استثماري	قيد التنفيذ	85%	193			1,107,401,000
32	تجهيز ونصب مجمع ماء الصوفية/ الحلابسة والمناطق المجاورة لها سعة 200م3/ساعة / الفلوجة	الفلوجة	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	65%	194			890,905,500
33	هدم وإعادة بناء دار القضاء في عنه	عنه	مباني حكومية	استثماري	قيد التنفيذ	17%	199			1,359,000,000
34	إعادة اكساء شوارع في المدينة السكنية في العبيدي بطول 13000م/ط/ القائم	القائم	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	36%	204			1,133,475,000
35	مشروع انشاء السياج الامني كونكريتي مع ابراج كونكريتية	الرمادي	الداخلية	استثماري	قيد التنفيذ	76%	206	180 يوم		1,342,590,000
36	تأهيل الخط الناقل للشبكة الكهربائية لمول الفلوجة	الفلوجة	الكهرباء	استثماري	قيد التنفيذ	80%	207			498,000,000
37	إعادة انشاء مجمع ماء لتغذية دور واطنة الكلفة الاول والثاني وتوزيع الشهداء والجرحى في السكنية وحي الارامل ومنطقة حصيوات والبوجولية سعة 400 م3/ساعة / الانبار	الماء		استثماري	قيد التنفيذ	65%	215	300		3,916,410,000
38	إعادة تأهيل شارع 60 من تقاطع التقوى الى تقاطع 40 الرابط بالجسر الثالث(السايدات الرئيسية) في قضاء الفلوجة	الفلوجة	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	30%	216			4,281,107,800
39	إعادة تأهيل دوار الساعة في قضاء الفلوجة	الفلوجة	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	8%	216	183		
40	إعادة تبليط طرق متفرقة في منطقة الهريمات- العامرية وإعادة اكساء طريق جسر يزبيز من الجسر الحديدي باتجاه بغداد/ الكرمة	الكرمة	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	70%	217			1,473,250,000

مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 - محافظة الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
41	هدم وإعادة بناء دار القضاء في الرطبة	الرطبة	مباني حكومية	استثماري	قيد التنفيذ	36%	225			1,382,522,200
42	تأهيل الشارع الحولي من حي المعصم باتجاه حي الأمين ضمن حدود بلدية الحبيانية	الحبيانية	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	22%	230	270 يوم		4,119,500,000
43	هدم وإعادة بناء مديرية ناحية الفرات	هيت	مباني حكومية	استثماري	قيد التنفيذ	26%	246	270 يوم		1,778,120,000
44	تأهيل طريق البوعلي بطول 1.5 كم وعرض 10 م في قرية الخفاجية ناحية الحقلانية / قضاء حديثة	حديثة	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	29%	252	180		327,220,000
45	تأهيل طريق البورج بطول 1100م وعرض 5 م في قضاء هيت /ناحية الفرات	هيت	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	24%	252	180		
46	تأهيل طرق المشتل بطول 3.5كم وعرض6 م في قضاء هيت	هيت	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	25%	260	150		343,500,000
47	هدم وإعادة بناء قائمقامية قضاء عنه و دار القانمقامية في القضاء	عنه	مباني حكومية	استثماري	قيد التنفيذ	7%	267	300 يوم		951,310,000
48	تأهيل وتطوير الميزل الرئيسي من بوابة (شرق الرمادي) الى المصب في المضيق (المرحلة الأولى) بطول 3700م	الرمادي	الموارد المائية	استثماري	قيد التنفيذ	25%	272			3,841,000,000
49	تأهيل طريق الجرايشي من محطة 3+000 الى المحطة (6+000) وبعرض 26.5 باعتبار المحطة 0+000 الجسر الفوقاني على طريق المرور السريع	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	6%	280	270			4,298,099,000
50	تأهيل الشارع العام والشوارع الخدمية ومقتربات جسر الناظم ضمن حدود بلدية الحبيانية	الحبيانية	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	13%	285	270		4,323,494,000
51	انشاء وحدة ماء مجمعة سعة مليون غالون في منطقة البوشجل- ناحية الصقلاوية	الصقلاوية	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	40%	289	270		3,749,667,500
52	انشاء وحدة مجمعة مليون غالون في منطقة الطالعة- ناحية الصقلاوية	الصقلاوية	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	40%	289	270		
53	إعادة انشاء مشروع ماء العبيدي 200م ³ /ساعة- مشروع ماء مخيم الموظفين	الصقلاوية	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	40%	289	270		
54	تجهيز ونصب وحدة مجمعة سعة 200م ³ /ساعة الحماميات -الخالدية	الصقلاوية	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	40%	289	270		
55	تأهيل وتبليط الطريق الرابط بين الطريق الحولي وشارع 30 بطول 1250م وعرض30م في عامرية الصمود / الانبار	الفلوجة	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	20%	291	210		1,265,860,000
56	هدم وإعادة انشاء مجمع ماء سعة 600 م ³ / ساعة لتغذية المنطقة الجنوبية (احياء الامين والمأمون والمعارض جامعة الفلوجة موقع السريع	الفلوجة	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	30%	294	300		4,252,500,000
57	هدم وإعادة انشاء مجمع ماء الجعفيقي 2 سعة 200 م ³ /ساعة المرحلة الثانية مع الربط مع مجمع المرحلة الأولى مع تنفيذ الخط الناقل	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	40%	295	300			4,309,050,000
58	انشاء طريق فوق الميزل في منطقة حصيبة الشرقية احمد صلال وخلف احمد بعرض 20 م	الرمادي	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	35%	296	210		1,766,530,000
59	هدم وإعادة انشاء مركز الشباب/حديثة	حديثة	الشباب والرياضة	استثماري	قيد التنفيذ	7%	299	300 يوم		629,667,000
60	وكراج الآليات / الانبار p5 و p4 f5تأهيل محطات مجاري شارع أربعين و	الفلوجة	المجاري	استثماري	قيد التنفيذ	24%	302	270		4,368,900,000
61	تأهيل شارع من نهاية السوق الى الشارع امام المدرسة النموذجية ضمن حدود بلدية النخيب	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	60%	303	150			300,000,000
62	هدم وإعادة بناء ثانوية ام المؤمنين للبنات 18 صف	التربية	استثماري	قيد المباشرة	0%	304	300			1,644,674,750
63	تأهيل كراج بلدية هيت	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	48%	305	300 يوم			849,505,000
64	تجهيز نصب وحدات طاقة شمسية عدد/3 مع تجهيز مواد احتياطية لمركز ماء الوليد	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	89%	306	180			329,100,000
65	تأهيل مجموعة طرق في منطقة البوعساف / الطرايشة بطول 15550 م	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	45%	307	210			1,499,645,000
66	إعادة بناء ثانوية زيد بن الحارث للبنين 18 صف في قضاء الحبيانية	الحبيانية	التربية	استثماري	قيد التنفيذ	0%	309	300		3,620,099,750
67	هدم وإعادة بناء مدرسة النصر 12 صف	التربية	استثماري	قيد التنفيذ	3%	309	300			
68	هدم وإعادة بناء مدرسة الخالصة النموذجية 12 صف	التربية	استثماري	قيد التنفيذ	1%	309	300			
69	تأهيل شوارع في احياء الميثاق الجديد والمطار الجديد والانتصار في قضاء الرطبة	الرطبة	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	35%	310	240		1,971,700,000
70	تأهيل شوارع في حي المعصم وحي الخلفاء ضمن حدود بلدية الحبيانية	الحبيانية	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	70%	311	270		4,281,576,000
71	هدم وإعادة انشاء مجمع ماء البو سودة والبو خليفة وكري اطراف ذراع دجلة سعة 400 م ³ / ساعة	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	25%	312	300			4,293,650,000
72	هدم وإعادة بناء مخازن مديرية ماء الانبار / المرحلة الأولى	الحبيانية	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	70%	313	300		4,281,490,000
73	إعادة بناء بناية مركز مجاري القائم	المجاري	استثماري	قيد التنفيذ	38%	314	270			746,020,000
74	إعادة تأهيل شوارع في ناحية المحمدي	هيت	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	12%	315	120		217,500,000
75	تبليط طريق فوق الميزل في منطقة البو ضليل بطول 1300 م وعرض 20 م	الرمادي	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	45%	318	240		2,002,729,000
76	هدم وإعادة انشاء بناية ملاحظة التسجيل العقاري في الخالدية	مباني حكومية	استثماري	قيد التنفيذ	0%	319	300			1,000,000,000
77	إعادة بناء مركز صيانة كهرباء الفلوجة الجنوبي	الكهرباء	استثماري	قيد التنفيذ	8%	320	300			951,251,500
78	هدم وإعادة بناء مدرسة بلال الحبشي الابتدائية 12 صف في المشحنية	التربية	استثماري	قيد التنفيذ	10%	321	300			1,132,100,000
79	تأهيل الشارع الحولي ضمن التصميم الأساسي المحدث لمديرية بلدية الحبيانية	الحبيانية	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	10%	322	270		4,317,400,000
80	إعادة تأهيل شبكات الماء في حديثة	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	47%	323	270			1,948,382,000

مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 - محافظة الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
81	إعادة تأهيل مجمع ماء البوحياة / قرية بهصه سعة 100م3/س في ناحية الحقلانية	الفلوجة	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	47%	323	270		
82	إعادة تأهيل مجمع ماء البوحياة الشرقي سعة 100م3/س في ناحية الحقلانية		الماء	استثماري	قيد التنفيذ	47%	323	270		
83	تأهيل وترميم مستشفى العامرية العام والعيادة الاستشارية		الصحة	استثماري	قيد التنفيذ	12%	324			916,050,000
84	هدم وإعادة بناء مدرسة أم الطويل الابتدائية 18 صف في الصبيحات		التربية	استثماري	قيد التنفيذ	10%	327	330		1,644,674,750
85	تأهيل الشبكة الكهربائية لقضاء الكرمة ونواحيها (ضغط واطئ)		الكهرباء	استثماري	قيد التنفيذ	75%	328	240		1,242,556,000
86	تأهيل الشبكة الكهربائية الضغط العالي والواطي لقضاء الكرمة ونواحيها		الكهرباء	استثماري	قيد التنفيذ	75%	328	240		
87	تجهيز مواد سائدة لفرع توزيع كهرباء شرق الانبار		الكهرباء	استثماري	منجز	100%	329	150		1,395,160,000
88	هدم وإعادة بناء جملونات مخازن الكتب قياس (18*40) م عدد (4) مع الجناح الاداري / الفلوجة		التربية	استثماري	قيد التنفيذ	10%	330	270		1,018,990,000
89	ترميم مدارس المجمع السكني في العامرية		التربية	استثماري	قيد التنفيذ	36%	331	180		394,508,000
90	إعادة اعمار 10 دار وقاعة ضيافة تابعة لدار كبير بمولد 50 كي في التابعة للإدارة المحلية قرب مستشفى طوارئ البغدادي	البغدادي	مباني حكومية	استثماري	قيد التنفيذ	80%	332			1,300,000,000
91	تأهيل شوارع رئيسية من الشارع الرئيسي الى الشارع الحولي الجنوبي في القائم	القائم	البلدية والبلديات	استثماري	قيد المباشرة	0%	333	210		1,317,500,000
92	هدم وإعادة بناء ثانوية هاجر للبنات 18 صف		الصحة	استثماري	قيد التنفيذ	15%	334	300		2,128,708,000
93	هدم وإعادة بناء مدرسة جميلة بوحيدر الابتدائية المختلطة 6 صف		الصحة	استثماري	قيد التنفيذ	13%	334	300		
94	إعادة انشاء مستوصف بيطري لمنطقة النعيمية والفلار		الزراعة	استثماري	قيد التنفيذ	27%	337	180		320,950,000
95	إعادة تأهيل مدرسة الإرادة الابتدائية في زنكورة الثانية للبنات 12 صف		التربية	استثماري	قيد التنفيذ	13%	339	330		3,612,100,000
96	إعادة تأهيل مدرسة الفقاع الابتدائية 12 صف في القرية العصرية		التربية	استثماري	قيد التنفيذ	11%	339	330		
97	هدم وإعادة بناء مدرسة العامل الابتدائية 12 صف في البوخليفة		التربية	استثماري	قيد التنفيذ	10%	339	330		
98	إعادة تأهيل وحدة ماء اليونسيف بسعة 200 م3 في القرية العصرية		الماء	استثماري	قيد التنفيذ	89%	340	270		1,556,167,500
99	هدم وإعادة بناء امرية قاطع مرور الرطبة		الداخلية	استثماري	قيد التنفيذ	50%	342	270		678,220,000
100	هدم وإعادة بناء مركز صحي نموذجي طابقين في البو عبيد مع دار سكن مزدوج لطبيب و مركز اسعاف فوري وصالة ولادة		الصحة	استثماري	قيد التنفيذ	3%	343	330		2,760,010,000
101	هدم وإعادة بناء مركز صحي فرعي مع دار سكن في السعدان والعزاز قرية الرحمة		الصحة	استثماري	قيد التنفيذ	3%	343	330		
102	هدم وإعادة بناء مدرسة المغفلون الابتدائية للبنين 6 صف		التربية	استثماري	قيد التنفيذ	6%	344	330		1,238,036,500
103	هدم وإعادة بناء مدرسة الفهد الابتدائية 12 صف / الحصي		التربية	استثماري	قيد التنفيذ	3%	344	330		
104	هدم وإعادة بناء متوسطة الجاحظ للبنات 18 صف في الفلوجة / الجولان		التربية	استثماري	قيد التنفيذ	5%	345	330		1,644,674,750
105	هدم وإعادة بناء مدرسة عامرية السلام الابتدائية للبنين 12 صف		التربية	استثماري	قيد التنفيذ	4%	346	300		1,132,100,000
106	إعادة تأهيل بناية الاثار في القائم	القائم	مباني حكومية	استثماري	قيد التنفيذ	55%	347			452,225,000
107	هدم وإعادة بناء مدرسة ابن البيطار الابتدائية للبنين 12 صف في الحبيانية	الحبيانية	التربية	استثماري	قيد التنفيذ	9%	348	300 يوم		1,131,313,000
108	انشاء مركز صحي رئيسي طابقين في العبيدي		الصحة	استثماري	قيد التنفيذ	25%	349	300 يوم		1,541,000,000
109	انشاء مركز صحي فرعي حي التلك - القائم		الصحة	استثماري	قيد التنفيذ	25%	349	300 يوم		
110	إعادة انشاء كورنيش لضفة نهر الفرات الجانب الامين في هيت (المرحلة الثانية)		الموارد المائية	استثماري	قيد التنفيذ	40%	351	240		1,302,463,500
111	إعادة انشاء بناية قسم شرطة قضاء الحبيانية		الداخلية	استثماري	قيد التنفيذ	65%	352	300		2,500,000,000
112	هدم وإعادة انشاء سياج الموقع الجامعي		التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	9%	353			3,368,550,000
113	تأهيل بناية مركز مجاري عنه		المجاري	استثماري	قيد التنفيذ	6%	354	210 يوم		350,000,000
114	تشبيد مغذي مزدوج 33 كف بطول 13 كم باستخدام عمود مشبك 14 م لتغذية محطة الخالدية 11/33 كف من محطة جزيرة الخالدية 33/132 كف المرحلة الثانية		الكهرباء	استثماري	قيد التنفيذ	55%	357	210		1,792,735,000
115	إعادة انشاء مجمع ماء الدرة سعة 200 م / دس داخل مشروع القائم الموحد	القائم	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	8%	358			1,000,000,000
116	هدم وإعادة بناء متوسطة الفضيلة 12 صف في قرية خنيلة/ قضاء الرمات	الرمات	التربية	استثماري	قيد التنفيذ	9%	359			843,325,000
117	تأهيل شارع 30 في حي الربيع مع مد شبكة مجاري مياه الامطار في قضاء الكرمة		البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	25%	360	210		1,540,000,000
118	تأهيل مغذيات النساف المقترحة الثابتة 11 كف		الكهرباء	استثماري	قيد التنفيذ	72%	363	240		2,345,160,000
119	تأهيل وتبليط طرق في قضاء عنه المرحلة السكنية الثانية بطول 6 كم		البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	12%	364	180		688,000,000
120	إعادة انشاء بناية فوج طوارئ الانبار الرابع في الفلوجة		الداخلية	استثماري	قيد التنفيذ	65%	365	300		2,231,520,000

مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 - محافظة الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
121	انشاء شارع خدمي يربط دوار الساعة بدوار جسر السكنية في الفلوجة		البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	65%	366	270		3,501,300,000
122	إعادة اعمار معمل السجاد اليدوي في عنة		مباني حكومية	استثماري	قيد التنفيذ	12%	367	300		1,671,651,000
123	إعادة تاهيل بنائية من طابقين لإدارة معمل خياطة عنة		مباني حكومية	استثماري	قيد التنفيذ	12%	367	300		
124	تجهيز وتنصيب مجمع ماء سعة 200 م ³ / ساعة لناحية المحمدي مع تاهيل مجمع ماء المحمدي الجديد	الرمادي	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	52%	368	270		2,000,505,500
125	إعادة انشاء بنائية مجمع اتصالات هيت		مباني حكومية	استثماري	قيد التنفيذ	26%	370	240		470,000,000
126	إعادة تاهيل وتبليط طريق السنجك بروانة بطول 4 كم وعرض 10 م باعتبار تقاطع الطريق مع مدخل محطة التعينة وقود بروانة نقطة 00+00	بروانة / حديثة	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	4%	372	210 يوم		1,059,087,500
127	تاهيل الشبكة الكهربائية الهوائية من محطة وقود الكرمة الى محطة كرامة 2-منطقة الزراعة - البعبدالعودة - منطقة ثورة العشرين	الكرمة	الكهرباء	استثماري	قيد التنفيذ	85%	373	210		452,874,000
128	تاهيل الشبكة الكهربائية الهوائية المتضررة لمغذي الخيرات من سور بغداد الى منطقة البوختج	الكرمة	الكهرباء	استثماري	قيد التنفيذ	85%	373	210		
129	تاهيل طرق ريفية في زويغير بطول 4.47 كم		البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	0%	374	150 يوم		368,410,000
130	إعادة بناء بنائية قسم مرور القائم		القائم	استثماري	قيد التنفيذ	52%	375	180 يوم		399,296,000
131	تاهيل وتبليط شارع الكورنيز مع شوارع داخلية ضمن قضاء حديثة		البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	50%	376	240 يوم		1,635,088,000
132	تاهيل مبنى كلية الآداب القاعات الدراسية / جامعة الانبار	الرمادي	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	65%	378	150		490,117,000
133	اعمال احياء الارقة القديمة من الطريق الرئيسي باتجاه نهر الفرات بطول 1325 م ومعدل عرض 3م في ناحية بروانة	حديثة	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	50%	379	120		243,060,000
134	تاهيل بنائية عمادة كلية الآداب / جامعة الانبار	الرمادي	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	30%	380	210		542,185,000
135	توسعة كلية العلوم الإسلامية (العمادة والنادي الطلابي) في جامعة الفلوجة	الفلوجة	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	18%	381	330		2,371,953,000
136	تاهيل واجهات بنائية القسم العلمي لكلية التربية الرياضية / جامعة الانبار	الرمادي	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	13%	382	210		1,477,482,500
137	إعادة انشاء بنائية مكتبة كلية التربية للبنات / جامعة الانبار	الرمادي	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	13%	382	210		
138	تاهيل واجهات بنايات كلية القانون والعلوم السياسية	الرمادي	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	13%	382	210		
139	اعادة تاهيل بنائية المختبرات العلمية / كلية الزراعة	الرمادي	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	7%	384	270		2,317,509,800
140	تاهيل بنائية كلية التربية للعلوم الإنسانية والصرقة في الموقع الجامعي / جامعة الانبار	الرمادي	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	7%	384	270		
141	تاهيل سقف الورش الهندسية / قسم الميكانيك لكلية الهندسة / جامعة الانبار	الرمادي	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	7%	384	270		
142	تاهيل الجناح الإداري في قسم الميكانيك / الطابق الأول لجامعة الانبار	الرمادي	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	7%	384	270		
143	تاهيل واجهات عمادة كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الانبار	الرمادي	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	7%	384	270		1,895,150,000
144	تاهيل شارع الزيتون والافرع المحيطة به في قضاء الرطبة		البلدية والبلديات	استثماري	منجز	100%	386	240		
145	تاهيل ابنية كلية العلوم الإسلامية/جامعة الانبار	الرمادي	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	20%	387	270		1,047,242,900
146	تاهيل ابنية ومسقات وسياج النقل والآليات في الموقع الجامعي	الرمادي	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	17%	387	270		
147	تأثيث طريق رمادي فلوجة - الكرمة بطول 56 كم		الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	10%	251			2,801,380,000
148	تجهيز مضخات افقية لمجمعات ماء راوة	راوه	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	30%	389			
149	تاهيل الشارع الخدمي من جسر الصديقية الى بلدية الحباتية وتطوير الشارع العام الى جسر الناظم	الحباتية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	60%	18	180		4,471,695,000
150	تاهيل قناة اروانية ميظنة في منطقة البوعينة	الرمادي	الموارد المائية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	80%	20	180		3,477,550,000
151	محطة ري ومد أنبوب في البوعبيد	الرمادي	الموارد المائية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	80%	20	180		
152	تاهيل سدة البوعينة - المرحلة الثانية	الرمادي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	75%	21	180		3,037,819,250
153	تاهيل وتوسيع شارع مركز الشباب ضمن مركز قضاء القائم	القائم	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	65%	30	180		1,005,065,789
154	هدم وإعادة بناء مديرية ناحية الوفاء	الوفاء / الرمادي	مباني حكومية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	80%	36	180		983,275,000
155	هدم وإعادة بناء مركز شرطة راوه	راوه	الداخلية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	43%	37	240		1,195,964,000
156	إعادة تاهيل القناطر الصندوقية المدمرة على طريق رمادي - سامراء من المحطة (00+0) فلكة الجسر البو فراج الى المحطة (100+5)	الرمادي	الطرق والجسور	برامج خاصة	منجز	100%	39	180		669,100,000
157	تاهيل سياج حول مجمع الكليات في القائم المرحلة الثانية / جامعة الانبار	القائم	التعليم العالي	برامج خاصة	قيد التنفيذ	92%	40	150		1,868,771,930
158	تاهيل الطريق الرئيسي من مفرق الرشاد الى تقاطع البو سودة في الكرمة	الكرمة	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	60%	41	300		4,301,990,000
159	تاهيل طريق القائم - العبيدي (الشهيد حيدر)	القائم	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	61%	48	240		1,181,929,000
160	تاهيل الطريق المحاذي لنهر الفرات ومعمل الزجاج	الرمادي	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	90%	52	240		945,740,000

مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 - محافظة الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
161	تأهيل الشوارع الرئيسية في حي الجامعة	الرمادي	البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	65%	53	240		1,276,000,000
162	إعادة إنشاء مستشفى طوارئ البغدادي 25 سرير (بنية القسم الخاص وبنية القسم العام)	هيت / البغدادي	الصحة	برامج خاصة	قيد التنفيذ	96%	55	360		2,190,500,000
163	تطوير وتبليط الشوارع الرئيسية في ناحية الريحانة بطول 4 كم	عنه	البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	62%	63	180		488,000,000
164	إعادة إنشاء قسم الميرة والتجهيز	الرمادي	الداخلية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	88%	65	360		2,250,000,000
165	إعادة إنشاء قسم الآليات والمعمل	الرمادي	الداخلية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	88%	65			
166	تأهيل شارع البلدية والشوارع المرتبطة به + شارع الليبية في حي الصمود	الكرمة	البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	85%	66	270		1,251,630,000
167	إعادة بناء دائرة أحوال الرطبة والبطافة الوطنية	الرطبة	الداخلية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	73%	67	240		612,718,000
168	(إعادة إنشاء جسر متضرر الشجة / البكرة / ابو علفان / ابو عبيد الغياض / ابو لطيف) بطول 32 متر وعرض 6 متر لكل جسر في الصقلاوية	الصقلاوية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	60%	69	360		4,665,380,000
169	تأهيل طريق تقاطع بنات الحسن الى محلات الشيخ عامر في ناحية الخيرات المرحلة الأولى	الكرمة / ناحية الخيرات	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	75%	69	360		
170	إعادة تأهيل الطريق الرابط بين جسر الشيخ عامر الى مرق بنات الحسن بطول 8كم	الكرمة	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	75%	69	360		
171	إعادة إنشاء قسم الحسابات والإدارة	الرمادي	الداخلية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	88%	71	360		2,155,000,000
172	إعادة إنشاء مركز شرطة الشهداء	الفلوجة	الداخلية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	88%	71	360		
173	إعادة إنشاء جسر بطول 24 م في منطقة السمك جدول إبراهيم بن علي في الكيلو متر (11+200)	الكرمة	الموارد المائية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	90%	74	360		780,680,000
174	إعادة إنشاء جسر بطول 24 م في منطقة المويحة والاصبوح على الميزل الرئيسي (DD+00)	الكرمة	الموارد المائية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	90%	74	360		
175	إعادة إنشاء جسر بطول 24 م في منطقة اليو مكلد جدول إبراهيم علي في الكيلو متر (0+700)	الكرمة	الموارد المائية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	90%	74	360		
176	إعادة إنشاء جسر بطول 24 م في منطقة الحلايس (الحويجة) في قضاء الكرمة	الكرمة	الموارد المائية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	90%	74	360		
177	تأهيل وتبليط شوارع في قضاء الرطبة	الرطبة	البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	100%	78	180		722,740,000
178	تأهيل شارع الصوفية من تقاطع جامع الوارث الى البطان الى الحولي الشمالي بعرض (20م)	الرمادي	البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	54%	79	360		4,306,592,750
179	إيصال الماء من سد حوران الى مدينة الرطبة	الرطبة	الموارد المائية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	89%	81	330		1,703,810,000
180	تأهيل طرق ريفية في ناحية حصيبة الشرقية	حصيبة الشرقية / الحياتية	الطرق والجسور	برامج خاصة	منجز	100%	93	240		875,864,000
181	هدم وإعادة بناء مدرسة 12 صف متوسطة المصير المختلطة / الصقلاوية	الصقلاوية / الفلوجة	التربية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	70%	105	360		1,496,955,000
182	هدم وإعادة بناء مدرسة 12 صف عبد الله بن عمر / التعمية	الفلوجة	التربية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	70%	105	360		
183	أعمال التكمية الحجرية للاكتاف وادي حوران في الرطبة	الرطبة	البلدية و البلديات	برامج خاصة	منجز	100%	106	150 يوم		492,400,000
184	أعمال التكمية الحجرية للاكتاف وادي المساد في الرطبة	الرطبة	البلدية و البلديات	برامج خاصة	منجز	100%	106	150 يوم		
185	تأهيل وتوسيع مجمع ماء ابو حردان - الحمضية مع مد ناقل رئيسي وشبكة فرعية - قضاء الرمانة	الرمانة	الموارد المائية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	85%	108	360		4,320,674,000
186	تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 200م³/ ساعة في منطقة الوفراف	الرمادي	الموارد المائية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	90%	108	360		
187	إعادة إنشاء مجمع ماء (الشاعي والطحاتين) سعة 200م³ / الساعة في ناحية بروانة قضاء حديثة	بروانة / حديثة	الموارد المائية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	85%	108	360		
188	تأهيل شوارع متفرقة في كبيسة	هيت / كبيسة	البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	65%	123	270		1,159,038,130
189	تأهيل شارع دور البلدية وشارع دائرة الكهرباء المرتبطة بشارع السوق القديم في ناحية كبيسة	هيت / كبيسة	البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	65%	123	270		
190	وحدة ماء مجمعة 200م³/ساعة من منطقة ابو دمنة جميلة الحصي		الماء	برامج خاصة	قيد التنفيذ	60%	127			875,845,000
191	تأهيل مقرب جسر الفلوجة الكونكريتي (الجديد) جهة الفلوجة	الفلوجة	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	55%	130			2,044,010,000
192	إعادة إنشاء طرق فرعية في منطقة الرملة ابو شجل (المرحلة الثانية) ناحية الصقلاوية	الفلوجة	الطرق والجسور	برامج خاصة	منجز	100%	130			
193	تأهيل طرق الممورة وحي امينة والخالدية في قضاء هيت	هيت	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	55%	130			
194	إعادة تأهيل الجسر الفوقاني لتقاطع الثرثار سماء كيلو 51	الفلوجة	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	40%	132			2,927,775,000
195	هدم وإعادة بناء ثانوية بزيق فتيخان أبو ريشة	الرمادي	التربية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	30%	140	360 يوم		1,436,443,500
196	تأهيل وإصلاح الشارع الرئيسي في حي البكر وشارع حي القاسمية وحي العامل في هيت	هيت	البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	65%	142	360 يوم		2,002,859,500
197	قلع وتوسيع وإعادة تبليط الطريق الرابط بين كراج بلدية بروانة مع جسر بروانة المعلن بطول 650م وعرض 20م وبطول 550 وعرض 15م	حديثة	البلدية و البلديات	برامج خاصة		55%	143	180		1,057,705,000
198	إعادة إنشاء مركز صيانة كهرباء العامرية	العامرية	الكهرباء	برامج خاصة	قيد التنفيذ	86%	151			390,428,000
199	إعادة إنشاء سياج كلية الزراعة وإتارة محيط الكلية والطرق الداخلية في جامعة الانبار	الرمادي	التعليم العالي	برامج خاصة	قيد التنفيذ	67%	158	210 يوم		649,160,000
200	مشروع تأهيل طرق خارج حدود البلدية (الزيتون مقابل محطة الكهرباء)		الطرق والجسور	برامج خاصة		26%	190	180		997,142,500

مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 - محافظة الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
201	– وتأهيل طرق خارج حدود البلدية (قرية جريجب)–		الطرق والجسور	برامج خاصة		26%	190	180		
202	تأهيل طرق خارج حدود البلدية (النهضة الجنوبية)–		الطرق والجسور	برامج خاصة		26%	190	180		
203	تأهيل طرق خارج حدود البلدية (منطقة شرق المعامل) / ناحية الكرابلة		الطرق والجسور	برامج خاصة		26%	223	180		1,176,350,000
204	تجهيز مواد لدعم الشبكة الكهربائية لتوزيع كهرباء مركز الانبار (مركز الرمادي)	الرمادي	الكهرباء	برامج خاصة	منجز	100%	228	240		787,394,000
205	عادة بناء ملاحظة التسجيل العقاري في قضاء الرطبة	الرطبة	مباني حكومية	برامج خاصة		33%				
206	تأهيل التقاطر الانبوبية والصندوقية المدمرة على طريق رمادي سامراء من المحطة 5+100 الى المحطة 100+59 تأهيل نهر الحلوه باعتبار نقطة 0+00 فلكة جسر البو فراج		الطرق والجسور	برامج خاصة		62%	248	240		1,429,250,000
207	كامل بناء مدرسة نموذجية 18 صف في ناحية الكرابلة/ قضاء القائم		التربية	برامج خاصة		40%	266			499,795,000
208	تأهيل طريق في الحي المدني ناحية الحبيانية	الفلوجة	الطرق والجسور	برامج خاصة		19%	325	210		1,150,100,000
209	تجهيز احتياجات مدارس اقصية (الرمادي-الحبيانية- الفلوجة - الكرمة)		التربية	برامج خاصة		25%	326	180		4,929,250,000
210	تجهيز اليات الى دوائر الاستخبارات والمخابرات والمرور في محافظة الانبار		الداخلية	برامج خاصة		0%	338	270		4,707,400,000
211	تأهيل البنى التحتية لجسم الطريق المرحلة الأولى للطريق الحولي الشمالي في الكرابلة بعرض 25م	القائم	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد المباشرة	17%	369			2,286,997,000
212	عادة انشاء مركز ماء الصقلاوية	الصقلاوية	الماء	برامج خاصة	قيد التنفيذ	70%	209	240		629,310,000
213	تأهيل طرق في البو كناس و البو عطية في البو دمنة ناحية حصيبة الشرقية بطول 2325 م	الرمادي	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				248,395,000
214	تأهيل طرق البومنسي قرب مضيف الشيخ رافع في ناحية حصيبة الشرقية و طرق مدرسة ذو الفقار الابتدائية في جزيرة الخالدية بطول 2860م	الرمادي	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				248,338,000
215	تنفيذ سباج و ساحات و شارع اعدادية صناعة القائم	القائم	التربية	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				239,896,000
216	تأهيل طرق مدرسة النصر الابتدائية للبنين و البنات في ناحية حصيبة الشرقية بطول 3600	الرمادي	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				247,840,000
217	تأهيل طرق في منطقة جامع المدينة المنورة في حصيبة الشرقية بطول 2620 م	الخالدية	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				248,154,000
218	استبدال ناقل رئيسي لمجمع الحي الصناعي / 1 ناحية الكرابلة / قضاء القائم	القائم	ماء والمجاري	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,750,000
219	استبدال ناقل رئيسي لمجمع الحي الصناعي / 2 المكارم / ناحية الكرابلة / قضاء القائم	القائم	ماء والمجاري	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				247,500,000
220	اعادة تأهيل و انشاء شبكة مجاري و خطوط تصريف ناقلة في راوه الجديدة لفتح الاختناقات الحاصلة في شوارعها و تصريف مياه الامطار و المياه الخارجة من الدور السكنية الى الوادي و رفع الضرر عن تلك الدور / راوه	راوه	ماء والمجاري	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,965,000
221	تأهيل شوارع في حي الحارة الجديدة في قضاء الرطبة	الرطبة	البلدية والبلديات	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,400,000
222	استبدال ناقل رئيسي و مد شبكة فرعية في حي الامين / قضاء القائم	القائم	الماء والمجاري	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,910,000
223	استبدال ناقل رئيسي و مد شبكة فرعية في حي 12 ربيع الاول و الدرة/ قضاء القائم	القائم	الماء والمجاري	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,050,000
224	هدم و اعادة بناء المستوصف البيطري في الرمانة	الرمانة	ابنية حكومية	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,900,000
225	تأهيل مجموعة طرق السيد الحكم حسين في منطقة حصيبة الشرقية بطول 2550 م	الرمادي	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				177,881,000
226	تأهيل مجموعة طرق السيد المختار ضاري في منطقة حصيبة الشرقية تأهيل مجموعة طرق السيد (المختار ضاري عودة شرموط) في منطقة حصيبة الشرقية بطول 2915 م بطول 2915 م	الرمادي	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				198,590,000
227	هدم و اعادة بناء مخزن الادوية في مستشفى القائم العام	القائم	الصحة	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				191,299,500
228	هدم و اعادة بناء القسم البلدي مع تأهيل قاعة المناسبات في مجمع الصكرة	عنه	البلدية والبلديات	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				248,550,000
229	تأهيل شوارع في الحي الموظفين في قضاء الرطبة	الرطبة	البلدية والبلديات	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,400,000
230	تأهيل شوارع في الحي العسكري في قضاء الرطبة	الرطبة	البلدية والبلديات	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,400,000
231	صيانة مجمع ماء الجراشي 200 م3/ساعة	الرمادي	الماء والمجاري	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				158,620,000
232	تجهيز تراكيب انارة مع مواد صيانة الانارة في مدينة هيت	هيت	الكهرباء	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,225,000
233	صيانة مجمع ماء السريدية سعة 60 م3 في هيت	هيت	الماء والمجاري	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				250,000,000
234	اعادة انشاء أرصفة و مقررص في شوارع قضاء الرطبة	الرطبة	البلدية والبلديات	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				244,800,000
235	تأهيل بناءية مركز الشباب و الرياضة ناحية العبيدي	القائم	ابنية حكومية	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,867,500
236	تأهيل شوارع في غرب الوادي في قضاء الرطبة	الرطبة	البلدية والبلديات	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,400,000
237	ايصال التيار الكهربائي الى النقاط العسكرية في مفرق الرافدة و قرب جامع الخصيم مع تأهيل جزء من مغذي الصفرة	القائم	الكهرباء	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,500,000
238	تأهيل جزء من مغذي غرزة و مغذيات الطواريء في قضاء القائم	القائم	الكهرباء	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,875,000
239	ترميم مدرسة 18 صف تقليدية في هيت / البغدادي	هيت	التربية و التعليم العالي	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,585,000
240	تأهيل مدرسة الناصر صلاح الدين 12 صف مع انشاء مجموعة صحية 10مقد داخل المدرسة / قضاء القائم	القائم	التربية و التعليم العالي	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,960,000
241	إعادة تأهيل مجمع ماء البوعبيد	راوه	الماء والمجاري	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				246,030,000
242	تيليط طريق ناحية الريحانة – بحيرة عنة مع انشاء بوابة للمدخل الشمالي لناحية الريحانة	عنه	الطرق و الجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,500,000
243	تأهيل قناة اروانية مع ملحقاتها في منطقة الوعية / كرطان (الشيخ عبد المجيد نايف رشيد) في محافظة الانبار	الرمادي	الموارد المائية	برامج خاصة / تنفيذ امانة	قيد التنفيذ / متوقف	0%				249,677,000
244	انشاء مسقفات و كراج للسيارات داخل المجمع الحكومي في عنة	عنه	ابنية حكومية	برامج خاصة / تنفيذ امانة	قيد التنفيذ	0%				249,970,000

مشاريع محافظة صلاح الدين



مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 / محافظة صلاح الدين

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تكلفة العقد الأصلي
1	تأهيل شارع الشط في قضاء بيجي	بيجي	البلدية والبلديات	استثماري	فقد التنفيذ	3%	152	210	1,680,200,000
2	تأهيل وتطوير شارع ابو رحمن في مدينة سامراء	سامراء	البلدية والبلديات	استثماري	فقد المباشرة	0%	176	180	499,600,000
3	تطوير مركز المدينة من شارع الجنسية باتجاه مشروع الماء في الصينية		البلدية والبلديات	استثماري	فقد التنفيذ	9%	219	240	937,169,000
4	إعادة اعمار بناية مقر تشكيلات وزارة الإسكان في صلاح الدين	تكريت	مباني حكومية	استثماري	فقد التنفيذ	6.0%	231	300	1,691,847,500
5	صيانة وتأهيل الأرصفة داخل حدود البلدية — ناحية المعتمد	سامراء	البلدية والبلديات	استثماري	فقد التنفيذ	18%	253	180	611,725,000
6	تأهيل وتطوير الشارع الرئيسي المار بناحية المعتمد	سامراء	البلدية والبلديات	استثماري	فقد التنفيذ	18%	253		
7	تأهيل وتطوير الشارع الحولي الممتد من منطقة ابو عنون الى فلكة الحي الصناعي /بلد	بلد	البلدية والبلديات	استثماري	فقد التنفيذ	5%	254	210	1,421,630,435
8	تأهيل بناية بلدية بيجي	بيجي	البلدية والبلديات	استثماري	فقد المباشرة	0%	265	270	1,448,703,000
9	إعادة انشاء بناية بلدية العوجة	تكريت	البلدية والبلديات	استثماري	فقد المباشرة	0%	265	270	
10	تطوير الشارع الرئيسي لمدخل ناحية يثرب	بلد	البلدية والبلديات	استثماري	فقد التنفيذ	32%	317	270	3,692,909,000
11	انشاء مشروع ماء سعة 200م3/ساعة في قرية كبيبة / الضلوعية	الضلوعية	الماء	استثماري	فقد المباشرة	0%	355		2,694,403,000
12	انشاء مشروع ماء سعة 200م3/ساعة في قرية خزر ج / الضلوعية	الضلوعية	الماء	استثماري	فقد المباشرة	0%	355		
13	انشاء مشروع ماء سعة 200م3/ساعة في قرية الفرسان /تكريت	تكريت	الماء	استثماري	فقد المباشرة	0%	385		3,094,281,500
14	انشاء مشروع ماء سعة 200م3/ساعة في القرية العصرية بيجي	بيجي	الماء	استثماري	فقد المباشرة	0%	385		
15	تأهيل شارع طريق سامراء بغداد من الجسر السريع الى جسر سامراء الكونكريتي		البلدية والبلديات	برامج خاصة	فقد التنفيذ	75%	29	240	3,289,820,000
16	تطوير الشارع الرئيسي في قضاء الضلوعية	الضلوعية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	فقد التنفيذ	10%	32	360	4,345,600,000
17	تطوير شبكة مياه الامطار وشبكة الماء للشارع الرئيسي في قضاء الضلوعية	الضلوعية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	فقد التنفيذ	26%	33	300	3,637,050,000
18	تطوير المدخل الجنوبي لمدينة تكريت من بوابة القدس	تكريت	البلدية والبلديات	برامج خاصة	فقد التنفيذ	50%	38	240	4,347,750,000
19	تطوير شوارع داخلية ضمن حدود بلدية الاسحافي		البلدية والبلديات	برامج خاصة	فقد التنفيذ	75%	57	240	1,413,580,000
20	تبليط شوارع (20) متفرقة في قضاء الشرقاط مقاطعة 56		البلدية والبلديات	برامج خاصة	فقد التنفيذ	35%	75	360	2,058,260,500
21	تطوير شارع السوق والفروع المؤدية اليه في قضاء الشرقاط	الشرقاط	البلدية والبلديات	برامج خاصة		35%	75		
22	تأهيل شوارع رئيسية رابطة في مدينة تكريت	تكريت	البلدية والبلديات	برامج خاصة	فقد التنفيذ	59%	76	360	3,067,940,000
23	تبليط مع القالب الجانبى للشوارع المتفرقة		البلدية والبلديات	برامج خاصة	فقد التنفيذ	42%	80	300	3,621,721,800
24	تبليط مع الانارة وعمل قالب جانبي في قضاء امرلي	امرلي	البلدية والبلديات	برامج خاصة	فقد التنفيذ	32%	80		
25	تأهيل الشوارع في حي العدل / الطوز	الطوز	البلدية والبلديات	برامج خاصة	فقد التنفيذ	44%	80		
26	إعادة تأهيل طريق الشرقاط - تلؤل الباج بطول 13كم في قضاء الشرقاط	الشرقاط	الطرق والجسور	برامج خاصة	فقد التنفيذ	61%	83	270	1,185,232,000
27	تأهيل وصيانة شارع الدجيل الرئيسي من مركز الحسين الصحي باتجاه السيطرة		البلدية والبلديات	برامج خاصة	فقد التنفيذ	47%	87	270	2,869,366,500
28	تطوير شارع المحيط الممتد من معهد الصم والبكم في دائرة الرعاية — رجال		البلدية والبلديات	برامج خاصة	فقد التنفيذ	0%	92	180	614,525,000
29	قلع وإعادة انشاء طريق المطعم - الاسالة بطول 1200م في ناحية سليمان بيك		البلدية والبلديات	برامج خاصة	فقد التنفيذ	49%	100	330	1,877,690,000
30	تأهيل المدخل الرئيسي لناحية سليمان بيك مع شارع مركز الشباب في ناحية سليمان بيك		البلدية والبلديات	برامج خاصة	فقد التنفيذ	49%	100		
31	قلع وإعادة انشاء طريق الاسالة — خاصة دارلي بطول 1500م في ناحية سليمان بيك		البلدية والبلديات	برامج خاصة	فقد التنفيذ	49%	100		
32	تبليط الشوارع الشريانية امام اعدادية الطوز للبنين ومركز شرطة الطوز	الطوز	البلدية والبلديات	برامج خاصة	فقد التنفيذ	49%	100		
33	تأهيل شارع 60 في تكريت	تكريت	البلدية والبلديات	برامج خاصة	فقد التنفيذ	38%	110	240	4,612,480,000
34	تأهيل شارع الزهور في تكريت	تكريت	البلدية والبلديات	برامج خاصة	فقد التنفيذ	38%	110		
35	شارع الانشائية في تكريت	تكريت	البلدية والبلديات	برامج خاصة	فقد التنفيذ	38%	110		

مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 - محافظة صلاح الدين

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلية	كلفة العقد الأصلي
36	تأهيل الشارع الرئيسي من سيطرة 14 الى فلكة الشهيد عبد الله جبارة بطول 3400م		البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	35%	113	240	2021-11-25	2,644,500,000
37	صيانة وتأهيل مدخل ناحية دجلة		البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	68%	116	360	2021-11-02	2,579,635,000
38	تأهيل طريق الشيخ هلوب في ناحية الاسحافي بطول 6كم		الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	50%	116			
39	إعادة انشاء بوابة المدخل الجنوبي وإعادة انشاء بوابة المدخل الشمالي		البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	50%	120	300		1,149,200,000
40	إعادة بناء قسم شرطة الدور	الدور	الداخلية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	45%	124	330		1,799,999,500
41	تبليط شوارع داخلية في ناحية دجلة (البو جرن)		البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	65%	129	240	2021-11-11	1,189,395,000
42	اكساء المقاطع المتضررة لطريق تكريت - سامراء بطول 3كم	تكريت	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	65%	129			
43	صيانة واكساء الطريق الرئيسي لمنطقة عوينات والطرق الفرعية الداخلية للقرية		البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	65%	129			
44	صيانة واكساء طريق ابو دلي وانشاء 500 م ط في القرية		البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	65%	129			
45	صيانة المقاطع المتضررة من طريق ناحية الشيخ جميل (المدخل الجنوبي)		الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	65%	129			
46	إعادة انشاء طرق داخلية فرعية لحي العباس الزراعي في مدينة بلد	بلد	البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	65%	129			
47	مد خط ناقل لتغذية الجبيرية / مد شبكات متفرقة في ناحية دجلة / مدشبكات متفرقة في ناحية المعصم		الماء	برامج خاصة	قيد التنفيذ	89%	138	210		906,700,000
48	تأهيل الشوارع في قرية السادة		البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	139	180		1,491,000,000
49	تبليط الشوارع في منطقة عرب الكبيرة الأيمن		البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	139			
50	تبليط الشوارع في منطقة عرب الكبيرة الأيسر		البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	139			
51	تأهيل الشوارع في منطقة ابو ضايح الكراعات		البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	139			
52	تأهيل الشوارع في منطقة البقشو		البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	139			
53	تأهيل الشوارع في منطقة ابو دوري		البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	139			
54	تأهيل شارع 60 في حي الديوم في تكريت /	تكريت	البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	34%	167	240		3,381,900,000
55	تبليط الشوارع الواقعة في حي كوماري في الطوز		البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	34%	167			
56	إعادة تأهيل شارع مستشفى صلاح الدين		البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	21%	177	270		1,488,380,000
57	تطوير الشارع الحولي في قضاء الدور	الدور	البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	20%	182	300		2,601,005,000
58	تجهيز وتأهيل مختبرات جامعة تكريت	تكريت	التعليم العالي	برامج خاصة	قيد التنفيذ	0%	187	360		4,333,601,833
59	إعادة انشاء الطريق الرابط بين قرية عين حياوي وقرية سيحة عثمان بطول 6كم		الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	65%	222	150		666,000,000
60	إعادة انشاء مكتبة الدري /الدور	الدور	مباني حكومية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	2.0%	245	330		643,225,000
61	تأهيل شوارع في قرية التقدم في قضاء بيجي بطول (7)كم وعرض (10)م	بيجي	البلدية و البلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	13%	249	180		2,558,750,000
62	هدم وإعادة بناء مركز ماء الدور	الدور	الماء	برامج خاصة	قيد المباشرة	0%	258	240		474,270,000
63	هدم وإعادة بناء مديرية كهرباء الدور مع المحطة /الدور	الدور	الكهرباء	برامج خاصة	قيد التنفيذ	10%	261	360		952,228,000
64	تجهيز ومد شبكات ماء في عموم محافظة صلاح الدين	عموم المحافظة	الكهرباء	برامج خاصة	قيد التنفيذ	85%	390	120		650,000,000
65	اعمال صيانة وانشاء طريق مقبرة اسديرة وسطى وصيانة مقاطع متضررة من الطريق الرابط بين قرية عوجيلة ومعمل غاز الرشيد وطريق مقبرة اسديرة سفلى	الشرقاط	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	5%	388	180		690,125,000
66	تأهيل طرق متفرقة في قرية علي الدلس في قضاء الدجيل بطول 1.5 كم	الدجيل		برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				193,800,000
67	تأهيل طرق داخلية في قرية الجمهورية الاولى الدجيل بطول 2 كم	الدجيل		برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				240,000,000
68	مد خط ناقل لتغذية منطقة هونداي / جنوب بيجي	بيجي		برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,300,000
69	اعادة تأهيل وتحويل مسار انبوب ماء مدخل سامراء القلعة	سامراء		برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				248,416,000
70	صيانة و اكساء الطريق الرئيسي قرية المسحك بطول 3.5 كم	الشرقاط		برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				238,000,000
71	صيانة و اكساء الطريق الرئيسي من من دار المواطن دخيل العلي الى شمال قرية المسحك بطول 2,5 كم	الشرقاط		برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,500,000

مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 / محافظة كركوك

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تاهيل الطريق الرابط بين طريق كركوك تكريت وقرية غيدة مروراً بقرى تل خديجة – طار الحمر – السعيدى بطول 32كم	الحوبيجة	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	31%	145	360	23/11/2021	3,677,200,000
2	تاهيل طريق كركوك - تكريت	الحوبيجة	الطرق والجسور	استثماري	قيد المباشرة		233	210		1,753,200,000
3	إعادة انشاء مدرسة العلا 12 صف / قضاء الحويجة	الحوبيجة	التربية	استثماري	قيد المباشرة		286	270		727,596,500
4	تاهيل الشوارع المتضررة في ناحية العباسي / كركوك	العباسي	البلدية والبلديات	استثماري	قيد المباشرة	10%	287	300		1,314,500,000
5	انشاء مدرسة الخازر 12 صف / ناحية الزاب في قضاء الحويجة	الحوبيجة	التربية	استثماري	قيد المباشرة		383	300		728,420,000
6	تاهيل وصيانة الشوارع في قرى / الخالدية ، الخبازة ، الخازر ، عتيرة ، العنادية ، العون ، الثيلة ، حلوة الوسطى ، العرام ، الزيتون، قرية سفلى شرقية ، الحويجة	الحوبيجة	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	49%	82	360		3,833,620,000
7	تاهيل الطرق لقرى كرحة غازان ، قرية هلال ، كرحة مرباط ،مراك الجلد ، العراعر ، تالو الفاخرة، الذيبات ، الخبازة ، بطول 14 كم في ناحية الرياض وناحية الرشاد	الحوبيجة	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	30%	85	300		1,891,200,000
8	تاهيل مسار الشارع الحولي خلف المعهد التقني مع تطور شارع كورنيش حي القادسية في قضاء الحويجة	الحوبيجة	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	63%	95	300	11-04-21	2,629,559,000
9	تاهيل شارع الحي العسكري والشوارع المجاورة مع شبكة المجاري والانتارة في قضاء الحويجة	الحوبيجة	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	69%	96	300	11-01-21	2,996,091,500
10	تجهيز ونصب مجمع ماء عواد المهاوش ومجمع ماء سراي الفضل ومجمع ماء عليوي السعد ومجمع ماء مع تاهيل الابنية في موقع تبة كرة / الرياض	الحوبيجة	الماء	برامج خاصة	قيد التنفيذ	10%	99	300	18-11-21	1,292,140,000
11	تاهيل شارع علوة الفواكه والخضر في قضاء الحويجة مع اعمال المجاري	الحوبيجة	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	20%	101	360	11-07-21	1,326,070,000
12	تاهيل الشوارع المتضررة في مركز ناحية الملتقى شوارع الشهداء- الناحية / المرحلة الاولى	الملتقى	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	45%	118	180	11-09-21	644,955,300
13	إعادة انشاء طريق يؤدي الى قرية يارمجة التابعة لناحية ليلان	الدبس	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	74%	125	150		1,033,425,000
14	تاهيل طريق الصالحي بطول 2كم	الدبس	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	74%	125	150		
15	إعادة انشاء طريق الكيف وقرية سيد طالب / قضاء الدبس	الدبس	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	74%	125	150		
16	تاهيل شارع علوة الأغنام والشوارع المجاورة مع اعمال المجاري والانتارة	الحوبيجة	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	43%	229	300		2,817,825,000

26,665,802,300

مشاريع محافظة ديالى

Diyala Governorate Projects



مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 / محافظة ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلية	كلفة العقد الأصلي
1	تبليط طرق متفرقة في قرّة تبة - جبارة	قرّة تبة	الطرق والجسور	استثماري	منجز	100%	31	180	2021-08-15	1,309,800,000
2	إعادة تاهيل المدخل الشمالي لمدينة جلولاء (مرحلة أولى)	جلولاء	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	75%	89	330	30/9/2021	1,165,475,000
3	إعادة تاهيل شوارع دور نواب الضباط	جلولاء	البلدية والبلديات	استثماري		75%	89			
4	تاهيل شوارع حي السلام الثاني قرب المدرسة الكرفانية	جلولاء	البلدية والبلديات	استثماري		75%	89			
5	تاهيل شوارع في (حي المصطفى -الهادي -المظفر-حي الحسين-حي البندر-حي النور-مدخل الخالص) قضاء الخالص	الخالص	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	90%	137	180	15/11/2021	1,075,730,000
6	توسيع طريق المنصورية-سراجق مروراً بقرى (العور -الابتير-ابراهيم الشيخ علي) بطول 6.5 كم	الخالص	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	84%	164	270	2021-11-25	2,590,250,000
7	تاهيل طرق في جلولاء وقرّة تبة وقرية عمر مندان /جلولاء	خانقين	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	96%	183	180	2021-11-30	699,105,000
8	تاهيل الطريق من بني سعد الى بعقوبة الرئيسي	بعقوبة	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	19%	198	300	2021-12-15	2,780,535,000
9	تاهيل وتحسين الشبكة الكهربائية لناحية بهرز وقراها	بهرز	الكهرباء	استثماري	قيد التنفيذ	25%	202	180	26/12/2021	917,305,000
10	إعادة تاهيل شوارع حي الشهداء المرحلة الأولى	جلولاء	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	62%	214	180	19/12/2021	1,590,000,000
11	تاهيل وتطوير الجزء الشمالي من جسر تقاطع القدس	بعقوبة	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	9%	234	300	2022-01-26	4,341,400,000
12	تجهيز ونصب مجمع ماء سعة 200 م3 ساعة مع خط ناقل لقرية العزية داخل مشروع ماء الشهيد غازي	بلدروز	الماء	استثماري		16%	237	330		1,951,965,000
13	تاهيل مشروع ماء قرّة تبة	قرّة تبة	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	40%	255	330	01-03-22	3,468,000,000
14	تاهيل طريق قرى التحويلة في الخالص / تاهيل طريق البو زوين / تاهيل طريق البوثنيني	الخالص	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	55%	257	180	2022-01-16	545,280,000
15	هدم الجزء المتضرر واكمال المركز الصحي في داود السالم		الصحة	استثماري		14%	268	330		1,128,290,000
16	تبليط الطرق الريفية في قضاء بعقوبة وقراها بطول 7 كم مع تبليط قرية ابو عاكولة وحد مكسر وسيببانة بطول 3 كم وبواقع 1 كم لكل قرية	بعقوبة	الطرق والجسور	استثماري		75%	270	180	2022-01-23	1,350,115,000
17	تاهيل طرق في قضاء بعقوبة بطول 4.5 كم	بعقوبة	الطرق والجسور	استثماري		75%	270			
18	تاهيل شوارع في حي الربيع / المرحلة الثانية / السعدية	السعدية	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	45%	275	360	2022-01-16	2,396,440,000
19	تاهيل شوارع العنكية /جلولاء	جلولاء	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	44%	276	210	2022-01-13	1,745,000,000
20	تبليط بيت كشكول بطول 2.75 كم	بهرز	الطرق والجسور	استثماري		35%	278	180	2022-01-20	498,000,000
21	تبليط طريق ابو خميس – جنوب ناحية بهرز	بهرز	الطرق والجسور	استثماري		35%	278			
22	صيانة واكساء طريق الناي	العظيم	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	5%	279	210	2022-01-16	1,381,600,000
23	تاهيل طرق قرى (المرفوع الكبير – منصورية الجبل – كشكين – السلام – دوخلة – سيف سعد – هبيب)	الخالص / هبيب	الطرق والجسور	استثماري		83%	281	180	2022-02-03	895,590,000
24	تبليط طرق ريفية في ناحية جديدة الشط	الخالص / جديدة الشط	الطرق والجسور	استثماري		83%	281			
25	تاهيل قرى امام عسكر والندی في قضاء بلدروز وقرى مياح وبدينة في قضاء المقدادية وطرق ريفية متفرقة في قضائي بلدروز والمقدادية	بلدروز	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	50%	288	210	2021-01-18	2,276,650,000
26	اعادة تاهيل شوارع حي العروبة / جلولاء / المرحلة الثانية	جلولاء	البلدية والبلديات	استثماري		40%	292	240	17/1/2022	2,698,500,000
27	تاهيل وتوسيع من تقاطع القدس باتجاه تقاطع السادة	بعقوبة	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	30%	293	300	2021-01-12	3,344,474,000
28	انشاء طرق متفرقة في ناحية كنعان طرق منطقة شمر – صوكو بطول 9 كم	كنعان	الطرق والجسور	استثماري		35%	298	150	2022-02-08	869,200,000
29	انشاء الممر الثاني تقاطع قرّة تبة – جبارة باتجاه مركز ناحية قرّة تبة	قرّة تبة	الطرق والجسور	استثماري		15%	300	270	2022-01-17	4,375,400,000
30	اعادة تاهيل شوارع حي السلام الاول / مرحلة اولى / جلولاء	جلولاء	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	35%	350	1930	2022-01-24	3,069,500,000

مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 - محافظة ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلية	كلفة العقد الأصلي
31	تبليط قرى بلدروز والدائنية والدهلكية والندى		الطرق والجسور	استثماري		10%	362	210	2021-01-08	1,994,250,000
32	تجهيز ونصب مجمع ماء سعة 100 م3إساعة لقرية الإصلاح / ناحية جولاء	جولاء	الماء	استثماري		24%	371	180		408,115,000
33	انشاء مركز صيانة كشكولات ذات الطابقين		الكهرباء	استثماري		20%	361	240		521,589,000
34	تاهيل شارع الحسينية في التحرير بطول 450 م وعرض 30 م	بعقوبة	البلدية والبلديات	استثماري		0%	341	180		646,000,000
35	تاهيل انارة الطريق العام من الغالبية الى تقاطع القدس	بعقوبة	الكهرباء	استثماري		0%	391	150		825,688,000
36	تاهيل طرق في جولاء وخانقين	خانقين	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	56	300	2021-09-07	3,127,527,200
37	تاهيل شوارع قرى جولاء سيد جابر وشيخ بابا والحسيني والرابط بين جسر حلوان وخانقين	خانقين	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	56			
38	تاهيل طريق قرية البدعة في كنعان	بعقوبة	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	61	360	2021-09-09	1,710,849,000
39	تاهيل قرى كنعان الريفية	بعقوبة	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	61			
40	تاهيل طريق قرية الناي والعودة والدرائش	الخالص	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	61			
41	تاهيل الطريق الحدودي في قرآنية	بلدروز	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	61			
42	تاهيل الطريق الرابط بين الناي والدوجمة	الخالص/ المقدادية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	70%	62	360	2021-09-09	3,538,558,000
43	تاهيل طرق ريفية وطريق قرية شيخ فلاح في العظيم (2.1)	العظيم	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	70%	62			
44	تاهيل شوارع حي العسكري والعمرانية وسنجية والتوجيهية والكوام والحديد وسويدي وكودان وأخرى	الطرق والجسور	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	70%	62			
45	تاهيل الشارع العام من الفلحة مقابل مركز الشرطة الى سيطرة المنخل باتجاه بغداد ويطول 2100 متر مع انشاء بوابة على الشارع العام لمدخل ناحية السعدية	السعدية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	80%	64	360	2021-09-16	3,025,693,000
46	تاهيل وتبليط شوارع المنطقة الغربية مع خطوط المجاري في ناحية سد العظيم / ديالى	الخالص	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	77%	68	300	15/9/2021	1,719,307,000
47	تاهيل طرق ريفية لقرى البيضاء والساكرة وربيعة وبني كعب ومجمع حميرين وزركوش النادر	السعدية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	75%	72	270	2021-10-04	1,080,000,000
48	تاهيل طريق بروانة الكبيرة وقرية شافراق	المقدادية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	73	270	2021-09-22	1,172,500,000
49	تاهيل شوارع في قضاء الخالص ونواحيها	الخالص	الطرق والجسور	برامج خاصة	منجز	100%	84	150	2021-11-10	433,370,000
50	تاهيل واكساء شوارع حي الربيع في ناحية السعدية	السعدية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	97%	90	210	10-02-21	1,079,300,000
51	إعادة تبليط طرق في ناحية هيبب وقراها بطول 5 كم وقضاء الخالص وقراها بطول 5 كم وناحية جديدة الشط وقراها بطول 5 كم	الخالص	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	98%	91	330	2021-11-10	2,482,580,000
52	إعادة تبليط طرق في قرية الحويش + القصيرين + دوخلة	الخالص	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	98%	91			
53	تبليط طرق في قرية سعدية الشط / قضاء الخالص	الخالص	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	98%	91			
54	إعادة تبليط طرق متفرقة في قرى الأسود الكبير والصغير والبدوانية بطول 2700 متر	الخالص	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	98%	91			
55	تاهيل قرى ريفية في قضائي المقدادية وبلدروز وناحية الوجيهية	المقدادية وبلدروز	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	60%	97	300	2021-10-13	1,722,560,000
56	تاهيل خطوط مجاري بعقوبة	بعقوبة	المجاري	برامج خاصة	قيد التنفيذ	100%	98	150	13/10/2021	697,000,000
57	إعادة تاهيل خط دفع لمجاري مياه الصرف الصحي في العمارات السكنية لشركة ديالى للصناعات الكهربائية	بعقوبة	المجاري	برامج خاصة	قيد التنفيذ	100%	98			
58	تاهيل خطوط مجاري مياه الامطار في حي الكرار/الخالص و منصورية الشط / الخالص	الخالص	المجاري	برامج خاصة	قيد التنفيذ	73%	103	300	14/11/2021	1,043,251,000
59	تاهيل شوارع متفرقة في حي الحسين مع شبكة مجاري مياه الامطار	الخالص	المجاري	برامج خاصة	قيد التنفيذ	73%	103	300	14/11/2021	
60	تبليط قرى قرية ملا عبد بهرز - قرية بيت حرامي - قرية رحيم سلمان - قرية نهر إبراهيم كنعان - تاهيل وترصف الشارع العريض في حي القادسية / ناحية بهرز	بهرز	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	82%	104	210	2021-10-23	1,501,085,000

مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 - محافظة ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
61	تاهيل قرية الحي العسكري الثاني حي الضبع في حد مكسور بطول (2كم) ناحية العبارة وتبليط (200 م) شارع بيت درجال و(200 م) شارع بني لام و(200 م) شارع حريث في قرية السلام و(150 م)شارع المشائل في قرية الشاكين وتبليط شوارع في قرية البوعينة بطول (1كم) وحي الصادي الثانية (150 م) وقرية الحد الأخضر بطول (500 م) وقرية عبد الحميد بطول (600 م) والاحمر بطول (500 م) والعطشانة بطول (500 م)	بعقوبة	الطرق والجسور	برامج خاصة	منجز	100%	107	120	2021-11-10	577,400,000
62	تاهيل واكمل شارع الحد الفاصل بين حي المعلمين والحي العسكري في الكاطون / تنفيذ شبكة مجاري مياه الامطار في الشارع الفاصل بين منطقة حي المعلمين وحي البرموك/بعقوبة / انشاء بني تحتية للاتصالات في شارع الحد الفاصل بين حي المعلمين والحي العسكري في الكاطون	بعقوبة	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	70%	109	360	15/11/2021	2,542,312,000
63	تاهيل الطرق من بلدروز الى كنعان وتاهيل طرق ريفية في قضاء بلدروز ونواحيها	بلدروز	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	52%	111	360	2021-10-26	4,190,120,000
64	تاهيل طرق في ناحية ابي صيدا والوجيهية والمقدادية	ابو صيدا	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	70%	121	180	2021-11-24	651,600,000
65	تاهيل مدخل الزهيرات السابك الثاني	المقدادية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	6%	122	300	2021-11-25	1,108,104,000
66	تاهيل طرق ومجاري في بلدروز ومنذلي / تاهيل شوارع متفرقة في منذلي / تنفيذ مجاري الامطار في حي الحسين (تكملة) وكسبرات	بلدروز + منذلي	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	92%	134	270	11-01-21	1,749,654,000
67	تاهيل مدخل الهويدر	بعقوبة	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	67%	135	240	2021-11-14	824,100,000
68	تبليط طرق في الخالص وقرها	الخالص	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	44%	136	180	2021-11-16	731,700,000
69	تبليط طرق في ناحية العظيم	الخالص	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	44%	136			
70	صيانة واكساء طريق زنبور /قضاء الخالص	الخالص	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	44%	136			
71	تبليط طرق السدة-نوفل -الخمس جسور وامام طالب الفاروق وجزيرة محطة البيات في المقدادية	المقدادية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	100%	147	210	2021-11-11	956,250,000
72	تاهيل شوارع الكاطون وجرف الملح للشوارع الرئيسية التي لاتقل اعراضها عن 15 م / الكاطون	بعقوبة	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	90%	148	160	11-10-21	646,000,000
73	إعادة تاهيل طرق في العبارة (قرية زهرة – قرية زاغينة – قرية ركة حجي سهيل	بعقوبة	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	94%	165	240	2021-11-17	1,562,740,000
74	إعادة تاهيل طرق ريفية في بعقوبة (قرية جبينات دربونة بيت حمادة والسوامة الثانية منطقة الزراعة الثانية	بعقوبة	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	94%	165			
75	إعادة تاهيل طرق ريفية في بني سعد (قرية داود السالم وقرية خديدان)	بني سعد	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	94%	165			
76	إعادة تاهيل طرق في قضاء بعقوبة (قرية التاميم –قرية بدعة –قرية المرادية –قرية الرسول) -بني سعد بطول 4.5 كم	بعقوبة	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	94%	165			
77	إعادة تاهيل طرق متفرقة ريفية في ناحية الجديدة	الخالص	الطرق والجسور	برامج خاصة	منجز	100%	170	180	2021-11-24	495,670,000
78	إعادة تاهيل قرى ناحية جديدة الشط في الخالص	الخالص	الطرق والجسور	برامج خاصة	منجز	100%	170			
79	إعادة تبليط طرق في العزية وبركنية وكرز الدين	المقدادية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	70%	173	180	2021-12-01	651,750,000
80	صيانة وتاهيل طريق تقاطع المطار باتجاه دلي عباس بطول 20 كم من المحطة (0+20) الى المحطة (0+40)	بعقوبة	الطرق والجسور	برامج خاصة	متوقف بانتظار صدور امر غيار رقم 1	0%	226	270	2022-01-11	2,182,000,000
81	تاهيل وتبليط طرق في (نارين – عليان – الاخوة – شلال – شيخ حمدي – المشايخ – دجاج – بني ويس) في خانقين	خانقين	الطرق والجسور	برامج خاصة		45%	236	240	2021-12-22	1,679,760,000
82	تبليط الطريق الرابط بين ديالى وصالح الدين – ناحية العظيم	العظيم	الطرق والجسور	برامج خاصة		15%	239	240	2021-12-23	1,646,486,000
83	تاهيل شبكة مجاري مياه الامطار في مناطق (الزيتون والنور والسلام) مع تاهيل خط ناقل في السعدية	السعدية	المجاري	برامج خاصة		70%	243	300		1,702,833,000
84	تاهيل طرق قرى الدومجة بطول 2 كم والزركانية بطول 2 كم والمحمودية بطول 1.5 كم / الخالص	الخالص	الطرق والجسور	برامج خاصة		50%	263	180	2022-01-11	526,900,000
85	اكمل المرحلة الثانية لصالة العمليات في مستشفى خانقين العام	خانقين	الصحة	برامج خاصة		0%	271	180		515,352,000
86	هدم وإعادة انشاء بناية جهاز الامن الوطني	بعقوبة	مباني حكومية	برامج خاصة		5%	169	300		785,336,000
87	تاهيل طرق متفرقة ريفية في قضاء الخالص	الخالص	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				248,080,000
88	أعادة انشاء طرق متفرقة في ناحية ههب	الخالص	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				248,080,000
89	تاهيل طرق المشاهدة و خليل داوي و مدخل كلية القانون في بعقوبة	بعقوبة	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				247,400,000
90	تاهيل طريق مرجانة في جلولاء	خانقين	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				240,000,000

مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 - محافظة ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
91	تأهيل طريق دور المعسكر في جلولاء	خاتقين	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				240,000,000
92	تبليط طريق قرية علي سراي في قره تبة	قره تبة	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				240,300,000
93	تأهيل طرق متفرقة في مندلي و قرانية	بلدروز	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				248,810,000
94	تنفيذ شبكات ماء قطر 110 ملم في قضاء بعقوبة و نواحيه	بعقوبة	ماء ومجاري	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				215,750,000
95	أكمال محطة 108 من فرع الرعاية الصحية باتجاه الأسواق	بعقوبة	البلدية	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				171,457,500
96	تأهيل الازقة محطة 106 (61,66,57,54) // بعقوبة النكية	بعقوبة	البلدية	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				172,278,000
97	طريق قرية عامر الشمري و سيد هاشم	بعقوبة	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				216,463,000
98	تبليط شوارع متفرقة في حي السناجرة ناحية جبارة	كفري	بلدية	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				184,800,000
99	تأهيل قرية عين السبع وقرية كاظم الغيدان	بلدروز	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				248,700,000
100	صيانة و تأهيل 1500 م طريق السندية الرابط بين ديالى - صلاح الدين	الخالص	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				239,500,000
101	اعادة تأهيل قرى متفرقة في ابي صيدا و المقدادية	المقدادية	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,750,000
102	تأهيل طريق قرية الجاغات	خانقين	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				237,400,000
103	تأهيل قرى شفته و مناطق متفرقة في قضاء بعقوبة	بعقوبة	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				248,095,000
104	تاهيل الفروع الداخلية في حي الاسراء	خانقين	البلدية	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				215,640,000
105	تبليط طريق درويش رحمن / هادي حسيب / حسن هادي في قضاء بلدروز و قرية صدر البدعة في ناحية كنعان	بعقوبة	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				249,400,000
106	تبليط قرية المجمعات و منطقة ابو كاظم و بيت خلف و قرية دبش و قرية حجي سعدون و مناطق متفرقة من منطقة العزبة في قضاء بلدروز و منطقة النخل و منطقة المناز و قرية بركنية – قضاء المقدادية	بلدروز و المقدادية	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				247,965,000
107	تأهيل مركز شرطة كشكول	خانقين	مراكز شرطة	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				208,769,000
108	اتارة شوارع قرى كشكول الكبير وكشكول الصغير / قره تبة	خانقين	كهرباء	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				216,002,200
109	تأهيل القناطر الصندوقية و المقتربات في سيد جابر و كشكول	المقدادية	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				166,200,000

108,119,732,900

محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

Baghdad Governorate Projects

الانبار



مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 / محافظة بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	صيانة وتبليط طرق شاخة (1 , 2 , 3) ناحية الطليطية	المحمودية	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	92%	45	370	2021-09-05	1,857,000,000
2	صيانة اكساء طريق الشيخ رافع حاتم والطرق المجاورة لها في ناحية المشاهدة بطول 7كم وعرض 5م قضاء الطارمية	الطارمية	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	92%	45	370	2021-09-05	
3	صيانة وتصلح طريق الاسحافي والطرق المجاورة لها في ناحية المشاهدة بطول 7كم وعرض 5م قضاء الطارمية	الطارمية	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	92%	45	370	2021-09-05	
4	تاهيل طرق متفرقة في اليوسفية : 1.اكساء طريق الشارع الاول ويبدأ من بنر الحمام وينتهي بابو حصوة 2. اكساء طريق الشارع الرابع الذي يبدأ من محلات ابو عامر (ثامر الشبلي) الى الشارع الرئيسي وشارع مدرسة الاماني 3.اعادة اكساء الشارع الثاني يبدأ من بنر الحمام باتجاه ابو حصوة 4. تبليط طريق قرية بريسم مقاطعة 2 ابو مفرج بطول 2850م	المحمودية	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	20%	201	240		1,775,345,000
5	اعادة اكساء وتاهيل وتطوير شارع العمارات من جامع الوصي الى تقاطع شارع الربيعي / المحمودية	المحمودية	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	20%	201	240		
6	تبليط شوارع متفرقة في قضاء المحمودية (شوارع حي النور - حي الوصي - الشوارع الخدمية للمدخل الشمالي والجنوبي)	المحمودية	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	30%	211	270		3,056,895,000
7	اعادة اكساء وتبليط شوارع متفرقة في قضاء المحمودية (شوارع حي الربيعي قطعة 35 مق 36 ابو الشمع , شوارع حي الربيعي خلف مركز الشرطة - الشارع المجاور لمحطة الوقود	المحمودية	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	30%	211	270		
8	تاهيل طرق متفرقة في اليوسفية :1. تبليط طريق هادي حسن الحميري بطول 1,5كم الجاون الجنوبي / 2.تبليط طرق الشيخ شهاب احمد شلال بطول 1800م الحركاوي الجنوبي/3.تاهيل تبليط طريق قرية الشريقات بطول 2كم مقاطعة الحركاوي الشمالي/ 4.تاهيل وتبليط الطريق الرابط بين مدرسة الجنودل وقرية عرب داود	المحمودية	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	20%	218	300		2,356,600,000
9	اكساء الطريق الرابط بين حي الشهداء والطاقة الروسية والمار بعشيرة كراغول بطول 22.8 كم وعرض 6 م / اليوسفية	المحمودية	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	20%	218	240		
10	تبليط شوارع حي الداخلية في ابو غريب	ابي غريب	الطرق والجسور	استثماري	منجز	100%	220	180	2021-08-12	1,578,200,000
11	تبليط طريق قرية (الصفير) بطول (2000)م وعرض (5)م في ناحية النصر والسلام	ابي غريب	الطرق والجسور	استثماري	منجز	100%	220	180	2021-08-12	
12	تبليط طريق قرية (البو عيسى الجطل) احمد عواد جطل بطول (2000)م وعرض (5)م في ناحية النصر والسلام	ابي غريب	الطرق والجسور	استثماري	منجز	100%	220	180	2021-08-12	
13	تبليط طريق قرية (محمد الشهوان) بطول (2000)م وعرض (5)م في ناحية النصر والسلام	ابي غريب	الطرق والجسور	استثماري	منجز	100%	220	180	2021-08-12	
14	اعادة تاهيل شارع لاحج السكان منطقة ديلبية بطول 1000م	ابي غريب	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	25%	221	240		2,569,400,000
15	اعادة تاهيل شارع عباس الحتروش /منطقة دويلبية	ابي غريب	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	25%	221	240		
16	اعادة تاهيل مجموعة طرق في منطقة ابو علوان والحلايسة ومنطقة ابو وسام اليساري / ناحية عركوف بطول 5000م	ابي غريب	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	25%	221	240		
17	اعادة تاهيل الشوارع الداخلية منطقة الشعار بطول 3600م	ابي غريب	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	25%	221	240		
18	اعادة تاهيل الشوارع الداخلية منطقة الزيدان بطول (6700)م	ابي غريب	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	25%	221	240		
19	اعادة تاهيل الشوارع الداخلية منطقة الحمدانية /الشيخ صالح المحل	ابي غريب	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	25%	221	240		
20	تبليط طرق العنازي والمحامدة والبكر والحدباء وتاهيل شوارع واحد اذار والريان والمنسية والصديق والمهندسين وغواص / ابو غريب	ابي غريب	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	10%	247	300		2,867,475,000
21	اعادة تبليط الجزء المتبقي من شوارع حي المرتضى للطرق المشيدة على القطع (10/4 و 11/4 و 12/4 و 13/4 و 14/4) والواقعة ضمن حدود بلدية المحمودية	المحمودية	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	25%	250	300		1,458,000,000
22	اكساء طريق قرية الغرات بطول (2)كم	المحمودية	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	15%	259	240		747,520,000

مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 - محافظة بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
23	اعادة اكساء الطريق الرابط بين حي الشهداء والطاقة الروسية والمار بعشيرة البو مفرج والكرابلة بطول 2كم	المحمودية	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	15%	259	240		
24	اعادة تاهيل وتشغيل مجمع ماء سعة 3م50/س في قرية الفرات مقاطعة الحركاوي الشمال ناحية اليوسقية	المحمودية	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	15%	259	240		
25	استبدال خط ناقل مجمع ماء الجميلاطية الجنوبي سعة 3م200/ساعة ناحية اليوسقية	المحمودية	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	15%	259	240		
26	قلع واعادة اكساء وانشاء قالب جانبي للطريق الحولي الاول لقرية الحرية وتاهيل الجزيرة الوسطية وفرشها بالمقرنص واعادة اكساء بعض الشوارع المتضررة داخل القرية	المدائن	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	35%	262	180		868,550,000
27	قشط واعادة اكساء وتطوير مدخل قرية 9 نيسان وشوارع السوق في قرية 9 نيسان	المدائن	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	35%	262	180		
28	معالجة التآكلات الحاصلة في ضفاف ايسر نهر الفرات في الرضوانية الغربية - مناطق (ركان الفليح) و (البطي و الدرنج) بطول 1500 م	ابي غريب	الموارد المائية	استثماري	قيد التنفيذ	20%	273	330		4,348,686,000
29	تبليط شوارع (محمد زوبع وفايز مظهر ووسام محمد ورعد سلطان ، شوارع قرية الجوادين ابو حسين الدفاعي ،شارع عباس حسن وسليم ربيش ومهدي الداود ، شارع العريقية ، شارع منعم عبد الله الهميص والشيخ سنان الرديني والحاج مطشر / ناحية الجسر بطول 7000 م	المدائن	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	63%	277	180		819,000,000
30	تبليط طريق فحيل ام الجبر النحالات في ناحية اللطيفية بطول 3 كم	المحمودية	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	95%	284	150		279,900,000
31	تنفيذ خط ناقل الى مناطق البو خليفة والبو عبيد والبو صباح وفهد الفاضل / التاجي	التاجي	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	75%	290			2,027,275,000
32	تاهيل واعادة اكساء المناطق التالية (منطقة رجاو / منطقة عتاب /منطقة عكيل / منطقة الجوادين / منطقة قرب التقاطع / المنطقة النفطية) والطرق المجاورة لها في قضاء المدائن	المدائن	الطرق والجسور	استثماري	منجز	100%	297			1,476,300,000
33	تاهيل الخط الناقل للماء في عرب كاموس / النصر والسلام	ابي غريب	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	91%	308			1,545,218,000
34	استبدال خط ناقل وشبكات ماء (خربايات الخيول وعكيل والخزرج وخربايات الشمالية الى مقفس تموز والاسببست من جسر الزيتون الى جسر السكراب / ناحية عركوف	ابي غريب	الماء	استثماري	قيد التنفيذ	91%	316			3,734,330,250
35	هدم واعادة بناء مدرسة الرباب ابن امرو القيس 12 صف / المدائن	المحمودية	التربية	استثماري		0%	392	300		871,308,900
36	اعمال تطوير المحلة 312	الاعظمية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	65%	15	240	2021-07-22	4,710,025,000
37	اعمال تطوير محلة 314	الاعظمية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	65%	15	240	2021-07-22	
38	اعمال تطوير شارع الضباط	الاعظمية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	65%	15	240	2021-07-22	
39	اعمال تطوير محلة 316	الاعظمية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	60%	16	300	2021-07-22	4,394,345,000
40	اعمال تطوير مناطق متضررة والمتفرقة في شارع عمر بن عبد العزيز من ساحة عنتر لغاية شارع 29 الباخرة	الاعظمية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	60%	16	300	2021-07-22	3,854,345,000
41	اعمال تطوير شارع الامام الاعظم من ساحة عنتر الى جسر الصرافية	الاعظمية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	60%	16	300	2021-07-22	
42	تطوير شارع ابي طالب من تقاطع النداء الى قناة الجيش	الاعظمية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	60%	17	300	2021-07-22	4,513,075,000
43	تطوير شارع ابي طالب من تقاطع شارع المغرب الى تقاطع النداء	الاعظمية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	60%	17	300	2021-07-22	
44	تطوير شارع ابي طالب من تقاطع شارع المغرب الى كلية الفنون	الاعظمية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	60%	17	300	2021-07-22	
45	اعمال تطوير شارع المشاتل	الاعظمية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	60%	17	300	2021-07-22	

مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 - محافظة بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
46	تاهيل بناية التسجيل العقاري	ابي غريب	مباني حكومية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	60%	22	360	2021-07-28	2,857,160,000
47	تاهيل بناية البطاقة الموحدة	ابي غريب	الداخلية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	55%	22	360	2021-07-28	
48	تاهيل بناية القسم البلدي لقاطع الشهداء	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	55%	22	360	2021-07-28	
49	تاهيل بناية مركز شرطة ابي غريب	ابي غريب	الداخلية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	55%	22	360	2021-07-28	
50	تاهيل شارع خرنابات الرئيسي الموازي لجدول النهر السابيد الثاني	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	23	300	2021-08-24	3,932,815,000
51	تطوير شوارع في خان ضاري بطول 2,3 كم (شارع 40 والشارع الحولي)	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	23	300	2021-08-24	
52	تطوير شوارع الرضوان بطول 1,5 كم و تغذية الانارة	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	23	300	2021-08-24	
53	تاهيل شارع الكراج السابيد الثاني	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	25	240	2021-08-24	3,021,204,000
54	مد شبكة تصريف مياه الامطار وتاهيل محطة الزهور	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	25	240	2021-08-24	
55	تاهيل وتبليط وتأثيث شارع 30 في حي المهندسين باتجاهين والشوارع المؤدية اليه	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	25	240	2021-08-24	
56	تأهيل السياج الواقى لطريق ابراهيم بن علي ناحية عكرکوف	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	25	240	2021-08-24	
57	تطوير شارع 30 مركز المدينة بطول 5,3 كم في ناحية النصر والسلام	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	80%	27	240	2021-08-26	4,789,230,000
58	تاهيل وتأثيث طريق ابي غريب - الشعلة ناحية عقرقوف	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	49	180	2021-09-05	2,256,800,000
59	تاهيل وتأثيث طريق الشعلة في ناحية ابراهيم بن علي ناحية عقرقوف طول 18كم	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	60	180	2021-09-05	2,452,200,000
60	انارة منطقة الاعظمية والمناطق المجاورة لها	الاعظمية	الكهرباء	برامج خاصة	قيد التنفيذ	60%	86	240	2021-09-29	2,771,170,000
61	تاهيل مجموعة شوارع في حي عويسات حطين - مربع مدرسة العدالة - المنسية - الرسالة - حي الصديق - الصحفيين - الدور الحمر	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	75%	88	360	2021-09-25	3,999,100,000
62	تاهيل واكساء شوارع - اكساء مجموعة شوارع ضمن مناطق النصر والسلام منطقة الاولى - مناطق 2000 و3000 و4000 و6000 بطول 32كم	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	94	360	2021-09-25	4,228,600,000
63	تبليط شوارع حي الفارس بطول كلي 1200م	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	94	360	2021-09-25	
64	تبليط شارع الزيدان بطول كلي 4000م	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	94	360	2021-09-25	
65	تبليط شارع سوق السعدان ابتداءً من تقاطع السعدان الى مدرسة الخزرف بطول كلي 2كم	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	94	360	2021-09-25	

مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 - محافظة بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
66	تبليط شارع مدرسة السراة من مدرسة السراة الى جامع اولي العزم بطول 2كم	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	94	360	2021-09-25	
67	تبليط شارع منطقة الطويل ابتداء من منطقة الشمال الى تقاطع السعدان بطول 2كم	ابي غريب	البلدية والبلديات	برامج خاصة	منجز	100%	94	360	2021-09-25	
68	تأهيل طرق متعددة في اليوسفية (طريق مدرسة الهداية بطول 900م الحركاوي الشمالي / طريق قرية حامد احمد صالح بطول 2150 م الجمبلاطية الجنوبية/ طريق هيثم مبدل قياض بطول 400م مقاطعة 18 الحركاوي الشمالي/ طريق قرية ابراهيم الخليل بطول 2650م الرضوانية الشرقية مقاطعة 15/ الطريق الرابط بين جاكع ابو واوي وصدر اللطيفية القديم والجديد بطول 900م/ اعادة اكساء طريق شببشة الرابط بين طريق اليوسفية كراغول وطريق شركة القعقاع بطول 5400 م	المحمودية	الطرق والجسور	برامج خاصة	منجز	100%	119	210	2021-10-24	991,600,000
69	تصليح واكساء طريق قرية عشمه بطول (9000)م وعرض (5)م ضمن قضاء الطارمية	الطارمية	الطرق والجسور	برامج خاصة	منجز	100%	150	210	2021-11-11	1,736,800,000
70	تصليح واكساء طرق في قرية نديم الذي تعرض لاعمال ارهابية بطول (7500)م وعرض(4)م	الطارمية	الطرق والجسور	برامج خاصة	منجز	100%	150	210	2021-11-11	
71	مشروع تأهيل وتبليط طرق في ناحية المشاهدة (تأهيل وتبليط طرق في قرية ابو خميس مع الدور والطرق القريبة منها بطول 3,5كم - تأهيل وتبليط الطريق الرئيسي المؤدي الى قرية محمود الجاسم بطول 1كم - تأهيل وتبليط الطرق المؤدية الى الدور السكنية لقرية محمود الجاسم بطول 1,5 كم)	الطارمية	الطرق والجسور	برامج خاصة	منجز	100%	150	210	2021-11-11	
72	اعادة تبليط طريق هشام السهيل بطول (1000)م – ناحية عكر كوف	ابي غريب	الطرق والجسور	برامج خاصة	منجز	100%	154	180	2021-11-13	886,250,000
73	اعادة تبليط طريق صالح العلواني بطول (1000)م وعرض (5)م في ناحية النصر والسلام	ابي غريب	الطرق والجسور	برامج خاصة	منجز	100%	154	180	2021-11-13	
74	اعادة تبليط الشوارع الرئيسية في (قرية الذهب الابيض – حي اشبيلية – باب الحارة)	ابي غريب	الطرق والجسور	برامج خاصة	منجز	100%	154	180	2021-11-13	
75	اعادة تبليط طريق سامي الدخيل(الجزء الرابط) منطقة ابو علوان بطول (700)م وعرض (5)م	ابي غريب	الطرق والجسور	برامج خاصة	منجز	100%	154	180	2021-11-13	
76	اعادة تبليط طريق عودة الرحال منطقة الشبيحة بطول (700)م وعرض(4)م	ابي غريب	الطرق والجسور	برامج خاصة	منجز	100%	154	180	2021-11-13	
77	اعادة تبليط طريق السياقية الاولى من السور الى قرية الامين والسمره وقرية 1 اذار (قرية الصايون وسيد رعد وقرية ابو درع)	المحمودية	الطرق والجسور	برامج خاصة	منجز	100%	155	180	2021-11-14	939,000,000
78	قلع واعادة تبليط ومد انبوب يصب في المبرز الرئيسي -مع عمل منهولات لتصريف مياه الامطر في قرية عواد الحسين ضمن مقاطعة (12) ضبايعي بطول (12000)م وعرض (6)م	التاجي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	60%	157	360	2021-11-30	3,519,400,000
79	تبليط اطراف جرف الملح مقابل معسكر التاجي التابعة الى مديرية ناحية الحماميات بطول 5000م وعرض 5م	التاجي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	93%	159	240	2021-11-20	1,667,250,000
80	تبليط قرية شاطيء التاجي ومنطقة ابو شاوي والطرايلة بطول 10000م وعرض 5م ضمن ناحية الحماميات	التاجي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	90%	159	240	2021-11-20	1,668,000,000
81	تبليط الطرق الفرعية للسياقية الاولى والسياقية الثانية بطول 10,500م وعرض 4م ناحية الرشيد	المحمودية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	66%	161	210	2021-11-16	1,128,750,000
82	اعادة تبليط طرق متفرقة في منطقة التويثة والقرى المجاورة لها - ناحية الجسر	المدائن	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	55%	162	240	2021-11-25	2,136,400,000
83	اعادة تبليط قرى نزار وهيب وحيدر عليوي وكريم جابر رشيد وشاخة 5 وحجي ناصر وحسين حمادي وخضير عباس والمولى ونوري تخيمة وحسين علي شكر واليو جناء والعكيدات وابو عباس ناحية الوحدة	المدائن	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	55%	162	240	2021-11-25	
84	اعادة تبليط مناطق كل من حي العروبة وحي الزلك (الامير) والطرق المجاورة	المدائن	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	80%	163	270	2021-11-25	3,063,000,000
85	اعادة تبليط شوارع في منطقة سيد علي والكراغول واطراف قرية محمد الوسمي والطرق المجاورة	المدائن	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	80%	163	270	2021-11-25	

مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 - محافظة بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
86	إعادة تخطيط قرية البو جمل وهادي الحمادي وقرية المعامرة (حقي اسماعيل المعموري) والقرى المجاورة /مركز قضاء المدائن	المدائن	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	80%	163	270	2021-11-25	
87	عادة تخطيط قرية عيسى كاظم نايل -الطيفية- الجسر الخامس شاخة 3 بطول 1,5كم	المحمودية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	65%	180	210	2021-11-28	769,625,000
88	إعادة تخطيط قرية كامل خيري سريهد بطول 1250م في ناحية الرشيد	المحمودية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	65%	180	210	2021-11-28	
89	تخطيط قرية بيت روضان في العوانية وطرق موسى حبيب وطريق علي روكان وطريق علي حمود وطريق زيدون عمران وطريق محمد جاسم العيثاوي /ناحية الرشيد	المحمودية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	65%	180	210	2021-11-28	
90	تاهيل وتخطيط طرق في قضاء الطارمية (على العزاوي + مشعان عرميط) و (الحلابسة البو خادم + البو عبيد) و (الشيخة +زويج) و (اللهيب + العزاز) و (خلف حمادي +خضير الحليوسي) و (المعين + غايب حميد ندا)	الطارمية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	50%	195	270		1,502,000,000
91	هدم وإعادة بناء مدرسة ابو ايوب الانصاري سعة 18 صف / الطارمية	الطارمية	التربية	برامج خاصة	قيد التنفيذ	15%	200	360		1,021,987,000
92	إعادة تاهيل وصيانة الطريق الرابط بين الدولي وقرية خضير شويد مرورا بعدة قرى في صخيرية الغربية قرية عادل الصالح ومدرسة الشاكرين وشمس الماجد وناهض فاضل وال فيحان ناصر السعيد ونجم عبيد وعبد الستار جبر وسعد عيسى وقرية العليانة والطرق المجاورة	المحمودية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	33%	203	240		1,740,000,000
93	تاهيل الخط الناقل منطقة عبد السهر / قضاء ابو غريب / ناحية النصر والسلام	ابي غريب	الماء	برامج خاصة	قيد التنفيذ	82%	210	270	2021-12-05	1,366,015,000
94	تجهيز وتنصيب مجمع ماء سعة 200م3/ساعة قرية عبد الحمد النمر /الطارمية	الطارمية	الماء	برامج خاصة	قيد التنفيذ	80%	213	300		1,740,359,600
95	الخط الناقل المغذي لمنطقة المصالحة والطجاج / التاجي - شبكة ماء قرية المسارة / التاجي - شبكة ماء قرية البو بكر / التاجي - شبكة ماء قرية العزة طريق ليث محمد العزاوي / المشاهدة - الخط المغذي لمنطقة ابو صباح / منطقة البو خليفة 12 ضباعي / التاجي - الخط المغذي لمنطقة البو ربحان / شاطي التاجي - الخط المغذي لمنطقة كريم النجم / التاجي - شبكة ماء ركية وفاضل قطر 110ملم / التاجي	التاجي	الماء	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	224	300	2021-12-15	2,209,690,000
96	انارة طريق مدخل المدائن من فلكة المدائن الى مرقد سلمان المحمدي / قضاء المدائن	المدائن	الكهرباء	برامج خاصة		0%	241	150		882,910,000
97	تجهيز اليات لدوائر جهاز الامن الوطني العراقي في المناطق المحررة		الداخلية	برامج خاصة		0%	336	150		2,349,500,000
98	تطوير تحويلة و غرف لافراد السيطرة في مدخل ابو غريب	ابي غريب	البلدية	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				205,364,000
99	تنفيذ خط ناقل ماء لقرى الطرفة و الرموت و المروح ناحية النصر و السلام	ابي غريب	الماء و المجاري	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				243,420,000
100	تنفيذ خط ناقل و شبكة ماء لقرى الخليفة و العبيد ناحية النصر و السلام	ابي غريب	الماء و المجاري	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				222,065,000
101	تنفيذ خط ناقل و شبكة ماء لقرى الخوصة و الكدير و المشاهدة و الرعيد و الفداغة	ابي غريب	الماء و المجاري	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				236,160,000
102	تصليح واكساء طريق قرية القاضي وليد بطول 2000 م وعرض 4 م	الطارمية	الطرق و الجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				219,340,000
103	تصليح و اكساء طريق الكردي بطول 2000 م و عرض 4م ناحية العبابجي	الطارمية	الطرق و الجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				239,700,000
104	تصليح و اكساء طريق 10- رفيع و طريق الاسالة بطول 2000م و بعرض 4 م ناحية العبابجي	الطارمية	الطرق و الجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				239,700,000

مشاريع محافظة بابل

المسيب

المحاويل

الحلة

الهاشمية



مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 / محافظة بابل

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تاهيل طريق العكير الشاخة (3) بطول 4 كم	كوثى	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	60%	172	180	2022-01-12	684,791,550
2	تاهيل وصيانة شبكات مجاري ومحطات مجمع حطين السكني في الاسكندرية	الاسكندرية	المجاري	استثماري	قيد التنفيذ	90%	186	210	2021-07-12	342,745,000
3	تبليط شوارع حي المواطنين خلف جامع المتقين -	المسيب	البلدية والبلديات	استثماري	قيد التنفيذ	20%	244	180	26/1/2022	748,291,600
4	صيانة طريق اولاد مسلم البيراوي في قضاء المسيب	المسيب	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	4%	244	180	26/1/2022	
5	تبليط شوارع حي الامير في الاسكندرية	الاسكندرية	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	17%	274	240	23/1/2022	3,096,000,000
6	تاهيل طريق البوعوان بطول (13750 م) باعتبار المحطة (00+00) نقطة تقاطع الطريق بطريق بغداد – الحلة مع تنفيذ استدارات نظامية لتنظيم حركة المرور على طريق الحلة – بغداد / استثماري/ محافظة بابل	الاسكندرية	الطرق والجسور	استثماري	قيد التنفيذ	90%	283	210		1,121,300,000
7	صيانة شوارع في حي الاتوار	الاسكندرية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	79%	102	330	13-10-2021	2,439,145,000
8	تبليط شوارع في حي العسكري مع عمل ارصفة جانبية	الاسكندرية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	91%	102	330	13-10-2021	
9	اكساء وتبليط شوارع في حي الانتصار / ناحية الاسكندرية	الاسكندرية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	58%	102	330	13-10-2022	
10	تبليط شوارع في ملحق حي المصطفى /	الاسكندرية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	43%	112	360	17-10-2021	4,124,940,500
11	اكساء الطرق الداخلية في مجمع حطين السكني / ناحية الاسكندرية	الاسكندرية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	81%	112	360	2021-10-17	
12	اعادة تاهيل طريق جنابية الحميري بطول 1,5 كم	كوثى	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	114	300	18-10-2021	3,435,419,250
13	أعادة إنشاء طريق الرابط بين الحميري و ابو شعير	كوثى	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	114	300	18-10-2021	
14	أعادة إنشاء طريق فرع الامام شاخة 4 بطول 3 كم	كوثى	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	114	300	18-10-2021	
15	تاهيل و صيانة طريق سريديب –الطاليع بطول 19,1 كم باعتبار المحطة (0+00) مقتربات مجسر كيش المرور السريع وطريق بطول 1.8 كم باعتبار المحطة (0+00) مقتربات المجسر الفوقاني لتقاطع النيل القديم مع المرور السريع	كوثى	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	90%	114	300	18-10-2021	
16	صيانة طريق قرى الشجيرية – البو داغر – الكلابيين – الزوية – الليلي بطول (8240 م)	الاسكندرية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	115	210	19-10-2021	1,228,948,000
17	تبليط افرع من طريق قرى (الشجيرية – البو داغر – الكلابيين – الزوية – الليلي) بطول (1960 م)	الاسكندرية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	115	210	19-10-2021	
18	تبليط طريق الحصوة الكبير بطول (2) كم	الاسكندرية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	115	210	19-10-2021	
19	تبليط طريق مدرسة ميسلون (ام الحمام بطول 4,700 م)	المسيب	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	50%	117	360	19-10-2021	4,267,702,450
20	تبليط طريق ضياء عبد الزهرة السعداوي بطول 2400م	المسيب	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	117	360	19-10-2021	
21	طريق الشهيد هاشم عدنان وزيد سلمان بطول 2 كم	المسيب	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	98%	117	360	19-10-2021	
22	صيانة طريق قرية 2 بطول 1750 م في ناحية سدة الهندية المنهاوية	المسيب	الطرق والجسور	برامج خاصة	منجز	100%	117	360	19-10-2021	
23	تبليط طريق راشد سهيل الحمداني بطول 3,9 كم/	المسيب	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	92%	117	360	19-10-2021	
24	اكمال تبليط تاهيل شوارع حي الزهراء في مدينة الحامية المفروش بالحصى الخابيط ببطيقة من الاستيلايزر	المسيب	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	117	360	19-10-2021	
25	/تبليط طريق عبد الكاظم عبيد قرية (5) بطول 1,25 كم	المسيب	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	90%	117	360	19-10-2021	
26	تبليط طريق الجانب الايسر من جدول بني حسن بطول 5,5 كم	المسيب	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	98%	117	360	19-10-2021	
27	تبليط طريق ابن الكاظم (الكيلو 10) بطول 1.35 كم	المسيب	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	80%	117	360	19-10-2021	
28	صيانة طريق مدخل كوثى المدخل الاول مقابل قرية الامام بطول 2600م	كوثى	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	99%	126	360	31-10-2021	4,407,093,850
29	اعادة تاهيل طريق الرشيد شاخة 14	كوثى	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	91%	126	360	31-10-2021	
30	اعادة تاهيل طريق قرية الرشيد (13/1) مدرسة الرضوان بطول 850 م	كوثى	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	99%	126	360	31-10-2021	

مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية للموازنة الاتحادية لعام 2021 - محافظة بابل

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
31	اعادة تاهيل طريق الهزيز مدرسة بيان النصر	كوثي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	99%	126	360	31-10-2021	
32	اعادة انشاء طريق منطقة الهلالي شاخة (9)	كوثي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	98%	126	360	31-10-2021	
33	اعادة انشاء طريق مدرسة صوت القرآن شاخة (2) /	كوثي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	99%	126	360	31-10-2021	
34	اعادة تاهيل طريق قرية الحيدري شاخة (3) مدرسة الاعتدال .	كوثي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	99%	126	360	31-10-2021	
35	صيانة طريق الجفجافة المحاذي لنهر الجفجافة بطول 6,5 كم باعتبار المحطة (00+0) الشارع العام من جهة طريق كربلاء المقدسة - بغداد	الاسكندرية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	93%	146	240	24-11-2021	2,853,514,300
36	صيانة طريق قرية تونس بطول 5325 م	الاسكندرية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	95%	146	240	24-11-2021	
37	صيانة طريق الدائرة بطول 7.2 كم وعرض 8م باعتبار المحطة (00+0) الشارع العام من جهة الحصوة	الاسكندرية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	30%	146	240	24-11-2021	
38	اعادة تاهيل طريق قرية سعد محيل البعجي	الاسكندرية	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	43%	146	240	24-11-2021	
39	اعادة انشاء مجمع ماء الجزيرة سعة 200 م3/ ساعة / ناحية الاسكندرية	الاسكندرية	الماء	برامج خاصة	قيد التنفيذ	72%	149	300	15-11-2021	1,702,377,250
40	اعادة تاهيل طريق جنبابية عجرش مدرسة الرحمة	كوثي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	50%	166	300	2021-01-12	2,231,934,800
41	اعادة تاهيل طريق شاخة الشيخ عادل صليبي المعموري	كوثي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	55%	166	300	2021-01-12	
42	اعادة انشاء طريق شاخة مزهر عداي 5/2	كوثي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	55%	166	300	2021-01-12	
43	مشروع تاهيل الطريق الريف الزاهر بطول (1.5) كم	كوثي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	50%	166	300	2021-01-12	
44	اعادة تاهيل طريق الرشيد شاخة 10	كوثي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	50%	166	300	2021-01-12	
45	مجمع ماء مويحة 2	الاسكندرية	الماء	برامج خاصة	قيد التنفيذ	65%	205	270	2021-06-12	1,438,025,500
46	اعادة تاهيل طريق زيدي شاخة 5 /	كوثي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	50%	208	180	27/12/2021	1,075,482,500
47	صيانة مدخل كوئي الثاني المحاذي لمشروع المسيب بطول 3600 م	كوثي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	30%	208	180	27/12/2021	
48	تبليط وتاهيل واكساء الشوارع الداخلية مع الارصفة وتاهيل الحدائق العامة للمجمع السكني التابع لمركز التدريب المهني	الاسكندرية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	21%	235	300	2022-12-01	2,917,500,000
49	اكساء شوارع العمارات الثلاثة وطريق كرفانات فندق الخبراء وتاهيل الجزيرة الوسطية مع الانارة حول مجمع حطين السكني /	الاسكندرية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	49%	238	300	2021-12-19	4,057,625,000
50	تاهيل واكساء الطرق الداخلية لمنطقة الاسكان الصناعي ومد انبوب وانشاء خزان كونكريت مسلح من محطة الرفع في الاسكان الصناعي الى محطة الرفع على طريق الزانرين	الاسكندرية	البلدية والبلديات	برامج خاصة	قيد التنفيذ	54%	238	300	2021-12-19	
51	انشاء طريق الدكتور امين عبد الحسن مانع	المحاولي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	16%	240	240	28/12/2021	952,486,450
52	تاهيل طريق علي العبود - البومراوح بطول 1.6 كم	المحاولي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	5%	240	240	28/12/2021	
53	انشاء طريق قرية ابو منغر - ابو بلاو بطول 550 م (250 م صيانة و 300 م انشاء)	المحاولي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	15%	240	240	28/12/2021	
54	تاهيل طريق خضير صالح عبد الله منطوق البوعنوان في قضاء المحاولي بطول 950 م	المحاولي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	29%	240	240	28/12/2021	
55	انشاء طريق بنة ميري	المحاولي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	43%	240	240	28/12/2021	
56	انشاء طريق السادة النعيم بطول 1500 م	المحاولي	الطرق والجسور	برامج خاصة	قيد التنفيذ	28%	240	240	28/12/2021	
57	تاهيل شبكات الصرف الصحي في مجمع الاسكان الصناعي / الاسكندرية	الاسكندرية	المجاري	برامج خاصة	قيد التنفيذ	70%	269	180	16/1/2022	734,930,000
58	تاهيل محطات مجاري في مجمع الاسكان الصناعي / الاسكندرية	الاسكندرية	المجاري	برامج خاصة	قيد التنفيذ	60%	269	180	16/1/2022	
59	مشروع تاهيل شبكات ومحطات مجاري الامطار في ناحية السدة	الاسكندرية	المجاري	برامج خاصة	قيد التنفيذ	23%	269	180	16/1/2022	
60	تاهيل طريق حسين علاوي بطول 580 م و طريق البوعنوان من جامع الحضرة المحمدية بطول 1 كم	المحاولي	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				140,670,000
61	اعادة انشاء طريق رحيم عبد الصاحب بطول 850 م	المحاولي	الطرق والجسور	برامج خاصة / تنفيذ امانة	منجز	100%				198,692,950

43,860,253,000

مشاريع المنح والقروض التي يعمل الصندوق
كمشرف ومنسق لها



مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي EODP

قرض البنك الدولي الطارئ / الأول M\$350

الملاحظات	المبلغ المتبقي (USD))	المبلغ المصروف (USD))	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص (USD))	القطاع
	2,713,039.16	67,286,960.84	28	28	28	70,000,000.00	الكهرباء
	28,314,737.60	108,685,262.40	35	35	35	137,000,000.00	الطرق والجسور
	12422078.63	49,577,921.37	45	45	45	62,000,000.00	البلديات
	12,971,403.85	15,028,596.15	3	3	3	28,000,000.00	الصحة
	11,906,073.00	93,927.00	0	6	6	12,000,000.00	دائرة المباني
-	29,935,583.00	64,417.00	0	0	14	30,000,000.00	الموارد المائية
	98,262,915.24	240,737,084.76	<u>111</u>	<u>117</u>	<u>131</u>	339,000,000.00	المجموع

قرض البنك الدولي الطارئ / الاضافي M\$400

الملاحظات	المبلغ المتبقي ((USD))	المبلغ المصروف ((USD))	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص ((USD))	القطاع
	48,948,728.17	1051271.83	0	6	20	50,000,000.00	الكهرباء
	107,231,560.11	3768439.89	0	1	24	111,000,000.00	الطرق والجسور
	47,500,000.00	0.00	0	0	12	47,500,000.00	البلديات
	28,000,000.00	0.00	0	0	1	28,000,000.00	الصحة
-	30,000,000.00	0.00	0	6	7	30,000,000.00	الموارد المائية
	5,000,000.00	0.00	0	0	7	5,000,000.00	النقل
	32,000,000.00	0.00	0	0	26	32,000,000.00	التربية والتعليم
	32,000,000.00	0.00	0	0	17	32,000,000.00	الزراعة
	15,916,380.68	4,083,619.32	1	4	8	20,000,000.00	محافظة الانبار / المكون العاشر
	20,000,000.00	0.00	1	7	7	20,000,000.00	محافظة نينوى / المكون العاشر
	9,332,303.00	667697.00	1	4	9	10,000,000.00	محافظة ديالى / المكون العاشر
	10,000,000.00	0	0	0	3	10,000,000.00	محافظة صلاح الدين / المكون العاشر
	385,928,971.96	9,571,028.04	<u>1</u>	<u>28</u>	<u>141</u>	395,500,000.00	<u>المجموع</u>

القرض الالمانى M€500							
الملاحظات	المبلغ المتبقي Euro	المبلغ المصروف Euro	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص / Euro	القطاع
	18,687,570.10	26,312,429.90	4	8	8	45,000,000.00	وزارة الكهرباء المرحلة الأولى
	172,200,454.43	7,799,545.57	0	1	6	180,000,000.00	وزارة الكهرباء المرحلة الثانية
	44,033,554.00	966,446.00	0	4	6	45,000,000.00	وزارة الاعمار والإسكان والاشغال العامة / الطرق والجسور
	45,000,000.00	0	0	0	24	45,000,000.00	وزارة الاعمار والإسكان والاشغال العامة / دائرة المشاريع الممولة خارجيا (الماء والمجاري)
	185,000,000.00	0	0	0	4	185,000,000.00	وزارة الصحة الصحة
-	<u>464,921,578.53</u>	<u>27,278,875.90</u>	<u>2</u>	<u>13</u>	<u>48</u>	<u>500,000,000.00</u>	<u>المجموع</u>

<u>المنحة الكويتية – خاصة لقطاع الصحة / المرحلة الاولى M\$15</u>							
القطاع	المبلغ المخصص (USD))	عدد المشاريع المخطط لها	عدد المشاريع المتعاقد عليها	المنجز	المبلغ المصروف (USD))	المبلغ المتبقي (USD))	الملاحظات
الصحة	15,000,000.00	19	19	0	1,557,755	13,442,245.00	
المجموع	15,000,000.00	<u>19</u>	<u>19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
<u>المنحة الكويتية – خاصة لقطاع الصحة / المرحلة الثانية M\$85</u>							
القطاع	المبلغ المخصص (USD))	عدد المشاريع المخطط لها	عدد المشاريع المتعاقد عليها	المنجز	المبلغ المصروف (USD))	المبلغ المتبقي (USD))	الملاحظات
الصحة	85,000,000.00	36	0	0	0	85,000,000.00	
المجموع	85,000,000.00	<u>36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		

المنحة الصينية / منحة عينية لقطاع البلديات / بمبلغ ستون يوان (9,000,000 \$)

المحافظة	عدد الاليات	أدوات احتياطية	ملاحظات
نينوى	36	105 صندوق أدوات احتياطية	تم تجهيز جميع الاليات والأدوات الاحتياطية
الانبار	36		
صلاح الدين	18		
كركوك	9		
ديالى	11		
بغداد	7		
بابل	1		
<u>المجموع</u>	<u>118</u>		

منحة البنك الإسلامي للتمنية \$1,250,000

الملاحظات	المبلغ المتبقي (USD))	المبلغ المصرف (USD))	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص (USD))	القطاع
	1,250,000.00	0	0	0	1	1,250,000	الماء والصرف الصحي
	0	0	0	0	1	1,250,000	المجموع

المنحة المالية \$100,000

الملاحظات	المبلغ المتبقي (USD))	المبلغ المصرف (USD))	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص (USD))	القطاع
	100,000.00	0	0	0	1	100,000	وزارة الصحة
		0	0	0	1	100,000	المجموع

المنحة التشيكية \$458,421.2							
الملاحظات	المبلغ المتبقي (USD))	المبلغ المصروف (USD))	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص (USD))	القطاع
	103,161.20	77,460	1	2	3	180,621	الكهرباء
	277,800.00	0	0	3	4	277,800	الصحة
		<u>77,460</u>	<u>1</u>	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>458,421</u>	<u>المجموع</u>

اليات المنحة الصينية





جسر عمر بن عبد العزيز / الرمادي / الأنبار





إعادة تأهيل جسر شيشين | صلاح الدين



تجهيز محطات متنقلة للمحافظات



تجهيز اليات تخصصية للمحافظات المحررة



42.5 كم شارع نفط خانة - منديلي



إعادة تأهيل جسر القاسم ومقاربه



حل مؤقت لجسر الموصل الرابع

תודה
Dankie Gracias
Спасибо شكراً
Merci Takk
Köszönjük Terima kasih
Grazie Dziękujemy Děkojame
Ďakujeme Vielen Dank Paldies
Kiitos Täname teid 谢谢
Thank You Tak
感謝您 Obrigado Teşekkür Ederiz
Σας ευχαριστούμε 감사합니다
ขอบคุณ
Bedankt Děkuje vám
ありがとうございます
Tack
