



صندوق  
إعادة اعمار المناطق المتضررة

Re  
F  
AA  
T  
O

التقرير الفني لمشاريع  
صندوق إعادة الاعمار  
منذ تأسيسه و لغاية  
2019/8/31  
الجزء (الثاني والعشرون)  
أب 2019

A horizontal rectangular panel with a repeating pattern of green and white concentric semi-circles, creating a wave-like or ripple effect.

## المقدمة

- تأسس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وفق المادة (28) من قانون الموازنة الفدرالية العامة لعام 2015. اعقبه صدور نظام الصندوق رقم (2) لسنة 2015، وقد نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددها (4352) في 16/2/2015 وقد جاء فيها (يؤسس صندوق إعادة اعمار المناطق التي دمرها الإرهاب ويمول من المنح والمساعدات الدولية، ويخصص له مبلغ من الموازنة الاتحادية).
- وفي عام 2017 تم تعديل بعض فقرات النظام وحددت الهيكلية الإدارية وصدر النظام رقم (3) في جريدة الوقائع العراقية بعددها (4441).
- وقد حددت مناطق عمل الصندوق في المدن التي دمرها الإرهاب في كل من الانبار، ديالى، صلاح الدين، نينوى، شمال بابل، حزام بغداد (أبو غريب) وبعض المناطق الجنوبية من كركوك.
- هذا الكراس وهو تقريراً فنياً والذي يصدر كل شهر لمشاريع التي ينفذها الصندوق من الموازنة الفدرالية بشقيها الاستثماري والبرامج الخاصة، ويتم التوثيق بإحداثيات الـ (GPS) إضافة الى صور ومراحل الإنجاز بصورة دقيقة، كما ويحتوي هذا الكراس على المشاريع التي تنفذها الوزارات القطاعية كجزء من واجبات الصندوق في التدقيق المالي والفني التي يشرف عليها مدققون عالميون معينين من قبل الصندوق من خلال البنك الدولي والبنك الألماني.
- نأمل ان ترسم هذه السلسلة الشهرية من الكراسات خارطة إعادة الاعمار المترتبة.
- والله ولي التوفيق.

## مهدف انشاء الصندوق:-

- 1- إعادة اعمار وتأهيل المناطق التي دمرها الإرهاب وإزالة آثارها.
- 2- معالجة الاضرار الحاصلة في البنى التحتية.
- 3- تعويض الفرص التنموية.

## آلية عمل الصندوق:

يعمل الصندوق كمنسق ومراقب على تنفيذ القروض التي تقدم للعراق مثل قرض البنك الدولي وقرض بنك التنمية الألماني والتي تنفذ من قبل الوزارات القطاعية او من خلال المنح (المنحة الكويتية للقطاع الصحي والمنحة الصينية لأليات البلديات والمنحة التشيكية).

كما ويعمل الصندوق كمنفذ للمشاريع التي تقدم له من المحافظات المتضررة من خلال المبالغ المرصودة من الموازنة الاتحادية

# مهام صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وفق نظام رقم (3) لسنة 2017

- حسب المادة اولا من نظام صندوق إعادة الاعمار يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بشخصية معنوية وذات استقلال مالي واداري.

وفق المادة (5) يمارس الصندوق المهام الآتية:-

- التنسيق مع الجهات المعنية لوضع أولويات المشاريع في المحافظات المتضررة.
- السعي الى جلب المنح والهبات والمساعدات والقروض.
- القيام بإجراءات التعاقد ومتابعة تنفيذ المشاريع.
- متابعة تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار الممولة من المنح والقروض.
- تقديم الخطط اللازمة لإعادة الاعمار ووضع السياسات اللازمة لتحقيق اهداف الدولة.
- تنظيم ورعاية المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية المتعلقة بإعادة الاعمار وذلك سعيا لجلب المنح والهبات والمساعدات.

# صندوق إعادة الاعمار

- الرؤيا:

بناء الثقة بين العراقيين والدولة من جهة وبين العراق والمجتمع الدولي من جهة أخرى.

- الرسالة:

إعادة بناء الانسان والجدران وادامة العجلة الاقتصادية في المدن المتضررة من العمليات الإرهابية.

وتتم من خلال الابعاد التالية:-

1- البعد الاجتماعي:

تجديد العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين على المصداقية والثقة في جهود إعادة

الاعمار.

2- البعد الاقتصادي:

ادامة العجلة الاقتصادية في المناطق المتضررة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة

3- البعد الفيزيائي وإعادة الخدمات:

إعادة اعمار المنشآت العامة والخاصة والمتضررة من العمليات الارهابية

## القسم الأول

### ملخص مشاريع الصندوق على الموازنة الفدرالية

#### عدد المشاريع المخطط لها والمنفذة والمنجزة والمستمرة للأعوام 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 للموازنة الفيدرالية

السنة	المبلغ المخصص / مليار دينار	عدد المشاريع المخطط لها	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المستمرة	نسبة المشاريع المنجزة من المتعاقد عليها
2016	155	150	150	150	—	100%
2017	150	163	159	154	5	97%
2018	150	198	196	128	68	65%
2019	244.3	337	116	0	116	0%
المجموع	699.3	848	621	432	189	70%

## جدول يمثل اعداد مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات منذ عام 2016 - 2018

المجموع		القطاعات																						المحافظات				
		دوائر حكومية		الموارد المائية		الماء والمجاري		الكهرباء		الطرق والجسور		الصحة		الزراعة		الداخلية		التعليم العالي		التربية		التجارة			البلدية و البلديات		نوع التمويل	
المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز		الكلية
208	216	4	4	7	9	95	96	13	14	7	8	9	9	0	0	7	9	24	24	34	35	1	1	7	7	7	7	الانبار
36	41				2					3	4	3	3			2	4			28	28							استثماري
172	175	4	4	7	7	95	96	13	14	4	4	6	6			5	5	24	24	6	7	1	1	7	7	7	7	تشغيلي
20	21	0	0	0	0	17	17	0	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	شمال بابل
1	2								1	1	1																	استثماري
19	19					17	17			2	2																	تشغيلي
35	37	3	3	1	1	5	5	10	10	2	2	1	1	0	0	2	2	0	0	8	10	0	0	3	3	3	3	حزام بغداد
8	10			1	1															7	9							استثماري
27	27	3	3			5	5	10	10	2	2	1	1			2	2			1	1					3	3	تشغيلي
48	54	0	0	0	0	7	7	4	4	30	30	1	1	0	0	0	0	0	0	4	9	0	0	2	3	3	3	ديالى
29	32							3	3	24	24									2	5							استثماري
19	22					7	7	1	1	6	6	1	1							2	4					2	3	تشغيلي
37	49	0	0	0	0	5	5	3	3	1	3	0	1	0	0	7	10	2	2	7	12	0	0	12	13	13	13	صلاح الدين
11	18							1	1	0	2									2	2					1	1	استثماري
26	31					5	5	2	2	1	1	0	1			7	10									11	12	تشغيلي
26	42	0	1	0	0	10	10	3	4	4	6	0	0	0	0	2	6	0	1	3	8	2	2	2	4	4	4	كركوك
8	18	0	1			2	2	0	1	3	4					0	1	0	1	3	8							استثماري
18	24					8	8	3	3	1	2					2	5					2	2	2	4	4	4	تشغيلي
58	92	2	5	0	0	4	6	6	9	1	4	4	6	1	1	6	7	11	17	7	19	1	3	15	15	15	15	نينوى
19	41	1	1					2	5	0	2	0	1			0	1	0	3	4	14	0	2	12	12	12	12	استثماري
39	51	1	4			4	6	4	4	1	2	4	5	1	1	6	6	11	14	3	5	1	1	3	3	3	3	تشغيلي
432	511	9	13	8	10	143	146	39	45	48	56	15	18	1	1	24	34	37	44	63	93	4	6	41	45	45	45	الإجمالي الكلي

## القسم الثاني

### مشاريع المنح والقروض التي يعمل الصندوق كمشرف ومنسق لها

#### عدد المشاريع المخطط لها والمنفذة والمنجزة والمستمرة

نسبة المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المستمرة	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص / دولار	نوع التمويل
74.60%	37	<u>98</u>	<u>137</u>	<u>137</u>	\$350,000,000	قرض البنك الدولي الطارئ- EODP
-	-	-	-	<u>~140</u>	\$400,000,000	قرض البنك الدولي الطارئ-الإضافي EODP
-	-	-	<u>9</u>	<u>~46</u>	URE 500,000,000	القرض الألماني - GFCI
			-	<u>10</u>	\$458,000,00	المنحة التشيكية
100%	0	<u>118</u>	<u>118</u>	<u>118</u>	\$9,000,000	المنحة الصينية (118) آلية
-	-	-	-	<u>55</u>	\$100,000,000	المنحة الكويتية

## ملخص بأعداد مشاريع المنح والقرض - التي يعمل الصندوق الأعمار كمشرف ومنسق لها / حسب المحافظات والقطاعات

المجموع	القطاعات																												المحافظة
	الشباب والرياضة		المباني الحكومية		الموارد المائية		الماء		الكهرباء		الطرق والجسور		الصحة		الزراعة		الداخلية		التعليم العالي		التربية		التجارة		البلديات				
	مجموع المنجز	المخطط المنجز	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	
57	121	0	0	0	0	0	4	0	1	9	20	5	12	0	15	0	3	0	0	0	1	0	5	0	0	43	60	الأنبار	
4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	شمال بابل	
8	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	7	7	حزام بغداد	
45	73	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	9	12	0	8	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	25	38	ديالى	
51	118	0	1	0	0	0	6	0	1	16	24	6	11	0	20	0	2	0	0	0	1	0	3	0	0	29	49	صلاح الدين	
9	39	0	0	0	0	0	3	0	0	0	7	0	1	0	7	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	9	18	كركوك	
42	140	0	0	0	0	0	1	0	0	3	29	3	13	0	10	0	2	0	0	0	1	0	9	0	0	36	75	نينوى	
216	512	0	1	0	0	0	14	0	3	39	91	24	52	0	62	0	8	0	0	0	4	0	26	0	0	153	251	المجموع	

ملاحظة :- حقول المشاريع المنجزة تشمل (البنك الدولي المرحلة الاولى + المنحة الصينية )

جدول يمثل اعداد مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات لعام 2016 / منجزة

الإجمالي الكلي	القطاعات											المحافظات
	الموارد المائية	المحافظة	الماء	الكهرباء	القضاء	الصحة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة	البلديات	المحافظات
113	4	2	78	1	1	5	3	18			1	الانبار
13			13									بابل
6				6								بغداد
4							4					صلاح الدين
3			1				2					كركوك
11			2	2		2			2	1	2	نينوى
2				2								عقود محولات وقابلات لجميع المحافظات
152	4	2	94	11	1	7	9	18	2	1	3	الإجمالي الكلي

جدول يمثل توزيع مبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية على المحافظات والقطاعات لعام 2016 / منجزة

الإجمالي الكلي	القطاعات											المحافظات
	الموارد المائية	المحافظة	الماء	الكهرباء	القضاء	الصحة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة	البلديات	
9,306,587,480	328,310,000	199,349,990	6,248,522,000	93,306,000	79,550,000	499,601,000	169,248,000	1,621,700,490			67,000,000	الانبار
1,083,000,000			1,083,000,000									بابل
599,591,000				599,591,000								بغداد
263,340,000							263,340,000					صلاح الدين
285,023,500			95,000,000				190,023,500					كركوك
542,971,250			121,000,000	39,078,500		27,000,000			63,142,750	98,000,000	194,750,000	نينوى
7,703,490,000				7,703,490,000								عقود محولات وقابلوات لجميع المحافظات
19,784,003,230	328,310,000	199,349,990	7,547,522,000	8,435,465,500	79,550,000	526,601,000	622,611,500	1,621,700,490	63,142,750	98,000,000	261,750,000	الإجمالي الكلي

جدول يمثل اعداد مشاريع الصندوق على الموازنة الفدرالية حسب المحافظات و القطاعات ونوع التمويل لعام 2017

المجموع		دوائر حكومية		قطاع الموارد مانية		قطاع الطرق والجسور		قطاع الماء		قطاع الكهرباء		قطاع الداخلية		قطاع التعليم العالي		قطاع التربية		قطاع البلديات		المحافظة
المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	نوع التمويل
30	33	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	9	12	4	4	12	12	نينوى
15	15															4	4	11	11	استثماري
15	18									1	1	4	4	9	12			1	1	تشغيلي
11	11	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	0	0	0	0	2	2	2	2	كركوك
2	2															2	2			استثماري
9	9					1	1	3	3	3	3							2	2	تشغيلي
26	27	0	0	0	0	0	0	5	5	2	2	2	2	2	2	6	6	9	10	صلاح الدين
10	10									1	1			2	2	6	6	1	1	استثماري
16	17							5	5	1	1	2	2					8	9	تشغيلي
19	20	0	0	0	0	12	12	3	3	1	1	0	0	0	0	2	3	1	1	ديالى
15	16					12	12			1	1					2	3			استثماري
4	4							3	3									1	1	تشغيلي
6	7	0	0	0	0	2	2	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	بابل
0	1									1										استثماري
6	6					2	2	4	4											تشغيلي
49	52	1	1	3	5	3	3	2	2	2	3	1	1	3	3	28	28	6	6	الانبار
29	31				2	1	1									28	28			استثماري
20	21	1	1	3	3	2	2	2	2	2	3	1	1	3	3			6	6	تشغيلي
13	13	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	7	7	0	0	بغداد
8	8			1	1											7	7			استثماري
5	5	1	1			1	1	1	1	2	2									تشغيلي
154	163	3	3	7	11	37	37	35	35	20	24	14	14	28	34	91	93	60	62	المجموع الكلي

## جدول يمثل توزيع مبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفدرالية على المحافظات و القطاعات لعام 2017

المجموع	دوائر حكومية	قطاع الموارد مائية	قطاع الطرق والجسور	قطاع الماء	قطاع الكهرباء	قطاع الداخلية	قطاع التعليم عالي	قطاع التربية	قطاع البلديات	المحافظة
16,583,191,450					731,600,000	519,926,500	9,418,039,550	2,885,667,900	3,027,957,500	نينوى
2,908,337,000			63,200,000	196,481,000	1,842,734,000			616,582,000	189,340,000	كركوك
12,547,743,900				1,713,600,000	1,628,400,000	779,982,000	1,214,602,000	3,491,996,900	3,719,163,000	صلاح الدين
6,825,722,350			4,196,530,750	385,400,000	111,220,000			2,025,821,600	106,750,000	ديالى
1,964,072,520			845,664,520	298,620,000	819,788,000					بابل
50,522,074,002	99750000	15612422000	2,507,415,000	136,800,000	3,614,782,980	1052385000	621812300	21,853,665,597	5,023,041,125	الانبار
6,193,070,280	100,000,000	899,346,750	88,225,000	284,350,000	694,443,370			4,126,705,160		بغداد
97,544,211,502	199,750,000	16,511,768,750	7,701,035,270	3,015,251,000	9,442,968,350	2,352,293,500	11,254,453,850	35,000,439,157	12,066,251,625	المجموع

جدول يمثل مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات لعام 2018

المجموع	المجموع	القطاعات																				المحافظات			
		دوائر حكومية		الماء والمجاري		الكهرباء		الطرق والجسور		الصحة		الزراعة		الداخلية		التعليم العالي		التربية		التجارة			البلدية و البلديات		نوع التمويل
		المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية		المنجز	الكلية	
46	51	0	0	15	16	10	10	4	5	4	4	0	0	3	5	3	3	6	7	1	1	0	0	الانبار	
7	10							2	3	3	3			2	4									استثماري	
39	41			15	16	10	10	2	2	1	1			1	1	3	3	6	7	1	1			تشغيلي	
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	شمال بابل	
1	1							1	1															استثماري	
16	18	2	2	4	4	2	2	1	1	1	1	0	0	2	2	0	0	1	3	0	0	3	3	حزام بغداد	
0	2																		2					استثماري	
16	16	2	2	4	4	2	2	1	1	1	1			2	2			1	1			3	3	تشغيلي	
29	34	0	0	4	4	3	3	18	18	1	1	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	1	2	ديالى	
14	16					2	2	12	12										2					استثماري	
15	18			4	4	1	1	6	6	1	1							2	4			1	2	تشغيلي	
7	18	0	0	0	0	1	1	1	3	0	1	0	0	1	4	0	0	1	6	0	0	3	3	صلاح الدين	
1	8								2									1	6					استثماري	
6	10					1	1	1	1		1			1	4							3	3	تشغيلي	
12	28	0	1	6	6	0	1	3	5	0	0	0	0	0	4	0	1	1	6	2	2	0	2	كركوك	
6	16		1	2	2		1	3	4						1		1	1	6					استثماري	
6	12			4	4				1					3						2	2		2	تشغيلي	
17	48	2	5	2	4	3	6	1	4	2	4	1	1	2	3	2	5	1	13	0	2	1	1	نينوى	
4	26	1	1			2	5		2		1				1		3		10		2	1	1	استثماري	
13	22	1	4	2	4	1	1	1	2	2	3	1	1	2	2	2	2	1	3					تشغيلي	
128	198	4	8	31	34	19	23	29	37	8	11	1	1	8	18	5	9	12	41	3	5	8	11	الإجمالي الكلي	

## جدول يمثل توزيع مبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية على المحافظات والقطاعات لعام 2018

الإجمالي الكلي	المحافظات											
	دوائر حكومية	الماء والمجاري	الكهرباء	الطرق والجسور	الصحة	الزراعة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة	البلدية و البلديات	نوع التمويل
19,120,011,200		4,021,707,200	2,658,704,000	3,013,384,000	1,242,514,000		2,345,197,800	1,141,948,900	4,089,139,300	607,416,000		الانبار
5,040,706,600				2,403,008,000	1,150,824,000		1,486,874,600					استثماري
14,079,304,600		4,021,707,200	2,658,704,000	610,376,000	91,690,000		858,323,200	1,141,948,900	4,089,139,300	607,416,000		تشغيلي
2,000,259,000				2,000,259,000								بابل
2,000,259,000				2,000,259,000								استثماري
5,194,149,600	300,000,000	817,903,100	1,016,109,900	205,980,000	19,750,000		400,036,000		1,753,555,600	680,815,000		بغداد
1,680,355,600									1,680,355,600			استثماري
3,513,794,000	300,000,000	817,903,100	1,016,109,900	205,980,000	19,750,000		400,036,000		73,200,000	680,815,000		تشغيلي
13,705,639,215		1,107,700,700	1,321,577,000	7,961,501,514	96,755,000				2,379,179,500	838,925,501		ديالى
7,512,775,500			742,572,500	5,803,121,500					967,081,500			استثماري
6,192,863,715		1,107,700,700	579,004,500	2,158,380,014	96,755,000				1,412,098,000	838,925,501		تشغيلي
14,564,300,850			1,017,611,200	4,985,812,000	284,192,000		2,579,462,400		4,281,372,250	1,415,851,000		صلاح الدين
9,827,395,450			1,017,611,200	4,528,412,000					4,281,372,250			استثماري
4,736,905,400				457,400,000	284,192,000		2,579,462,400			1,415,851,000		تشغيلي
11,219,925,305	362,528,000	2,248,862,005	467,952,500	2,278,434,000			1,678,050,400	864,570,000	2,398,886,000	576,140,000	344,502,400	كركوك
7,652,564,901	362,528,000	970,112,001	467,952,500	2,207,634,000			380,882,400	864,570,000	2,398,886,000			استثماري
3,567,360,404		1,278,750,004		70,800,000			1,297,168,000			576,140,000	344,502,400	تشغيلي
43,318,433,950	2,054,444,000	1,479,428,750	13,159,580,000	3,300,644,000	6,263,047,000	232,313,000	2,317,910,600	3,348,214,600	5,944,624,000	5,029,748,000	188,480,000	نينوى
30,864,723,800	589,560,000		11,741,080,000	2,331,764,000	1,038,672,000		1,961,520,000	2,600,567,000	5,383,332,800	5,029,748,000	188,480,000	استثماري
12,453,710,150	1,464,884,000	1,479,428,750	1,418,500,000	968,880,000	5,224,375,000	232,313,000	356,390,600	747,647,600	561,291,200			تشغيلي
109,122,719,120	2,716,972,000	9,675,601,755	19,641,534,600	23,746,014,514	7,906,258,000	232,313,000	9,320,657,200	5,354,733,500	20,846,756,650	6,213,304,000	3,468,573,901	الإجمالي الكلي

## جدول باعداد مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات لعام 2019

الإجمالي الكلي	المحافظات												
	نوع التمويل	البلدية والبلديات	التجارة	التربية والتعليم	الداخلية	الزراعة	الشباب و الرياضة	الصحة	الطرق والجسور	الكهرباء	الماء والمجاري	الموارد المائية	دوائر حكومية
114	11	3	20	15	8	3	1	3	2	35	2	11	الانبار
79	8		9	8	5	3	1		2	34		9	استثماري
35	3	3	11	7	3			3		1	2	2	تشغيلي
5	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	بابل
3			1	1	1								استثماري
2			1		1								تشغيلي
34	2	1	5	1	14	1	0	0	0	8	0	2	بغداد
27	2		2	1	11	1				8		2	استثماري
7		1	3		3								تشغيلي
54	0	0	9	5	18	3	0	0	4	7	0	8	ديالى
46			4	5	17	3			2	7		8	استثماري
8			5		1				2				تشغيلي
41	7	0	8	0	5	3	1	0	2	11	0	4	صلاح الدين
29	3		4		4	3			2	11		2	استثماري
12	4		4		1		1					2	تشغيلي
41	2	0	5	2	6	0	0	3	3	10	0	10	كركوك
34	1		5	2	3			3		10		10	استثماري
7	1				3				3				تشغيلي
48	1	4	0	5	3	2	0	6	2	19	4	2	نينوى
28	1	2		3	1			3		14	2	2	استثماري
20		2		2	2	2		3	2	5	2		تشغيلي
337	23	8	49	29	56	12	2	12	13	90	6	37	الإجمالي الكلي

جدول بمبالغ مشاريع الصناديق للموازنة الفيدرالية لعام 2019 ( استثماري + تشغيلي ) حسب المحافظات و القطاعات

الإجمالي الكلي	القطاعات												المحافظة
	دوائر حكومية	الموارد المائية	الماء والمجاري	الكهرباء	الطرق والجسور	الصحة	الشباب و الرياضة	الزراعة	الداخلية	التربية والتعليم	التجارة	البلدية والبلديات	
113,734,869,826	9,641,948,236	1,208,979,245	17,680,664,773	7,521,131,208	7,788,064,900	3,496,101,170	874,603,750	832,824,538	6,892,403,009	41,796,348,090	974,750,609	15,027,050,300	الاتبار
100,292,867,744	8,066,985,300		13,643,684,590	4,742,089,220	6,899,979,700	3,496,101,170	874,603,750		6,892,403,009	41,546,784,405		14,130,236,600	استثماري
13,442,002,082	1,574,962,936	1,208,979,245	4,036,980,183	2,779,041,988	888,085,200			832,824,538		249,563,685	974,750,609	896,813,700	تشغيلي
7,743,607,650	0	0	1,414,827,950	2,200,000,000	4,128,779,700	0	0	0	0	0	0	0	بابل
6,421,771,200			800,000,000	2,200,000,000	3,421,771,200								استثماري
1,321,836,450			614,827,950		707,008,500								تشغيلي
31,073,458,338	769,910,050	471,094,338	2,470,325,900	1,405,588,000	14,791,781,250	959,048,250	0	0	0	6,390,935,550	0	3,814,775,000	بغداد
27,694,160,050	769,910,050		1,571,660,700	1,405,588,000	12,782,242,500	959,048,250				6,390,935,550		3,814,775,000	استثماري
3,379,298,288		471,094,338	898,665,200		2,009,538,750								تشغيلي
64,640,799,779	0	0	5,784,034,604	6,363,659,095	23,210,189,190	9,329,818,220	0	0	4,470,051,150	6,152,497,850	0	9,330,549,670	ديالى
57,375,759,060			2,689,748,325	6,363,659,095	21,325,634,750	9,329,818,220			2,183,851,150	6,152,497,850		9,330,549,670	استثماري
7,265,040,719			3,094,286,279		1,884,554,440				2,286,200,000				تشغيلي
38,779,892,165	6,372,007,400	0	5,281,176,280	0	8,538,751,300	3,902,321,070	585,444,300	0	1,560,651,200	9,227,747,213	0	3,311,793,403	صلاح الدين
30,596,864,533	3,124,582,200		3,326,113,950		7,385,362,650	3,902,321,070			1,560,651,200	9,227,747,213		2,070,086,250	استثماري
8,183,027,633	3,247,425,200		1,955,062,330		1,153,388,650		585,444,300					1,241,707,153	تشغيلي
33,014,693,706	1,141,440,550	0	3,400,182,000	1,636,154,059	7,068,935,000	0	0	4,785,446,412	751,536,500	3,406,474,800	0	10,824,524,385	كركوك
29,029,127,206	589,440,550		3,400,182,000	1,636,154,059	4,386,905,000			4,785,446,412		3,406,474,800		10,824,524,385	استثماري
3,985,566,500	552,000,000				2,682,030,000				751,536,500				تشغيلي
102,935,252,112	583,920,550	7,543,416,438	0	7,830,452,039	2,640,442,750	3,606,114,660	0	15,614,274,344	2,468,500,000	46,815,024,315	7,323,107,537	8,509,999,480	نينوى
88,690,044,453	583,920,550	6,871,090,500		6,422,768,690	1,646,584,000			14,103,446,376		43,803,369,125	6,748,865,732	8,509,999,480	استثماري
14,245,207,659		672,325,938		1,407,683,349	993,858,750	3,606,114,660		1,510,827,968	2,468,500,000	3,011,655,190	574,241,805		تشغيلي
391,922,573,576	18,509,226,786	9,223,490,020	36,031,211,507	26,956,984,400	68,166,944,090	21,293,403,370	1,460,048,050	21,232,545,293	16,143,141,859	113,789,027,818	8,297,858,146	50,818,692,238	الإجمالي الكلي

**مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية  
حسب المحافظات لعام 2016**

# مشروع محافظة الانبار

الانبار



## مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة الانبار

ت	القطاع	اسم المشروع	القضاء / الناحية	المبلغ
1	الماء	صيانة مجمع ماء الجبور / القرية العصرية سعة 100م <sup>3</sup> / ساعة + تأهيل مجمع زويغير سعة 200م <sup>3</sup> / ساعة	الرمادي	58,320,000
2	الماء	صيانة مجمع ماء زويغير الثاني سعة 200م <sup>3</sup> في الرمادي	الرمادي	69,525,000
3	الماء	صيانة مجمع ماء البوعيثة الخامس سعة 100م <sup>3</sup> + تأهيل مجمع ماء البوعيثة الرابع سعة 50م <sup>3</sup> / ساعة	الرمادي	55,534,000
4	الماء	تجهيز مولدة 150 كي في اي + مولدة 250 كي في اي لمشروع ماء تل اسود ( عبد مخيلف ) وتل اسود ( عبد مناور )	هيت / الفرات	86,000,000
5	الماء	صيانة مجمع ماء الحامضية القديم سعة 200م <sup>3</sup> / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	96,515,000
6	الماء	صيانة مجمع العدنان في قضاء الرمادي	الرمادي	76,570,000
7	الماء	تجهيز مولدة كهرباء 250 كي في اي لمجمع اليونسييف + تجهيز مولدة كهرباء لمجمع ماء زنكورة الثالث	الرمادي	90,000,000
8	الماء	تجهيز مولدة 250 كي في اي مع هيكل السحب لمجمع العدنان في قضاء الرمادي	الرمادي	66,000,000
9	الماء	صيانة مجمع ماء البوغضبان + تجهيز مولدة ببيركنز 250 كي في اي	الرمادي	81,167,000
10	الماء	صيانة ماء طوي البوجراد	الرمادي	72,500,000
11	الماء	صيانة مجمع ابو طيبان / صعب الحردان القصر سعة 200م <sup>3</sup> / ساعة + تأهيل مجمع ماء زنكورة الاول سعة 200م <sup>3</sup> / ساعة	الرمادي	75,850,000
12	الماء	صيانة مجمع ماء البوعبيد الجديد سعة 200م <sup>3</sup> / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	84,960,000
13	الماء	صيانة مجمع ماء البوكاطع + تجهيز مولدة 250 كي في اي لمجمع ماء البوذباب الحويجة	الرمادي	93,000,000
14	الماء	صيانة مجمع ماء البوعبيد ( طالب عفات ) + تأهيل مجمع ماء البوذباب القصر سعة 200م <sup>3</sup> / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	73,280,000
15	الماء	تجهيز مولدة قدرة 250 كي في اي لمجمع ماء المداليس + تجهيز مولدة 250 كي في اي في البوذباب الجنابيين	الرمادي	90,000,000
16	الماء	صيانة مجمع ماء الحامضية الجديد سعة 200م <sup>3</sup> / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	42,890,000
17	الماء	استبدال الاتابيب الواقعة في منطقة الحوز شارع النهر الشارع الرابط بين جسر الحوز ومجسر الزيوت الجانب الايمن في الرمادي	الرمادي	68,495,000
18	الماء	استبدال الاتابيب الواقعة في منطقة الحوز شارع النهر الشارع الرابط بين جسر الحوز ومجسر الزيوت الجانب الايسر في الرمادي	الرمادي	66,295,000
19	الماء	صيانة مجمعات اليونسييف / الدوار في قضاء الرمادي	الرمادي	72,960,000
20	البلديات	تأهيل الشارع الرابط بين شارع البوذباب وجسر الحوز في الرمادي	الرمادي	67,000,000

82,778,000	الرمادي	تاهيل الجناح الاداري والواجهة الخارجية لمديرية جنسية محافظة الانبار	الداخلية	21
40,950,000	الرمادي	ترميم وتاهيل جنسية واحوال الرمادي	الداخلية	22
82,120,000	الرمادي	صيانة مجمع ماء الدوار / عبد الصالح	الماء	23
75,493,000	الرمادي	صيانة مجمع ماء البو شعبان قرب مدرسة سمية + صيانة مجمع ماء البو شعبان 2	الماء	24
51,800,000	الرمادي	اىصال التيار الكهربائي المغذي لمحطات ضخ الماء في الموقع الجامعي لجامعة الانبار	الماء	25
99,325,000	الرمادي	تاهيل مبنى كلية الادارة والاقتصاد - القاعات الدراسية لجامعة الانبار	التعليم العالي	26
45,800,000	الرمادي	تاهيل محطة ري البوذباب المساعدة ( البوهايس )	الموارد المائية	27
86,810,000	الرمادي	تجهيز محولات KVA 630 في محطة ري القطنية المساعدة ومحطة ري بزايذ ابو طيبان	الموارد المائية	28
97,235,000	الرمادي	صيانة وتاهيل محطة تصفية وتعقيم ماء الجامعة ومحطات الضخ لجامعة الانبار	التعليم العالي	29
87,740,000	الرمادي	تاهيل مبنى شؤون الطلبة لجامعة الانبار	التعليم العالي	30
99,999,990	الرمادي	اعادة تاهيل بناية الاقسام الادارية في المحافظة	التعليم العالي	31
45,520,000	الرمادي	اعادة تاهيل بناية دائرة حماية المنشاة في الرمادي	الداخلية	32
99,350,000	الرمادي	اعادة تاهيل بناية الاشراف الهندسي	المحافظة	33
83,660,000	الرمادي	صيانة مجمع ماء البوعيثة الاول بسعة 200م <sup>3</sup> في قضاء الرمادي	الماء	34
99,500,000	الرمادي	تاهيل القناة الناقلة لشارع اربعين في الرمادي	الموارد المائية	35
99,999,990	الرمادي	اعادة تاهيل بناية الاقسام الفنية في المحافظة	المحافظة	36
96,200,000	الرمادي	تاهيل المحطة المساعدة الغربية لمحطة ري البوذباب	الموارد المائية	37
19,638,000	الفلوجة	صيانة مجمع ماء البو كريطي	الماء	38
44,930,000	الفلوجة	تجهيز ونصب وتشغيل مولد 250 كي في اي لمجمع ماء ابو سديرة القديم	الماء	39
96,500,000	الفلوجة	تجهيز مواد لصيانة مشاريع وشبكات للمجمعات المائية في الفلوجة	الماء	40

58,405,000	هيئة / الفرات	صيانة مجمع ماء جبيل سعة 200م <sup>3</sup> /ساعة	الماء	41
94,650,000	الفلوجة	صيانة مجمع ماء البوعبد الحسن في الفلوجة	الماء	42
78,500,000	الفلوجة	تاهيل مجمع ماء الشهداء القديم سعة 200م <sup>2</sup> /ساعة في قضاء الفلوجة	الماء	43
73,000,000	الفلوجة	صيانة مجمع ماء الفلاحات وصبيحات القديم والهيثاويين في الفلوجة	الماء	44
86,950,000	الفلوجة	صيانة مجمع الفلاحات الجفة في قضاء الفلوجة	الماء	45
97,760,000	الفلوجة	تاهيل مجمع ماء البوخميس سعة 200م <sup>3</sup> /ساعة+تاهيل مجمع ماء البويوسف	الماء	46
67,195,000	الفلوجة	صيانة مجمعات ماء البوعزام والفلاحات الجفة والبوزياب في قضاء الفلوجة	الماء	47
75,180,000	الفلوجة	صيانة مجمع ماء البوشمخان الحلابسة والبشويش الحلابسة والشيخ نعيم والبوعلوان 1 في الفلوجة	الماء	48
99,900,000	الفلوجة	تجهيز الاجهزة الطبية لكلية الطب والطب البيطري لجامعة الفلوجة	التعليم العالي	49
79,550,000	الفلوجة	تأهيل وترميم بناية محكمة الفلوجة	القضاء	50
90,000,000	الفلوجة	تجهيز مولدات عدد (2) اثنان لكلية الطب والطب البيطري جامعة الفلوجة	التعليم العالي	51
55,905,000	هيئة	مجمع ماء تل اسود المكاشير وعودة الرجب	الماء	52
43,200,000	هيئة	مد الخط الناقل لاهياء الحلبسية و فرات وسيطرة ماجد في هيئة	الماء	53
84,505,000	هيئة	اعادة تأهيل وصيانة مجمع ماء المحمدي القديم سعة 200م <sup>3</sup> /ساعة	الماء	54
93,306,000	هيئة	تجهيز وتنصيب مواد صيانة الكهرباء لناحية المحمدي مركز المدينة	الكهرباء	55
67,000,000	هيئة / الفرات	صيانة مجمع ماء البومانع سعة 200م <sup>3</sup> /ساعة	الماء	56
58,405,000	هيئة	صيانة مجمع ماء حي البكر الشرقي سعة 200م <sup>3</sup>	الماء	57
42,000,000	هيئة	تاهيل مشروع ماء المؤسسة	الماء	58
97,500,000	هيئة	تاهيل مشروع ماء قرى هيئة	الماء	59
90,350,000	هيئة / الفرات	صيانة مجمع ماء زوية الشرقية + مجمع ماء بكرة البو غانم	الماء	60

84,810,000	هيت	صيانة مولدة مشروع ماء هيت- كيبسة الموحد قدرة 1100 كي في اي	الماء	61
92,620,000	هيت	تجهيز مواد صيانة شبكات لمركز ماء هيت	الماء	62
99,080,000	هيت / الفرات	صيانة مجمع ماء تل اسود ( مخلف المحل ) + صيانة مجمع ماء تل اسود ( عبد مناور )	الماء	63
95,700,000	هيت	صيانة المجمعات المائية في ناحية البغدادي + تجهيز ونصب مضخة قدرة 250 م <sup>3</sup> /ساعة * 80م ومد خط ناقل قطر 160 ملم لمنطقة شرق البغدادي قرب مدرسة الثواب في قضاء هيت	الماء	64
99,877,000	هيت	اعادة تأهيل ردهات الاطفال في مستشفى هيت	الصحة	65
99,928,000	هيت	اعادة تأهيل صالة العمليات الكبرى في مستشفى هيت العام	الصحة	66
99,972,000	هيت	اعادة تأهيل جناح الطوارئ في مستشفى هيت العام	الصحة	67
99,947,000	هيت	اعادة تأهيل صالة عمليات الولادة والاطفال في مستشفى هيت العام	الصحة	68
99,877,000	هيت	اعادة تأهيل ردهات الرجالية في مستشفى هيت العام	الصحة	69
96,500,000	هيت	تاهيل مشروع ماء هيت /كيبسة الموحد سعة 1000م <sup>3</sup> /ساعة	الماء	70
86,240,000	هيت / الفرات	صيانة ماء الغرير سعة 50م <sup>3</sup> /ساعة	الماء	71
84,769,000	هيت	صيانة واعادة تأهيل بناية كلية العلوم التطبيقية / جامعة الانبار في هيت	التعليم العالي	72
93,210,000	هيت	اعادة تأهيل وصيانة مجمع ماء المحمدي الجديد سعة 200م <sup>3</sup> / ساعة	الماء	73
97,000,000	حديثة	تجهيز مضخات ومحركات لمشاريع ومجمعات حديثة ونواحيها	الماء	74
97,500,000	حديثة	تجهيز مضخات ومحركات لمحطة توزيع مشروع حديثة / حقلانية الموحد	الماء	75
93,800,000	حديثة	تاهيل مشروع ماء البوحيات الشرقي سعة 50م <sup>3</sup> /ساعة	الماء	76
75,780,000	حديثة	تاهيل مشروع ماء البوحيات الوسطي بطاقة 50م <sup>3</sup> /ساعة	الماء	77
80,750,000	حديثة	تاهيل مجمع ماء الخسفة	الماء	78
80,650,000	حديثة	اعادة تأهيل مجمع ماء البوحيات الغربي 50م <sup>3</sup> /ساعة	الماء	79
76,250,000	حديثة	تاهيل مجمع ماء الشاعي سعة 100م <sup>3</sup> /ساعة	الماء	80

95,445,000	حديثة	تأهيل بناية القاعات الدراسية لكلية التربية الاساسية حديثة / الخدمات والتابعة لجامعة الانبار	التعليم العالي	81
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء البو تايه سعة 200م <sup>3</sup> في الكرمة	الماء	82
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء اللهب 2	الماء	83
98,260,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء اللهب 1 بسعة 100م <sup>3</sup>	الماء	84
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء الغرير سعة 200م <sup>3</sup> في الكرمة	الماء	85
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء المصالحة سعة 200م <sup>3</sup>	الماء	86
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء ذراع دجلة سعة 200م <sup>3</sup>	الماء	87
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء البودخيل	الماء	88
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء بني زيد الاول	الماء	89
94,750,000	الخالدية	صيانة مجمع البوبالي رقم 3 مع تجهيز مولدة 250 كي في اي في قضاء الرمادي	الماء	90
95,650,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء ابو زعيان في الخالدية	الماء	91
99,800,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء البوشهاب + تجهيز مولدة بيركنز 250 كي في اي	الماء	92
91,750,000	الخالدية	تجهيز مولدة كهرباء نوع بيركنز 500 كي في اي وبورد كهربائي لمشروع قرى الحباتية في قضاء الخالدية	الماء	93
96,700,000	الخالدية	صيانة مولدة 250 كي في اي لمجمع ماء البو شعبان 1 + صيانة مجمع ماء البو عبد المحسن + تجهيز ونصب مولدة 250 كي في اي	الماء	94
90,400,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء البوبالي الاول في الخالدية	الماء	95
99,700,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء الكرابلة+تجهيز ونصب مولدة بيركنز 250 كي في اي	الماء	96
63,520,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء سن الذبان سعة 200م <sup>3</sup> /ساعة	الماء	97
87,200,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء الملاحمة + تجهيز ونصب مولدة بيركنز 250 كي في اي	الماء	98
93,300,000	الخالدية	صيانة مجمع البوبالي الثاني في الخالدية	الماء	99
95,000,000	الرطبة	تجهيز طواقم ضخ عمودية خاصة بالابار لمركز ماء الرطبة والوليد ومركز ماء النخيب ومركز ماء عرعر	الماء	100

84,000,000	الرطوبة	صيانة الفلاتر في المحطة الرئيسية لمشروع ماء الصحراء الغربية في الرطوبة	الماء	101
53,800,000	طربيل	تأهيل وجدة التحلية رقم ( 3 ) في مركز ماء طربيل الرئيسي	الماء	102
96,500,000	طربيل	استخراج البئر الساقط في منفذ طربيل الحدودي وبعمق 450 متر	الماء	103
82,175,000	الصقلاوية	تأهيل بناية الأقسام العلمية ومختبرات القسم المدني في المعهد التقني	التعليم العالي	104
88,700,000	الصقلاوية	تجهيز المتطلبات المهمة لضخ وتصفية وتوزيع الماء في المعهد التقني	التعليم العالي	105
90,334,000	الصقلاوية	انشاء مجموعتي حمامات للطلبة + انشاء ملحق قاعة دراسية سندويج بئل في المعهد التقني	التعليم العالي	106
87,455,000	الصقلاوية	تأهيل قسم الكهرباء والقسم المدني في المعهد التقني	التعليم العالي	107
70,900,000	الصقلاوية	اعادة ربط الكهرباء الوطنية لموقع المعهد التقني	التعليم العالي	108
97,060,000	الصقلاوية	توليد وايصال وتوزيع الكهرباء لموقع المعهد التقني	التعليم العالي	109
93,180,000	الصقلاوية	انشاء مسقف استراحة الطلاب في المعهد التقني	التعليم العالي	110
66,622,500	الصقلاوية	تأهيل وانشاء قاعة دراسية مرسوم المعهد التقني	التعليم العالي	111
93,860,000	الصقلاوية	عزل المواقع الغير مؤمنة في المعهد + تأهيل بناية قاعات قسم الكهرباء والورش الهندسية في المعهد التقني	التعليم العالي	112
97,000,000	الصقلاوية	تجهيز الاثاث المدرسي المطلوب لابنية موقع المعهد التقني	التعليم العالي	113
9,306,587,480		المجموع		

# مشاريع محافظة نينوى



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة نينوى

ت	اسم المشروع	القضاء	القطاع	المبلغ
1	اعمار البئر الارتوازي في ناحية الشمال	سنجار	الماء	22,000,000
2	اعمار مدرسة ( برج ابة لة ك ) في ناحية شنكال	سنجار	التربية	45,886,000
3	اعمار مستوصف في مركز ناحية الشمال	سنجار	الصحة	8,000,000
4	اعمار القنطرة الصندوقية في وادي سنجان	سنجان	البلديات	95,000,000
5	اعمار مستوصف مجمع دوكري في ناحية الشمال	سنجان	الصحة	19,000,000
6	اعمار سايلو سنجان	سنجان	التجارة	98,000,000
7	محطة كهرباء الشمال في ناحية الشمال	سنجان	الكهرباء	19,078,500
8	شراء اليات تخصصية لبلدية سنجان	سنجان	البلديات	99,750,000
9	اعمار مركز تشغيل ماء سنجان	سنجان	الماء	99,000,000
10	بنابة دائرة كهرباء الشمال في ناحية الشمال	سنجان	الكهرباء	20,000,000
11	اعمار مدرسة كوهبةل في ناحية الشمال	سنجان	التربية	17,256,750
	المجموع			542,971,250

# مشاريع محافظة صلاح الدين



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة صلاح الدين

ت	القطاع	اسم المشروع	القضاء	المبلغ
1	الداخلية	تأهيل وصيانة قسم شرطة الاسحافي ومركز شرطة السجلة	الدجيل	79,120,000
2	الداخلية	اعادة تأهيل وصيانة مقر فوج طوارئ الدجيل	الدجيل	61,820,000
3	الداخلية	اعادة تأهيل وصيانة قسم الكلاب البوليسية وقسم مكافحة الاجرام وقسم شؤون الميرة	تكريت	56,200,000
4	الداخلية	اعادة تأهيل وصيانة قسم الادلة الجنائية ومركز شرطة تكريت	تكريت	66,200,000
		المجموع		263,340,000

# مشروع محافظة كركوك



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة كركوك

المبلغ	اسم المنطقة	اسم المشروع	القطاع	ت
92,310,500	تازة	اعمار مركز شرطة البشير في ناحية تازة	الداخلية	1
95,000,000	تازة	اعمار شبكة ماء البشير في ناحية تازة	الماء	2
97,713,000	الملتقى	اعمار مركز شرطة ناحية الملتقى	الداخلية	3
285,023,500	المجموع			

# مشاريع محافظة بابل

## Babil Governorate projects

المسيب

المحلويل

الحلة

الهاشمية



## مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة بابل

ت	القطاع	اسم المشروع	اسم المنطقة	المبلغ
1	الماء	تأهيل مجمعات ماء الدوريين 14م <sup>3</sup> / ساعة	الاسكندرية	70,500,000
2	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية ( المنطقة الغربية )	الاسكندرية	82,500,000
3	الماء	تأهيل مجمع ماء الشيحة 14م <sup>3</sup> / ساعة	الاسكندرية	76,500,000
4	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية ( المنطقة الشرقية )	الاسكندرية	79,200,000
5	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية ( المنطقة الشمالية )	الاسكندرية	88,000,000
6	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية ( المنطقة الجنوبية )	الاسكندرية	80,300,000
7	الماء	تأهيل مجمعات ماء الحويجة 14م <sup>3</sup> / ساعة	الاسكندرية	70,500,000
8	الماء	تأهيل مجمع ماء ابو شمسي سعة 200م <sup>3</sup> / ساعة	الاسكندرية	92,000,000
9	الماء	تأهيل مجمع ماء الخضر سعة 200م <sup>3</sup> / ساعة	الاسكندرية	92,000,000
10	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية ( 3 ) سعة 50م <sup>3</sup> / ساعة	جرف النصر	88,000,000
11	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية ( 2 ) سعة 50م <sup>3</sup> / ساعة	جرف النصر	88,000,000
12	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية ( 4 ) سعة 50م <sup>3</sup> / ساعة	جرف النصر	88,000,000
13	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية ( 1 ) سعة 50م <sup>3</sup> / ساعة	جرف النصر	87,500,000
		المجموع		1,083,000,000

# محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

# Baghdad Governorate Projects

الانبار



## مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / حزام بغداد

ت	القطاع	اسم المشروع	اسم المنطقة	المبلغ
1	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية السعدان ( 1 )	النصر والسلام	99,962,500
2	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية السعدان ( 2 )	النصر والسلام	99,956,000
3	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العجاج	النصر والسلام	99,881,000
4	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العناز ( 1 )	النصر والسلام	99,950,500
5	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العناز ( 2 )	النصر والسلام	99,915,500
6	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية عودة الشكر	النصر والسلام	99,925,500
المجموع				599,591,000

**مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية  
حسب المحافظات لعام 2017**

# مشاريع محافظة نينوى



## مشاريع محافظة نينوى على الموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة الشورة الابتدائية 12 صف/ القيارة / نينوى	التربية	35° 59'43.8"N 43° 13'18.5"E	600	38+170	715,512,000	716,492,000	2017-08-02	2017-08-16	7/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	اعدادية القيارة للبنين 12 صف / القيارة / نينوى	التربية	35° 47'23.1"N 43° 17'23.4"E	600	28+180	687,989,900	684,563,900	2017-08-02	2017-08-16	5/12/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	ثانوية الشورة للبنين 12 صف/ القيارة / نينوى	التربية	36° 00'03.8"N 43° 13'36.0"E	600	18+170	750,236,000	748,708,000	2017-08-02	2017-08-16	18/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة اجحلة الابتدائية للبنين 12 صف/ القيارة/ نينوى	التربية	35° 42'31.9"N 43° 17'58.5"E	600	28+160	737,710,000	735,904,000	2017-08-02	2017-08-13	5/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	صب ارصفة وبناء القوالب الجانبية للشارع الرئيسي / حي النصر وبربوش /مركز قضاء سنجار/نينوى	البلديات			60	188,480,000	188,480,000	2018-05-06	25L6L2016	16/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	تأهيل شوارع وصيغ القوالب في الشورة	البلديات												
7	إعادة تأهيل وأكساء شوارع رئيسية في حمام العليل	البلديات												
8	كشف أعمال تأهيل و أكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية القيارة	البلديات												
9	تأهيل وإكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية القيارة	البلديات		400,000	28+70	1,527,640,000	1,570,680,000	2017-11-05	2017-11-20	16/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	إعادة تأهيل المدخل الجنوبي للقصة (شارع الصلاحية) مع تحويل العارض (أنبوب الماء) الموجود في وسط الشارع في ناحية حمام العليل/ المرحلة الاولى	البلديات												
11	إكساء شوارع داخل ناحية الشورة	البلديات												
12	إكساء طرق داخلية في ناحية بعشيقه													
13	صيانة شوارع متفرقة في ناحية بعشيقه													
14	بناء القوالب الجانبية وصب الارصفة والفسالس في برطلة													
15	تبليط مسارات شبكة مجاري في برطلة													
	المجموع					5,553,547,900	5,638,612,900							

مشاريع محافظة نينوى على الموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	صيانة وتأهيل ابنية كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36 22.897'N 43 8.592'E	2000	45+140	900,000,000	985,290,000	2017-08-02	2017-08-20		100%	100%	0%	انجاز العمل
2	تأهيل شبكات الكهرباء / الموصل	الكهرباء	36 21 34 05N 43 01 34 28E	25,000	30	731,600,000	731,600,000	2017-10-18	منجز		100%	100%	0%	انجاز العمل
3	تأهيل وصيانة طرق في قضاء الحمدانية وناحية النمرود	البلديات		85,000	4+50	275,012,500	275,012,500	2017-11-02	2017-11-16	29/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	تأهيل بناية مركز شرطة الوقاص	الداخلية		150000	12+50	303428000	327096500	2017-11-20	2017-12-04		100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تأهيل بناية مركز شرطة اليرموك	الداخلية		200000	12+50	175316000	192830000	2017-11-21	2017-12-03	2/11/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	تأهيل بناية مركز الدفاع المدني الجزائر	الداخلية		4000	40+154	1,414,930,000	1,539,455,000	2017-08-02	2017-10-08	16/5/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	تأهيل ابنية كلية الآداب / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36° 23.126'N 43° 8.471'E	4000	34+140	1,627,784,000	1,785,149,550	2017-09-25	2017-10-03	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تأهيل ابنية كلية التقانات وعلوم البيئة / جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي	36° 22.574'N 43° 8.948'E	4000	36+140	1,627,784,000	1,785,149,550	2017-09-25	2017-10-03	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	تأهيل ابنية كلية التمريض / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36° 22.696'N 43° 8.696'E	4000	28+140	1,464,915,000	1,611,067,000	2017-10-15	2017-10-29	26/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تأهيل ابنية كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36° 23.197'N 43° 8.919'E	2500	28+140	1,464,915,000	1,611,067,000	2017-10-15	2017-10-29	26/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تأهيل ابنية كلية الصيدلة/ جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي	36° 22.491'N 43° 8.637'E	2500	28+140	1,464,915,000	1,611,067,000	2017-10-15	2017-10-29	26/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	تأهيل بناية قسم الاعمار والمشاريع/جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي	36° 22.552'N 43° 8.762'E	4250	45+105	1,624,462,000	1,784,852,000	2017-09-28	2017-10-11	مستمر	100%	97%	3%	تلكو الشركة المنفذة , وتم توجيهه كتاب انذار
13	تأهيل ابنية كلية العلوم/جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36° 22.557'N 43° 8.579'E	4250	45+105	1,624,462,000	1,784,852,000	2017-09-28	2017-10-11	مستمر	100%	97%	3%	تلكو الشركة المنفذة , وتم توجيهه كتاب انذار
14	تأهيل ابنية المراكز البحثية/ جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي		4250	61+110	1,571,950,000	1,712,226,000	2017-10-30	2017-11-14	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
15	تأهيل ابنية كلية التربية / جامعة الموصل	التعليم العالي		4250	61+110	1,571,950,000	1,712,226,000	2017-10-30	2017-11-14	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
16	تأهيل ابنية كلية الهندسة / جامعة الموصل	التعليم العالي		4250	61+110	1,571,950,000	1,712,226,000	2017-10-30	2017-11-14	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
				481000		10089401500	10,944,578,550				40			




ثانوية الشورة / الشورة / نينوى



اعدادية القيارة / القيارة / نينوى



كلية طب الأسنان / جامعة الموصل / نينوى

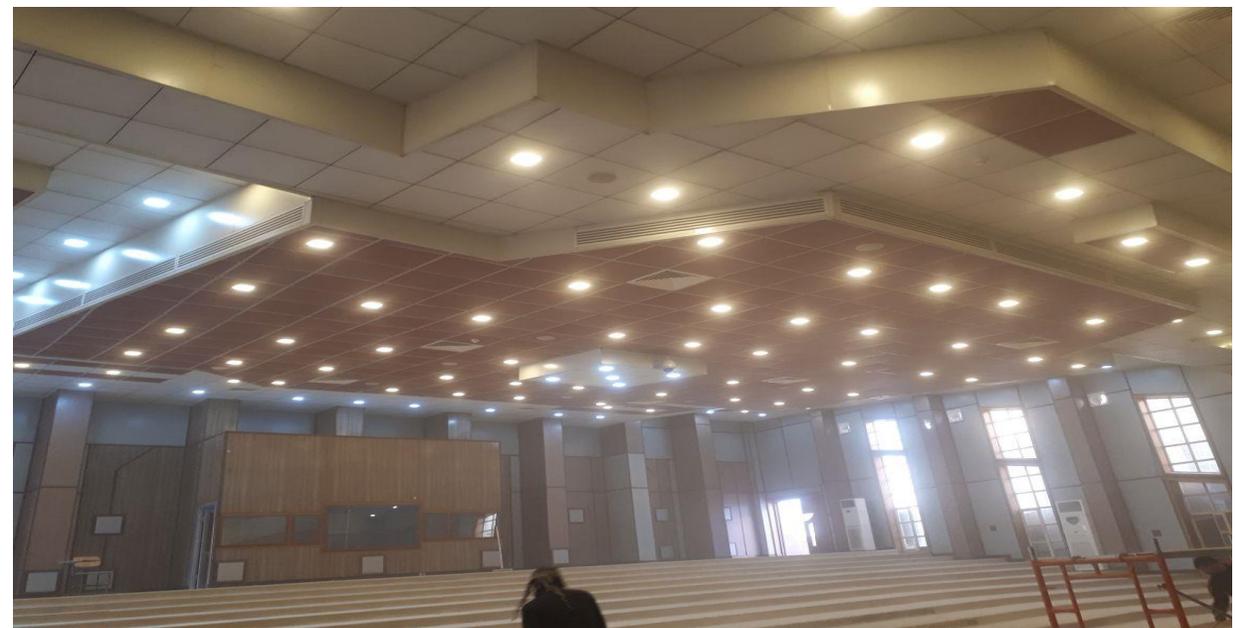

كلية طب الأسنان / جامعة الموصل / نينوى



إعادة تأهيل طرق الحمدانية والنمرود / نينوى





تاهيل وتبليط مسارات شبكة مجاري في برطلة و بعشيقه





كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى



كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى



كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى



كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل / نينوى



46



كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل / نينوى



تجهيز محولات إلى الجانب الأيمن / الموصل

# مشروع محافظة الانبار

الانبار



مشاريع محافظة الانبار للموازنة الاستثمارية / الخطة الاستثمارية 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	ثانوية العلا للبنات / 18 صف الرمادي/الانبار	التربية	33 25 13.0N 43 18 28.2E	650	95+210	1,066,033,000	2017-07-23	2017-08-06	18/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	ثانوية الكواكب للبنات /ثانوية/18 صف/الرمادي/الانبار	التربية	33 ° 24 37.3N 43° 16 42.6E	450	80+190	1,070,000,000	2017-07-24	2017-08-09	26/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	ثانوية دار السلام للبنين /ثانوية/18 صف /هيت /الانبار	التربية	33 39 03.0N 42 49 48.3E	650	78+190	1,144,525,000	2017-07-30	2017-08-21	15/5/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة أبو أيوب الانصاري للبنين /ابتدائية/12 صف/الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 23 31.4N 43 52 50.8E	450	177+160	659,631,000	2017-07-30	2017-08-17	2018-07-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	مدرسة صعدة الابتدائية المختلطة الابتدائية 12 صف/الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 33 14.7N 44 06 14.5E	450	166+170	585,985,000	2017-07-31	2017-08-13	18/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	مدرسة الوفاء الابتدائية للبنين 12 صف /الرمادي/ الانبار	التربية	33° 25 50.2N 43° 21 22.0E	450	83+165	598,000,000	2017-08-02	2017-08-15	2018-10-05	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	ثانوية الرشاد للبنين الثانوية 18 صف/الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 23 57.2N 43 36 01.7E	650	96+210	1,093,229,000	2017-08-02	2017-08-17	2/1/2019	100%	100%	0	انجاز العمل
8	مدرسة الافنان الابتدائية للبنين 12 صف /جزيرة الرمادي/ الانبار	التربية	33 28 03.5N 43 18 04.6E	450	153+180	611,468,000	2017-08-02	2017-08-15	2018-01-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	اعدادية حليلة السعدية للبنات 12 صف /الرمادي/ الانبار	التربية	33° 26' 00.0N 43° 22' 05.6E	450	103+180	599,981,000	2017-08-03	2017-08-08	30/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	مدرسة الصمد الابتدائية 12 صف/ هيت/ الانبار	التربية	33 37 55.3N 42 50 26.8E	450	63+170	639,571,000	2017-08-03	2017-08-21	2018-12-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	متوسطة المامون 18 صف /الرمادي/الانبار	التربية	33 25 17.0N 43 19 57.9E	650	29+210	1,266,865,000	2017-08-03	2017-08-15	2018-05-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	مدرسة دجلة الابتدائية للبنين 12 صف/ الرمادي/ الانبار	التربية	33 25 39.2N 43 17 01.6E	450	20+170	592,525,000	2017-08-03	2017-08-16	25/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
13	اشبيلية الابتدائية المختلطة 12 صف /الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 29 46.6N 44 06 14.5E	450	143+160	614,777,000	2017-08-03	2017-08-13	20/12/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
14	مدرسة الخضر الابتدائية 12 صف /الصقلاوية/الفلوجة/الانبار	التربية	33 27 50.4N 43 36 27.3E	450	150+150	573,888,800	2017-08-03	2017-10-25	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
15	مدرسة السلوى الابتدائية 18 صف/ الفلوجة/ الانبار	التربية	33 19 49.2N 43 47 49.5E	650	161+210	1,078,596,000	2017-08-03	2017-08-15	19/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل

انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-05-02	2017-08-09	2017-08-03	631,520,000	93+180	450	33 27 29.1N 43 16 17.7E	التربيه	مدرسة ابي ذر الغفاري الابتدائية للبنات 12 صف /جزيرة الرمادي/ الانبار	16
انجاز العمل	0%	100%	100%	20/12/2018	2017-08-23	2017-08-13	595,000,000	134+180	450	33 25 31.6N 43 43 10.7E	التربيه	مدرسة المروج الخضراء الابتدائية 12 صف/ الفلوجة/ الانبار	17
انجاز العمل	0%	100%	100%	20/3/2018	2017-09-05	2017-08-13	688,586,000	15+170	450	33 00 16.3N 42 26 13.6E	التربيه	مدرسة عامر بن ربيعة 12 صف/ حديثة/ الانبار	18
انجاز العمل	0%	100%	100%	14/7/2018	2017-09-10	2017-08-13	651,962,500	129+170	450	33 26 49.3N 43 44 37.4E	التربيه	مدرسة الخالد الابتدائية 12 صف /الفلوجة/ الانبار	19
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-01-07	2017-08-23	2017-08-13	594,113,000	134+180	450	33 26 00.0N 43 22 05.6E	التربيه	مدرسة الفتوة الابتدائية للبنين 12 صف/ الرمادي/ الانبار	20
انجاز العمل	4%	96%	100%	23/9/2018	2017-08-23	2017-08-13	575,131,000	101+160	450	33 54 33.0N 42 33 04.6E	التربيه	ثانوية جبة للبنين 12 صف / البغدادي/ هيت/ الانبار	21
انجاز العمل	0%	100%	100%	19/8/2018	2017-08-27	2017-08-13	611,635,000	20+170	450	33 24 44.5N 43 18 24.5E	التربيه	مدرسة دار العلم الابتدائية 12 صف / الرمادي/ الانبار	22
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-08-20	2017-08-13	669,928,000	114+180	450	33 42 17.7N 43 55 18.8E	التربيه	متوسطة خالد بن الوليد 12 صف/ الكرمة/ الفلوجة/ الانبار	23
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-08-27	2017-08-13	672,513,500	145+160	450	33 23 02.4N 43 51 59.1E	التربيه	ثانوية الشهابي للبنين 12 صف/ الفلوجة/ الانبار	24
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-09-07	2017-09-06	2017-08-14	577,451,000	20+165	450	33 24 04.0N 43 19 58.1E	التربيه	ثانوية الرشيدية للبنين 12 صف /الرمادي/ الانبار	25
انجاز العمل	0%	100%	100%	25/4/2018	2017-09-06	2017-08-15	573,900,500	71+170	450	33 25 54.3N 43 12 40.1E	التربيه	مدرسة جنة الماوى الابتدائية للبنين 12 صف /الرمادي/ الانبار	26
انجاز العمل	0%	100%	100%	30/1/2018	2017-08-23	2017-08-23	667,409,500	180	450	33 38 16.8N 42 49 34.1E	التربيه	متوسطة الشيماء للبنات 12 صف/ هيت/ الانبار	27
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-10-11	2017-08-24	1,195,056,000	162+180	650	33 24 02.3N 43 42 05.6E	التربيه	اعدادية صناعة الصقلاوية 18 صف/ الصقلاوية/الفلوجة/ الانبار	28
	-5%	95%	100%	مستمر	2017-11-19	2017-11-07	7,038,189,000	25+570	10,000,000	33° 26.057'N 43° 15.928'E	موارد مائية	مشروع ناظم الورار	29
الانحراف بسبب تأخر وصول المعدات الاستيرادية من تركيا .	-10%	90%	100%	مستمر	2017-11-19	2017-11-07	6,911,239,000	25+570	10,000,000	33° 26.444'N 43° 16.138'E	موارد مائية	اعادة اعمار ناظم سدة الرمادي على نهر الفرات	30
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-12-17	2017-12-07	1,983,315,000	180	200000		طرق وجسور	اعادة تاهيل جسر هيت الحديدي	31
							36,832,023,800		20,213,800			المجموع	

## مشاريع محافظة الانبار للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	اصلاح وتاهيل طريق الرمادي- هيت/ الرمادي/ الانبار	طرق وجسور	33 25 36.6N 42 58 36.1E	400,000	145	285,000,000	312,200,000	2017-07-30	2017-08-21	2018-03-01	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	إعادة انشاء القسم البلدي السادس/ الرمادي الانبار	البلديات	33 24 46.0N 43 12 51.0E	100,000	180	220,575,000	242,575,000	2017-08-02	2017-08-29	25/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	تاهيل بناية الاقسام الداخلية في قضاء الفلوجة/ الانبار	التعليم العالي		500.00	80	211,829,000	229,851,000	2017-10-15	2017-10-29	2018-05-02	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	تأهيل المحطات الاروانية في جزيرة موارد وشامية الرمادي/ الانبار	موارد مانية												
5	تأهيل محطات البزل في جزيرة وشامية الرمادي / الانبار	موارد مانية			25+90	877,170,000	920,790,000	2017-10-17	2017-10-29	19/2/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	اعادة انشاء قناطر في البوعينة	موارد مانية												
7	اعادة انشاء السياج الامني لقضاء هيت / الانبار	دوائر حكومية		150,000		99,750,000	99,750,000	تنفيذ امانة	\	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	مجمع ماء الحميدية	ماء		12000		100,000,000	100,000,000	تنفيذ امانة	\	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	مجمع ماء الصبيحات	ماء		10000		36,800,000	36,800,000	تنفيذ امانة	\	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تجهيز وتنفيذ وتنصيب محطة تحويل الحصرة 33/11 كي في سعة 2*31.5 ام في أي / هيت/الانبار	كهرباء		200,000	25+90	361,000,000	396,779,980	2017-10-18	2017-10-30	17/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تاهيل شارع المعارض الى تقاطع الفرسان في الرمادي/ الانبار	البلدية		100,000	60+140	2,123,020,000	2,250,940,000	2017-10-22	2017-11-05	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	تاهيل شارع من تقاطع الفرسان الى تقاطع شارع (20) الرمادي/الانبار	البلدية		100,000	25+140	967,828,000	1,037,349,000	2017-10-22	2017-11-06	2018-04-06	100%	100%	0%	انجاز العمل

انجاز العمل	0%	100%	100%	14/4/2018	2017-11-14	2017-10-22	507,653,000	472,473,000	25+140	150,000		13 تجهيز ونصب محطة تحويل المشتل كهرباء 33/11 كي في /هيت/الانبار
سحب عمل من المقاول بموجب قرار محكمة			0%		2017-11-14	2017-10-25	2,710,350,000	2,710,350,000	140	1,500,000		14 إعادة تأهيل خط كهرباء غرب بغداد - حديثة 400 كي في /عموم محافظة الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-05-07	2017-11-06	2017-10-26	410,812,000	373,752,000	70+170	200,000		15 تأهيل ابنية دائرة البلدية /القسم البلدي الثاني/الرمادي/الانبار
												16 تأهيل انية دائرة البلدية القسم البلدي الرابع/ الرمادي الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	24/5/2018	2017-11-19	2017-10-30	1,052,385,000	974,585,000	25+150	250,000		17 اعادة انشاء مديرية شرطة نموذجية في قضاء الفلوجة
انجاز العمل	0%	100%	100%	19/6/2018	2017-11-14	2017-11-12	1,081,365,125	983,270,000	30+120	100,000		18 الشارع الرابط بين تقاطع شارع عشرين الى شارع الملعب
انجاز العمل	0%	100%	100%	23/12/2017	2017-11-23	2017-11-14	211,900,000	194,400,000	30	75,000		19 العبارة النهريه في هيت ( الباتونات)
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-04-07		2017-12-04	391,961,300	360,895,000	25+75	8,000		20 تأهيل بناية قسمي الفيزياء والعربي في كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة الانبار
												21 تأهيل بناية القاعات الدراسية في كلية الزراعة / جامعة الانبار
							11,993,461,405	11,352,697,000		3,355,500		المجموع



مدرسة دار السلام / هيت / الانبار

مدرسة دار السلام / هيت / الانبار (صعب نقل مواد البناء)



مدرسة دار السلام / هيت / (قبل الاعمار)




اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت<sup>53</sup>



اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت (انفجار عبوة)



اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت

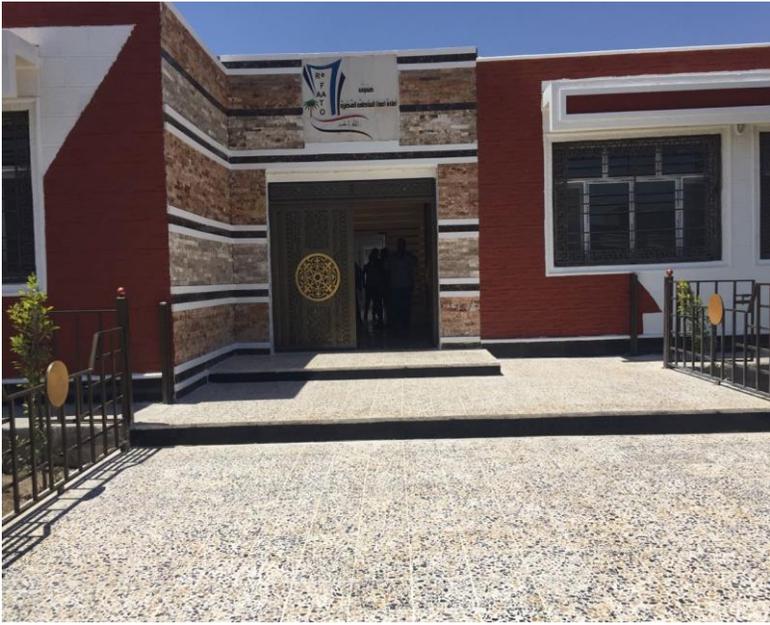

مدرسة السلوى / الفلوجة الانبار



مدرسة جنة الماوى / الرمادي / الانبار



تاهيل مباني كلية الزراعة/جامعة الانبار/الرمادي / الانبار



مدرسة ابي ذر الغفاري / الجزيرة / الرمادي / الانبار



مدرسة الصمد / هيت / الانبار



مدرسة المأمون / الرمادي / الانبار




إعادة تاهيل مستشفى هيت العام





إعادة تأهيل جسر هيت

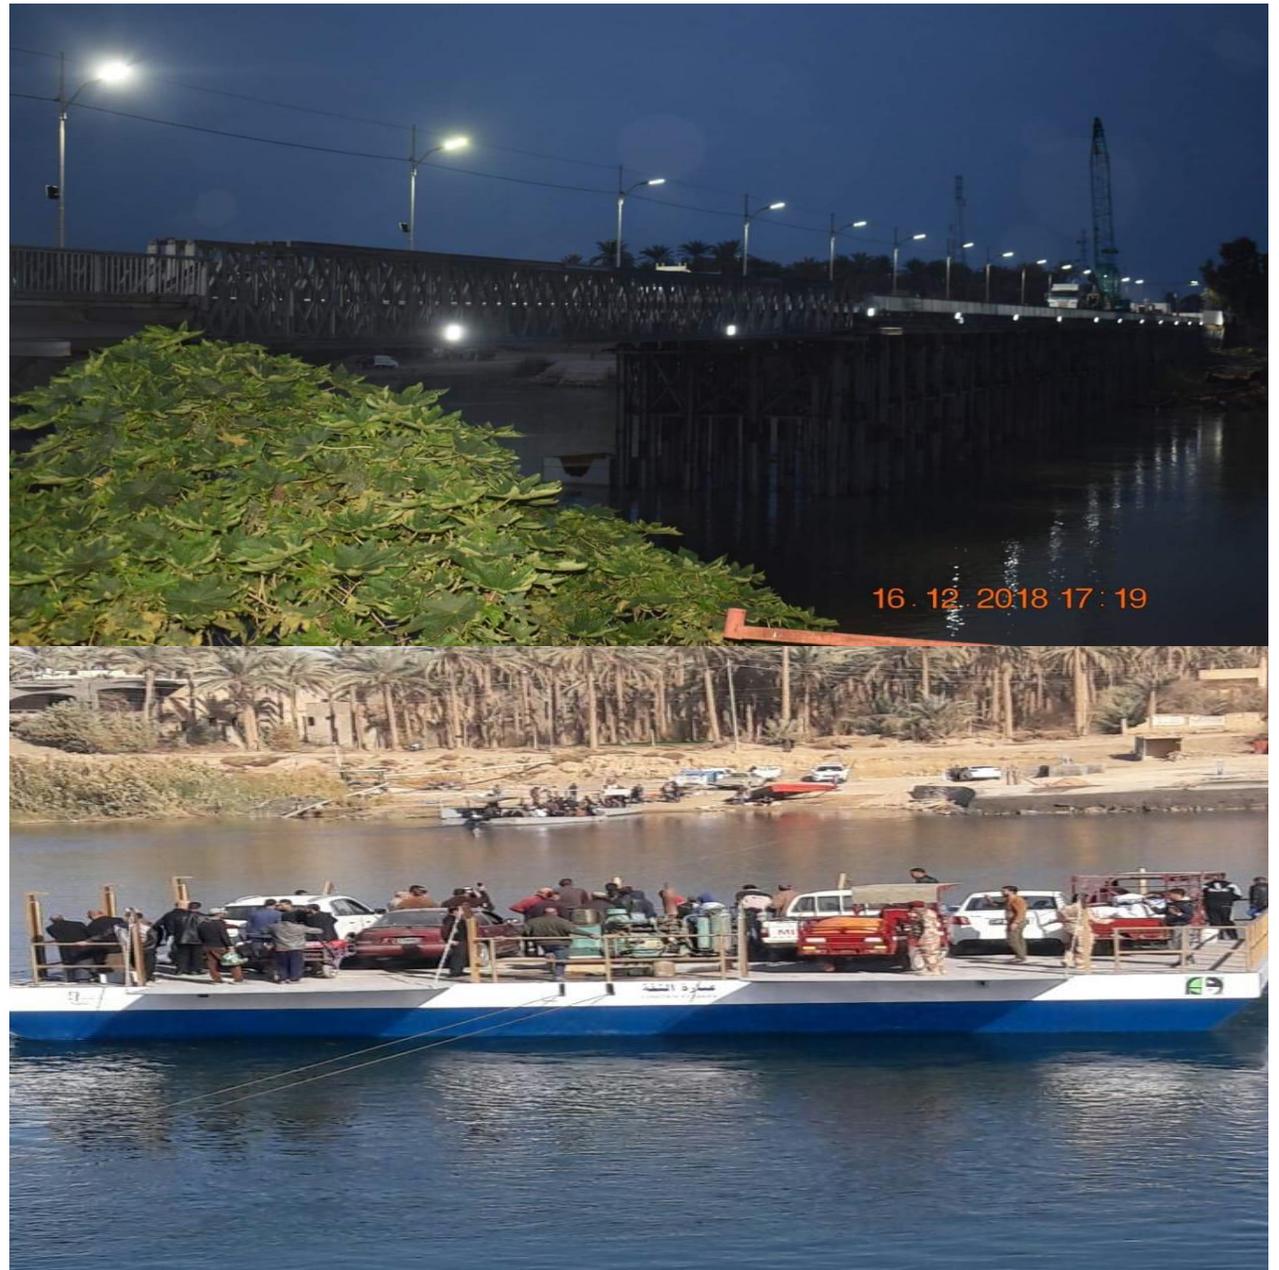

العبارة (حل مؤقت أثناء إعادة تأهيل الجسر)





هدم وإعادة بناء القسم البلدي السادس / الرمادي / الأنبار



هدم وإعادة بناء مدرسة الفتوة / الأنبار



إعادة بناء سدة الرمادي على نهر الفرات / الرمادي / الأنبار



# مشاريع محافظة صلاح الدين



## مشاريع محافظة صلاح الدين للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة الدور الأولى للبنات 12 صف/ الدور - صلاح الدين	التربية	34 27 26.2N 47 47 18.5 E	450	92+180	716,944,000	729,733,400	2017-07-25	2017-08-05	2018-05-08	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	ثانوية الفرقان 18 صف/ تكريت /صلاح الدين	التربية	34 26 18.0N 43 40 35.5E	700	120+170	1,119,644,000	1,194,869,900	2017-07-30	2017-08-28	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	مدرسة حفص الدوري للبنين 6 صف/ الدور/ صلاح الدين	التربية	34 27 42.8N 43 50 31.3E	255	12+120	330,000,000	339,733,500	2017-08-03	2017-08-21	2018-07-03	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية 6 صف/تكريت صلاح الدين	التربية	34 26 42.9N 43 44 05.2E	250	33+180	303,645,000	303,645,000	2017-08-13	2017-08-22	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	روضة الفارس العربي 4 صف/ تكريت / صلاح الدين	التربية	34 36 06.9 N 43 40 32.9 E	350	96+180	417,595,000	417,595,000	2017-08-13	2017-08-28	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	مدرسة الاشواس للبنين 9 صف/ ناحية مكيشيفة/ تكريت/	التربية	34 18 23.4N 43 46 59.1E	140	95+180	469,258,000	506,420,100	2017-08-24	2017-09-11	25/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	تاهيل اقسام داخلية للطالبات وقاعة الدري لمعهد الدور التقني /الدور -صلاح الدين	التعليم العالي	34 27 36N 43 48 34E	3000	10+150	484,140,000	484,140,000	2017-09-25	2017-10-04	2018-12-09	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	مد شبكة مياه تصريف الامطار واعمال الانارة والتبليط للطريق من مستشفى الحارث الى الوادي وبطول 1800 م طول / الضلوعية - صلاح الدين	البلديات	37 68 92N 42 77 17 E	25,000	80+150	994,050,000	1,083,067,000	2017-09-26	2017-10-10	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	اعمال اعادة بناء اقسام داخلية للطلاب عدد/4 جامعة تكريت	التعليم العالي	34° 40.717'N 43° 38.914'E	4,000	78+240	754,370,000	730,462,000	2017-12-11	2017-12-20	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تجهيز مواد لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم صلاح الدين (أعمدة)	كهرباء		50,000	20	144,600,000	144,600,000	2017-12-14		منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	تجهيز مواد لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم صلاح الدين (محولات)	كهرباء		25,000	30	939,000,000	939,000,000	2017-12-14		منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			109,145		6,673,246,000	6,873,265,900							

## مشاريع محافظة صلاح الدين للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تاهيل وتشغيل وحدة ماء العيثة سعة 200م <sup>3</sup> /ساعة/ الشرايط /صلاح الدين	ماء	35 63 864N 43 24 181E	27,000	120	257900000	257900000	2017-07-25	2017-08-06	17/12/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	تاهيل وتشغيل وحدة ماء الحجاج سعة 200م <sup>3</sup> /ساعة/بيجي/ صلاح الدين	ماء	34 85 308N 43 54 104E											
3	اكساء شارع معهد الدور في قضاء الدور/صلاح الدين البلديات	البلديات	34 28 12N 43 47 38.16E	10,000	80	435,000,000	435,000,000	2017-09-17	2017-09-26	منجز	100%	100%	0%	نجاز العمل
4	تاهيل واكمال بناية شرطة الدور وسيطرة العلم/العلم/ صلاح الدين	الداخلية	21 49 34 .27N 26 76 43 47E	40,000	10+90	307,000,000	324,387,000	2017-09-17	2017-10-01	16/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تأهيل مقرات مديريات (التدخل السريع (سوات) ومكافحة المتفجرات وانضباط الشرطة) وقاعة الشهيد صالح عويد/ تكريت/ صلاح الدين	الداخلية	3.21 34 37N 23.44 43 40E	30,000	85	455,595,000	455,595,000	2017-09-25	2017-10-05	20/12/2017	100%	100%	0	انجاز العمل
6	تاهيل الشارع الرابط بين شارع الزهور والشارع الحولي/ تكريت/ صلاح الدين	البلديات	34 35 159N 43 40 425E	150,000	20+80	762,737,000	767,215,000	2017-09-25	2017-10-02	26/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	إعادة تاهيل الشارع الممتد من تقاطع المجلس القديم باتجاه القادسية بطول 680 م / تكريت /صلاح الدين	البلديات	37 68 92N 42 77 17 E											
8	تاهيل مبنى مختبر صلاح الدين الاتشاني/ تكريت /صلاح الدين	البلديات	43 40 58.16E 34 34 47.29N											
9	تاهيل مديرية كمارك صلاح الدين/ تكريت /صلاح الدين	البلديات	43 41 01.95E 34 35 11.93N											
10	تاهيل مديرية إحصاء صلاح الدين/ تكريت / صلاح الدين	البلديات	43 41 02.27E 34 35 13.79N	180,000	84	872,881,000	872,881,000	2017-10-03	2017-10-17	15/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تاهيل بناية ناحية دجلة المتضررة من الاعمال الإرهابية/سامراء/صلاح الدين	البلديات	43 44 11.1E 34 23 39.25N											
12	تاهيل مديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين	البلديات	43 41 01.15E 34 35 00.27N											
13	تجهيز مولدة مختلفة السعات لمشاريع الماء	ماء		80,000	90	1,173,000,000	1,173,000,000	2017-11-26	منجز		100%	100%	0%	انجاز العمل
14	تجهيز مولدة مختلفة السعات لمحطات الرفع والضخ لمشاريع الصرف الصحي	البلديات				561,000,000	561,000,000							
15	تجهيز غواطس عدد 5 لمحطات ضخ مياه الامطار الأولى والثانية في قضاء الدجيل - صلاح الدين	ماء		75,000	30	95,450,000	95,450,000	2017-12-04	منجز	30/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
16	تجهيز غواطس نهريّة ومضخات الدفع لمجمعات الماء في شاطئ الجدر وهيجل الكبير والفياض الثاني وشهيد احمد وسديرة الوسطى	ماء		50,000	45	187,250,000	187,250,000	2017-12-10	منجز	22/2/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
17	تجهيز مواد لصيانة شبكة كهرباء مركز قضاء الطوز وامرلي (اعمدة)	كهرباء		50,000	20	75,300,000	75,300,000	2017-12-14	منجز		100%	100%	0%	انجاز العمل
	تجهيز مواد لصيانة شبكة كهرباء مركز قضاء الطوز وامرلي (محولت)	كهرباء		50,000	30	469,500,000	469,500,000	2017-12-14	منجز		100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			742,000		5,674,478,000	5,652,613,000							



مدرسة حفص الدوري / قرية أبي دلف / الدور / صلاح الدين



مدرسة الدور الأولى / الدور / صلاح الدين



قاعة الشهيد صالح عويد / تكريت / صلاح الدين



إعادة تأهيل مقر إدارة (سوات)



مركز شرطة الدور / صلاح الدين



ثانوية الفرقان / صلاح الدين



إعادة تأهيل بناية ناحية دجلة / سامراء / صلاح الدين





تأهيل الأقسام الداخلية للطالبات | المعهد الفني / الدور / صلاح الدين



إعادة تأهيل شارع معهد الدور / صلاح الدين



محطة ماء الحويجة / تكريت / صلاح الدين

# مشروع محافظة كركوك



## مشاريع محافظة كركوك للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	كلفة المشروع بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	هدم وإعادة بناء مدرسة الشهيد الابتدائية 6 صف/كركوك	التربية	35 14.653N 44 16.121E	180	165	306,926,000	306,926,000	2017-07-23	2017-08-03	29/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	هدم وإعادة بناء مدرسة الامام حسن الابتدائية 6 صف/ كركوك	التربية	35 13.101N 44 16.902E	180	165	309,656,000	306,926,000	2017-07-23	2017-08-03	27/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			360		616,582,000	613,852,000							

## مشاريع محافظة كركوك للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	إعادة تاهيل الشبكات الكهربائية	كهرباء	35 27.117N 44 11.325E	5,200	30	153,734,000	153,734,000	2017-07-31	2017-08-10	31/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	إعادة تاهيل الشبكات الكهربائية في قرى ملا عبدالله وادريس خباز وادريس خزعل والهندية 1,2/كركوك													
3	تاهيل وتشغيل مجمع ماء بطاقة (50)م/3 ساعة في قرية قرنية- ناحية يابجي/كركوك	ماء	35 24.107N 44 21.151E	3,800	85	71,281,000	71,281,000	2017-07-31	2017-08-03	14/11/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	صيانة طريق الشمسية/كركوك	البلديات	35 14.511N 44 16.217E	4,000	55	189,340,000	189,340,000	2017-08-03	2017-08-03	24/9/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تبليط شوارع داخلية بالكونكريت قرب مدرسة البلديات الوقف الشيعي في قصر البشير // كركوك													
6	تجهيز محولات الى قضاء الحويجة	كهرباء		250,000	30	1,689,000,000	1,689,000,000	2017-12-14			100%	100%	0%	انجاز العمل
7	ايصال الماء الى قرية الهندية الجديدة / ناحية الملتقى	ماء		20,000		55,600,000	55,600,000		تنفيذ امانة	15/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تاهيل وتبليط طريق كركوك الحويجة قرب مجسر خالد	طرق وجسور		75,000		63,200,000	63,200,000		تنفيذ امانة	24/12/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	تاهيل محطة ماء مزرع العاصي/ الحويجة	ماء		12,500		69,600,000	69,600,000		تنفيذ امانة	25/12/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			370,500		2,291,755,000	2,291,755,000							



إعادة تأهيل وتبليط طريق كركوك - الحويجة بالقرب من مجسر خالد



إعادة تأهيل محطة ماء مزهر العاصي / الحويجة



أعادة بناء مدرسة الشهيد الابتدائية / البشير / كركوك



تاهيل شبكة ماء قرية الهندية الجديدة / الملتقى / كركوك



إعادة تأهيل وصب شوارع في قرية البشير / كركوك



إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في قرية الملا عبد الله / كركوك

# مشاريع محافظة ديالى

## Diyala Governorate Projects




مشاريع محافظة ديالى للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)+المدة الإضافية	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة امر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة المامون /12 صف/ العظيم/الخالص/ديالى	التربية	34.273507 N 44. 542155E	720	107+180	752,704,000	745,105,400	2017-07-23	2017-09-26		100%	100%	0%	انجاز العمل
2	مدرسة الهديل /9 صف/الصدور/المقدادية/ديالى	التربية	34 03 44.1N 44 59 00.6E	600	168+63	461,667,000	505,058,200	2017-07-25	2017-09-24	2019-02-18	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	مدرسة ابن زيدون	التربية	34 01 30N 44 57 32.1E	600	160	775,658,000	775,658,000				0%	0%	0%	تم فسخ العقد رضائياً مع المقاول
4	تبليط شارع من جسر محمود العلي الى جسر سراجق دلي عباس بطول ( 6 كم )	الطرق	34 01 41.7N 44 45 17.4E	2,200	120	449,000,000	449,000,000	2017-11-12	2017-11-29	2018-04-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تبليط واكساء شوارع في منطقة الشرقية والغربية في ناحية سد العظيم (تبليط شوارع داخل حدود البلدية ناحية سد/العظيم)	الطرق		3800	60	390,420,000	390,420,000	2017-11-13	2017-12-25	13/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	صب شوارع حي الاسراء في السعدية	الطرق	34 11 18.24N 45 07 08.5E	2,500	45	116,040,000	116,040,000	2017-11-13	2017-12-04	17/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	تبليط طرق في المقدادية بطول (5 كم )	الطرق		10,000	60	348,860,000	348,860,000	2017-11-13	2017-12-13	28/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تأهيل الشارع العام لمدينة جلولاى الرئيسي	الطرق	34 15 41.59N 45 9 29.47E	200000	90	259,563,500	259,563,500	2017-11-13	2018-01-02	20/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	فرش خابط بطول ( 12 كم ) من جسر شارقاق – قرية العباسية الى قرية العالي وزحام الاسيود	الطرق		2000	90	168,750,000	168,750,000	2017-11-07	2017-11-19	2018-08-02	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تبليط شوارع داخل حدود البلدية /بلدية المنصورية بطول 1650 م	الطرق		8000	40	375,373,250	375,373,250	2017-11-22	2017-12-06	25/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تبليط شوارع في قرى شيروين بطول 6,5 كم / المنصورية شيروين/ ديالى	الطرق	34 04 13 N 44 88 08E	10000	12+180	559,485,000	559,484,000	2017-11-13	2017-11-19	24/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	تأهيل الشارع رقم 21 المار ضمن م311 و 313 بطول 1,4 كم للمقطع ما بين المستوصف الصحي واستدارة الدور الجاهزة في حي التحرير/بعقوبة/ديالى	الطرق	46 82 27.411E 37 32 93 2.28N	4500	100	195,720,000	195,720,000	2018-05-06	20/6/2018	2019-02-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
13	مشروع تأهيل شبكة انارة شوارع ناحية كنعان- بعقوبة/ديالى	الكهرباء			45	111,220,000	111,220,000	2018-07-06	21/6/2018	29/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
14	مشروع صيانة واكساء وتبليط طرق وقرى بلد روز- قرية عتبه بطول 7,5 كم - قرية اطعيمات 1,5 قضاء بلدروز/ديالى	الطرق	33 40 39.7N 45 01 36.3E	8000	120	921,260,000	921,260,000	20/6/2018	2018-04-07	31/10/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
15	مشروع تبليط شارع ام العظام العثمانية بطول 2,15 كم قضاء بعقوبة/ديالى	الطرق	33 39 19N 44 44 37 35.7E	1000	75	227,020,000	227,020,000	25/6/2018	19/7/2018	2018-03-10	100%	100%	0%	انجاز العمل
16	مشروع تبليط شوارع بطول 1,8 كم لقرى خان بني سعد - بعقوبة (ربيع عطشانة وعلي الهادي والشيماء)/ديالى	الطرق	33 56 6 87N 44 44 54 89 57E	2500	30	185,040,000	185,040,000	25/6/2018	19/7/2018	2018-09-08	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع					6,297,780,750	6,333,572,350							

## مشاريع محافظة ديالى للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تاهيل مجمع ماء سويد وزحام والعالى وبسعة 200 م <sup>3</sup> / ساعة/المقدادية/ ديالى	ماء	34 03 46 N 44 58 35 E											
2	تاهيل مجمع ماء نوفل والصدور والهارونية سعة 200 م <sup>3</sup> / ساعة / المقدادية /ديالى	ماء	34 02 79.1N 44 58 54.3E	13,500	60	385,400,000	385,400,000	2017-07-20	2017-08-27	26/10/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	تجهيز ونصب محطة تحلية بطاقة 200م <sup>3</sup> / ساعة قرية حد مزيد/ بعقوبة/ديالى	ماء	33 48 06 N 44 44 09 E											
4	تاهيل شارع السوق في ناحية السعدية/ديالى	البلديات	30 11 23.01N 45 07 13.63E	35,000	35	106,750,000	106,750,000	2017-07-31	2017-09-14	18/10/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
		المجموع		48,500		492,150,000	492,150,000							



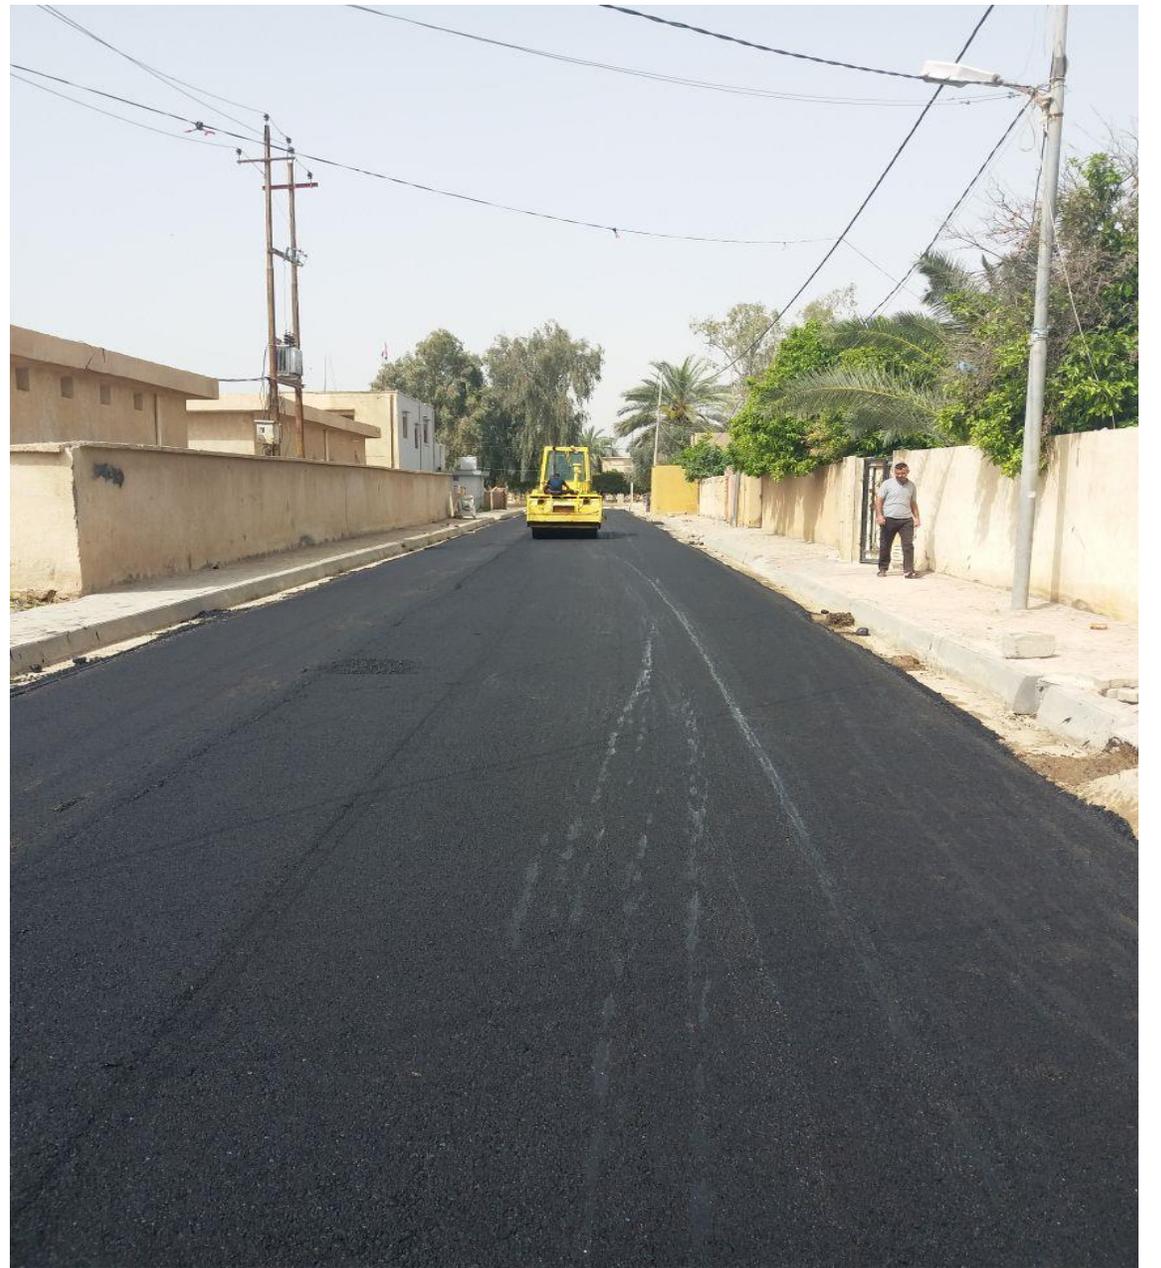

تبليط الشوارع وعمل أرصفة داخل الحدود البلدية بطول (1650 م) / المنصورية / ديالى





تأهيل وتبليط شارع السوق / السعدية / ديالى





## مشروعات محافظة بابل / شمال بابل للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	تكلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تجهيز وفحص وتنفيذ خطوط جهد (11 كي.في) في قطاع المسيب / بابل	كهرباء		11,568	150	819,788,000	819,788,000	21-11-2017	26/11/2018		0%	0%	0%	تم فسخ العقد رضائياً مع المقاول
	المجموع					819,788,000	819,788,000							

## مشروعات محافظة بابل / شمال بابل للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	تكلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	صيانة طريق الحامية - صنيديج بطول 3,5 كم/جرف النصر/شمال بابل	طرق وجسور	43 22 34 X 36 27 763 Y	12,500	40	287,125,000	287,125,000	13-08-2017	13-08-2017	09-05-2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	مد واستبدال شبكة ماء متفرقة في حي المواطنين والحي العسكري/جرف النصر/شمال بابل	ماء	32 46 32.1N 44 15 48.3E	18,000	50	298,620,000	298,620,000	13-08-2017	14-08-2017	10-04-2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	مد واستبدال شبكة ماء الحامية/جرف النصر/شمال بابل	ماء	32 48 28.4 N 44 15 53.9 E											
4	مد واستبدال شبكة ماء القاطع الشمالي 1 (الفاضلية 1)/جرف النصر /شمال بابل	ماء	33 00 53.5N 44 09 56.1 E											
5	مد واستبدال شبكة ماء القاطع الشمالي 2 (الفاضلية 2)/جرف النصر/شمال بابل	ماء	33 00 49.6N 44 08 36 E											
6	صيانة طريق الخضر بمحاذاة نهر الفرات بطول 18 كيلو	طرق وجسور	43 46 70X 36 33 44 6Y											
	المجموع			45,500		1,144,284,520	1,144,305,000							



استبدال شبكة الماء / شمال بابل



إعادة تاهيل الطريق (الحامية - صنديج) / جرف النصر / بابل



تاهيل طريق الخضر على طول نهر الفرات لمسافة 18 كم

# محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

# Baghdad Governorate Projects

الانبار



## مشاريع محافظة بغداد/ حزام بغداد للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة حافظ ابراهيم الابتدائية 6 صف/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 195 557N 43 968 712E	360	59+70	349,240,000	380,255,000	23-07-2017	11-09-2017	24/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	مدرسة المسجد الأقصى الابتدائية 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 213 317N 43 892 967 E	600	170124+170	479,647,000	513,436,400	26-07-2017	11-09-2017	08-05-2018	100%	100%	87%	انجاز العمل
3	مدرسة ابراهيم طوقان الابتدائية 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 209 976N 43 930 087E	600	51+175	400,366,000	440,344,000	30-07-2017	11-09-2017	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة عز الدين القسام الابتدائية 18 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 216 750 N 43 879 541 E	900	105+200	827,057,000	815,204,000	30-07-2017	11-09-2017	17/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	مدرسة أسماء بنت أبو بكر 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 216 750 N 43 879 541 E	600	111+180	398,228,000	437,960,200	30-07-2017	11-09-2017	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	مدرسة الزخرف 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 219 497 N 43 911 557E	600	126+190	1,024,768,500	1,073,136,960	02-08-2017	11-09-2017	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	مدرسة الخوارزمي الابتدائية 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 394 093N 44 037 368E	600	124+180	425,137,000	466,368,600	03-08-2017	11-09-2017	15/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تاهيل ناظم صدر ابو غريب والناظم القاطع في كيلو (8) من القناة الموحدة والمنشآت الاخرى.	الموارد المائية		2,000,000	100+120	830,278,500	899,346,750	07-11-2017	20-11-2017	14/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			2,004,260		4,734,722,000	5,026,051,910							

## مشاريع محافظة بغداد/ حزام بغداد للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تجهيز وتنفيذ ونصب شبكات كهرباء في ناحية النصر والسلام/ أبو غريب/حزام	كهرباء		2000	50	438,843,370	13-08-2017	24-08-2017	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	تاهيل شبكات كهرباء (تجهيز محولات) أبو غريب/حزام بغداد	كهرباء		15000	15	255,600,000	18-10-2017	قيد التنفيذ	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	انشاء جسر عودة الشكر في الرفوش	الطرق والجسور		25000	30	88,225,000		تنفيذ امانة	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	تاهيل محطات ماء (السعدان, الهيتاويين, فزع شنيتر)	ماء		10,000		284,350,000		تنفيذ امانة	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تطوير موقع الصندوق	دوائر حكومية				100,000,000		20-11-2017	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			52000		1,167,018,370							



جسر عودة الشكر / حزام أبو غريب / بغداد



إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرى أبو غريب / حزام بغداد





(إعادة تأهيل محطة ماء السعدان / أبو غريب / حزام بغداد)



**مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية  
حسب المحافظات لعام 2018**

# مشاريع محافظة نينوى



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / نينوى


ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	لشهر آب نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
1	اعادة تاهيل مستشفى تلعفر العام	تلعفر	الصحة	قيد التنفيذ	90%	12	13/11/2018	180	2018/11/27	1,038,672,000
2	صيانة واعادة تاهيل القنطرة الصندوقية السداسية الواقعة على طريق موصل بغداد في المحطة (32+000) على وادي القصب ولممرى الذهاب والاياب بطول 65م	القيارة	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	47%	16	18/11/2018	180	2018/11/27	830,406,000
3	اعادة اعمار بناية المركز الطلابي و وحدة الرياضة الجامعية في الكلية التقنية	الموصل	التعليم العالي	قيد التنفيذ	78%	140	31/12/2018	200	2019/01/14	553,100,000
4	ترميم بناية المجمع الاذاعي والتلفزيوني / الفيصلية	الموصل	شبكة الاعلام العراقي	منجز	100%	28	29/11/2018	150	2018/12/03	589,560,000
5	اعادة تاهيل سقائف لمخزن المواد الغذائية الكرامة (1)	الموصل	التجارة	قيد التنفيذ	76%	35	4/12/2018	240	2018/12/18	2,254,676,800
6	تاهيل ابنية الاقسام الداخلية – مجمع القادسية / جامعة الموصل	الموصل	التعليم العالي	قيد التنفيذ	90%	111	19/12/2018	220	2019/01/02	509,927,000
7	تاهيل وصيانة جسر الحضر والاجزاء المتضررة في الطريق الرابط بين طريق (موصل – بغداد) والمنطقة اثرية في الحضر (المرحلة الاولى)	الحضر	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	20%	99	18/12/2018	240	1/1/2019	1,501,358,000
8	اعادة تاهيل المشروع الوطني لمديرية المرور في الشلالات / المرحلة الاولى	الموصل	الداخلية	قيد التنفيذ	16%	132	30/12/2018	550	2019/01/10	1,961,520,000
9	تاهيل بناية كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل	الموصل	التعليم العالي	متوقف / لاسباب تعود الى المفاوض	62%	41	4/12/2018	200	2018/12/18	1,537,540,000
10	هدم واعادة بناء ثانوية تل واعي للبنين 12 صف	حمام العليل	التربية	قيد التنفيذ	93%	44	5/12/2018	240	2018/12/13	579,291,200
11	هدم واعادة بناء ثانوية فلجيل 12 صف	تلكيف	التربية	قيد التنفيذ	89%	51	5/12/2018	240	2018/12/13	579,291,200
12	هدم واعادة بناء متوسطة علي بن ابي طالب للبنين 12صف	الأيمن	التربية	قيد التنفيذ	57%	45	5/12/2018	240	2018/12/13	579,291,200

579,291,200	2018-12-16	240	4/12/2018	36	77%	قيد التنفيذ	التربية	الايسر	هدم واعادة بناء متوسطة المسعودي 12 صف	13
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	76	26%	قيد التنفيذ	التربية	تلعفر	هدم واعادة بناء مدرسة كركافر 12 صف	14
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	75	73%	قيد التنفيذ	التربية	الأيمن	هدم واعادة بناء مدرسة العامل للبنين 12 صف	15
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	74	66%	قيد التنفيذ	التربية	الأيمن	هدم واعادة بناء مدرسة الحدباء للبنين 12 صف	16
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	73	44%	قيد التنفيذ	التربية	الايسر	هدم واعادة بناء مدرسة العطاء للبنات 12 صف	17
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	88	70%	قيد التنفيذ	التربية	الأيمن	هدم واعادة بناء مدرسة القدس الابتدائية للبنين 12 صف	18
511,028,000	2018-12-27	220	26/12/2018	126	83%	قيد التنفيذ	التربية	الايسر	هدم واعادة بناء مدرسة ابن رشد للبنين 12 صف	19
2,775,071,200	2019-01-23	450	26/12/2018	125	57%	قيد التنفيذ	التجارة	الموصل	تاهيل مجمع مخازن الحرية وتاهيل مباني الشركة العامة لتصنيع الحبوب	20
1,530,000,000		45	23/10/2018	8	100%	منجز	الكهرباء		تجهيز محولات قدرة 16 MVA لمحطات جهد 33/11 كف ومحولات توزيع جهد 0,4 / 11 كف	21
177,500,000		45	23/10/2018	7	100%	منجز			تجهيز محولات توزيع سعة KVA250	
2,988,297,000	2019-01-12	360	30/12/2018	135	39%	قيد التنفيذ	الكهرباء	الموصل	تاهيل محطة كهرباء النسيج في الساحل الايمن	22
3,381,299,000	2018-12-17	360	4/12/2018	39	58%	قيد التنفيذ	الكهرباء	الموصل	تاهيل محطة كهرباء الدواسه في الساحل الايمن	23
3,281,763,000	2018-12-17	360	4/12/2018	38	22%	قيد التنفيذ	الكهرباء	الموصل	تاهيل محطة كهرباء باب البيض في الساحل الايمن	24
382,221,000		100	30/12/2018	134	100%	منجز	الكهرباء	الأيمن	المعدات المطلوبة لورشة فحص وتصليح المحولات في الجانب الايمن	25
188,480,000	2018-06-19	60	5/6/2018	2	100%	منجز	البلديات	سنجار	صب ارصفة وبناء القوالب الجانبية للشارع الرئيسي في حي النصر وبربوش وصيانة الحفر والتخسفات في مناطق متفرقة / مركز قضاء سنجار	26
30,864,723,800									المجموع	

## الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / نينوى


ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	لشهر تموز 2019 نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تجهيز جهاز التصوير المقطعي عدد 2	الموصل	الصحة	منجز	100%	104	19/12/2018	180		1,700,000,000
2	تجهيز جهاز الرنين المغناطيسي عدد 2	الموصل	الصحة	منجز	100%	105	19/12/2018	180		2,560,000,000
3	تجهيز جهاز كرسي أسنان متكامل عدد(50)	عدة اقصية	الصحة	قيد التنفيذ	85%	110	19/12/2018	180		964,375,000
4	إعادة تأهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق حي الخضراء	الموصل	المجاري	قيد التنفيذ	100%	72	13/12/2018	160	2018-12-27	336,068,750
5	تاهيل المجرى الصندوقي في باب البيض	الموصل	الماء والمجاري	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	2018-12-24	122,870,000
6	تاهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق اليرموك	الموصل	المجاري	قيد التنفيذ	100%	71	13/12/2018	150	2018-12-27	422,670,000
7	تاهيل بناية مخازن مديرية المجاري مع انشاء مسقفات عدد/3 في وادي عكاب	الموصل	المجاري	متوقف	85%	42	4/12/2018	180	2018-12-18	597,820,000
8	تاهيل بناية الهيئة العامة للضرائب في محافظة نينوى/ الجانب الايمن (عمارة التامين على الحياة)	الموصل	الادارة المحلية	تنفيذ امانة / الغي - مؤجل للعام القادم				60	2018-12-24	197,495,000
9	تاهيل مخازن مركز تكنولوجيا البذور/ موقع الموصل	الموصل	العلوم والتكنولوجيا	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	2018-12-24	221,525,000
10	اعادة تأهيل قسم بحوث نينوى		الزراعة	قيد التنفيذ	100%	47	5/12/2018	100	2018-12-16	232,313,000
11	إعادة اعمار بناية المعهد التقني نينوى		التعليم العالي	منجز	100%	13				
12	اعادة اعمار بناية المختبرات العلمية في الكلية التقنية الزراعية / الموصل		التعليم العالي	منجز	100%	13	13/11/2018	180	2018-11-25	747,647,600


322,399,200	2018-12-27	150	13/12/2018	87	83%	قيد التنفيذ	التربية	الموصل	تاهيل ابنية مدرسية في الموصل / الجانب الأيمن (البتول والمواهب)	13
574,228,000	2019-01-03	180	23/12/2018	114	95%	قيد التنفيذ	رئاسة الوزراء		تأهيل بناية مديرية المخبرات في نينوى	14
356,390,600	2019-01-03	120	19/12/2018	101	100%	منجز	الداخلية		إعادة تاهيل مراكز شرطة (اليرموك , الوقاص , النصر) المرحلة الثانية	15
				101	100%	منجز	الداخلية		تاهيل بناية الغرامات والحاسبة لمرور نينوى	16
471,636,000	2018-12-30	180	16/12/2018	90	50%	قيد التنفيذ	دوائر حكومية		أعادة بناء بناية مديرية مختبر نينوى الانشائي	17
598,800,000	2018-12-27	180	13/12/2018	89	22%	قيد التنفيذ	الطرق والجسور		صيانة و تاهيل جسر وادي المر على طريق (كسك - ربيعة)	18
370,080,000	2018-12-27	100	13/12/2018	83	100%	منجز	الطرق والجسور	تلعفر	تاهيل طرق ناحية العياضية	19
1,418,500,000	2019-01-21	45	23/12/2018	117	100%	منجز	الكهرباء		تجهيز محولات كهربائية (تجهيز محولات سعة(400,250) kva عدد (185)محولة لمخزن الكرامة)	20
118,654,000	2018-12-24	60			95%	تنفيذ امانة / قيد التنفيذ	التربية	سنجار	تاهيل ابنية مدرسية في قضاء سنجار (مدرسة كوجو)	21
120,238,000	2018-12-24	60			100%	تنفيذ امانة / منجز	التربية	تلعفر	تاهيل ابنية مدرسية في قضاء تلعفر مدرسة (اميرة الجنة و المنتظر و الجزيرة)	22
12,453,710,150									المجموع	



## تأهيل الأبنية المدرسية لـ (مدرسة اميرة الجنة - الجزيرة -المنتظر )


قام صندوق إعادة اعمار  
المناطق المتضررة من  
العمليات الإرهابية بإعادة  
اعمار مشروع تأهيل الأبنية  
المدرسية وهو ضمن خطة  
مشاريع عام 2018 مدة  
العمل مشروع 75 يوم وقد  
تم إنجاز العمل 100%  
وحسب التوقيتات  
الموضوعة في العقد

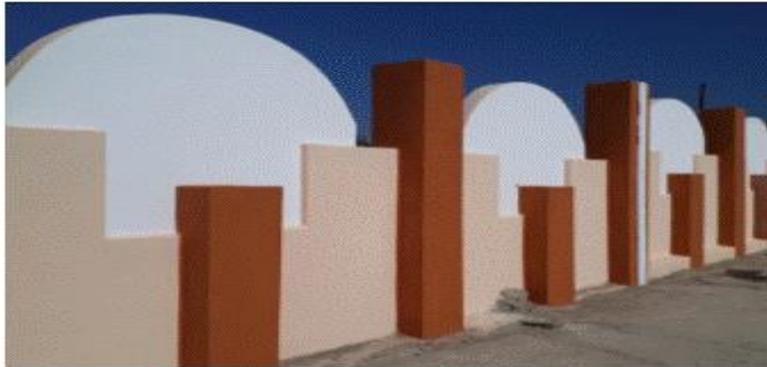

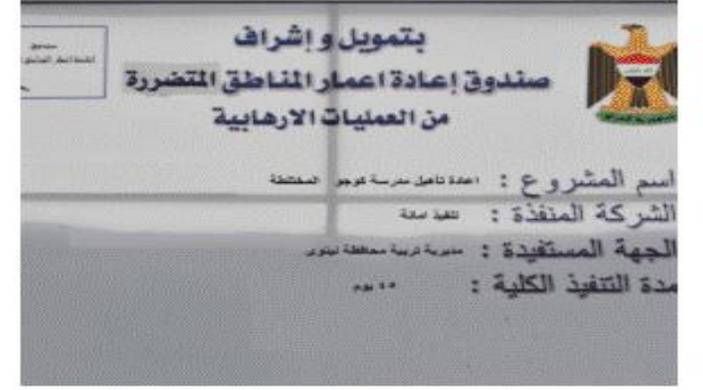

**تأهيل مدرسة كوجو في قضاء سنجار**

قام صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بإعادة اعمار مشروع تأهيل مدرسة كوجو وهو ضمن خطة مشاريع عام 2018 مدة العمل مشروع 60 يوم مستمر حالياً علماً ان نسبة الإنجاز الفعلي 95%

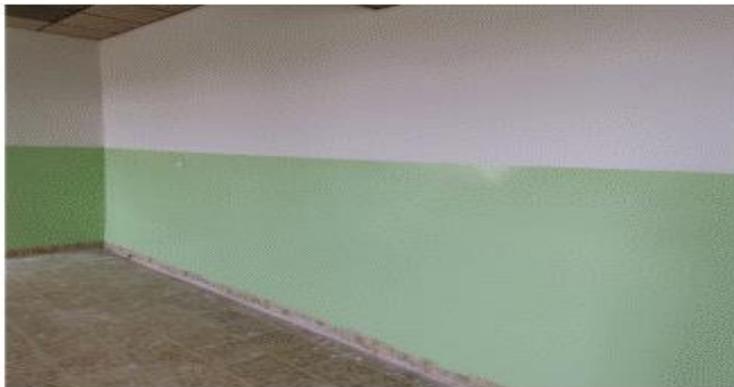



## إعادة تأهيل مراكز الشرطة وأبنية مرور نينوى

قام صندوق إعادة اعمار  
المناطق المتضررة من  
العمليات الإرهابية بإعادة  
اعمار مشروع إعادة تأهيل  
مراكز الشرطة وأبنية مرور  
نينوى وهو ضمن خطة  
مشاريع عام 2018 مدة  
العمل مشروع 120 يوم  
ومستمر به العمل حالياً  
علماً ان نسبة الإنجاز  
الفعلي 100%



## تأهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق اليرموك

قام صندوق إعادة اعمار  
المناطق المتضررة من  
العمليات الإرهابية بإعادة  
اعمار مشروع معالجة  
المياه الثقيلة لشقق  
الخضراء وهو ضمن خطة  
مشاريع عام 2018 مدة  
العمل مشروع 150 يوم  
ومستمر به العمل حالياً  
علماً ان نسبة الإنجاز  
الفعلي 100%

# مشروع محافظة الانبار

الانبار



## الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	هدم وإعادة بناء مركز صحي ودار سكن البوزعيان	الخالدية	الصحة	منجز	100%	124	26/12/2018	200	8/1/2019	1,150,824,000
2	هدم وإعادة بناء مركز صحي المضيق	الخالدية	الصحة	منجز	100%	124				
3	هدم وإعادة بناء مركز صحي في البوبالي مع دار سكن	الخالدية	الصحة	منجز	100%	124				
4	هدم وإعادة بناء جنسية راوه	راوه	الداخلية	قيد التنفيذ	85%	136	30/12/2018	180	12/1/2019	907,329,600
5	هدم وإعادة بناء جنسية عنه	عنه	الداخلية	قيد التنفيذ	35%	136		180		
6	هدم وإعادة بناء البطاقة الوطنية في القائم	القائم	الداخلية	منجز	100%	138	30/12/2018	150	13/1/2019	579,545,000
7	تاهيل دائرة البطاقة الوطنية في العبيدي		الداخلية	منجز	100%	138		150		
8	اعادة اعمار جسر وادي الفحيمي الاول	عنه	الطرق والجسور	منجز	100%	130	27/12/2018	180	7/1/2019	633,920,000
9	اعادة اعمار جسر وادي زغيدان	حديثه	الطرق والجسور	منجز	100%	122	26/12/2018	180	7/1/2019	467,200,000
10	اعادة اعمار جسر البغدادي العائم بطول 420متر		الطرق والجسور	قيد التنفيذ	92%	131	30/12/2018	360	12/1/2019	1,301,888,000
	المجموع									5,040,706,600

## الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	شهر تموز نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	صيانة مجمع ماء البوسودة سعة (200م3/سا)	الخالدية	الماء والمجاري	منجز	100%	19	22/11/2018	90	16/12/2018	560,392,000
2	تجهيز ونصب وحدة مجمعة تقوية سعة 200م3/ساعة حي القدس والشهداء	الخالدية	الماء والمجاري	منجز	100%	19				
3	تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 100م3/ساعة (النساف/اليوعلون /البوراشد )	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56	6/12/2018	120	20/12/2018	1,003,847,500
4	تأهيل مجمع ماء الاسباني/ الشهداء النعيمية	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56				
5	تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 200م3/ساعة لمناطق الصبيحات	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56				
6	صيانة وتأهيل مجمع ماء بني زيد سعة (200م3/س)	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56				
7	تأهيل مجمع ماء سويحل و النهضة الشرقية/ القائم	القائم	الماء والمجاري	منجز	100%	50	5/12/2018	55	2/1/2019	130,640,000
8	صيانة مجمع ماء الصروح سعة 300 م3/ساعة	هيت	الماء والمجاري	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	19/12/2018	125,670,000
9	تجهيز ونصب وحدة تقوية سعة مليون غالون لمجمع ماء الخسفة	حديثة	الماء والمجاري	منجز	100%	52	5/12/2018	90	3/1/2019	699,079,000
10	تأهيل مشروع ماء حديثة - حقلانية الموحد	حديثة	الماء والمجاري	منجز	100%	52				
11	تأهيل مجمع ماء حي الشرطة لناحية بروانة	حديثة	الماء والمجاري	منجز	100%	52				
12	صيانة مشروع ماء الجزيرة في الرمادي	الرمادي	الماء والمجاري	منجز	100%	62	11/12/2018	150	24/12/2018	743,927,500
13	مد شبكة ماء في الاحياء الجنوبية لمدينة الفلوجة	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	29	29/11/2018	80		560,939,200
14	تنفيذ خط دكتايل من ناقل الخزان الى الحي العسكري	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	29			24/12/2018	
15	مد شبكة ماء في حي الجمهورية وحي الشهداء	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	29				
16	انشاء خزان كونكريتي سعة (750) م3 في قضاء الرطبة	الرطبة	الماء والمجاري	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	14/12/2018	197,212,000
17	تأهيل الشبكة الكهربائية في قضاء حديثة	حديثة	الكهرباء	منجز	100%	100	18/12/2018	180	5/1/2019	529,287,500
18	تأهيل الشبكة الكهربائية في ناحية حصيبة الشرقية / قضاء الخالدية	الخالدية	الكهرباء	منجز	100%	30	29/11/2018	150	23/12/2018	202,198,000
19	تأهيل الشبكة الكهربائية في زوية غراب	الخالدية	الكهرباء	منجز	100%	30				
20	تأهيل الشبكات الكهربائية في قضاء الرطبة	الرطبة	الكهرباء	منجز	100%			60	26/12/2018	248,715,000

794,233,500	17/12/2018	120	5/12/2018	46	100%	منجز	الكهرباء	الكرمة	تاهيل الشبكة الكهربائية الهوائية المتضررة في قضاء الكرمة	21
22,000,000					100%	شراء مباشر / منجز	الكهرباء	القائم	تجهيز مولد كهرباء / قانمقامية القائم	22
28,000,000					100%	شراء مباشر / منجز	الكهرباء	القائم	تجهيز مولد كهرباء / تربية القائم	23
407,976,000	11/12/2018	150	2/12/2018	33	100%	منجز	الطرق والجسور	البغدادي	اعادة اعمار جسر البغدادي الخرساني على طريق رمادي-حديثة	24
202,400,000	20/12/2018	90	11/12/2018	61	100%	منجز	الطرق والجسور	الفلوجة	أعادة أعمار جسر الجعفي فوق سكة القطار/ الفلوجة	25
607,416,000	9/12/2018	120	27/11/2018	25	100%	منجز	التجارة	الرمادي	ترميم وصيانة مخازن عدد 6/ في سايلو الرمادي	26
573,888,800	2/1/2019	180	20/12/2018	112	97%	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	الرمادي	هدم وإعادة بناء مدرسة الدعاء/12 صف	27
552,765,000	28/12/2018	160	16/12/2018	91	100%	منجز	التربية والتعليم	عنه	تاهيل الورش لاعدادية صناعة عنة	28
581,613,500	16/12/2018	180	4/12/2018	40	100%	منجز	التربية والتعليم	الكرمة	هدم وإعادة بناء مدرسة الفداء /12 صف	29
1,190,436,000	10/1/2019	180	20/12/2018	113	100%	منجز	التربية والتعليم	راوه	هدم وإعادة بناء مدرسة المواهب للبنين 12 صف	30
				113	100%	منجز	التربية والتعليم	راوه	هدم وإعادة بناء مدرسة ذو الجادين للبنين 12 صف	31
1,190,436,000	2/1/2019	180	19/12/2018	109	100%	منجز	التربية والتعليم	القائم	هدم وإعادة بناء مدرسة شط العرب للبنين 12 صف	32
				109	100%	منجز	التربية والتعليم	القائم	هدم وإعادة بناء مدرسة النهضة الشرقية للبنين 12 صف	33
694,910,500	27/12/2018	90	13/12/2018	69	100%	منجز	التربية والتعليم	الفلوجة	تأهيل الشقق السكنية للتدريسيين في جامعة الفلوجة	34
				69	100%	منجز	التربية والتعليم	الرمادي	تأهيل قسم السدود والكهرباء جامعة الانبار	35
447,038,400	3/1/2019	180	11/12/2018	66	100%	منجز	التربية والتعليم	الصلاولية	هدم و اعادة بناء بناية العمادة/ المعهد التقني في الصقلوية	36
858,323,200	27/12/2018	180	13/12/2018	85	100%	منجز	الداخلية	الرمادي	هدم وإعادة بناء مديرية شرطة الرمادي	37
691,500,000	30/1/2019	45	23/12/2018	116	100%	منجز	الكهرباء		تجهيز محولات كهرباء	38
91,690,000	26/12/2018	60			100%	منجز	الصحة	القائم	ترميم بناية الردهة المشتركة في مستشفى القائم العام	39
142,770,000	23/12/2018	60			100%	منجز	الكهرباء	راوه	تاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء راوة مع تاهيل بناية كهرباء راوه	40
		60			100%	منجز	الكهرباء	هيت	تاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء هيت	41
14,079,304,600									المجموع	

# مشاريع محافظة صلاح الدين



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / صلاح الدين

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	اعادة تاهيل جسر الشرفاڤ الكونكريتي ومقترباته في محافظة صلاح الدين	الشرفاڤ	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	40%	17	21/11/2018	360	12/12/2018	3,948,780,000
2	هدم واعادة بناء مدرسة العلياء الابتدائية للبنات 12 صف	بلد	التربية	قيد التنفيذ	68%	54	5/12/2018	180	15/1/2019	610,965,000
3	هدم واعادة بناء ثانوية جمال عبدالناصر 12 صف	بلد	التربية	قيد التنفيذ	78%	43	4/12/2018	180	15/1/2019	528,360,000
4	هدم واعادة بناء مدرسة المحزم الابتدائية للبنين 12 صف	تكريت	التربية	منجز	100%	67	12/12/2018	180	25/12/2018	607,200,000
5	هدم واعادة بناء ثانوية الاريڤ للبنات 12 صف	بيجي	التربية	قيد التنفيذ	88%	37	4/12/2018	180	20/1/2019	573,400,000
6	اعادة تاهيل جسر البوجواري ورفع انقاض جسر سكة القطار المتضرر في قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين	بيجي	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	75%	20	22/11/2018	150	8/12/2018	579,632,000
7	هدم واعادة بناء ثانوية بيجي للبنات 18 صف	بيجي	التربية	قيد التنفيذ	85%	80	13/12/2018	180	20/1/2019	980,658,750
8	هدم واعادة بناء ثانوية الخضراء للبنين 18 صف	يثرڤ	التربية	قيد التنفيذ	77%	64	11/12/2018	180	14/1/2019	980,788,500
	المجموع									8,809,784,250

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / صلاح الدين

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	شهر تموز	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
1	توسعة مركز صحي في الساحل الأيسر/ قضاء الشرفا	الشرفا	الصحة	قيد التنفيذ	38%	55	5/12/2018	150	18/12/2018	284,192,000	
2	هدم و اعادة بناء مديرية بلدية سليمان بيك	سليمان بيك	البلدية	منجز	100%	103	19/12/2018	120	2/1/2019	467,699,000	
3	أكساء شوارع متفرقة في قضاء سامراء	سامراء	البلدية	منجز	100%	49	5/12/2018	120	23/12/2018	548,060,000	
4	هدم و اعادة بناء مديرية بلدية يثرب	يثرب	البلدية	منجز	100%	65	11/12/2018	160	24/12/2018	400,092,000	
5	هدم و إعادة بناء مركز شرطة سليمان بيك	سليمان بيك	الداخلية	قيد التنفيذ	45%	58	11/12/2018	180	27/12/2018	563,272,900	
6	هدم و إعادة بناء مديرية شرطة يثرب	يثرب	الداخلية	قيد التنفيذ	40%	34	2/12/2018	180	20/12/2018	834,784,000	
7	هدم و إعادة بناء مركز شرطة المعتصم	المعتصم	الداخلية	قيد التنفيذ	50%	18	22/11/2018	180	16/12/2018	591,548,000	
8	هدم و إعادة بناء مركز شرطة دجلة	دجلة	الداخلية	منجز	100%	23	27/11/2018	180	24/12/2018	589,857,500	
9	أعادة تأهيل 4 جسور للمحطة (700+ 16) كم و المحطة (115+17) كم على طريق تكريت - بيجي	بيجي	الطرق والجسور	منجز	100%	77	13/12/2018	150	26/12/2018	457,400,000	
10	تاهيل كهرباء محطات التوزيع الرئيسية / A - B جامعة تكريت	تكريت	الكهرباء	منجز	100%	106	19/12/2018	140	3/1/2019	1,017,611,200	
	المجموع									5,754,516,600	



## الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / كركوك

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	شهر تموز	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
					نسبة الإنجاز الفني					
1	هدم واعادة بناء مدرسة الاسكندرونة 12 صف في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	منجز	100%	15	18/11/2018	210	19/11/2018	557,435,000
2	تاهيل خطوط ابراج مغذي 33كف لتغذية محطة الرياض من محطة ملاعبالله	الحويجة	الكهرباء	قيد التنفيذ/ الانحراف بسبب 1- امر غيار مع طلب مدة لرفع الألغام 2- الامطار	87%	22	26/11/2018	160	9/12/2018	467,952,500
3	اعادة انشاء الجسر الكونكريتي على طريق (كركوك -تكريت)		الطرق والجسور	قيد التنفيذ / امر غيار إضافة فقرات عمل + مدة إضافية	98%	21	26/11/2018	360	6/12/2018	1,249,294,000
4	صيانة جسور باي حسن		الطرق والجسور	منجز	100%	26	27/11/2018	180	9/12/2018	391,990,000
5	اعادة اعمار بنايات المعهد التقني - الحويجة (بناية العمادة, المركز الثقافي, ورش تدريب الطلاب)	الحويجة	التعليم العالي	قيد التنفيذ / الانحراف بسبب 1- تعديل تصاميم أسس بناية المركز الثقافي 2- الامطار	78%	108	19/12/2018	150	30/12/2018	864,570,000
6	اعادة ترميم محكمة بداعة الرياض	الرياض	وزارة العدل	قيد التنفيذ / الانحراف بسبب 1- البت في تغييرات مطابقة الكشف 2- الامطار	90%	115	23/12/2018	150	3/1/2019	362,528,000
7	اعادة انشاء بناية مركز شرطة الزاب	الزاب	الداخلية	قيد التنفيذ/ مباشرة بعد التوقف بسبب تغيير موقع المشروع	40%	121	23/12/2018	150	2019-05-19	380,882,400
8	اعادة تاهيل ثانوية الاوس في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	قيد التنفيذ / الانحراف بسبب 1- الامطار 2- تلكو الشركة	80%	84	13/12/2018	240	27/12/2019	401,301,000
9	تاهيل مشروع ماء تل علي القديم (400 م/3 ساعة - قضاء الحويجة	الحويجة	الماء	منجز	100%	92	16/12/2018	180	30/12/2018	706,112,001
10	إعادة اعمار محطات الدفع العالي لمشاريع ماء (غريب وشجرة) ناحية العباسي	العباسي	الماء	منجز	100%	98	18/12/2018	150	30/12/2018	264,000,000
11	هدم واعادة بناء مدرسة البونجم 12 صف في دافوق	دافوق	التربية	قيد التنفيذ / سبب الانحراف 1- فحص تحريات التربة 2- الامطار 3- تلكو الشركة	30%	82	13/12/2018	300	27/12/2018	557,408,000
12	هدم واعادة بناء مدرسة ام البنين في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	قيد التنفيذ / سبب الانحراف 1- فحص تحريات التربة 2- الامطار	82%	96	17/12/2018	300	31/12/2018	557,410,000
13	هدم واعادة بناء مدرسة البويتير 6 صف في ناحية الملتقى	الملتقى	التربية	منجز	100%	95	17/12/2018	200	31/12/2018	325,332,000
14	هدم واعادة بناء مدرسة المرة 6 صف في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	منجز	100%	95				
15	صيانة الشارع الرابط بين كيون وناحية الملتقى	الملتقى	الطرق والجسور	منجز	100%	143	31/12/2018	60	10/1/2019	280,000,000
16	إعادة اكساء الطريق الرابط بين ناحية الرياض وقضاء الحويجة	الرياض	الطرق والجسور	منجز	100%	128	27/12/2018	60		286,350,000
	المجموع									7,652,564,901

## الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / كركوك

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	شهر تموز نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
1	تبديل رمل و حصى للفلاتر لمشروع ماء الحويجة الحديث	الحويجة	الماء	منجز / تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امانة		60	27/12/2018	162,250,000
2	تاهيل مجمع ماء جديدة السادة	الحويجة	الماء	منجز / تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امانة				
3	هدم واعادة بناء مركز الدفاع المدني في قضاء الحويجة	الحويجة	الداخلية	قيد التنفيذ / أسباب الانحراف 1- تأخر تحريات التربة 2- شدة الامطار	46%	93	16/12/2018	180	30/12/2018	535,403,200
4	تجهيز مضخات لمحطات الماء في المناطق المحررة/ الحويجة	الحويجة	الماء	منجز	100%	94	17/12/2018	50	31/12/2018	368,000,004
5	هدم واعادة بناء مركز شرطة الرياض	الرياض	الداخلية	قيد التنفيذ	70%	11	4/11/2018	180	18/11/2018	380,882,400
6	هدم واعادة بناء مركز شرطة الرشاد	الرشاد	الداخلية	قيد التنفيذ	70%	10	4/11/2018	180	16/12/2018	380,882,400
7	تجهيز مولدات لمشاريع الماء في المناطق المحررة / كركوك		الماء	منجز	100%	142	31/12/2018	60	31/1/2019	748,500,000
8	هدم واعادة بناء بناية بلدية مجاري ناحية الرياض	الرياض	البلدية	قيد التنفيذ / التاخر بسبب تغيير تصاميم الأساس حسب تقرير فحص التربة	45%	81	13/12/2018	150	26/12/2018	344,502,400
9	هدم واعادة بناء بناية بلدية مجاري ناحية الزاب	الحويجة	البلدية		45%	81				
10	تاهيل سايلو حبوب في قضاء الحويجة	الحويجة	التجارة	منجز	100%	78	13/12/2018	183	26/12/2018	576,140,000
11	تاهيل سايلو حبوب في ناحية الرياض	الرياض	التجارة	منجز	100%	78				
12	رفع الصبات الكونكريتية / سدة كركوك الحديثة		الطرق والجسور	لم ينفذ / تم تحويله الى خطة عام 2019		تنفيذ امانة		25		70,800,000
	المجموع									3,567,360,404

# مشاريع محافظة ديالى

## Diyala Governorate Projects



## الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي	شهر تموز
										نسبة الإنجاز الفني
1	تبليط واكساء شوارع متفرقة في مركز قضاء الخالص	الخالص	الطرق والجسور	منجز	14	14/11/2018	90	21/11/2018	1,009,317,500	100%
2	تجهيز مواد ومعدات لصيانة الشبكة الكهربائية في ناحية العظيم	العظيم	الكهرباء	منجز	60	11/12/2018	60	28/1/2019	631,352,500	100%
3	صيانة واكساء وتثبيت اكتاف طريق الصدور - ناحية المنصورية بطول 13,500 كم		الطرق والجسور	منجز	97	18/12/2018	120	2/1/2019	908,000,000	100%
4	هدم واعادة بناء مدرسة شجرة البيقطين 12 صف في جلولاء	جلولاء	التربية	قيد التنفيذ	123	26/12/2018	180	4/2/2019	540,411,500	97%
5	اعادة تاهيل طريق قرية الجبل بطول 4كم في ناحية بهرز باعتبار المحطة (صفر+صفر) هي الشارع الرئيسي لطريق بعقوبة - النهروان	بعقوبة	الطرق والجسور	منجز	119	23/12/2018	120	8/1/2019	404,240,000	100%
6	اعادة تأهيل طرق ( الزركانية - العودة - سفيط - دراويش ) مع الطريق الفرعي لقرية الزركانية في الخالص من المحطة (صفر + صفر) سيطرة الجيش الى (100+3)	الخالص	الطرق والجسور	منجز	120	23/12/2018	90	23/1/2019	308,040,000	100%
7	صيانة واكساء الطريق الرابط لقرى الجبل الصاعد بطول 6كم من المحطة (صفر+صفر) الى (6+صفر) /ناحية بهرز	بهرز	الطرق والجسور	منجز	139	31/12/2018	100	14/1/2019	518,640,000	100%
8	إعادة تاهيل طريق التحويلة والقرى المحاذية لها		الطرق والجسور	منجز	137	30/12/2018	120	13/1/2019	709,840,000	100%
9	هدم واعادة بناء روضة اطفال السعدية النموذجية	السعدية	التربية	قيد التنفيذ	133	30/12/2018	180	17/1/2019	426,670,000	96%
10	صيانة واكساء وتبليط لقرى بلدروز ( قرية عتبة 7.5 كم وقرية طعيمات 1.5 كم ) مقاطعة 17	بلدروز	الطرق	منجز	4	20/6/2018	120	03/7/2018	921,260,000	100%
11	اكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية قره تبة و قصبته القديمة		الطرق	منجز	9	28/10/2018	60	25/11/2018	320,000,000	100%
12	تبليط شارع ام العظام العثمانية / بعقوبة بطول 2.15 كم	بعقوبة	الطرق	منجز	5	25/6/2018	75	19/7/2018	227,020,000	100%
13	تبليط شوارع بطول 11.8 كم لقرى خان بني سعد / بعقوبه / ربيع عطشانه / وعلى الهادي والشيماء	بعقوبة	الطرق	منجز	6	25/6/2018	30	19/7/2018	185,040,000	100%
14	تأهيل الشارع رقم 21 المار ضمن المحلة 311 و 313 بطول 1.4 كم للمقطع مابين المستوصف الصحي القديم واستدارة دور الجاهزة في حي التحرير / بعقوبة	بعقوبة	الطرق	منجز	1	5/6/2018	100	20/6/2018	195,720,000	100%
15	تبليط الشارع الرئيسي داخل حدود بلدية السلام بطول 550 م	السلام	الطرق	منجز	53	5/12/2018	75	13/1/2019	96,184,000	100%
16	تأهيل انارة شوارع ناحية كنعان في ديالى	بعقوبة	الكهرباء	منجز	3	7/6/2018	45	21/6/2018	111,220,000	100%
	المجموع								7,512,955,500	

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	شهر تموز		رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
					نسبة الإنجاز الفني	نسبة الإنجاز الفني					
1	تبليط طرق في قضاء بلدروز	بلدروز	البلدية	متوقف	60%	129	27/12/2018	90	28/1/2019	448,757,500	
2	اكساء الشوارع الرئيسية - ههب		البلدية	منجز	100%	24	27/11/2018	90	27/12/2018	390,168,001	
3	صيانة واكساء طريق جيزاني الجول-الخالص		الطرق	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	24/12/2018	216,000,000	
4	صيانة جسر بعقوبة الثالث		الطرق	منجز	100%	31	29/11/2018	90	11/12/2018	193,240,000	
5	صيانة و اكساء مدخل قرية الزهيرات بطول 3 كم / ابو صيدا		الطرق	قيد التنفيذ	100%	48	5/12/2018	60	3/1/2019	257,600,000	
6	صيانة واكساء و تثبيت اكتاف طريق قرّة تبة/ ناحية جبارة		الطرق	منجز	100%	32	2/12/2018	90	16/12/2018	692,320,014	
7	تبليط طريق ناحية السلام		الطرق	قيد التنفيذ	100%	59	11/12/2018	120	9/1/2019	412,320,000	
8	تجهيز مواد لتاهيل شبكة كهرباء احياء (الرمادية-الحرية-الجزيرة-النضال-ابو الدهن)	المقدادية	الكهرباء	منجز	100%					579,004,500	
	أ- تجهيز قابلوات واسلاك كهربائية / كهرباء المقدادية	المقدادية	الكهرباء	منجز	100%	107	19/12/2018	30	9/1/2019	87,796,000	
	ب- تجهيز محولات كهرباء / كهرباء المقدادية	المقدادية	الكهرباء	منجز	100%	118	23/12/2018	45	21/1/2019	184,000,000	
9	تبدیل الخط الناقل المغذي من محطة تقوية ماء سيف سعد الى ههب قطر 315 ملم	الخالص	الماء	تنفيذ امانة /منجز	100%			45	26/12/2018	167,800,000	
10	تجهيز و نصب مجمع ماء الشاخرة في قضاء المقدادية	المقدادية	الماء	تنفيذ امانة /منجز	100%			60	30/12/2018	159,237,700	
11	تاهيل مجمع ماء الشهيد غازي سعة 100 م3/ساعة مع تنفيذ خط ناقل سعة 250 ملم		الماء	منجز	100%	27	29/11/2018	120	9/12/2018	559,663,000	
12	هدم و اعادة بناء مدرسة الرابطة (6) صف	خانقين	التربية	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	26/12/2018	239,487,000	
13	تجهيز مولدة لمستشفى جلولاء		الصحة	منجز	100%	141			31/1/2019	96,755,000	
14	تبليط طريق كشكول الصغير و الكبير		الطرق	منجز	100%	86	13/12/2018	90	16/1/2019	386,900,000	
15	هدم وإعادة بناء مدرسة ابن الهيثم 12 صف	الخالص	التربية	قيد التنفيذ	24%	79	13/12/2018	180		1,097,486,000	
16	هدم وإعادة بناء مدرسة الاصاله 12 صف	الخالص	التربية	قيد التنفيذ	90%	79			4/2/2019		
17	تاهيل مجمع ماء السادة سعة 200م3/ساعة	بعقوبة	الماء	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	30/12/2018	221,429,100	
18	هدم وإعادة بناء السياج الخارجي لمدرسة اعدادية مندلي	مندلي	التربية	تنفيذ امانة / منجز	100%			40	24/12/2018	75,125,000	
	المجموع									6,465,088,815	



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / شمال بابل

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	صيانة طريق مسيب - جرف النصر على اعتبار المحطة (صفر+صفر) تقاطع التحرير	جرف النصر	الطرق والجسور	2,860,369,360	انجز بتاريخ 8/8/2019	%100	68	12/12/2018	150	26/12/2018	27/12/2018	2,000,259,000
	المجموع			2,860,369,360								2,000,259,000

# محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

# Baghdad Governorate Projects

الانبار



## الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / حزام بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	هدم واعادة بناء مدرسة بن غازي الابتدائية 18 صف	الطارمية	التربية	1,207,253,080	قيد التنفيذ	90%	102	19/12/2018	240	2/1/2019	27/12/2018	840,178,000
2	هدم واعادة بناء مدرسة ابن النفيس الابتدائية 18 صف	المشاهدة	التربية	1,207,253,080	قيد التنفيذ	70%	127	26/12/2018	240	8/1/2019	8/1/2019	840,177,600
	<b>المجموع</b>			2,414,506,160								1,680,355,600

## الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تاهيل خط كهرباء (33 كي في) محطة الصمود/ مستودعات نطف المشاهدة	المشاهدة	الكهرباء	512,502,848	منجز	100%	57	9/12/2018	120	23/12/2018	507,471,500
2	اىصال الماء الصافى الى قرية المزرفة فى التاجى		الماء	99,800,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			25	21/10/2018	99,800,000
3	مجمع ماء الحركاوى الجنوبى سعة 200م3/س	اليوسفية	الماء	792,511,290	منجز	100%	70	13/12/2018	120	27/12/2018	718,103,100
4	تأهيل مجمع ماء عودة المفرجى سعة 200م3/س	اليوسفية	الماء		منجز	100%	70				
5	تأهيل مجمع ماء هور ابو فاضل سعة 200م3/س	اليوسفية	الماء		منجز	100%	70				
6	تبليط الشارع الرئيسى فى حى الجزائر/ قضاء المحمودية	المحمودية	الطرق والجسور	230,270,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	24/12/2018	205,980,000
7	تاهيل خطوط تغذية الشبكة الكهربائية لمناطق الزيدان دولية/ قضاء ابو غريب		الكهرباء	561,344,763	منجز	100%	63	11/12/2018	60	25/12/2018	508,638,400
8	انشاء كرفان دار مبيت اطباء سبع البور		الصحة	17,437,235	لجنة مشتريات / منجز	100%					19,750,000
9	إعادة تاهيل طريق الشاحنات / سيطرة بغداد - كوت	الرستمية	الداخلية	249,485,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			50	23/12/2018	200,332,000
10	إعادة تاهيل طريق الشاحنات / سيطرة بغداد - الشعب	الشعب	الداخلية	248,676,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			50	23/12/2018	199,704,000
11	تاهيل طريق قرية البوذياب واطراف الحماميات	التاجى	البلدية	250,000,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	24/12/2018	210,000,000
12	تاهيل طريق حنون	الشعب	البلدية	262,075,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	24/12/2018	229,915,000
13	تاهيل طريق السدة المحاذى لنهر دجلة / جسر ذراع دجلة لغاية جامع نور المصطفى / مقاطعة مزرفة وحصيوه	التاجى	البلدية	286,350,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	24/12/2018	240,900,000
14	ترميم ابنية مدرسية (مدرسة الامام الصادق وعظماء العرب)	النهروان	التربية	73,200,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	27/12/2018	73,200,000
15	توسعة مقر الصندوق		مباني حكومية	500,000,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	27/12/2018	250,000,000
16	توسعة القسم الهندسى / مقر الصندوق		مباني حكومية	50,000,000	لجنة مشتريات / منجز	100%			60		50,000,000
	المجموع			4,133,652,136							3,513,794,000

**مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية  
حسب المحافظات لعام 2019**

# مشاريع محافظة نينوى



## خطة صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / محافظة نينوى

ت	نوع التمويل	القطاع	اسم المشروع	الكلفة الكلية
1	استثماري	الكهرباء	تجهيز مواد لتاهيل واعمار وصيانة الشبكة الكهربائية - الجانب الايسر	1,591,106,190
2	استثماري	الزراعة	اعادة تاهيل المستشفى البيطري في باب سنجار- الجانب الايمن	1,375,977,640
3	استثماري	البلدية والبلديات	تليط وتاهيل وصيانة واكساء شوارع متفرقة داخل قضاء تلعفر	2,509,999,480
4	استثماري	التربية والتعليم	اعادة انشاء عمادة كلية الطب جامعة الموصل	3,358,395,460
5	استثماري	التربية والتعليم	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 1	3,356,188,990
6	استثماري	التربية والتعليم	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 2	3,453,088,990
7	استثماري	التربية والتعليم	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 3	3,453,088,990
8	استثماري	التربية والتعليم	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 4	3,356,188,990
9	استثماري	التربية والتعليم	اعادة انشاء كلية هندسة الكهرباء	7,768,657,600
10	استثماري	دوائر حكومية	تاهيل بناية شعبة احصاء تلعفر	583,920,550
11	استثماري	الموارد المائية	تاهيل بناية ادارة الدراسات والتصاميم الهندسية في الموصل	871,090,500
12	استثماري	التربية والتعليم	تاهيل ابنية الاقسام الداخلية مجمع الفاروق/ الساحل الايمن	4,252,631,980
13	استثماري	التربية والتعليم	هدم واعادة بناء متوسطة الجمهورية للبنين 12 صف	688,832,750
14	استثماري	التربية والتعليم	هدم واعادة بناء متوسطة العقيدة للبنين 12 صف	858,322,625
15	استثماري	التربية والتعليم	هدم واعادة بناء روضة الاربج 4 صف	570,255,100
16	استثماري	التربية والتعليم	هدم واعادة بناء اعدادية اسماعيل طالب /ناحية القيروان- 12 صف	879,827,625
17	استثماري	التربية والتعليم	هدم واعادة بناء مدرسة عبدالرحمن الداخل 12 صف	737,890,025
18	استثماري	التربية والتعليم	تاهيل واعادة اعمار ابنية جامعة نينوى	10,270,000,000
19	استثماري	الزراعة	اعادة انشاء بناية المقر الرئيسي لمديرية زراعة نينوى	5,942,742,400
20	استثماري	التجارة	هدم واعادة بناء مجمع الكرامة 2/	5,101,073,332

566,662,500	تجهيز المعدات المطلوبة لورشة فحص وتصليح المحولات في محافظة نينوى / تلعفر	الكهرباء	استثماري	21
6,000,000,000	اعادة اعمار وتاهيل الممر الايمن لجسر موقع سد بادوش الحديدي	الموارد المائية	استثماري	22
800,000,000	هدم واعادة بناء مخازن تربية محافظة نينوى	التربية والتعليم	استثماري	23
6,000,000,000	اعادة انشاء بناية مديرية بلديات نينوى	البلدية والبلديات	استثماري	24
1,647,792,400	تأهيل سايلو الموصل /وادي حجر	التجارة	استثماري	25
4,265,000,000	هدم واعادة انشاء محطة كهرباء القيروان	الكهرباء	استثماري	26
1,646,584,000	تبليط وفرش اكتاف الطريق الرابط من مشروع ري الجزيرة الشمالي الى قرية حردان	الطرق والجسور	استثماري	27
6,784,726,336	اعادة انشاء مديرية زراعة نينوى	الزراعة	استثماري	28
238,479,813	اعادة تاهيل جسر الصابونية على طريق موصل - كسك	الطرق والجسور	تشغيلي	29
755,378,938	اعادة تاهيل جسر المفري (حنكة - زمار)	الطرق والجسور	تشغيلي	30
400,926,455	اكمال انشاء شعبة زراعة الحمدانية	زراعة	تشغيلي	31
516,105,625	اعادة بناء القناطر في حي المامون	الموارد المائية	تشغيلي	32
156,220,313	اعادة بناء القناطر في حي النجار	الموارد المائية	تشغيلي	33
570,638,913	تاهيل مبنى الادارة و الجدار المحيطي لمعمل تنقية البذور	الزراعة	تشغيلي	34
539,262,600	تجهيز و نصب معمل تنقية البذور	الزراعة	تشغيلي	35
900,114,660	اعادة انشاء مركز صحي الوحدة	الصحة	تشغيلي	36
251,102,414	اعادة بناء مركز صيانة كهرباء القاطع الجنوبي / تلعفر	الكهرباء	تشغيلي	37
1,156,580,935	اعادة انشاء ورشة فحص المحولات / تلعفر	الكهرباء	تشغيلي	38
1,014,711,269	هدم و اعادة بناء ثانوية زمار للبنات 12 صف	التربية	تشغيلي	39
620,194,310	هدم و اعادة بناء جناح (6صف) طابقين + (4صف) + مجموعة صحية /مدرسة عبد الله بن مسعود / سنجان	التربية	تشغيلي	40
322,928,050	هدم و اعادة بناء جناح (6صف) طابقين / مدرسة القيروان / سنجان	التربية	تشغيلي	41
846,536,879	هدم و اعادة بناء مدرسة ام الشباييط - 12 صف/سنجان	التربية	تشغيلي	42
207,284,683	تأهيل مدرسة ابو خشب /ناحية ربيعة مع بناء جناح (6) صف طابقين مع وحدات صحية عدد (4)	التربية	تشغيلي	43
2,706,000,000	تجهيز جهاز تفتيت الحصى عدد (2)	الصحة	تشغيلي	44
267,025,975	تأهيل ساحة الموصل لخرن الحبوب	التجارة	تشغيلي	45
307,215,830	تأهيل مجمع تل عبطة لخرن الحبوب	التجارة	تشغيلي	46
1,606,000,000	اعادة تأهيل مديرية الدوريات النجدة / الجانب الايمن	الداخلية	تشغيلي	47
862,500,000	اعادة تأهيل مركز شرطة باب الشط / الجانب الايمن	الداخلية	تشغيلي	48
102,935,252,112	المجموع			

# مشروع محافظة الانبار

الانبار



## خطة صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / محافظة الانبار

ت	نوع التمويل	القطاع	اسم المشروع	الكلفة الكلية
1	استثماري	الماء والمجاري	هدم واعادة انشاء محطة ماء الكرابلة /القائم	1,056,913,250
2	استثماري	الماء والمجاري	تاهيل وصيانة محطة الفاو ( 14p التابعة الى مركز مجاري الفلوجة	1,583,998,000
3	استثماري	الماء والمجاري	تاهيل محطة اسالة مياه الشرب ومحطة المعالجة الثقيلة في العامرية - مجمع الاخاء	1,636,738,960
4	استثماري	الماء والمجاري	تاهيل مشروع ماء ال 5 كيلو في الرمادي	3,104,435,380
5	استثماري	البلدية والبلديات	تاهيل شوارع حي الزيتون في منطقة 5 كيلو الرمادي	1,717,606,000
6	استثماري	البلدية والبلديات	اعادة تاهيل طريق بين حي اليرموك وجسر التفاحة بطول 2900م	2,254,660,000
7	استثماري	البلدية والبلديات	اكساء وتاهيل ارصفة في قضاء حديثة	1,013,782,500
8	استثماري	البلدية والبلديات	اعادة تاهيل طرق في عموم احياء وقرى البغدادي	1,207,000,000
9	استثماري	الطرق والجسور	اعادة اعمار جسور زنكورة الفوقاني كم (94+000) على طريق المرور السريع	772,570,000
10	استثماري	الطرق والجسور	تاهيل طريق المدخل الشرقي للحي المدني (السي سي) من جهة حي العمال بطول اكم وعرض 25,5 متر	910,800,000
11	استثماري	الطرق والجسور	تاهيل طريق ابوفليس الحولي المحاذي لقاعدة الحياتية بطول 3425 م وعرض 30 متر	942,425,000
12	استثماري	الطرق والجسور	تاهيل سدة جويبية باتجاه النساف بطول 3كم من المحطة 11+000 الى المحطة 14+000 باعتبار (صفر+صفر) جسر النافورة	3,427,554,700
13	استثماري	البلدية والبلديات	تاهيل شوارع لمديرية ناحية الرطبة	854,347,650
14	استثماري	البلدية والبلديات	تاهيل شارع نهر فليح من شارع المنجزات الى محطة الماء باتجاه النهر/ الفلوجة	3,165,753,700
15	استثماري	التربية والتعليم	هدم واعادة بناء مدرسة المكاسب الابتدائية للبنين	816,468,375
16	استثماري	دوائر حكومية	اعادة بناء المجمع الحكومي في ناحية الرمانة	984,367,800
17	استثماري	البلدية والبلديات	هدم وانشاء بناية مديرية بلدية هيت	1,240,786,750
18	استثماري	البلدية والبلديات	اعادة انشاء القسم البلدي في ناحية الوفاء	345,000,000
19	استثماري	دوائر حكومية	هدم واعادة بناء مديرية ناحية الصقلاوية	810,961,600
20	استثماري	التربية والتعليم	هدم واعادة بناء مدرسة التل الاخضر- الحميرة 12 صف	816,468,375

1,523,617,900	هدم واعادة بناء ثانوية الوطن للبنين 18 صف الكرامة	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	21
816,468,375	هدم واعادة بناء مدرسة الغر المحجلين الابتدائية المختلطة 12 صف	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	22
816,468,375	هدم واعادة بناء ثانوية التهذيب للبنات 12 صف - هيت	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	23
816,468,375	هدم واعادة بناء مدرسة الشعلة الابتدائية 12 صف - راوه	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	24
816,468,375	هدم واعادة بناء ثانوية الامالي للبنين 12 صف - القائم	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	25
1,523,617,900	هدم واعادة بناء ثانوية الرحاب للبنات 18 صف - القائم	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	26
816,468,375	هدم واعادة بناء مدرسة الامين 12 صف- الفلوجة	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	27
1,523,617,900	هدم واعادة بناء ثانوية الرشيد 18 صف	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	28
1,175,860,900	اعادة بناء هيئة استثمار الانبار	دوائر حكومية	استثماري	الانبار	29
697,159,900	تاهيل بناية كلية العلوم التطبيقية - الحي العسكري	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	30
637,456,500	هدم واعادة بناء قطاع الرعاية الصحية الاولية في عنه	الصحة	استثماري	الانبار	31
654,069,400	هدم واعادة بناء قاطع مرور الرمادي	الداخلية	استثماري	الانبار	32
3,569,604,400	هدم واعادة بناء بناية الاقسام العلمية /كلية التربية في القائم	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	33
1,742,549,200	تاهيل بنايتي عمادة كلية التربية لعلوم الصرفة وعمادة كلية التربية للعلوم الانسانية	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	34
745,016,000	تاهيل بناية مديرية احصاء الانبار	دوائر حكومية	استثماري	الانبار	35
771,437,250	ترميم وتاهيل مبنى الدوائر الحكومية في عنه	دوائر حكومية	استثماري	الانبار	36
303,976,000	اعادة انشاء مركز صحي فرعي مع دار سكن/العبيدي	الصحة	استثماري	الانبار	37
2,554,668,670	تاهيل مستشفى القائم العام	الصحة	استثماري	الانبار	38
1,150,000,000	اعادة انشاء مبنى المجلس المحلي / قضاء القائم	دوائر حكومية	استثماري	الانبار	39
833,341,750	اعادة انشاء بناية المجلس المحلي لقضاء هيت	دوائر حكومية	استثماري	الانبار	40

2,449,750,560	اعادة انشاء بناية الاقسام الداخلية للطلاب لكلية التربية في القائم	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	41
6,238,333,609	هدم واعادة بناء مديرية شرطة الانبار	الداخلية	استثماري	الانبار	42
860,950,375	هدم واعادة بناء مدرسة الحبوبى الابتدائية 12 صف في البغدادي	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	43
860,950,375	هدم واعادة بناء مدرسة سومر الابتدائية / 12 صف	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	44
860,950,375	هدم واعادة بناء مدرسة الاسكندرونة الابتدائية للبنين / 12 صف	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	45
860,950,375	هدم واعادة بناء مدرسة الفلاح الابتدائية للبنين / 12 صف	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	46
860,950,375	هدم واعادة بناء مدرسة حلب الابتدائية للبنين / 12 صف	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	47
1,635,542,610	هدم واعادة بناء مدرسة الجماهير الابتدائية للبنين / 12 صف	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	48
1,635,542,610	هدم واعادة بناء مدرسة المهدي الابتدائية للبنين / 12 صف	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	49
874,603,750	اعادة تأهيل مركز شباب هيت	الشباب والرياضة	استثماري	الانبار	50
2,331,300,000	اعادة انشاء الشارع الخدمي في الخمسة كيلو في الرمادي	البلدية والبلديات	استثماري	الانبار	51
1,694,179,000	تأهيل وصيانة محطة ( p10 الفاو (امطار)	الماء والمجاري	استثماري	الانبار	52
458,332,500	تأهيل مغذي سعده من محطة سعده	الكهرباء	استثماري	الانبار	53
374,037,500	تأهيل مغذي الصفرة ومغذي النهية	الكهرباء	استثماري	الانبار	54
535,693,000	تأهيل مغذي جريجب من محطة القنيطرة	الكهرباء	استثماري	الانبار	55
371,478,750	تأهيل مغذي الكرابلة من محطة سعده	الكهرباء	استثماري	الانبار	56
314,398,500	انشاء مركز صيانة العبيدي المدمر	الكهرباء	استثماري	الانبار	57
619,844,250	تأهيل الشبكة الكهربائية لقرى جريجب والفياضية والقنيطرة	الكهرباء	استثماري	الانبار	58
512,267,500	اعادة ائصال التيار الكهربائي الى المجمع السكني التابع الى الشركة العامة للفوسفات	الكهرباء	استثماري	الانبار	59
1,556,037,220	تأهيل مغذي كهرباء المعسكر	الكهرباء	استثماري	الانبار	60

846,630,000	تاهيل الطريق الرابط بين جسر المخازن الى نهاية الجسر المؤدي الى منطقة البوعيثة	الطرق والجسور	استثماري	الانبار	61
1,596,000,000	هدم و اعادة بناء بناية قانممقامية الرطبة	دوائر حكومية	استثماري	الانبار	62
1,099,032,000	تاهيل عمادة كلية التربية الرياضية/بناية المساعد العلمي	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	63
860,950,375	هدم و اعادة بناء مدرسة دار العلم الابتدائية 12 صف في الرمادي / المركز	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	64
860,950,975	هدم و اعادة بناء مدرسة التلاحم الابتدائية 12 صف	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	65
1,523,617,900	هدم و اعادة بناء مدرسة فاطمة البرناوي للبنات 18 صف في هيت/ كبيسة	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	66
1,523,617,900	هدم و اعادة بناء اعدادية حليلة السعدية للبنات/18 صف	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	67
860,950,375	هدم و اعادة بناء مدرسة الوهج الابتدائية 12 صف في زنكورة	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	68
860,950,375	هدم و اعادة بناء ثانوية ام سلمة 12 صف	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	69
860,950,375	هدم و اعادة بناء مدرسة بغداد الابتدائية للبنين 12 صف	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	70
1,764,606,000	هدم و اعادة بناء قسم تربية الفلوجة	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	71
1,523,617,900	هدم و اعادة بناء ثانوية الناظم للبنين 18 صف	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	72
860,950,375	هدم و اعادة بناء مدرسة الشقانق الابتدائية للبنات /12 صف	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	73
860,950,375	هدم و اعادة بناء مدرسة الاخاء الابتدائية المختلطة /12 صف	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	74
1,764,606,000	هدم و اعادة بناء قسم تربية راوة	التربية والتعليم	استثماري	الانبار	75
747,500,000	تاهيل وتوسيع مجمع ماء سعدة مع اضافة وحدة مجمعة 200م3/ساعة مع خط ناقل بطول 1500 متر	الماء والمجاري	استثماري	الانبار	76
920,000,000	تاهيل وتوسيع مجمع ماء النهضة الشرقية مع اضافة خط ناقل بطول 3500 متر	الماء والمجاري	استثماري	الانبار	77
920,000,000	تاهيل وتوسيع مشروع الماء المركزي في القانم	الماء والمجاري	استثماري	الانبار	78
1,979,920,000	صيانة وتاهيل محطات الدفع لمشروع ماء الصحراء الغربية - هيت	الماء والمجاري	استثماري	الانبار	79
117,933,938	تاهيل المجمع الحكومي لناحية العبيدي في القانم	الادارة المحلية	تشغيلي	الانبار	80

260,664,750	اعادة تبليط شوارع في حي العروبة قضاء الكرمة	البلديات	تشغيلي	الانبار	81
249,563,685	اعادة بناء الجناح الاداري المهدم مع تاهيل الاجزاء المتضررة في مدرسة المسار /هيت	التربية	تشغيلي	الانبار	82
125,809,425	تاهيل بناية شعبة زراعة راوه	الزراعة	تشغيلي	الانبار	83
303,593,100	تاهيل الشبكة الكهربائية في جزيرة الخالدية	الكهرباء	تشغيلي	الانبار	84
354,337,425	فك اختناق مغذيات احياء العسكري والزراشة والحي القديم	الكهرباء	تشغيلي	الانبار	85
305,431,375	تاهيل جزء من شبكة مغذي الزراشية	الكهرباء	تشغيلي	الانبار	86
484,101,125	تاهيل جزء من مغذي راوه القديمة	الكهرباء	تشغيلي	الانبار	87
376,648,000	تاهيل جزء من شبكة مغذي الحي العسكري	الكهرباء	تشغيلي	الانبار	88
385,872,438	تاهيل شبكات الضغط العالي والواطيء في مركز الكرمه	الكهرباء	تشغيلي	الانبار	89
160,402,000	تاهيل مجمع ماء رميلة القديم سعة 50 م3/ساعة	الماء	تشغيلي	الانبار	90
673,946,000	تاهيل مجمع ماء البوعيثة البونجرس 200م3/ساعة	الماء	تشغيلي	الانبار	91
168,618,750	تاهيل مجمع ماء سعة 250 كالون في الخفاجية	الماء	تشغيلي	الانبار	92
165,312,500	استبدال الاتابيب الخاصة بمجمع ماء الزنكورة التاسع	الماء	تشغيلي	الانبار	93
452,295,000	تاهيل مجمع ماء الدواية سعة 200م3/ساعة	الماء	تشغيلي	الانبار	94
133,457,500	تاهيل مجمع ماء الزغاريت الصقلاوية	الماء	تشغيلي	الانبار	95
396,750,000	تاهيل شبكات الماء في قضاء الكرمة	الماء	تشغيلي	الانبار	96
130,424,950	تاهيل مجمع ماء الزاوية 200م3/ساعة	الماء	تشغيلي	الانبار	97
651,349,765	صيانة مجمعات الماء في العامرية	الماء	تشغيلي	الانبار	98
435,763,750	اعادة اعمار محطة الدفع ( 4p لتصريف مياه الامطار في الفلوجة	المجاري	تشغيلي	الانبار	99
795,153,125	اعادة انشاء القناطر المتفجرة للمشاريع الاروائية	الموارد المائية	تشغيلي	الانبار	100

636,148,950	هدم واعادة بناء مديرية بلدية القائم	البلديات	تشغيلي	الانبار	101
736,487,686	اعادة انشاء مخازن كونكريتية عدد 3 في موقع سايلو الرمادي	التجارة	تشغيلي	الانبار	102
357,365,950	هدم واعادة بناء شعبة زراعة الرطبة	الزراعة	تشغيلي	الانبار	103
569,058,525	اعادة اعمار محطة كهرباء جنوب الفلوجة	الكهرباء	تشغيلي	الانبار	104
668,659,968	اعادة تاهيل مجمع ماء البوشلال 200م3/ساعة في هيت	الماء	تشغيلي	الانبار	105
583,491,299	اعادة انشاء مصرف الرافدين فرع عنه	المالية	تشغيلي	الانبار	106
873,537,700	اعادة تاهيل مصرف الرشيد في القائم	المالية	تشغيلي	الانبار	107
329,302,500	مشروع اكساء مدخل ناحية النخيب من ثلاث محاور (كيلو 160 و كربلاء و الرطبة )	الطرق و الجسور	تشغيلي	الانبار	108
349,649,163	اعادة انشاء شعبة الزراعة في الرمانة	الزراعة	تشغيلي	الانبار	109
158,442,113	انشاء شعبة الموارد المائية في راوه	الموارد المائية	تشغيلي	الانبار	110
300,895,200	تاهيل الشارع من السوق القديم الى دائرة الكهرباء مع شوارع متفرقة - كبيسه	الطرق و الجسور	تشغيلي	الانبار	111
257,887,500	اعادة انشاء شوارع في حي السلام في ناحية المحمدي	الطرق والجسور	تشغيلي	الانبار	112
255,384,008	هدم و اعادة بناء شعبة الموارد المائية في القائم	الموارد المائية	تشغيلي	الانبار	113
238,262,923	اعادة انشاء بناية الرقابة التجارية و المالية - فرع الانبار	التجارة	تشغيلي	الانبار	114
113,734,869,826	المجموع				

# مشاريع محافظة صلاح الدين



## خطة صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / محافظة صلاح الدين

ت	نوع التمويل	القطاع	اسم المشروع	الكلفة الكلية
1	استثماري	الماء والمجاري	صيانة وتاهيل مشروع ماء السفينة في الساحل الايسر في الشرفاط سعة 3م600/ساعة	914,549,000
2	استثماري	الماء والمجاري	صيانة وتاهيل محطة تقوية الصينية سعة 3م500/ساعة	573,850,000
3	استثماري	الماء والمجاري	صيانة وتاهيل مشروع ماء سامراء الموحد 3م1500/ساعة	919,425,000
4	استثماري	الماء والمجاري	صيانة وتاهيل مشروع ماء تكريت الموحد 3م2250/ساعة	918,289,950
5	استثماري	الطرق والجسور	اعادة تاهيل قناطر عدد 7 على طريق بيجي - الشرفاط	753,314,400
6	استثماري	الطرق والجسور	تاهيل جسور صغيرة عدد 3 في محافظة صلاح الدين	910,926,500
7	استثماري	الطرق والجسور	اعادة تاهيل طريق تكريت - بيجي بطول 45 كم	4,697,110,000
8	استثماري	الصحة	هدم واعادة بناء مركز صحي رئيس عزيز بلد- بيجي	721,285,750
9	استثماري	الصحة	هدم واعادة بناء مركز صحي نموذجي بيجي - بيجي	1,590,517,660
10	استثماري	الصحة	هدم واعادة بناء مركز صحي نموذجي الحجاج - بيجي	1,590,517,660
11	استثماري	الداخلية	هدم واعادة بناء مركز شرطة المحطة في قضاء بلد	780,325,600
12	استثماري	الداخلية	هدم واعادة بناء مركز شرطة الركة	780,325,600
13	استثماري	دوائر حكومية	هدم واعادة بناء دار القضاء في الدور	1,041,527,400
14	استثماري	دوائر حكومية	هدم واعادة بناء دار القضاء في الضلوعية	1,041,527,400
15	استثماري	دوائر حكومية	هدم واعادة بناء دار القضاء في يثرب	1,041,527,400
16	استثماري	التربية والتعليم	هدم وبناء مباني لكلية التربية الاساسية في الشرفاط - جامعة تكريت	2,007,852,000
17	استثماري	التربية والتعليم	هدم واعادة بناء مدرسة 12 صف ثانوية قتيبة المختلطة	782,434,988
18	استثماري	التربية والتعليم	هدم واعادة بناء مدرسة 12 صف التحدي الابتدائية	782,434,988
19	استثماري	التربية والتعليم	هدم واعادة بناء مدرسة لبنان الابتدائية 12 صف	782,434,988
20	استثماري	التربية والتعليم	هدم واعادة بناء مدرسة 6 صف سليمان بيك الابتدائية	782,434,988

782,434,988	هدم واعادة بناء مدرسة 12 صف بيجي الابتدائية للبنات	التربية والتعليم	استثماري	21
782,434,988	هدم واعادة بناء مدرسة 12 صف الخلفاء الابتدائية	التربية والتعليم	استثماري	22
419,643,050	هدم واعادة بناء مدرسة الوادي الخصب 6 صف	التربية والتعليم	استثماري	23
782,434,988	هدم واعادة بناء مدرسة الفياض للبنين 12 صف	التربية والتعليم	استثماري	24
764,796,000	تاهيل وصيانة البنى التحتية لجامعة تكريت	التربية والتعليم	استثماري	25
558,411,250	تاهيل وصيانة الصرف الصحي وشبكة تصريف مياه الامطار لجامعة تكريت	التربية والتعليم	استثماري	26
1,024,011,750	اعادة تاهيل قناطر عدد 7 على طريق بيجي - الشرفاظ	الطرق والجسور	استثماري	27
1,019,561,250	تطوير شوارع داخلية قرب السايلو (منطقة 77)	البلدية والبلديات	استثماري	28
1,050,525,000	اعمال ارصفة وتبليط حي الطيارة	البلدية والبلديات	استثماري	29
343,387,125	مشروع معالجة و اكساء طريق ( المدخل الشمالي) بطول 1700 م لمركز قضاء امرلي	البلديات	تشغيلي	30
1,153,388,650	اعادة تاهيل الشوارع الداخلية المتضررة من جراء العمليات الارهابية في قضاء امرلي	الطرق و الجسور	تشغيلي	31
811,856,300	هدم واعادة بناء بناية ناحية المعتصم	الادارة المحلية	تشغيلي	32
585,444,300	تأهيل و صيانة منتدى شباب و رياضة بلد	الشباب و الرياضة	تشغيلي	33
811,856,300	هدم و اعادة بناء بناية ناحية مكحول	الادارة المحلية	تشغيلي	34
811,856,300	هدم و اعادة بناء بناية ناحية الصينية	الادارة المحلية	تشغيلي	35
898,320,028	هدم و اعادة بناء مديرية بلدية الصينية	البلديات	تشغيلي	36
396,750,000	هدم واعادة بناء مركز ماء بيجي	الماء	تشغيلي	37
608,350,000	اعادة تاهيل بناية مديرية مجاري صلاح الدين في تكريت و بناية مركز شرطة الشرفاظ	المجاري	تشغيلي	38
415,265,000	هدم و اعادة بناء مركز مجاري بيجي	المجاري	تشغيلي	39
534,697,330	هدم واعادة بناء مركز ماء بثرپ	الماء	تشغيلي	40
811,856,300	هدم واعادة بناء بناية ناحية سليمان بيك	الادارة المحلية	تشغيلي	41
39,732,092,165	المجموع			



## خطة صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / محافظة كركوك

الكلفة الكلية	اسم المشروع	القطاع	نوع التمويل	ت
362,699,127	تجهيز محولات ومواد صيانة في قضاء الحويجة	الكهرباء	استثماري	1
1,273,454,932	تاهيل شبكات كهرباء في قرى متفرقة ومغذيات 11كف - السلام وباجوان مع تنفيذ مغذي جديد من محطة الطابوق في ناحية الملتقى	الكهرباء	استثماري	2
1,025,121,500	تاهيل مجاري حي حطين في قضاء الحويجة	الماء والمجاري	استثماري	3
446,993,500	تاهيل مجاري حي النصر في قضاء الحويجة	الماء والمجاري	استثماري	4
101,832,500	تاهيل مجاري حي النداء في قضاء الحويجة	الماء والمجاري	استثماري	5
830,367,850	تاهيل شوارع حي النصر في قضاء الحويجة	البلدية والبلديات	استثماري	6
1,162,414,600	تاهيل شوارع حي حطين في قضاء الحويجة	البلدية والبلديات	استثماري	7
1,229,824,510	تاهيل شوارع حي النداء في قضاء الحويجة	البلدية والبلديات	استثماري	8
784,966,425	تاهيل شوارع القطاع الثالث في قضاء الحويجة	البلدية والبلديات	استثماري	9
866,007,500	تاهيل السوق الصغير وجزء من حي اليرموك	البلدية والبلديات	استثماري	10
771,851,250	هدم واعادة بناء ورشة مركزية لبلدية الحويجة	البلدية والبلديات	استثماري	11
446,372,500	تاهيل مجاري القطاع الثالث في قضاء الحويجة	الماء والمجاري	استثماري	12
490,020,750	هدم واعادة بناء المستوصف البيطري في الحويجة	الزراعة	استثماري	13
479,607,500	صيانة واكساء وتبليط الشوارع الداخلية في ناحية الرياض	البلدية والبلديات	استثماري	14
801,274,000	هدم واعادة بناء مدرسة اشبيلية 12 صف - مركز الحويجة	التربية والتعليم	استثماري	15
801,274,000	هدم واعادة بناء مدرسة الربيع 12 صف- دافوق -قرية الصمود	التربية والتعليم	استثماري	16
225,490,850	هدم واعادة بناء مدرسة كواز عرب الابتدائية 6 صف - ناحية الملتقى	التربية والتعليم	استثماري	17
225,490,850	هدم واعادة بناء مدرسة زمزم الابتدائية 6 صف - دافوق -طويلعة	التربية والتعليم	استثماري	18
225,490,850	هدم واعادة بناء مدرسة تل الجول 6 صف - نازة	التربية والتعليم	استثماري	19
225,490,850	هدم واعادة بناء مدرسة الخندق 6 صف - الملتقى	التربية والتعليم	استثماري	20

225,490,850	هدم واعادة بناء مدرسة الزيتون الابتدائية 6 صف - الدبس	التربية والتعليم	استثماري	21
225,490,850	هدم واعادة بناء مدرسة المصطافية الابتدائية المختلطة 6 صف - الحويجة - المصطافية	التربية والتعليم	استثماري	22
225,490,850	هدم واعادة بناء مدرسة اسماعيل اوة الابتدائية المختلطة 6 صف - الدبس- اسماعيل اوة	التربية والتعليم	استثماري	23
225,490,850	هدم واعادة بناء مدرسة كواز كرد الابتدائية المختلطة 6 صف - الملتقى	التربية والتعليم	استثماري	24
589,440,550	تاهيل شعبة احصاء الحويجة	دوائر حكومية	استثماري	25
2,413,194,750	تأهيل مدخل المنزل والاحياء المجاورة	البلدية والبلديات	استثماري	26
1,086,290,000	تاهيل مشروع مجاري مدخل المنزل والاحياء المجاورة	البلدية والبلديات	استثماري	27
1,379,862,000	بناء دائرة ومركز جباية ماء قضاء الحويجة مع تأهيل المخزن	الماء والمجاري	استثماري	28
2,170,225,662	هدم واعادة بناء مخازن عدد9 في قضاء الحويجة مع بناية الشعبة الزراعية والقاعة الارشادية	الزراعة	استثماري	29
1,200,000,000	تأهيل ومدخل وبوابات قضاء الحويجة	البلدية والبلديات	استثماري	30
2,125,200,000	اعادة تأهيل منشأة محطة بستنة الحويجة	الزراعة	استثماري	31
1,819,530,000	صيانة وتاهيل جسر زغيتون على طريق (كركوك -تكريت)	الطرق والجسور	استثماري	32
960,825,000	اعادة تأهيل الطريق الرابط بين قضاء الحويجة ومفرق الصفرة	الطرق والجسور	استثماري	33
1,606,550,000	صيانة الطريق الرابط بين الشلالات وقرى النكرات	الطرق والجسور	استثماري	34
552,000,000	رفع الصبات الكونكريتية الجاهزة و المخلفات الحربية على كتف القناة الرئيسية ري كركوك و نقلها الى مطار كركوك	الادارة المحلية	تشغيلي	35
682,410,000	اكساء طريق الحويجة - العباسي	الطرق و الجسور	تشغيلي	36
952,200,000	اكساء شوارع قرى (ابو الجيس - الرشيدية - النعمية)	الطرق و الجسور	تشغيلي	37
1,047,420,000	اكساء شارع كركوك - تكريت	الطرق و الجسور	تشغيلي	38
751,536,500	هدم واعادة بناء مركز شرطة المحاوز - الحويجة	الداخلية	تشغيلي	39
	هدم واعادة بناء مركز شرطة الشعب	الداخلية	تشغيلي	40
	هدم واعادة بناء قسم مكافحة الاجرام	الداخلية	تشغيلي	41
33,014,693,706	المجموع			

# مشاريع محافظة ديالى

## Diyala Governorate Projects



## خطة صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / محافظة ديالى

ت	نوع التمويل	القطاع	اسم المشروع	الكلفة الكلية
1	استثماري	الكهرباء	تاهيل خط جهد 33 كي في وتحويله الى خط دبل سركت باستخدام اعمدة 14 م من محطة الغربية الى محطة جديدة الشط بطول 22 كم	1,464,685,600
2	استثماري	الكهرباء	تجهيز مواد لتاهيل وتحسين وفك اختناق الشبكة الكهربائية لناحية ابي صيدا وقراها	990,207,500
3	استثماري	الكهرباء	تجهيز مواد لتاهيل وتحسين وفك اختناق الشبكة الكهربائية في مناطق متفرقة في المقدادية	978,261,875
4	استثماري	الطرق والجسور	صيانة واكساء وتبليط طرق في قرى الخالص (منصورية الشط بطول 5 كم , الجيزاني الامام بطول 1,5 كم , السندية بطول 1,4 كم , البوبالي بطول 1,5 كم)	1,266,736,000
5	استثماري	البلدية والبلديات	اكساء شوارع في ناحية ابي صيدا	247,573,150
6	استثماري	البلدية والبلديات	اعادة تاهيل تبليط شوارع في حي المعلمين في قضاء المقدادية	287,363,150
7	استثماري	البلدية والبلديات	تاهيل شوارع في قضاء المقدادية ( حي التاميم - حي اشور - الحي العصري - حي التحرير)	2,029,248,940
8	استثماري	الطرق والجسور	صيانة واكساء طريق اشتوكان وعرجان وتبليط طرق البكالي وسيف سعد في ناحية جبارة وقره تبه	1,450,048,000
9	استثماري	الطرق والجسور	تبليط طرق في ناحية جديدة الشط والقرى التابعة لها وناحية بني سعد والقرى التابعة لها وتبليط طرق في قضاء الخالص وقراها وقضاء بعقوبة وقراها	2,164,030,000
10	استثماري	البلدية والبلديات	اعادة تاهيل شارع سايدين مع سايدين خدمي لمدخل قره تبه مع اكساء شوارع متفرقة لحياء (الصدر - الشرطة - الشهداء - المشروع)	2,030,992,000
11	استثماري	البلدية والبلديات	اعادة تاهيل الشارع امام المجلس المحلي والشوارع المحيطة به مع اكمال كافة المتطلبات الخاصة به	760,782,500
12	استثماري	البلدية والبلديات	اعادة تاهيل شوارع في حي (الزهور والزهراء- المصطفى-الرسول والنور)	1,490,625,730
13	استثماري	الطرق والجسور	تبليط شوارع في قرية سنسل (عدنان اللهيبي) وتبليط افرع الحساوية والحي العسكري وتبليط قرى الوسط وحمبس وجرخي اسبود وصيانة طريق الوجيهية	2,563,688,350
14	استثماري	الصحة	تاهيل مستشفى بعقوبة التعليمي	3,516,174,880
15	استثماري	الصحة	تاهيل مستشفى البتول التعليمي للنسائية والاطفال	5,195,610,340
16	استثماري	التربية والتعليم	هدم واعادة بناء مدرسة الزهراوي 12 صف	869,460,950
17	استثماري	التربية والتعليم	هدم واعادة بناء مدرسة الحليمة الابتدائية 12 صف	834,960,950
18	استثماري	الطرق والجسور	صيانة وتاهيل طرق في محافظة ديالى ( رعد الفرج , طامي , الزاوية , زرکوش عساكره)	1,838,628,400
19	استثماري	البلدية والبلديات	اعادة تاهيل الجزيرة الوسطية طريق بغداد - كركوك في ناحية سد العظيم وتبليط شوارع في الجهة الشرقية والغربية للناحية	1,109,176,150
20	استثماري	البلدية والبلديات	اعادة تاهيل شوارع ( الافرازات -شوارع خلف محطة الغاز في الحي العسكري -شوارع حي المعلمين)	1,374,788,050

2,288,584,120	تجهيز مواد لتاهيل وتشبيد خط 33كف دبل سركت اعمدة 14م من محطة بلدروز 33/11كف الى محطة مندلي 11/33ك بطول 45 كم	الكهرباء	استثماري	21
641,920,000	اعادة تاهيل الشبكة الكهربائية في حي التحرير	الكهرباء	استثماري	22
226,957,000	ايصال الماء الصافي منطقة الحد الاخضر/العبارة	الماء والمجاري	استثماري	23
786,246,000	مشروع ماء خان العرقة/العظيم	الماء والمجاري	استثماري	24
584,045,325	تاهيل مشروع ماء خانقين	الماء والمجاري	استثماري	25
894,561,000	هدم واعادة بناء مدرسة التجنيد(12 صف)في ناحية جلولاء.	التربية والتعليم	استثماري	26
665,468,000	هدم واعادة بناء مدرسة بشانر الخير 12 صف في الخالص	التربية والتعليم	استثماري	27
718,586,000	هدم واعادة بناء مدرسة هاشم بن عتبة في قضاء خانقين	التربية والتعليم	استثماري	28
1,300,000,000	هدم واعادة بناء قسم الاعداد والتدريب للتربية	التربية والتعليم	استثماري	29
3,500,000,000	اعادة تاهيل الشارع العام غالبية تقاطع القدس	الطرق والجسور	استثماري	30
796,170,000	تاهيل طرق في بلدروز	الطرق والجسور	استثماري	31
1,400,000,000	تاهيل طريق التحويلة	الطرق والجسور	استثماري	32
460,500,000	تاهيل طريق شيروين	الطرق والجسور	استثماري	33
693,000,000	تاهيل طريق سراجق	الطرق والجسور	استثماري	34
343,960,000	تاهيل طريق الدوريين	الطرق والجسور	استثماري	35
429,880,000	تاهيل طريق المنصوريه مع القنطرة	الطرق والجسور	استثماري	36
830,000,000	تاهيل طرق في بهرز(خميس - علي الحمود)	الطرق والجسور	استثماري	37
574,800,000	تاهيل طرق الداينية	الطرق والجسور	استثماري	38
1,491,308,000	اعادة تاهيل الشارع الرئيسي لحي الضباط في جلولاء	الطرق والجسور	استثماري	39
890,976,000	اعادة تاهيل الشوارع في حي السلام الثاني في جلولاء	الطرق والجسور	استثماري	40
631,910,000	اعادة تاهيل الشوارع الاربعة خلف مركز الشباب في جلولاء	الطرق والجسور	استثماري	41
1,092,500,000	تاهيل مشروع ماء المنصورية الموحد	الماء والمجاري	استثماري	42
1,091,925,575	هدم واعادة بناء مركز شرطة جلولاء	الداخلية	استثماري	43
1,091,925,575	هدم واعادة بناء مركز شرطة المنصورية	الداخلية	استثماري	44
869,460,950	هدم واعادة بناء مدرسة الفراهيدي 12 صف	التربية والتعليم	استثماري	45
618,033,000	تاهيل مركز صحي الشهيد حسين الشاجي وتحويله من مركز صحي فرعي الى مركز صحي رئيسي	الصحة	استثماري	46
1,068,701,670	ايصال الماء الصافي لقرية جبارة	الماء	تشغيلي	47
1,884,554,440	صيانة و تاهيل 4 كم من طريق السندية الرابط مع محافظة صلاح الدين	الطرق والجسور	تشغيلي	48
108,709,500	تجهيز ونصب محطة تحلية سعة 5م3 ساعة في قرية الشيخ طامي / ناحية بهرز	الماء	تشغيلي	49
713,191,188	تاهيل مشروع ماء الحويش - جديدة الشط	الماء	تشغيلي	50
215,029,209	تاهيل وصيانة مجمع ماء عتبة بطاقة نصف مليون غالون - بلدروز	الماء	تشغيلي	51
988,654,713	تاهيل مشروع ماء ابي صيدا	الماء	تشغيلي	52
1,143,100,000	هدم واعادة بناء مركز شرطة جلولاء	الداخلية	تشغيلي	53
1,143,100,000	هدم و اعادة بناء مركز شرطة المنصورية	الداخلية	تشغيلي	54
64,640,799,779	المجموع			

# محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

# Baghdad Governorate Projects

الانبار



## خطة صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / حزام بغداد

ت	نوع التمويل	القطاع	اسم المشروع	الكلفة الكلية
1	استثماري	الكهرباء	تاهيل مغذي 33 كي في ( مغذي ماء الكرخ - طارمية قديمة /طارمية جديدة وبنظام الدبل سيركت)	1,405,588,000
2	استثماري	الطرق والجسور	تصليح وصيانة طريق مرمره وطريق البوصالح الاحمد بطول 8كم	1,051,100,000
3	استثماري	الطرق والجسور	تاهيل طريق تل طاسة وطريق الثائر الثانية- الطارمية	1,051,100,000
4	استثماري	الطرق والجسور	تاهيل طريق تل طاسة وطريق الثائر الاولى وطريق البوفراس 8كم	1,051,100,000
5	استثماري	الطرق والجسور	تصليح وصيانة طريق شيخ رافع حاتم والطرق المجاورة له بطول 7كم	909,650,000
6	استثماري	الطرق والجسور	قلع وتوسيع واكساء طريق مدخل سجن التاجي المركزي من الشارع العام بغداد -موصل الى موقع السجن بطول 600 متر وبعرض 8 م	2,205,640,000
7	استثماري	الطرق والجسور	تصليح واكساء طريق زملة حمدي في قضاء الطارمية بطول 14000م وعرض 6 متر	1,649,320,000
8	استثماري	الطرق والجسور	قلع وتبليط طريق محطة الكهرباء الغازية ابتداءا من طريق بغداد - الموصل الى منطقة السدة التابعة الى قضاء التاجي بطول 5000 متر وعرض 6 متر	1,372,300,000
9	استثماري	الطرق والجسور	تصليح وتبليط واكساء طريق اللين من سكة القطار الى سيطرة ام نجم ضمن مقاطعة 12 ضباعي التابعة الى مديرية ناحية التاجي الجديد بطول 10000متر وعرض 6 متر	1,831,720,000
10	استثماري	التربية والتعليم	هدم واعادة بناء مدرسة البواسل 9 صف في قضاء الطارمية	509,939,900
11	استثماري	التربية والتعليم	هدم واعادة بناء مدرسة الايثار الابتدائية 12 صف	1,007,917,500
12	استثماري	البلدية والبلديات	قلع واعادة تبليط مع انبوب تصريف مياه الامطار لشوارع هور الباشا	1,572,655,000
13	استثماري	البلدية والبلديات	تصليح واكساء طريق هور الباشا من شارع بغداد- مول الى منطقة الشيخ عمر	2,242,120,000
14	استثماري	الصحة	هدم واعادة بناء مركز صحي هور الباشا	959,048,250
15	استثماري	التربية والتعليم	هدم واعادة بناء مدرسة العراق الجديد	959,048,250
16	استثماري	التربية والتعليم	هدم واعادة بناء مدرسة ابو ايوب الانصاري	998,148,000
17	استثماري	التربية والتعليم	هدم واعادة بناء مدرسة المنامة	820,424,950
18	استثماري	الطرق والجسور	تاهيل واكساء طريق قرية الضحي	485,012,500
19	استثماري	التربية والتعليم	تاهيل مدارس في ابو غريب	636,881,500
20	استثماري	التربية والتعليم	هدم واعادة بناء مدرسة الرواشد	820,735,450

637,840,000	هدم واعادة بناء مدرسة عباس بن فرناس	التربية والتعليم	استثماري	21
909,650,000	تأهيل طريق الاسحافي	الطرق والجسور	استثماري	22
228,907,500	تأهيل ناحية سبع البور	دوائر حكومية	استثماري	23
541,002,550	تأهيل بناية مكتبة الطارمية	دوائر حكومية	استثماري	24
1,424,460,700	نقل خزان وتنفيذ خط ناقل لمنطقة 9 نيسان / النهروان	الماء والمجاري	استثماري	25
265,650,000	اكساء واعادة تاهيل طريق اطراف قرية ابراهيم جعيقص والجعيفر بطول 2200 م	الطرق والجسور	استثماري	26
147,200,000	مد انبوب ماء المزرفة (المرحلة الثانية)	الماء والمجاري	استثماري	27
846,400,000	تبليط شوارع قرية المهجرين الثانية / النهروان	الطرق و الجسور	تشغيلي	28
677,120,000	تبليط شوارع قرية المهجرين الاولى / النهروان	الطرق و الجسور	تشغيلي	29
486,018,750	تبليط طرق قرية الزيتية / النهروان	الطرق و الجسور	تشغيلي	30
94,691,000	تاهيل مجمع ماء صالح الاحمد 50م3/ساعة	الماء	تشغيلي	31
206,270,325	تاهيل مجمع ماء المشاهدة 200م3/ساعة	الماء	تشغيلي	32
597,703,875	صيانة مجمعات ماء النهروان ومشروع التوسعة ومحطة الخام	الماء	تشغيلي	33
471,094,338	تاهيل جسر السيارات المتضرر لناظم قاطع (8) كم وناظم صدر ابوغريب	الموارد المائية	تشغيلي	34
31,073,458,338	المجموع			




خطة صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / شمال بابل

الكلفة الكلية	اسم المشروع	القطاع	نوع التمويل	ت
3,421,771,200	صيانة الطريق الصحراوي	الطرق والجسور	استثماري	1
2,200,000,000	تجهيز محولات واعمدة مختلفة لمحافظة بابل/ جرف النصر	الكهرباء	استثماري	2
800,000,000	تجهيز مضخات وادوات احتياطية لمشاريع الماء في جرف النصر	الماء والمجاري	استثماري	3
614,827,950	تأهيل مجمعات عدد 4 في الحامية - جرف النصر	الماء	تشغيلي	4
707,008,500	تأهيل طريق الخضر المحاذي لنهر الفرات /المرحلة الثانية	الطرق و الجسور	تشغيلي	5
7,743,607,650	المجموع			

مشاريع المنح والقروض التي يعمل الصندوق  
كمشرف ومنسق لها

## ملخص تخصيصات المنح والقروض 2015 - 2018

غير ملتزم	المصرف	الملتزم به	التخصيص	القروض	المخطط	المصرف	الملتزم به	التخصيص	المنح
\$82,425,324.27	\$217,738,486.92	\$267,574,675.73	\$350,000,000	قرض البنك الدولي- مشروع التنمية الطارئ - EODP	\$458,000	0	0	\$458,000	المنحة الجبكية
\$377,282,415.36	\$6,417,400.71	\$22,717,584.64	\$400,000,000	قرض البنك الدولي- التنمية الطارئ الاضافي EODP/AF	\$100,000,000	0	0	\$100,000,000	المنحة الكويتية
EUR 417,640,791	EUR 13,299,315	EUR 44,594,141	EUR 500,000,000	قرض الالمانى - برنامج العاجل - M URE 135		\$9,000,000		\$9,000,000	المنحة الصينية
	EUR 6,676,074	EUR 37,765,068		قرض الالمانى - المرحلة الثانية - M URE 365					



# مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي EODP

## قرض البنك الدولي - \$350 - EODP

المحافظة	القطاع	التخصيص(م. دولار)	المخطط	المصرف (م. دولار)	المصرف %	الملتزم (م. دولار)	الملتزم %	غير ملزم ملاحظات
نينوى , الانبار , صلاح الدين, ديالى	الكهرباء (30 مشروع منها 3 استشاري) 28 مشروع منجز و مستمر	\$70,000,000	\$70,000,000	\$66,885,263.00	97%	\$69,006,602.00	99%	
الانبار , صلاح الدين , ديالى	البلدية و البلديات (45 مشروع ) // عدد المشاريع المنجزة 32 مشروع	\$62,000,000	\$62,000,000	\$43,144,487.03	80%	\$53,707,838.70	87%	
نينوى (3 جسور), الانبار (9 جسور) , صلاح الدين (5 جسور & 5 طرق) , ديالى(6 طرق & 6 جسور), حزام بغداد (1 جسر )	الطرق و الجسور (33 مشروع) // عدد المشاريع المنجزة 29 مشروع	\$137,000,000	\$137,000,000	\$98,953,831.57	85%	\$115,798,764.86	85%	
صلاح الدين ( 13 سيارة اسعاف & 5 عيادات متنتلة) + ديالى (26 سيارة اسعاف & 9 عيادات متنتلة )	الصحة + المياني (3 مشاريع ) عدد سيارات الاسعافات 39 و 14 سيارات متنتلة // منجزة	\$42,000,000	\$28,000,000	\$14,981,454.86	148.64%	10,078,886.00	36%	
سليمانية	موارد مائية ( تعديل القرض)- قيد التحضير - تم ادراج 8 مشاريع من ضمن 18 مشروع	30,000,000	30,000,000	-	0%	-	0%	
	المجموع الجزئي	\$341,000,000	\$327,000,000	\$223,965,036	90%	\$248,592,091.56	76%	
	صندوق اعادة الاعمار	\$9,200,000	\$9,200,000	\$5,537,539.07	199%	2,782,503.53	30%	
	رسوم			\$875,000.00		-		
	المجموع الكلي	350,200,000	336,200,000	230,377,576	92%	251,374,595	75%	

قرض البنك الدولي- الاضافي \$ 400									
ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (م. دولار)	المصرف %	المصرف (م. دولار)	المخطط	التخصيص (م. دولار)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0	\$45,000,000	\$45,000,000	الكهرباء	صلاح الدين, نينوى, الانبار, كركوك
		0%	0	0%	0	\$40,000,000	\$40,000,000	البلدية و البلديات	صلاح الدين, نينوى, الانبار, كركوك
		9%	\$9,283,723.24	2.68%	\$2,817,400.17	\$105,000,000	\$105,000,000	الطرق و الجسور	صلاح الدين, نينوى, الانبار, كركوك
		0%	0	0%	0	\$32,000,000	\$32,000,000	الزراعة	صلاح الدين, نينوى, الانبار, كركوك
		0%	0	0%	0	\$5,000,000	\$5,000,000	النقل	صلاح الدين, نينوى, الانبار
		0%	0	0%	0	\$35,000,000	\$35,000,000	التربية	صلاح الدين, نينوى, الانبار
		0%	0	27%	\$8,705,000	\$32,000,000	\$32,000,000	موارد مائية	صلاح الدين, نينوى, الانبار, كركوك
		0%	0	0%	0	\$60,000,000	\$60,000,000	المكون العاشر ( محافظات ) و تشمل ( صلاح الدين =10, ديالى =10, نينوى =20, الانبار =20 )	صلاح الدين , الانبار , نينوى, ديالى )
		0%	0	0%	0	\$354,000,000	\$354,000,000		المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0	\$1,000,000	\$1,000,000		رسوم
		0%	0	0%	0	\$30,000,000	\$30,000,000		احتياط
		0%	0	0%	0	\$385,000,000	\$385,000,000		المجموع الكلي

**القرض الالمانى - البرنامج العاجل 135 مليون يورو**

ملاحظات	نسبة الملتمزم من التخصيص %	نسبة المصروف من الملتمزم %	المصروف (يورو)	الملتمزم به (يورو)	التخصيص (يورو)	القطاع	المحافظة
	99%	30%	EUR 13,299,315	EUR 44,594,141	EUR 45,000,000	الكهرباء	نينوى
	0%	0%	0	0	EUR 45,000,000	الماء والصرف الصحي	
	0%	0%	0	0	EUR 45,000,000	الطرق و الجسور	
	33%	30%	13,299,315.00	EUR 44,594,141	EUR 135,000,000	المجموع الكلي	

**القرض الالمانى - البرنامج العاجل المرحلة الثانية / لقطاع الكهرباء - 180 مليون يورو**

ملاحظات	نسبة الملتمزم من التخصيص %	نسبة المصروف من الملتمزم %	المصروف (م. يورو)	الملتمزم به	التخصيص (م. يورو)	القطاع	المحافظة
	21%	18%	EUR 6,676,074	EUR 37,765,068	EUR 180,000,000	الكهرباء	نينوى , صلاح الدين , الانبار
	21%	18%	EUR 6,676,074	EUR 37,765,068	EUR 180,000,000	المجموع الكلي	

**القرض الالمانى / قطاع الصحة - 185 مليون يورو**

ملاحظات	نسبة الملتمزم من التخصيص %	نسبة المصروف من الملتمزم %	المصروف (م. يورو)	الملتمزم به	التخصيص (م. يورو)	القطاع	المحافظة
	0%	0%	0	0	185,000,000	الصحة	بغداد , صلاح الدين , الانبار , نينوى
	0%	0%	0	0	185,000,000	المجموع الكلي	

قرض البنك التنمى الاسلامى 250 مليون دولار تم تخصيص 119 مليون للقطاعات التالية:

ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (م. دولار)	المصرف %	المصرف (م. دولار)	المخطط	التخصيص (م. دولار)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	صحة	الانبار و صلاح الدين - 2019
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	مياه	الانبار - 2019
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	تعليم تقني	كركوك - 2019
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	زراعة	صلاح الدين و الانبار - 2020
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	تعليم عالي	نينوى و الانبار - 2020
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	تعليم عالي	صلاح الدين - 2021
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	طرق	بابل - 2021
		0%	0	0%	0				المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0				رسوم
		0%	0	0%	0				احتياط
		0%	0	0%	0				المجموع الكلي

المنحة الجيكية - 458 الف دولار

ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (دولار)	المصرف %	المصرف (دولار)	المخطط	التخصيص (دولار)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0	277,800	277,800	الصحة	نينوى ( قضاء الحمدانية)
		0%	0	0%	0	180,200	180,200	الكهرباء	نينوى ( قضاء الحمدانية)
		0%	0	0%	0	458,000	458,000		المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0				الاحتياط
		0%	0	0%	0	458,000	458,000		المجموع الكلي

المنحة الكويتية - المرحلة الاولى 15 مليون دولار									
ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (م. دولار)	المصرف %	المصرف (م. دولار)	المخطط	التخصيص (م. دولار)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0	\$ 6,021,418.00	\$ 6,021,418.00	الصحة	الانبار (8)
		0%	0	0%	0	\$ 1,238,817.00	\$ 1,238,817.00		ديالى (1)
		0%	0	0%	0	\$ 2,696,863.00	\$ 2,696,863.00		صلاح الدين (5)
		0%	0	0%	0	\$ 3,024,093.00	\$ 3,024,093.00		نينوى (4)
		0%	0	0%	0	\$ 415,638.00	\$ 415,638.00		شمال بابل (1)
		0%	0	0%	0	\$ 13,396,829.00	\$ 13,396,829.00		المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00		رسوم
		0%	0	0%	0	\$ 440,000.00	\$ 440,000.00		احتياط
		0%	0	0%	0	\$ 14,396,829.00	\$ 14,396,829.00		المجموع الكلي
المنحة الكويتية - المرحلة الثانية 85 مليون دولار									
ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (م. دولار)	المصرف %	المصرف (م. دولار)	المخطط	التخصيص (م. دولار)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0	\$ 28,153,489.00	\$ 28,153,489.00	الصحة	الانبار (6)
		0%	0	0%	0	\$ 7,162,400.00	\$ 7,162,400.00		ديالى (5)
		0%	0	0%	0	\$ 8,146,164.00	\$ 8,146,164.00		صلاح الدين (11)
		0%	0	0%	0	\$ 29,193,225.00	\$ 29,193,225.00		نينوى (2)
		0%	0	0%	0	\$ 2,868,384.00	\$ 2,868,384.00		كركوك (7)
		0%	0	0%	0	\$ 476,338.00	\$ 476,338.00		شمال بابل (1)
		0%	0	0%	0	\$ 76,000,000.00	\$ 76,000,000.00		المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0	5,000,000	5,000,000		رسوم
		0%	0	0%	0	4,000,000	4,000,000		احتياط
		0%	0	0%	0	\$ 85,000,000.00	\$ 85,000,000.00		المجموع الكلي

مشاريع المنحة الصينية عدد الاليات 118 بمبلغ ستون يوان صيني او \$ 9,000,000

قطاع البلديات					
عدد المستفيدين	مشاريع قيد الانجاز	مشاريع المنجزة	عدد المشاريع الكلية	القطاع	المحافظة
		36	36	تجهيز اليات	نينوى
		36	36	تجهيز اليات	الانبار
		18	18	تجهيز اليات	صلاح الدين
		11	11	تجهيز اليات	ديالى
		9	9	تجهيز اليات	كركوك
		7	7	تجهيز اليات	بغداد
		1	1	تجهيز اليات	بابل
		118	118		المجموع

منحة البنك الاسلامي للتنمية 5 مليون دولار

ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (دولار)	المصرف %	المصرف (دولار)	المخطط	التخصيص (دولار)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0	1.2	1.2	مياه - 2019	صلاح الدين (1)
		0%	0	0%	0	1.2	1.2	صرف صحي - 2020	الانبار (1)
		0%	0	0%	0	2.5	2.5	مياه- 2021	بغداد (1)
		0%	0	0%	0	4.9	4.9		المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0	0.1	0.1		احتياط
		0%	0	0%	0	5	5		المجموع الكلي

منحة الهند 494 الف دولار

ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (دولار)	المصرف %	المصرف (دولار)	المخطط	التخصيص (دولار)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0		ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات	ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات	نينوى / سنجان
		0%	0	0%	0		ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات	ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات	نينوى / سنجان
		0%	0	0%	0		ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات	ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات	نينوى / سنجان
		0%	0	0%	0				المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0				احتياط
		0%	0	0%	0				المجموع الكلي

# اليات المنحة الصينية





جسر عمر بن عبد العزيز / الرمادي / الأنبار





إعادة تأهيل جسر شيشين | صلاح الدين



تجهيز محطات متنقلة للمحافظات



تجهيز اليات تخصصية للمحافظات المحررة



42.5 كم شارع نفط خانة - مندلي



إعادة تأهيل جسر القاسم ومقاربه



## حل مؤقت لجسر الموصل الرابع

תודה  
Dankie Gracias  
Спасибо شكراً  
Merci Takk  
Köszönjük Terima kasih  
Grazie Dziękujemy Děkojame  
Ďakujeme Vielen Dank Paldies  
Kiitos Tänname teid 谢谢  
**Thank You** Tak  
感謝您 Obrigado Teşekkür Ederiz  
Σας ευχαριστούμε 감사합니다  
ขอบคุณ  
Bedankt Děkujeme vám  
ありがとうございます  
Tack
