



صندوق
إعادة اعمار المناطق المتضررة

Re
F
AA
T
O

التقرير الفني لمشاريع
صندوق إعادة الاعمار
منذ تأسيسه و لغاية
31/10/2020
الجزء (السادس والثلاثون)
تشرين الاول 2020

A horizontal rectangular panel with a repeating pattern of green and white concentric semi-circles, similar to the orange pattern in the top left.

المقدمة

- تأسس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وفق المادة (28) من قانون الموازنة الفدرالية العامة لعام 2015. اعقبه صدور نظام الصندوق رقم (2) لسنة 2015، وقد نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددها (4352) في 16/2/2015 وقد جاء فيها (يؤسس صندوق إعادة اعمار المناطق التي دمرها الإرهاب ويمول من المنح والمساعدات الدولية، ويخصص له مبلغ من الموازنة الاتحادية).
- وفي عام 2017 تم تعديل بعض فقرات النظام وحددت الهيكلية الإدارية وصدر النظام رقم (3) في جريدة الوقائع العراقية بعددها (4441).
- وقد حددت مناطق عمل الصندوق في المدن التي دمرها الإرهاب في كل من الانبار، ديالى، صلاح الدين، نينوى، شمال بابل، حزام بغداد (أبو غريب) وبعض المناطق الجنوبية من كركوك.
- هذا الكراس وهو تقريراً فنياً والذي يصدر كل شهر لمشاريع التي ينفذها الصندوق من الموازنة الفدرالية بشقيها الاستثماري والبرامج الخاصة، ويتم التوثيق بإحداثيات الـ (GPS) إضافة الى صور ومراحل الإنجاز بصورة دقيقة، كما ويحتوي هذا الكراس على المشاريع التي تنفذها الوزارات القطاعية كجزء من واجبات الصندوق في التدقيق المالي والفني التي يشرف عليها مدققون عالميون معينين من قبل الصندوق من خلال البنك الدولي والبنك الألماني.
- نأمل ان ترسم هذه السلسلة الشهرية من الكراسات خارطة إعادة الاعمار المترقبة.
- والله ولي التوفيق.

مهدف انشاء الصندوق:-

- 1- إعادة اعمار وتأهيل المناطق التي دمرها الإرهاب وإزالة آثارها.
- 2- معالجة الاضرار الحاصلة في البنى التحتية.
- 3- تعويض الفرص التنموية.

آلية عمل الصندوق:

يعمل الصندوق كمنسق ومراقب على تنفيذ القروض التي تقدم للعراق مثل قرض البنك الدولي وقرض بنك التنمية الألماني والتي تنفذ من قبل الوزارات القطاعية او من خلال المنح (المنحة الكويتية للقطاع الصحي والمنحة الصينية لأليات البلديات والمنحة التشيكية).

كما ويعمل الصندوق كمنفذ للمشاريع التي تقدم له من المحافظات المتضررة من خلال المبالغ المرصودة من الموازنة الاتحادية

مهام صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وفق نظام رقم (3) لسنة 2017

- حسب المادة اولا من نظام صندوق إعادة الاعمار يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بشخصية معنوية وذات استقلال مالي واداري.

وفق المادة (5) يمارس الصندوق المهام الآتية:-

- التنسيق مع الجهات المعنية لوضع أولويات المشاريع في المحافظات المتضررة.
- السعي الى جلب المنح والهبات والمساعدات والقروض.
- القيام بإجراءات التعاقد ومتابعة تنفيذ المشاريع.
- متابعة تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار الممولة من المنح والقروض.
- تقديم الخطط اللازمة لإعادة الاعمار ووضع السياسات اللازمة لتحقيق اهداف الدولة.
- تنظيم ورعاية المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية المتعلقة بإعادة الاعمار وذلك سعيا لجلب المنح والهبات والمساعدات.

صندوق إعادة الاعمار

- الرؤيا:

بناء الثقة بين العراقيين والدولة من جهة وبين العراق والمجتمع الدولي من جهة أخرى.

- الرسالة:

إعادة بناء الانسان والجدران وادامة العجلة الاقتصادية في المدن المتضررة من العمليات الإرهابية.

وتتم من خلال الابعاد التالية:-

1- البعد الاجتماعي:

تجديد العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين على المصداقية والثقة في جهود إعادة

الاعمار.

2- البعد الاقتصادي:

ادامة العجلة الاقتصادية في المناطق المتضررة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة

3- البعد الفيزيائي وإعادة الخدمات:

إعادة اعمار المنشآت العامة والخاصة والمتضررة من العمليات الارهابية

القسم الأول

ملخص مشاريع الصندوق على الموازنة الفدرالية للاعوام 2016 لغاية 2019

الملاحظات	نسبة المشاريع المنجزة من المتعاقد عليها	عدد المشاريع المستمرة	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المتعاقد عليه / مليار دينار	السنة
أنجزت المشاريع بالكامل	100%	—	152	152	152	19,784	2016
3 مشاريع من المخطط تم سحب العمل منها	100%	0	159	159	162	97,432	2017
مشروعين مؤجلة الى 2019	93%	14	182	196	198	109,122	2018
11 مشروع لم يتم التعاقد عليها مؤجلة الى 2020	32%	290	135	425	436	340,243	2019
	67%	304	628	932	948	566,581	المجموع

جدول يمثل اعداد مشاريع صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة للموازنة الفيدرالية حسب القطاعات منذ عام 2016 - 2019

المجموع		القطاعات																								المحافظة		
		دوائر حكومية		الموارد المائية		الماء والمجاري		الكهرباء		الطرق والجسور		الصحة		الشباب والرياضة		الزراعة		الداخلية		التعليم العالي		التربية		التجارة			البلدية و البلديات	
المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	
264	355	6	15	12	12	109	121	20	31	13	19	10	12	1	2	1	3	10	12	24	30	41	69	3	3	14	26	الانبار
21	22	0	0	0	0	17	17	0	1	4	4	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	شمال بابل
61	90	4	4	2	2	6	11	13	13	2	2	1	5			0	0	2	3	0	0	10	23	0	0	21	27	حزام بغداد
79	130	0	0	0	0	12	20	8	14	39	51	1	4	0	1	0	0	1	3	0	0	7	20	0	0	11	17	ديالى
50	92	0	7	0	0	5	8	3	3	2	11	1	4	1	1	0	0	10	12	2	4	12	20	0	0	14	22	صلاح الدين
51	90	1	2	1	1	14	17	5	6	8	16	0	0			0	2	5	9	0	1	7	18	2	2	8	16	كركوك
100	165	4	8	0	3	7	8	7	21	4	7	7	10	0	1	2	6	6	7	16	26	29	39	2	8	16	21	نينوى
2	2							2	2																			عقد تجهيز محولات لكافة المحافظات 2016
0	2							0	2																			عقد تجهيز محولات لكافة المحافظات 2019
628	948	15	36	15	18	170	202	58	93	72	110	20	35	2	5	3	11	34	46	42	61	106	189	7	13	84	129	الإجمالي الكلي

القسم الثاني

مشاريع المنح والقروض التي يعمل الصندوق كمشرف ومنسق لها

عدد المشاريع المخطط لها والمنفذة والمنجزة والمستمرة						
نسبة المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المستمرة	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص / دولار	نوع التمويل
84%	19	<u>98</u>	<u>117</u>	<u>131</u>	\$350,000,000	قرض البنك الدولي الطارئ- EODP
8%	22	2	24	<u>137</u>	\$400,000,000	قرض البنك الدولي الطارئ-الإضافي EODP
15%	11	2	<u>13</u>	<u>50</u>	URE 500,000,000	القرض الألماني - GFCI
80%	1	4	<u>5</u>	<u>10</u>	\$458,000,000	المنحة التشيكية
100%	0	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	\$9,000,000	المنحة الصينية (118) آلية
0%	19	0	19	<u>55</u>	\$100,000,000	المنحة الكويتية

جدول يمثل اعداد مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات لعام 2016 / منجزة

الإجمالي الكلي	القطاعات											المحافظات
	الموارد المائية	المحافظة	الماء	الكهرباء	القضاء	الصحة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة	البلديات	
113	4	2	78	1	1	5	3	18			1	الانبار
13			13									بابل
6				6								بغداد
4							4					صلاح الدين
3			1				2					كركوك
11			2	2		2			2	1	2	نينوى
2				2								عقود محولات وقابلوات لجميع المحافظات
152	4	2	94	11	1	7	9	18	2	1	3	الإجمالي الكلي

جدول يمثل توزيع مبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية على المحافظات والقطاعات لعام 2016 / منجزة

الإجمالي الكلي	القطاعات											المحافظات
	الموارد المائية	المحافظة	الماء	الكهرباء	القضاء	الصحة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة	البلديات	
9,306,587,480	328,310,000	199,349,990	6,248,522,000	93,306,000	79,550,000	499,601,000	169,248,000	1,621,700,490			67,000,000	الأنبار
1,083,000,000			1,083,000,000									بابل
599,591,000				599,591,000								بغداد
263,340,000							263,340,000					صلاح الدين
285,023,500			95,000,000				190,023,500					كركوك
542,971,250			121,000,000	39,078,500		27,000,000			63,142,750	98,000,000	194,750,000	نينوى
7,703,490,000				7,703,490,000								عقود محولات وقابلوات لجميع المحافظات
19,784,003,230	328,310,000	199,349,990	7,547,522,000	8,435,465,500	79,550,000	526,601,000	622,611,500	1,621,700,490	63,142,750	98,000,000	261,750,000	الإجمالي الكلي

جدول يمثل مشاريع الصندوق على الموازنة الفدرالية حسب المحافظات و القطاعات لعام 2017

المحافظة	قطاع البلديات		قطاع التربية		قطاع التعليم العالي		قطاع الداخلية		قطاع الطرق والجسور		قطاع الكهرباء		قطاع الماء		قطاع الموارد المائية		دوائر حكومية		المجموع	
	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي
الانبار	6	6	28	28	3	3	1	1	3	3	2	2	2	2	5	5	1	1	52	51
استثماري			28	28					1	1					2	2			31	31
تشغيلي	6	6			3	3	1	1	2	2	2	3	2	2	3	3	1	1	20	21
بابل	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	4	4	0	0	7	6
استثماري												1							1	0
تشغيلي									2	2					4	4			6	6
بغداد	0	0	7	7	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	13	13
استثماري			7	7													1	1	8	8
تشغيلي									1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	5	5
ديالى	1	1	2	3	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	3	3	0	0	19	18
استثماري			2	3					12	12									15	14
تشغيلي														3	3				4	4
صلاح الدين	10	10	6	6	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	5	5	0	0	27	27
استثماري			6	6										1	1				10	10
تشغيلي												2	2	5	5				17	17
كركوك	2	2	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	3	3	0	0	11	11
استثماري			2	2															2	2
تشغيلي									1	1	3	3	3	3	3	3	0	0	9	9
نينوى	12	12	4	4	12	12	4	4	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	33	33
استثماري			4	4															15	15
تشغيلي												4	4	1	1				18	18
المجموع الكلي	31	31	49	50	17	17	7	7	19	19	10	12	18	18	6	6	2	2	162	159

ملاحظة: الخلايا باللون الأصفر تعني مشروع تم سحب العمل منه .

جدول يمثل توزيع مبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية على المحافظات والقطاعات لعام 2017

الإجمالي الكلي	القطاعات													المحافظة	
	موارد مانية	ماء	كهرباء	طرق وجسور	دوائر حكومية	الموارد المانية	الكهرباء	الطرق والجسور	الطرق	الداخلية	التعليم العالي	التربية	البلدية		البلديات
50,522,074,002	15,612,422,000	136,800,000	3,614,782,980	2,507,415,000	99,750,000					1,052,385,000	621,812,300	21,853,665,597	4,369,654,125	653,387,000	الانبار
1,964,072,520		298,620,000	819,788,000	845,664,520											بابل
6,193,070,280		284,350,000	694,443,370		100,000,000	899,346,750		88,225,000				4,126,705,160			بغداد
6,714,502,350		385,400,000							4,196,530,750			2,025,821,600		106,750,000	ديالى
12,547,743,900		1,713,600,000	1,628,400,000							779,982,000	1,214,602,000	3,491,996,900		3,719,163,000	صلاح الدين
2,908,337,000		196,481,000	1,842,734,000	63,200,000								616,582,000		189,340,000	كركوك
16,583,191,450							731,600,000			519,926,500	9,418,039,550	2,885,667,900		3,027,957,500	نينوى
97,432,991,502	15,612,422,000	3,015,251,000	8,600,148,350	3,416,279,520	199,750,000	899,346,750	731,600,000	88,225,000	4,196,530,750	2,352,293,500	11,254,453,850	35,000,439,157	4,369,654,125	7,696,597,500	الإجمالي الكلي

جدول يمثل مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب القطاعات والمحافظات لخطة عام 2018

المجموع		المحافظات																						
		دوائر حكومية		الماء والمجاري		الكهرباء		الطرق والجسور		الصحة		الزراعة		الداخلية		التعليم العالي		التربية		التجارة		البلدية و البلديات		
المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	
51	51	0	0	16	16	10	10	5	5	4	4	0	0	5	5	3	3	7	7	1	1	0	0	الانبار
10	10							3	3	3	3			4	4									استثماري
41	41			16	16	10	10	2	2	1	1			1	1	3	3	7	7	1	1			تشغيلي
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	شمال بابل
1	1							1	1															استثماري
18	18	2	2	4	4	2	2	1	1	1	1	0	0	2	2	0	0	3	3	0	0	3	3	حزام بغداد
2	2																	2	2					استثماري
16	16	2	2	4	4	2	2	1	1	1	1			2	2			1	1			3	3	تشغيلي
33	34	0	0	4	4	3	3	18	18	1	1	0	0	0	0	0	0	5	6	0	0	2	2	ديالى
16	16					2	2	12	12									2	2					استثماري
17	18			4	4	1	1	6	6	1	1							3	4			2	2	تشغيلي
16	18	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	0	0	4	4	0	0	6	6	0	0	3	3	صلاح الدين
6	8								2									6	6					استثماري
10	10					1	1	1	1	1	1			4	4							3	3	تشغيلي
22	28	1	1	6	6	1	1	4	5	0	0	0	0	3	4	0	1	5	6	2	2	0	2	كركوك
14	16	1	1	2	2	1	1	4	4					1	1		1	5	6					استثماري
8	12			4	4				1					2	3					2	2		2	تشغيلي
41	48	4	5	4	4	3	6	4	4	4	4	1	1	2	3	4	5	13	13	1	2	1	1	نينوى
20	26	1	1			2	5	2	2	1	1				1	2	3	10	10	1	2	1	1	استثماري
21	22	3	4	4	4	1	1	2	2	3	3	1	1	2	2	2	2	3	3					تشغيلي
182	198	7	8	34	34	20	23	34	37	11	11	1	1	16	18	7	9	39	41	4	5	9	11	الإجمالي الكلية

ملاحظة : اللون الأصفر يعني وجود مشروع لم ينفذ (مؤجل).

جدول يمثل توزيع مبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية على المحافظات والقطاعات لعام 2018

الإجمالي الكلي	القطاعات											المحافظات
	دوائر حكومية	الماء والمجاري	الكهرباء	الطرق والجسور	الصحة	الزراعة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة	البلدية و البلديات	
19,120,011,200		4,021,707,200	2,658,704,000	3,013,384,000	1,242,514,000		2,345,197,800	1,141,948,900	4,089,139,300	607,416,000		الانبار
2,000,259,000				2,000,259,000								بابل
5,194,149,600	300,000,000	817,903,100	1,016,109,900	205,980,000	19,750,000		400,036,000		1,753,555,600		680,815,000	بغداد
13,705,639,215		1,107,700,700	1,321,577,000	7,961,501,514	96,755,000				2,379,179,500		838,925,501	ديالى
14,564,300,850			1,017,611,200	4,985,812,000	284,192,000		2,579,462,400		4,281,372,250		1,415,851,000	صلاح الدين
11,219,925,305	362,528,000	2,248,862,005	467,952,500	2,278,434,000			1,678,050,400	864,570,000	2,398,886,000	576,140,000	344,502,400	كركوك
43,318,433,950	2,054,444,000	1,479,428,750	13,159,580,000	3,300,644,000	6,263,047,000	232,313,000	2,317,910,600	3,348,214,600	5,944,624,000	5,029,748,000	188,480,000	نينوى
109,122,719,120	2,716,972,000	9,675,601,755	19,641,534,600	23,746,014,514	7,906,258,000	232,313,000	9,320,657,200	5,354,733,500	20,846,756,650	6,213,304,000	3,468,573,901	الإجمالي الكلي

		جدول يمثل اعداد مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب القطاعات والمحافظات لخطة عام 2019																									المحافظة		
الإجمالي الكلي		القطاعات																									نوع التمويل		
		مباني حكومية		الموارد المائية		الماء والمجاري		الكهرباء		الطرق والجسور		الصحة		الشباب والرياضة		الزراعة		الداخلية		التعليم العالي		التربية		التجارة		البلدية والبلديات			
المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي		
49	139	2	11	3	3	13	25	7	17	5	11	1	3	1	2	1	3	1	3	0	6	6	34	2	2	7	19	الاتبار	
18	97	2	9			3	14		10	4	10	1	3		1				2		5	5	30			3	13	استثماري	
31	42		2	3	3	10	11	7	7	1	1			1	1	1	3	1	1		1	1	4	2	2	4	6	تشغيلي	
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	بابل
1	1									1	1																	تشغيلي	
24	53	1	1	1	1	1	6	3	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	0	0	18	24	بغداد	
12	26						1	3	3				1									6			9	15	استثماري		
12	27	1	1	1	1	1	5						3						1			7			9	9	تشغيلي		
28	77	0	0	0	0	5	13	5	11	9	21	0	3	0	1	0	0	1	3	0	0	0	11	0	0	8	14	ديالى	
22	60					2	5	3	6	8	20		3						1	3		9			8	14	استثماري		
6	17					3	8	2	5	1	1				1							2					تشغيلي		
3	43	0	7	0	0	0	3	0	0	1	8	0	3	1	1	0	0	0	2	0	2	0	8	0	0	1	9	صلاح الدين	
2	32		3				1			1	5		3						2		2		8			1	8	استثماري	
1	11		4				2				3			1	1												1	تشغيلي	
15	48	0	1	1	1	4	7	1	2	3	10	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	10	0	0	6	12	كركوك	
11	39		1			4	6	1	2		6						2						10			6	12	استثماري	
4	9			1	1		1			3	4								3									تشغيلي	
15	73	0	3	0	3	1	2	1	12	0	3	1	4	0	1	1	5	0	0	0	9	10	20	0	5	1	6	نينوى	
13	52		2		3			1	10		1				1	1	3				9	10	15		2	1	6	استثماري	
2	21		1			1	2		2		2	1	4			2						5		3				تشغيلي	
0	2								2																			عقد تجهيز محولات KVA + 400KVA 250 لكافة المحافظات	
135	436	3	23	5	8	24	56	17	47	19	54	2	17	2	5	2	10	2	12	0	17	16	96	2	7	41	84	الإجمالي الكلي	
ملاحظة : 1/ اللون الأصفر يعني وجود مشاريع لم تنفذ (مؤجلة).																													
2/ 11 مشروع مدرجة في وزارة التخطيط ولم يتم التعاقد عليها (مؤجلة).																													

كف مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية لعام 2019 موزعة حسب القطاعات والمحافظات

الإجمالي الكلي	القطاعات												المحافظة	
	مباني حكومية	الموارد المائية	الماء والمجاري	الكهرباء	الطرق والجسور	الصحة	الشباب والرياضة	الزراعة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة		البلدية والبلديات
105,832,527,134	5,408,799,800	731,329,600	13,378,678,200	6,311,006,334	14,639,315,200	2,826,389,800	1,133,000,000	1,093,879,000	4,933,227,700	7,678,840,000	22,397,589,400		25,300,472,100	الأنبار
197,190,000					197,190,000									بابل
22,437,696,150	250,000,000	284,972,000	1,885,424,000	1,941,297,500	12,866,938,000	1,230,226,000					3,728,838,650		250,000,000	بغداد
56,451,653,650			5,362,936,190	7,745,451,400	18,809,091,400	7,406,275,000			1,969,140,800		6,523,158,660		8,635,600,200	ديالى
37,025,090,702	5,472,100,900		1,135,174,400		11,014,512,000	2,698,634,400			1,085,670,400	920,492,000	5,000,335,600		9,698,171,002	صلاح الدين
27,686,252,641	3,098,129,600		4,171,735,000	1,175,735,040	7,679,450,000			2,131,577,600	461,959,000		2,369,721,600		6,597,944,801	كركوك
80,312,855,740	275,000,000	4,334,667,600	406,700,000	17,715,446,300	601,200,000	5,614,116,000	339,240,000	6,062,453,800		24,555,012,200	6,001,559,000	5,044,808,640	9,362,652,200	نينوى
				10,300,000,000										عقد تجهيز محولات KVA + 400KVA 250 لكافة المحافظات
340,243,266,017	14,504,030,300	5,350,969,200	26,340,647,790	45,188,936,574	65,807,696,600	19,775,641,200	1,472,240,000	9,287,910,400	8,449,997,900	33,154,344,200	46,021,202,910	5,044,808,640	59,844,840,303	الإجمالي الكلي

**مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية
حسب المحافظات لعام 2016**

مشروع محافظة الانبار

الانبار



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة الانبار

ت	القطاع	اسم المشروع	القضاء / الناحية	المبلغ
1	الماء	صيانة مجمع ماء الجبور / القرية العصرية سعة 100م ³ / ساعة + تاهيل مجمع زويغير سعة 200م ³ / ساعة	الرمادي	58,320,000
2	الماء	صيانة مجمع ماء زويغير الثاني سعة 200م ³ في الرمادي	الرمادي	69,525,000
3	الماء	صيانة مجمع ماء البوعيثة الخامس سعة 100م ³ + تاهيل مجمع ماء البوعيثة الرابع سعة 50م ³ / ساعة	الرمادي	55,534,000
4	الماء	تجهيز مولدة 150 كي في اي + مولدة 250 كي في اي لمشروع ماء تل اسود (عبد مخيلف) وتل اسود (عبد مناور)	هيت / الفرات	86,000,000
5	الماء	صيانة مجمع ماء الحامضية القديم سعة 200م ³ / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	96,515,000
6	الماء	صيانة مجمع العدنان في قضاء الرمادي	الرمادي	76,570,000
7	الماء	تجهيز مولدة كهرباء 250 كي في اي لمجمع اليونسييف + تجهيز مولدة كهرباء لمجمع ماء زنكورة الثالث	الرمادي	90,000,000
8	الماء	تجهيز مولدة 250 كي في اي مع هيكل السحب لمجمع العدنان في قضاء الرمادي	الرمادي	66,000,000
9	الماء	صيانة مجمع ماء البوغضبان + تجهيز مولدة بيركنز 250 كي في اي	الرمادي	81,167,000
10	الماء	صيانة ماء طوي البوجراد	الرمادي	72,500,000
11	الماء	صيانة مجمع ابو طيبان / صعب الحردان القصر سعة 200م ³ / ساعة + تاهيل مجمع ماء زنكورة الاول سعة 200م ³ / ساعة	الرمادي	75,850,000
12	الماء	صيانة مجمع ماء البوعبيد الجديد سعة 200م ³ / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	84,960,000
13	الماء	صيانة مجمع ماء البوكاطع + تجهيز مولدة 250 كي في اي لمجمع ماء البوذباب الحويجة	الرمادي	93,000,000
14	الماء	صيانة مجمع ماء البوعبيد (طالب عفات) + تاهيل مجمع ماء البوذباب القصر سعة 200م ³ / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	73,280,000
15	الماء	تجهيز مولدة قدرة 250 كي في اي لمجمع ماء المداليس + تجهيز مولدة 250 كي في اي في البوذباب الجنابيين	الرمادي	90,000,000
16	الماء	صيانة مجمع ماء الحامضية الجديد سعة 200م ³ / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	42,890,000
17	الماء	استبدال الانابيب الواقعة في منطقة الحوز شارع النهر الشارع الرابط بين جسر الحوز ومجسر الزيوت الجانب الايمن في الرمادي	الرمادي	68,495,000
18	الماء	استبدال الانابيب الواقعة في منطقة الحوز شارع النهر الشارع الرابط بين جسر الحوز ومجسر الزيوت الجانب الايسر في الرمادي	الرمادي	66,295,000
19	الماء	صيانة مجمعات اليونسييف / الدوار في قضاء الرمادي	الرمادي	72,960,000
20	البلديات	تاهيل الشارع الرابط بين شارع البوذباب وجسر الحوز في الرمادي	الرمادي	67,000,000

82,778,000	الرمادي	تاهيل الجناح الاداري والواجهة الخارجية لمديرية جنسية محافظة الانبار	الداخلية	21
40,950,000	الرمادي	ترميم وتاهيل جنسية واحوال الرمادي	الداخلية	22
82,120,000	الرمادي	صيانة مجمع ماء الدوار / عبد الصالح	الماء	23
75,493,000	الرمادي	صيانة مجمع ماء البو شعبان قرب مدرسة سمية + صيانة مجمع ماء البو شعبان 2	الماء	24
51,800,000	الرمادي	ايصال التيار الكهربائي المغذي لمحطات ضخ الماء في الموقع الجامعي لجامعة الانبار	الماء	25
99,325,000	الرمادي	تاهيل مبنى كلية الادارة والاقتصاد - القاعات الدراسية لجامعة الانبار	التعليم العالي	26
45,800,000	الرمادي	تاهيل محطة ري البوذيب المساعدة (البوهايس)	الموارد المائية	27
86,810,000	الرمادي	تجهيز محولات KVA 630 في محطة ري القطنية المساعدة ومحطة ري بزايذ ابو طيبان	الموارد المائية	28
97,235,000	الرمادي	صيانة وتاهيل محطة تصفية وتعقيم ماء الجامعة ومحطات الضخ لجامعة الانبار	التعليم العالي	29
87,740,000	الرمادي	تاهيل مبنى شؤون الطلبة لجامعة الانبار	التعليم العالي	30
99,999,990	الرمادي	اعادة تاهيل بناية الاقسام الادارية في المحافظة	التعليم العالي	31
45,520,000	الرمادي	اعادة تاهيل بناية دائرة حماية المنشأة في الرمادي	الداخلية	32
99,350,000	الرمادي	اعادة تاهيل بناية الاشراف الهندسي	المحافظة	33
83,660,000	الرمادي	صيانة مجمع ماء البوعيثة الاول بسعة 200م ³ في قضاء الرمادي	الماء	34
99,500,000	الرمادي	تاهيل القناة الناقلة لشارع اربعين في الرمادي	الموارد المائية	35
99,999,990	الرمادي	اعادة تاهيل بناية الاقسام الفنية في المحافظة	المحافظة	36
96,200,000	الرمادي	تاهيل المحطة المساعدة الغربية لمحطة ري البوذيب	الموارد المائية	37
19,638,000	الفلوجة	صيانة مجمع ماء البو كريطي	الماء	38
44,930,000	الفلوجة	تجهيز ونصب وتشغيل مولد 250 كي في اي لمجمع ماء ابو سديرة القديم	الماء	39
96,500,000	الفلوجة	تجهيز مواد لصيانة مشاريع وشبكات للمجمعات المائية في الفلوجة	الماء	40

58,405,000	هيت / الفرات	صيانة مجمع ماء جبيل سعة 200م ³ /ساعة	الماء	41
94,650,000	الفلوجة	صيانة مجمع ماء البوعبد الحسن في الفلوجة	الماء	42
78,500,000	الفلوجة	تاهيل مجمع ماء الشهداء القديم سعة 200م ² /ساعة في قضاء الفلوجة	الماء	43
73,000,000	الفلوجة	صيانة مجمع ماء الفلاحات وصبيحات القديم والهيثاويين في الفلوجة	الماء	44
86,950,000	الفلوجة	صيانة مجمع الفلاحات الجفة في قضاء الفلوجة	الماء	45
97,760,000	الفلوجة	تاهيل مجمع ماء البوخميس سعة 200م ³ /ساعة+تاهيل مجمع ماء البو يوسف	الماء	46
67,195,000	الفلوجة	صيانة مجمعات ماء البوعزام والفلاحات الجفة والبوندياب في قضاء الفلوجة	الماء	47
75,180,000	الفلوجة	صيانة مجمع ماء البوشمخان الحلابسة والبشويش الحلابسة والشيخ نعيم والبوعنوان 1 في الفلوجة	الماء	48
99,900,000	الفلوجة	تجهيز الاجهزة الطبية لكلية الطب والطب البيطري لجامعة الفلوجة	التعليم العالي	49
79,550,000	الفلوجة	تاهيل وترميم بناية محكمة الفلوجة	القضاء	50
90,000,000	الفلوجة	تجهيز مولدات عدد (2) اثنان لكلية الطب والطب البيطري جامعة الفلوجة	التعليم العالي	51
55,905,000	هيت	مجمع ماء تل اسود المكاشير وعودة الرجب	الماء	52
43,200,000	هيت	مد الخط الناقل لاهياء الحلبسية وفرات وسيطرة ماجد في هيت	الماء	53
84,505,000	هيت	اعادة تاهيل وصيانة مجمع ماء المحمدي القديم سعة 200م ³ /ساعة	الماء	54
93,306,000	هيت	تجهيز وتنصيب مواد صيانة الكهرباء لناحية المحمدي مركز المدينة	الكهرباء	55
67,000,000	هيت / الفرات	صيانة مجمع ماء البو مانع سعة 200م ³ /ساعة	الماء	56
58,405,000	هيت	صيانة مجمع ماء حي البكر الشرقي سعة 200م ³	الماء	57
42,000,000	هيت	تاهيل مشروع ماء المؤسسة	الماء	58
97,500,000	هيت	تاهيل مشروع ماء قرى هيت	الماء	59
90,350,000	هيت / الفرات	صيانة مجمع ماء زوية الشرقية + مجمع ماء بكرة البو غانم	الماء	60

84,810,000	هيت	صيانة مولدة مشروع ماء هيت- كبيسة الموحد قدرة 1100 كي في اي	الماء	61
92,620,000	هيت	تجهيز مواد صيانة شبكات لمركز ماء هيت	الماء	62
99,080,000	هيت / الفرات	صيانة مجمع ماء تل اسود (مخلف المحل) + صيانة مجمع ماء تل اسود (عبد مناور)	الماء	63
95,700,000	هيت	صيانة المجمعات المائية في ناحية البغدادي + تجهيز ونصب مضخة قدرة 250 م ³ /ساعة * 80 م ومد خط ناقل قطر 160 ملم لمنطقة شرق البغدادي قرب مدرسة الثواب في قضاء هيت	الماء	64
99,877,000	هيت	اعادة تأهيل ردهات الاطفال في مستشفى هيت	الصحة	65
99,928,000	هيت	اعادة تأهيل صالة العمليات الكبرى في مستشفى هيت العام	الصحة	66
99,972,000	هيت	اعادة تأهيل جناح الطوارئ في مستشفى هيت العام	الصحة	67
99,947,000	هيت	اعادة تأهيل صالة عمليات الولادة والاطفال في مستشفى هيت العام	الصحة	68
99,877,000	هيت	اعادة تأهيل ردهات الرجالية في مستشفى هيت العام	الصحة	69
96,500,000	هيت	تاهيل مشروع ماء هيت /كبيسة الموحد سعة 1000م ³ /ساعة	الماء	70
86,240,000	هيت / الفرات	صيانة ماء الغرير سعة 50م ³ /ساعة	الماء	71
84,769,000	هيت	صيانة واعادة تأهيل بناية كلية العلوم التطبيقية / جامعة الانبار في هيت	التعليم العالي	72
93,210,000	هيت	اعادة تأهيل وصيانة مجمع ماء المحمدي الجديد سعة 200م ³ / ساعة	الماء	73
97,000,000	حديثة	تجهيز مضخات ومحركات لمشاريع ومجمعات حديثة ونواحيها	الماء	74
97,500,000	حديثة	تجهيز مضخات ومحركات لمحطة توزيع مشروع حديثة / حقلانية الموحد	الماء	75
93,800,000	حديثة	تاهيل مشروع ماء البوحيات الشرقي سعة 50م ³ /ساعة	الماء	76
75,780,000	حديثة	تاهيل مشروع ماء البوحيات الوسطي بطاقة 50م ³ /ساعة	الماء	77
80,750,000	حديثة	تاهيل مجمع ماء الخسفة	الماء	78
80,650,000	حديثة	اعادة تأهيل مجمع ماء البوحيات الغربي 50م ³ /ساعة	الماء	79
76,250,000	حديثة	تاهيل مجمع ماء الشاعي سعة 100م ³ /ساعة	الماء	80

95,445,000	حديثة	تأهيل بناية القاعات الدراسية لكلية التربية الاساسية حديثة / الخدمات والتابعة لجامعة الانبار	التعليم العالي	81
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء البو تايه سعة 200م ³ في الكرمة	الماء	82
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء اللهب 2	الماء	83
98,260,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء اللهب 1 بسعة 100م ³	الماء	84
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء الغرير سعة 200م ³ في الكرمة	الماء	85
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء المصالحة سعة 200م ³	الماء	86
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء ذراع دجلة سعة 200م ³	الماء	87
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء البودخيل	الماء	88
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء بني زيد الاول	الماء	89
94,750,000	الخالدية	صيانة مجمع البوبالي رقم 3 مع تجهيز مولدة 250 كي في اي في قضاء الرمادي	الماء	90
95,650,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء ابو زعيان في الخالدية	الماء	91
99,800,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء البوشهاب + تجهيز مولدة بيركنز 250 كي في اي	الماء	92
91,750,000	الخالدية	تجهيز مولدة كهرباء نوع بيركنز 500 كي في اي وبورد كهربائي لمشروع قرى الحباتية في قضاء الخالدية	الماء	93
96,700,000	الخالدية	صيانة مولدة 250 كي في اي لمجمع ماء البو شعبان 1 + صيانة مجمع ماء البو عبد المحسن + تجهيز ونصب مولدة 250 كي في اي	الماء	94
90,400,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء البوبالي الاول في الخالدية	الماء	95
99,700,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء الكرابلة+تجهيز ونصب مولدة بيركنز 250 كي في اي	الماء	96
63,520,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء سن الذبان سعة 200م ³ /ساعة	الماء	97
87,200,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء الملاحمة + تجهيز ونصب مولدة بيركنز 250 كي في اي	الماء	98
93,300,000	الخالدية	صيانة مجمع البوبالي الثاني في الخالدية	الماء	99
95,000,000	الرطوبة	تجهيز طواقم ضخ عمودية خاصة بالابار لمركز ماء الرطوبة والوليد ومركز ماء النخيب ومركز ماء عرعر	الماء	100

84,000,000	الربطة	صيانة الفلاتر في المحطة الرئيسية لمشروع ماء الصحراء الغربية في الربطة	الماء	101
53,800,000	طربيل	تأهيل وحدة التحلية رقم (3) في مركز ماء طربيل الرئيسي	الماء	102
96,500,000	طربيل	استخراج البئر الساقط في منفذ طربيل الحدودي وبعمق 450 متر	الماء	103
82,175,000	الصقلاوية	تأهيل بناية الأقسام العلمية ومختبرات القسم المدني في المعهد التقني	التعليم العالي	104
88,700,000	الصقلاوية	تجهيز المتطلبات المهمة لضخ وتصفية وتوزيع الماء في المعهد التقني	التعليم العالي	105
90,334,000	الصقلاوية	انشاء مجموعتي حمامات للطلبة + انشاء ملحق قاعة دراسية سندويج بئل في المعهد التقني	التعليم العالي	106
87,455,000	الصقلاوية	تأهيل قسم الكهرباء والقسم المدني في المعهد التقني	التعليم العالي	107
70,900,000	الصقلاوية	اعادة ربط الكهرباء الوطنية لموقع المعهد التقني	التعليم العالي	108
97,060,000	الصقلاوية	توليد وايصال وتوزيع الكهرباء لموقع المعهد التقني	التعليم العالي	109
93,180,000	الصقلاوية	انشاء مسقف استراحة الطلاب في المعهد التقني	التعليم العالي	110
66,622,500	الصقلاوية	تأهيل وانشاء قاعة دراسية مرسوم المعهد التقني	التعليم العالي	111
93,860,000	الصقلاوية	عزل المواقع الغير مؤمنة في المعهد + تأهيل بناية قاعات قسم الكهرباء والورش الهندسية في المعهد التقني	التعليم العالي	112
97,000,000	الصقلاوية	تجهيز الاثاث المدرسي المطلوب لابنية موقع المعهد التقني	التعليم العالي	113
9,306,587,480		المجموع		

مشاريع محافظة نينوى



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة نينوى				
ت	اسم المشروع	القضاء	القطاع	المبلغ
1	اعمار البئر الارتوازي في ناحية الشمال	سنجار	الماء	22,000,000
2	اعمار مدرسة (برجاية لة ك) في ناحية شنكال	سنجار	التربية	45,886,000
3	اعمار مستوصف في مركز ناحية الشمال	سنجار	الصحة	8,000,000
4	اعمار القنطرة الصندوقية في وادي سنجان	سنجان	البلديات	95,000,000
5	اعمار مستوصف مجمع دوكري في ناحية الشمال	سنجان	الصحة	19,000,000
6	اعمار سايلو سنجان	سنجان	التجارة	98,000,000
7	محطة كهرباء الشمال في ناحية الشمال	سنجان	الكهرباء	19,078,500
8	شراء اليات تخصصية لبلدية سنجان	سنجان	البلديات	99,750,000
9	اعمار مركز تشغيل ماء سنجان	سنجان	الماء	99,000,000
10	بنائة دائرة كهرباء الشمال في ناحية الشمال	سنجان	الكهرباء	20,000,000
11	اعمار مدرسة كوهبةل في ناحية الشمال	سنجان	التربية	17,256,750
	المجموع			542,971,250

مشاريع محافظة صلاح الدين



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة صلاح الدين

ت	القطاع	اسم المشروع	القضاء	المبلغ
1	الداخلية	تأهيل وصيانة قسم شرطة الاسحافي ومركز شرطة السجلة	الدجيل	79,120,000
2	الداخلية	اعادة تأهيل وصيانة مقر فوج طوارئ الدجيل	الدجيل	61,820,000
3	الداخلية	اعادة تأهيل وصيانة قسم الكلاب البوليسية وقسم مكافحة الاجرام وقسم شؤون الميرة	تكريت	56,200,000
4	الداخلية	اعادة تأهيل وصيانة قسم الادلة الجنائية ومركز شرطة تكريت	تكريت	66,200,000
		المجموع		263,340,000

مشروع محافظة كركوك



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة كركوك

المبلغ	اسم المنطقة	اسم المشروع	القطاع	ت
92,310,500	تازة	اعمار مركز شرطة البشير في ناحية تازة	الداخلية	1
95,000,000	تازة	اعمار شبكة ماء البشير في ناحية تازة	الماء	2
97,713,000	الملتقى	اعمار مركز شرطة ناحية الملتقى	الداخلية	3
285,023,500	المجموع			

مشاريع محافظة بابل

Babil Governorate projects

المسيب

المحلويا

الحلة

الهاشمية



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة بابل

ت	القطاع	اسم المشروع	اسم المنطقة	المبلغ
1	الماء	تأهيل مجمعات ماء الدوريين 14م ³ / ساعة	الاسكندرية	70,500,000
2	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الغربية)	الاسكندرية	82,500,000
3	الماء	تأهيل مجمع ماء الشيحة 14م ³ / ساعة	الاسكندرية	76,500,000
4	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الشرقية)	الاسكندرية	79,200,000
5	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الشمالية)	الاسكندرية	88,000,000
6	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الجنوبية)	الاسكندرية	80,300,000
7	الماء	تأهيل مجمعات ماء الحويجة 14م ³ / ساعة	الاسكندرية	70,500,000
8	الماء	تأهيل مجمع ماء ابو شمسي سعة 200م ³ / ساعة	الاسكندرية	92,000,000
9	الماء	تأهيل مجمع ماء الخضر سعة 200م ³ / ساعة	الاسكندرية	92,000,000
10	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (3) سعة 50م ³ / ساعة	جرف النصر	88,000,000
11	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (2) سعة 50م ³ / ساعة	جرف النصر	88,000,000
12	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (4) سعة 50م ³ / ساعة	جرف النصر	88,000,000
13	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (1) سعة 50م ³ / ساعة	جرف النصر	87,500,000
		المجموع		1,083,000,000

محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

Baghdad Governorate Projects

الانبار



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / حزام بغداد

ت	القطاع	اسم المشروع	اسم المنطقة	المبلغ
1	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية السعدان (1)	النصر والسلام	99,962,500
2	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية السعدان (2)	النصر والسلام	99,956,000
3	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العجاج	النصر والسلام	99,881,000
4	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العناز (1)	النصر والسلام	99,950,500
5	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العناز (2)	النصر والسلام	99,915,500
6	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية عودة الشكر	النصر والسلام	99,925,500
المجموع				599,591,000

**مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية
حسب المحافظات لعام 2017**

مشاريع محافظة نينوى



مشاريع محافظة نينوى على الموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة الشورة الابتدائية 12 صف/ القيارة / نينوى	التربية	35° 59'43.8"N 43° 13'18.5"E	600	38+170	715,512,000	716,492,000	2017-08-02	2017-08-16	7/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	اعدادية القيارة للبنين 12 صف / القيارة / نينوى	التربية	35° 47'23.1"N 43° 17'23.4"E	600	28+180	687,989,900	684,563,900	2017-08-02	2017-08-16	5/12/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	ثانوية الشورة للبنين 12 صف/ القيارة / نينوى	التربية	36° 00'03.8"N 43° 13'36.0"E	600	18+170	750,236,000	748,708,000	2017-08-02	2017-08-16	18/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة اجحة الابتدائية للبنين 12 صف/ القيارة/ نينوى	التربية	35° 42'31.9"N 43° 17'58.5"E	600	28+160	737,710,000	735,904,000	2017-08-02	2017-08-13	5/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	صب ارسفة وبناء القوالب الجانبية للشارع الرئيسي / حي النصر وبربوش /مركز قضاء سنجار/نينوى	البلديات			60	188,480,000	188,480,000	2018-05-06	25L6L2016	16/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	تأهيل شوارع وصبغ القوالب في الشورة	البلديات												
7	إعادة تأهيل وأكساء شوارع رئيسية في حمام العليل	البلديات												
8	كشف أعمال تأهيل وأكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية القيارة	البلديات												
9	تأهيل وإكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية القيارة	البلديات		400,000	28+70	1,527,640,000	1,570,680,000	2017-11-05	2017-11-20	16/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	إعادة تأهيل المدخل الجنوبي للقصة (شارع الصلاحية) مع تحويل العارض (أنبوب الماء) الموجود في وسط الشارع في ناحية حمام العليل/ المرحلة الاولى	البلديات												
11	إكساء شوارع داخل ناحية الشورة	البلديات												
12	إكساء طرق داخلية في ناحية بعشيقه													
13	صيانة شوارع متفرقة في ناحية بعشيقه													
14	بناء القوالب الجانبية وصب الارصفة والفاسلس في برطلة	البلديات		150,000	24+65	945,980,000	993,785,000	2017-11-14	2017-11-28	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
15	تبليط مسارات شبكة مجاري في برطلة													
	المجموع					5,553,547,900	5,638,612,900							

مشاريع محافظة نينوى على الموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	صيانة وتأهيل ابنية كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل / نينوى	التعليم العالي	36 22.897'N 43 8.592'E	2000	45+140	900,000,000	985,290,000	2017-08-02	2017-08-20		100%	100%	0%	انجاز العمل
2	تأهيل شبكات الكهرباء / الموصل	الكهرباء	36 21 34 05N 43 01 34 28E	25,000	30	731,600,000	731,600,000	2017-10-18	منجز		100%	100%	0%	انجاز العمل
3	تأهيل وصيانة طرق في قضاء الحمدانية وناحية النمرود	البلديات		85,000	4+50	275,016,500	275,012,500	2017-11-02	2017-11-16	29/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	تأهيل بناية مركز شرطة الوقاص	الداخلية		150000	12+50	303428000	327096500	2017-11-20	2017-12-04		100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تأهيل بناية مركز شرطة اليرموك	الداخلية												
6	تأهيل بناية مركز الدفاع المدني الجزائر	الداخلية		200000	12+50	175316000	192830000	2017-11-21	2017-12-03	2/11/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	تأهيل بناية مديرية شرطة النصر	الداخلية												
8	تأهيل ابنية كلية الآداب / جامعة الموصل / نينوى	التعليم العالي		4000	40+154	1,414,930,000	1,539,455,000	2017-08-02	2017-10-08	16/5/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	تأهيل ابنية كلية التقانات وعلوم البيئة / جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي	36° 23.126'N 43° 8.471'E											
10	تأهيل ابنية كلية التمريض / جامعة الموصل / نينوى	التعليم العالي	36° 22.574'N 43° 8.948'E	4000	34+140	1,627,784,000	1,785,149,550	2017-09-25	2017-10-03	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تأهيل ابنية كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل / نينوى	التعليم العالي	36° 22.696'N 43° 8.696'E											
12	تأهيل كلية طب الاسنان/جامعة الموصل /نينوى	التعليم العالي	36° 23.197'N 43° 8.919'E	2500	28+140	1,464,915,000	1,611,067,000	2017-10-15	2017-10-29	26/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
13	تأهيل كلية الصيدلة/ جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي	36° 22.491'N 43° 8.637'E											
14	تأهيل بناية قسم الاعمار والمشاريع/جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي	36° 22.552'N 43° 8.762'E	4250	45+105	1,624,462,000	1,784,852,000	2017-09-28	2017-10-11	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
15	تأهيل ابنية كلية العلوم/جامعة الموصل / نينوى	التعليم العالي	36° 22.557'N 43° 8.579'E											
16	تأهيل ابنية المراكز البحثية/ جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي												
17	تأهيل ابنية كلية التربية / جامعة الموصل	التعليم العالي		4250	61+110	1,571,950,000	1,712,226,000	2017-10-30	2017-11-14	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
18	تأهيل ابنية كلية الهندسة / جامعة الموصل	التعليم العالي												
				481000		10089401500	10,944,578,550				39			



ثانوية الشورة / الشورة / نينوى



اعدادية القيارة / القيارة / نينوى



كلية طب الأسنان / جامعة الموصل / نينوى





إعادة تأهيل طرق الحمدانية والنمرود / نينوى



تأهيل مديرية شرطة النصر / نينوى



تاهيل وتبليط مسارات شبكة مجاري في برطلة و بعشيقه





كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى

كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى



كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى



كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل / نينوى



45



كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل / نينوى



تجهيز محولات إلى الجانب الأيمن / الموصل

مشروع محافظة الانبار

الانبار



مشاريع محافظة الانبار للموازنة الاستثمارية / الخطة الاستثمارية 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	ثانوية العلا للبنات / 18 صف الرمادي/الانبار	التربية	33 25 13.0N 43 18 28.2E	650	95+210	1,066,033,000	2017-07-23	2017-08-06	18/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	ثانوية الكواكب للبنات /ثانوية/18 صف/الرمادي/الانبار	التربية	33 ° 24 37.3N 43° 16 42.6E	450	80+190	1,070,000,000	2017-07-24	2017-08-09	26/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	ثانوية دار السلام للبنين /ثانوية/18 صف /هيت /الانبار	التربية	33 39 03.0N 42 49 48.3E	650	78+190	1,144,525,000	2017-07-30	2017-08-21	15/5/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة أبو أيوب الانصاري للبنين /ابتدائية/12 صف/ الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 23 31.4N 43 52 50.8E	450	177+160	659,631,000	2017-07-30	2017-08-17	2018-07-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	مدرسة صعدة الابتدائية المختلطة الابتدائية 12 صف/الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 33 14.7N 44 06 14.5E	450	166+170	585,985,000	2017-07-31	2017-08-13	18/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	مدرسة الوفاء الابتدائية للبنين 12 صف /الرمادي/ الانبار	التربية	33° 25 50.2N 43° 21 22.0E	450	83+165	598,000,000	2017-08-02	2017-08-15	2018-10-05	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	ثانوية الرشاد للبنين الثانوية 18 صف/الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 23 57.2N 43 36 01.7E	650	96+210	1,093,229,000	2017-08-02	2017-08-17	2/1/2019	100%	100%	0	انجاز العمل
8	مدرسة الافنان الابتدائية للبنين 12 صف /جزيرة الرمادي/ الانبار	التربية	33 28 03.5N 43 18 04.6E	450	153+180	611,468,000	2017-08-02	2017-08-15	2018-01-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	اعدادية حليلة السعدية للبنات 12 صف /الرمادي/ الانبار	التربية	33° 26' 00.0N 43° 22' 05.6E	450	103+180	599,981,000	2017-08-03	2017-08-08	30/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	مدرسة الصمد الابتدائية 12 صف/ هيت/ الانبار	التربية	33 37 55.3N 42 50 26.8E	450	63+170	639,571,000	2017-08-03	2017-08-21	2018-12-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	متوسطة المامون 18 صف /الرمادي/الانبار	التربية	33 25 17.0N 43 19 57.9E	650	29+210	1,266,865,000	2017-08-03	2017-08-15	2018-05-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	مدرسة دجلة الابتدائية للبنين 12 صف/الرمادي/ الانبار	التربية	33 25 39.2N 43 17 01.6E	450	20+170	592,525,000	2017-08-03	2017-08-16	25/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
13	اشبيلية الابتدائية المختلطة 12 صف /الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 29 46.6N 44 06 14.5E	450	143+160	614,777,000	2017-08-03	2017-08-13	20/12/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
14	مدرسة الخضر الابتدائية 12 صف /الصقلاوية/الفلوجة/الانبار	التربية	33 27 50.4N 43 36 27.3E	450	150+150	573,888,800	2017-08-03	2017-10-25	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
15	مدرسة السلوى الابتدائية 18 صف/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 19 49.2N 43 47 49.5E	650	161+210	1,078,596,000	2017-08-03	2017-08-15	19/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل

16	مدرسة ابي ذر الغفاري الابتدائية للبنات 12 صف /جزيرة الرمادي/ الانبار	التربية	33 27 29.1N 43 16 17.7E	450	93+180	631,520,000	2017-08-03	2017-08-09	2018-05-02	100%	100%	0%	انجاز العمل
17	مدرسة المروج الخضراء الابتدائية 12 صف/ الفلوجة/ الانبار	التربية	33 25 31.6N 43 43 10.7E	450	134+180	595,000,000	2017-08-13	2017-08-23	20/12/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
18	مدرسة عامر بن ربيعة 12 صف/ حديثة/ الانبار	التربية	33 00 16.3N 42 26 13.6E	450	15+170	688,586,000	2017-08-13	2017-09-05	20/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
19	مدرسة الخالد الابتدائية 12 صف /الفلوجة/ الانبار	التربية	33 26 49.3N 43 44 37.4E	450	129+170	651,962,500	2017-08-13	2017-09-10	14/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
20	مدرسة الفتوة الابتدائية للبنين 12 صف/ الرمادي/ الانبار	التربية	33 26 00.0N 43 22 05.6E	450	134+180	594,113,000	2017-08-13	2017-08-23	2018-01-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
21	ثانوية جبة للبنين 12 صف / البغدادي/ هيت/ الانبار	التربية	33 54 33.0N 42 33 04.6E	450	101+160	575,131,000	2017-08-13	2017-08-23	23/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
22	مدرسة دار العلم الابتدائية 12 صف / الرمادي/ الانبار	التربية	33 24 44.5N 43 18 24.5E	450	20+170	611,635,000	2017-08-13	2017-08-27	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
23	متوسطة خالد بن الوليد 12 صف/ الكرمة/ الفلوجة/ الانبار	التربية	33 42 17.7N 43 55 18.8E	450	114+180	669,928,000	2017-08-13	2017-08-20	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
24	ثانوية الشهابي للبنين 12 صف/ الفلوجة/ الانبار	التربية	33 23 02.4N 43 51 59.1E	450	145+160	672,513,500	2017-08-13	2017-08-27	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
25	ثانوية الرشيدية للبنين 12 صف /الرمادي/ الانبار	التربية	33 24 04.0N 43 19 58.1E	450	20+165	577,451,000	2017-08-14	2017-09-06	2018-09-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
26	مدرسة جنة الماوى الابتدائية للبنين 12 صف /الرمادي/ الانبار	التربية	33 25 54.3N 43 12 40.1E	450	71+170	573,900,500	2017-08-15	2017-09-06	25/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
27	متوسطة الشيماء للبنات 12 صف/ هيت/ الانبار	التربية	33 38 16.8N 42 49 34.1E	450	180	667,409,500	2017-08-23	2017-08-23	30/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
28	اعدادية صناعة الصقلاوية 18 صف/ الصقلاوية/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 24 02.3N 43 42 05.6E	650	162+180	1,195,056,000	2017-08-24	2017-10-11	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
29	مشروع ناظم الورار	موارد مائية	33° 26.057'N 43° 15.928'E	10,000,000	25+570	7,038,189,000	2017-11-07	2017-11-19	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
30	اعادة اعمار ناظم سدة الرمادي على نهر الفرات	موارد مائية	33° 26.444'N 43° 16.138'E	10,000,000	25+570	6,911,239,000	2017-11-07	2017-11-19	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
31	اعادة تاهيل جسر هيت الحديدي	طرق وجسور		200000	180	1,983,315,000	2017-12-07	2017-12-17	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع					36,832,023,800							

مشاريع محافظة الانبار للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	اصلاح وتاهيل طريق الرمادي- هيت/ الرمادي/ الانبار	طرق وجسور	33 25 36.6N 42 58 36.1E	400,000	145	285,000,000	312,200,000	2017-07-30	2017-08-21	2018-03-01	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	إعادة انشاء القسم البلدي السادس/ الرمادي الانبار	البلديات	33 24 46.0N 43 12 51.0E	100,000	180	220,575,000	242,575,000	2017-08-02	2017-08-29	25/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	تاهيل بناية الاقسام الداخلية في قضاء الفلوجة/ الانبار	التعليم العالي		500.00	80	211,829,000	229,851,000	2017-10-15	2017-10-29	2018-05-02	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	تأهيل المحطات الاروانية في جزيرة وشامية الرمادي/ الانبار	موارد مائية												
5	تأهيل محطات البزل في جزيرة وشامية الرمادي / الانبار	موارد مائية			25+90	877,170,000	920,790,000	2017-10-17	2017-10-29	19/2/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	اعادة انشاء قناطر في البوعينة	موارد مائية												
7	اعادة انشاء السياج الامني لقضاء هيت / الانبار	دوائر حكومية		150,000		99,750,000	99,750,000	تنفيذ امانة	\	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	مجمع ماء الحميدية	ماء		12000		100,000,000	100,000,000	تنفيذ امانة	\	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	مجمع ماء الصبيحات	ماء		10000		36,800,000	36,800,000	تنفيذ امانة	\	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تجهيز وتنفيذ وتنصيب محطة تحويل الحصرة 33/11 كي في ساعة 2*31.5 ام في أي / هيت/ الانبار	كهرباء		200,000	25+90	361,000,000	396,779,980	2017-10-18	2017-10-30	17/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تاهيل شارع المعارض الى تقاطع الفرسان في الرمادي/ الانبار	البلدية		100,000	60+140	2,123,020,000	2,250,940,000	2017-10-22	2017-11-05	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	تاهيل شارع من تقاطع الفرسان الى تقاطع شارع (20) الرمادي/ الانبار	البلدية		100,000	25+140	967,828,000	1,037,349,000	2017-10-22	2017-11-06	2018-04-06	100%	100%	0%	انجاز العمل

انجاز العمل	0%	100%	100%	14/4/2018	2017-11-14	2017-10-22	507,653,000	472,473,000	25+140	150,000		كهرباء	13	تجهيز ونصب محطة تحويل المشتل كهرباء 33/11 كي في /هيت/الانبار
سحب عمل من المقاول بموجب قرار محكمة			0%		2017-11-14	2017-10-25	2,710,350,000	2,710,350,000	140	1,500,000		كهرباء	14	إعادة تأهيل خط كهرباء غرب بغداد - حديثة 400 كي في /عموم محافظة الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-05-07	2017-11-06	2017-10-26	410,812,000	373,752,000	70+170	200,000		البلديات	15	تأهيل ابنية دائرة البلدية /القسم البلدي الثاني/الرمادي/الانبار
												البلديات	16	تأهيل انية دائرة البلدية القسم البلدي الرابع/ الرمادي الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	24/5/2018	2017-11-19	2017-10-30	1,052,385,000	974,585,000	25+150	250,000		الداخلية	17	اعادة انشاء مديرية شرطة تمونجية في قضاء الفلوجة
انجاز العمل	0%	100%	100%	19/6/2018	2017-11-14	2017-11-12	1,081,365,125	983,270,000	30+120	100,000		البلدية	18	الشارع الرابط بين تقاطع شارع عشرين الى شارع الملعب
انجاز العمل	0%	100%	100%	23/12/2017	2017-11-23	2017-11-14	211,900,000	194,400,000	30	75,000		طرق وجسور	19	العبارة النهريه في هيت (البايتونات)
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-04-07		2017-12-04	391,961,300	360,895,000	25+75	8,000		التعليم العالي	20	تأهيل بناية قسمي الفيزياء والعربي في كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة الانبار
												التعليم العالي	21	تأهيل بناية القاعات الدراسية في كلية الزراعة / جامعة الانبار
							11,993,461,405	11,352,697,000		3,355,500				المجموع



مدرسة دار السلام / هيت / الانبار

مدرسة دار السلام / هيت / الانبار (صعب نقل مواد البناء)



مدرسة دار السلام / هيت / (قبل الاعمار)




اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت ⁵²



اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت (انفجار عبوة اثناء العمل)



اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت

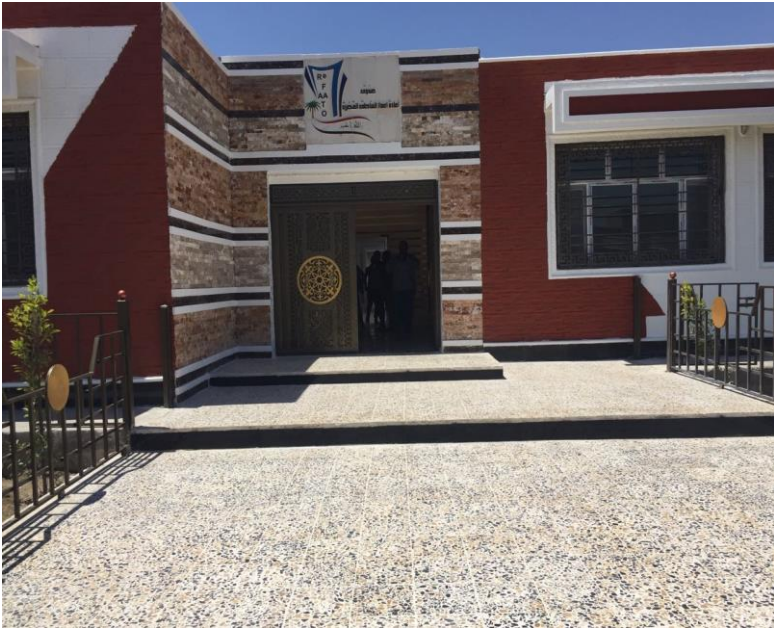

مدرسة السلوى / الفلوجة الانبار



مدرسة جنة الماوى / الرمادي / الانبار



تاهيل مباني كلية الزراعة/جامعة الانبار/ الرمادي / الانبار



مدرسة ابي ذر الغفاري / الجزيرة / الرمادي / الانبار



مدرسة الصمد / هيت / الانبار



مدرسة المأمون / الرمادي / الانبار



إعادة تاهيل مستشفى هيت العام





إعادة تاهيل جسر هيت



العبرة (حل مؤقت أثناء إعادة تاهيل الجسر)



هدم وإعادة بناء القسم البلدي السادس / الرمادي / الأنبار



هدم وإعادة بناء مدرسة الفتوة / الأنبار



إعادة بناء سدة الرمادي على نهر الفرات / الرمادي / الأنبار



مشاريع محافظة صلاح الدين



مشاريع محافظة صلاح الدين للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة الدور الأولى للبنات 12 صف/ الدور - صلاح الدين	التربية	34 27 26.2N 47 47 18.5 E	450	92+180	716,944,000	729,733,400	2017-07-25	2017-08-05	2018-05-08	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	ثانوية الفرقان 18 صف/ تكريت /صلاح الدين	التربية	34 26 18.0N 43 40 35.5E	700	120+170	1,119,644,000	1,194,869,900	2017-07-30	2017-08-28	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	مدرسة حفص الدوري للبنين 6 صف/ الدور/ صلاح الدين	التربية	34 27 42.8N 43 50 31.3E	255	12+120	330,000,000	339,733,500	2017-08-03	2017-08-21	2018-07-03	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية 6 صف/تكريت صلاح الدين	التربية	34 26 42.9N 43 44 05.2E	250	33+180	303,645,000	303,645,000	2017-08-13	2017-08-22	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	روضة الفارس العربي 4 صف/ تكريت / صلاح الدين	التربية	34 36 06.9 N 43 40 32.9 E	350	96+180	417,595,000	417,595,000	2017-08-13	2017-08-28	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	مدرسة الاشاوس للبنين 9 صف/ ناحية مكيشيفة/ تكريت/	التربية	34 18 23.4N 43 46 59.1E	140	95+180	469,258,000	506,420,100	2017-08-24	2017-09-11	25/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	تاهيل اقسام داخلية للطالبات وقاعة الدري لمعهد الدور التقني /الدور -صلاح الدين	التعليم العالي	34 27 36N 43 48 34E	3000	10+150	484,140,000	484,140,000	2017-09-25	2017-10-04	2018-12-09	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	مد شبكة مياه تصريف الامطار واعمال الانارة والتبليط للطريق من مستشفى الحارث الى الوادي وبطول 1800 م طول / الضلوعية - صلاح الدين	البلديات	37 68 92N 42 77 17 E	25,000	80+150	994,050,000	1,083,067,000	2017-09-26	2017-10-10	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	اعمال اعادة بناء اقسام داخلية للطلاب عدد/4 جامعة تكريت	التعليم العالي	34° 40.717'N 43° 38.914'E	4,000	78+240	754,370,000	730,462,000	2017-12-11	2017-12-20	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تجهيز مواد لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم صلاح الدين (أعمدة)	كهرباء		50,000	20	144,600,000	144,600,000	2017-12-14		منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	تجهيز مواد لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم صلاح الدين (محولات)	كهرباء		25,000	30	939,000,000	939,000,000	2017-12-14		منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			109,145		6,673,246,000	6,873,265,900							

مشاريع محافظة صلاح الدين للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تاهيل وتشغيل وحدة ماء العيثة سعة 200م3/ساعة/ الشرقاط /صلاح الدين	ماء	35 63 864N 43 24 181E	27,000	120	257900000	257900000	2017-07-25	2017-08-06	17/12/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	تاهيل وتشغيل وحدة ماء الحجاج سعة 200م3/ساعة/بيجي/ صلاح الدين	ماء	34 85 308N 43 54 104E											
3	اكساء شارع معهد الدور في قضاء الدور/صلاح الدين	البلديات	34 28 12N 43 47 38.16E	10,000	80	435,000,000	435,000,000	2017-09-17	2017-09-26	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	تاهيل واكمال بناية شرطة الدور وسيطرة العلم/العلم/ صلاح الدين	الداخلية	21 49 34 .27N 26 76 43 47E	40,000	10+90	307,000,000	324,387,000	2017-09-17	2017-10-01	16/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تأهيل مقرات مديريات (التدخل السريع (سوات) ومكافحة المتفجرات وانضباط الشرطة) وقاعة الشهيد صالح عويد/ تكريت/ صلاح الدين	الداخلية	3.21 34 37N 23.44 43 40E	30,000	85	455,595,000	455,595,000	2017-09-25	2017-10-05	20/12/2017	100%	100%	0	انجاز العمل
6	تاهيل الشارع الرابط بين شارع الزهور والشارع الحولي/ تكريت/ صلاح الدين	البلديات	34 35 159N 43 40 425E	150,000	20+80	762,737,000	767,215,000	2017-09-25	2017-10-02	26/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	إعادة تاهيل الشارع الممتد من تقاطع المجلس القديم باتجاه القادسية بطول 680 م/ تكريت /صلاح الدين	البلديات	37 68 92N 42 77 17 E											
8	تاهيل مبنى مختبر صلاح الدين الانشائي/ تكريت /صلاح الدين	البلديات	43 40 58.16E 34 34 47.29N											
9	تاهيل مديرية كمارك صلاح الدين/ تكريت /صلاح الدين	البلديات	43 41 01.95E 34 35 11.93N											
10	تاهيل مديرية إحصاء صلاح الدين/ تكريت / صلاح الدين	البلديات	43 41 02.27E 34 35 13.79N	180,000	84	872,881,000	872,881,000	2017-10-03	2017-10-17	15/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تاهيل بناية ناحية دجلة المتضررة من الاعمال الإرهابية/سامراء/صلاح الدين	البلديات	43 44 11.1E 34 23 39.25N											
12	تاهيل مديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين	البلديات	43 41 01.15E 34 35 00.27N											
13	تجهيز مولدة مختلفة السعات لمشاريع الماء	ماء		80,000	90	1,173,000,000	1,173,000,000	2017-11-26	منجز		100%	100%	0%	انجاز العمل
14	تجهيز مولدة مختلفة السعات لمحطات الرفع والضخ لمشاريع الصرف الصحي	البلديات				561,000,000	561,000,000							
15	تجهيز غواطس عدد 5 لمحطات ضخ مياه الامطار الأولى والثانية في قضاء الدجيل - صلاح الدين	ماء		75,000	30	95,450,000	95,450,000	2017-12-04	منجز	30/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
16	تجهيز غواطس نهريّة ومضخات الدفع لمجمعات الماء في شاطئ الجدر وهيجل الكبير والفياض الثاني وشهيد احمد وسديرة الوسطى	ماء		50,000	45	187,250,000	187,250,000	2017-12-10	منجز	22/2/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
17	تجهيز مواد لصيانة شبكة كهرباء مركز قضاء الطوز وامرلي (العمدة)	كهرباء		50,000	20	75,300,000	75,300,000	2017-12-14	منجز		100%	100%	0%	انجاز العمل
	تجهيز مواد لصيانة شبكة كهرباء مركز قضاء الطوز وامرلي (محولت)	كهرباء		50,000	30	469,500,000	469,500,000	2017-12-14	منجز		100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			742,000		5,674,478,000	5,652,613,000							



مدرسة حفص الدوري / قرية أبي دلف / الدور / صلاح الدين



مدرسة الدور الأولى / الدور / صلاح الدين



قاعة الشهيد صالح عويد / تكريت / صلاح الدين





مركز شرطة الدور / صلاح الدين



ثانوية الفرقان / صلاح الدين



إعادة تأهيل بناية ناحية دجلة / سامراء / صلاح الدين





تأهيل الأقسام الداخلية للطالبات | المعهد الفني / الدور / صلاح الدين



إعادة تأهيل شارع معهد الدور / صلاح الدين



محطة ماء الحويجة / تكريت / صلاح الدين

مشاريع محافظة كركوك



مشاريع محافظة كركوك للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	كلفة المشروع بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	هدم وإعادة بناء مدرسة الشهيد الابتدائية 6 صف/كركوك	التربية	35 14.653N 44 16.121E	180	165	306,926,000	306,926,000	2017-07-23	2017-08-03	29/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	هدم وإعادة بناء مدرسة الامام حسن الابتدائية 6 صف/ كركوك	التربية	35 13.101N 44 16.902E	180	165	309,656,000	306,926,000	2017-07-23	2017-08-03	27/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			360		616,582,000	613,852,000							

مشاريع محافظة كركوك للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	إعادة تاهيل الشبكات الكهربائية	كهرباء	35 27.117N 44 11.325E	5,200	30	153,734,000	153,734,000	2017-07-31	2017-08-10	31/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	إعادة تاهيل الشبكات الكهربائية في قرى ملا عبدالله وادريس خيبار وادريس خزعل والهندية 1,2/كركوك													
3	تاهيل وتشغيل مجمع ماء بطاقة (50)م/3 ساعة في قرية قرنية- ناحية بابجي/كركوك	ماء	35 24.107N 44 21.151E	3,800	85	71,281,000	71,281,000	2017-07-31	2017-08-03	14/11/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	صيانة طريق الشمسية/كركوك	البلديات	35 14.511N 44 16.217E	4,000	55	189,340,000	189,340,000	2017-08-03	2017-08-03	24/9/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تبليط شوارع داخلية بالكونكريت قرب مدرسة البلديات (الوقف الشيعي في قصر البشير) / كركوك													
6	تجهيز محولات الى قضاء الحويجة	كهرباء		250,000	30	1,689,000,000	1,689,000,000	2017-12-14			100%	100%	0%	انجاز العمل
7	إيصال الماء الى قرية الهندية الجديدة / ناحية الملتقى	ماء		20,000		55,600,000	55,600,000	تنفيذ امانة		15/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تاهيل وتبليط طريق كركوك الحويجة قرب مجسر خالد	طرق وجسور		75,000		63,200,000	63,200,000	تنفيذ امانة		24/12/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	تاهيل محطة ماء مزهر العاصي/ الحويجة	ماء		12,500		69,600,000	69,600,000	تنفيذ امانة		25/12/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			370,500		2,291,755,000	2,291,755,000							



إعادة تأهيل وتبليط طريق كركوك - الحويجة بالقرب من مجسر خالد



إعادة تأهيل محطة ماء مزهر العاصي / الحويجة



أعادة بناء مدرسة الشهيد الابتدائية / البشير / كركوك



تاهيل شبكة ماء قرية الهندية الجديدة / الملتقى / كركوك



4000 Ben

إعادة تأهيل وصب شوارع في قرية البشير / كركوك



5,200 Ben

إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في قرية الملا عبد الله / كركوك

مشاريع محافظة ديالى

Diyala Governorate Projects



مشاريع محافظة ديالى للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017


ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)+المدة الإضافية	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة امر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة المامون / 12 صف/ العظيم/الخالص/ديالى	التربية	34.273507 N 44. 542155E	720	107+180	752,704,000	745,105,400	2017-07-23	2017-09-26		100%	100%	0%	انجاز العمل
2	مدرسة الهديل / 9 صف/الصدور/المقدادية/ديالى	التربية	34 03 44.1N 44 59 00.6E	600	168+63	461,667,000	505,058,200	2017-07-25	2017-09-24	2019-02-18	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	مدرسة ابن زيدون	التربية	34 01 30N 44 57 32.1E	600	160	775,658,000	775,658,000				0%	0%	0%	تم فسخ العقد رضائياً مع المقاول
4	تبليط شارع من جسر محمود العلي الى جسر سراجق دلي عباس بطول (6 كم)	الطرق	34 01 41.7N 44 45 17.4E	2,200	120	449,000,000	449,000,000	2017-11-12	2017-11-29	2018-04-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تبليط واكساء شوارع في منطقة الشرقية والغربية في ناحية سد العظيم (تبليط شوارع داخل حدود البلدية ناحية سد/العظيم)	الطرق		3800	60	390,420,000	390,420,000	2017-11-13	2017-12-25	13/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	صب شوارع حي الاسراء في السعدية	الطرق	34 11 18.24N 45 07 08.5E	2,500	45	116,040,000	116,040,000	2017-11-13	2017-12-04	17/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	تبليط طرق في المقدادية بطول (5 كم)	الطرق		10,000	60	348,860,000	348,860,000	2017-11-13	2017-12-13	28/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تأهيل الشارع العام لمدينة جلولاء الرئيسي	الطرق	34 15 41.59N 45 9 29.47E	200000	90	259,563,500	259,563,500	2017-11-13	2018-01-02	20/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	فرش خابط بطول (12 كم) من جسر شافراق - قرية العباسية الى قرية العالي وزحام الاسيود	الطرق		2000	90	168,750,000	168,750,000	2017-11-07	2017-11-19	2018-08-02	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تبليط شوارع داخل حدود البلدية /بلدية المنصورية بطول 1650 م	الطرق		8000	40	375,373,250	375,373,250	2017-11-22	2017-12-06	25/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تبليط شوارع في قرى شيروين بطول 6,5 كم / المنصورية شيروين/ ديالى	الطرق	34 04 13 N 44 88 08E	10000	12+180	559,485,000	559,484,000	2017-11-13	2017-11-19	24/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	تأهيل الشارع رقم 21 المار ضمن م311 و 313 بطول 1,4 كم للمقطع ما بين المستوصف الصحي واستدارة الدور الجاهزة في حي التحرير/بعقوبة/ديالى	الطرق	46 82 27.411E 37 32 93 2.28N	4500	100	195,720,000	195,720,000	2018-05-06	20/6/2018	2019-02-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
13	مشروع تأهيل شبكة انارة شوارع ناحية كنعان- بعقوبة/ديالى	الكهرباء			45	111,220,000	111,220,000	2018-07-06	21/6/2018	29/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
14	مشروع صيانة واكساء وتبليط طرق وقرى بلد روز- قرية عتبه بطول 7,5 كم - قرية اطعيمات 1,5 قضاء بلدروز/ديالى	الطرق	33 40 39.7N 45 01 36.3E	8000	120	921,260,000	921,260,000	20/6/2018	2018-04-07	31/10/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
15	مشروع تبليط شارع ام العظام العثمانية بطول 2,15 كم قضاء بعقوبة/ديالى	الطرق	33 39 19N 44 44 37 35.7E	1000	75	227,020,000	227,020,000	25/6/2018	19/7/2018	2018-03-10	100%	100%	0%	انجاز العمل
16	مشروع تبليط شوارع بطول 1,8 كم لقرى خان بني سعد - بعقوبة (ربيع عطشانة وعلي الهادي والشيماء)/ديالى	الطرق	33 56 6 87N 44 44 54 89 57E	2500	30	185,040,000	185,040,000	25/6/2018	19/7/2018	2018-09-08	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			256420		6,297,780,750	6,333,572,350							

مشاريع محافظة ديالى للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تاهيل مجمع ماء سويد وزحام والعالى وبسعة 200م ³ / ساعة/المقدادية/ ديالى	ماء	34 03 46 N 44 58 35 E	13,500	60	385,400,000	385,400,000	2017-07-20	2017-08-27	26/10/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	تاهيل مجمع ماء نوفل والصدور والهارونية سعة 200 م ³ / ساعة / المقدادية /ديالى	ماء	34 02 79.1N 44 58 54.3E											
3	تجهيز ونصب محطة تحلية بطاقة 200م ³ / ساعة قرية حد مزيد/ بعقوبة/ديالى	ماء	33 48 06 N 44 44 09 E											
4	تاهيل شارع السوق في ناحية السعدية/ديالى	البلديات	30 11 23.01N 45 07 13.63E	35,000	35	106,750,000	106,750,000	2017-07-31	2017-09-14	18/10/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			48,500		492,150,000	492,150,000							



تبليط شوارع / قرية علي الهادي / خان بني سعد / ديالى

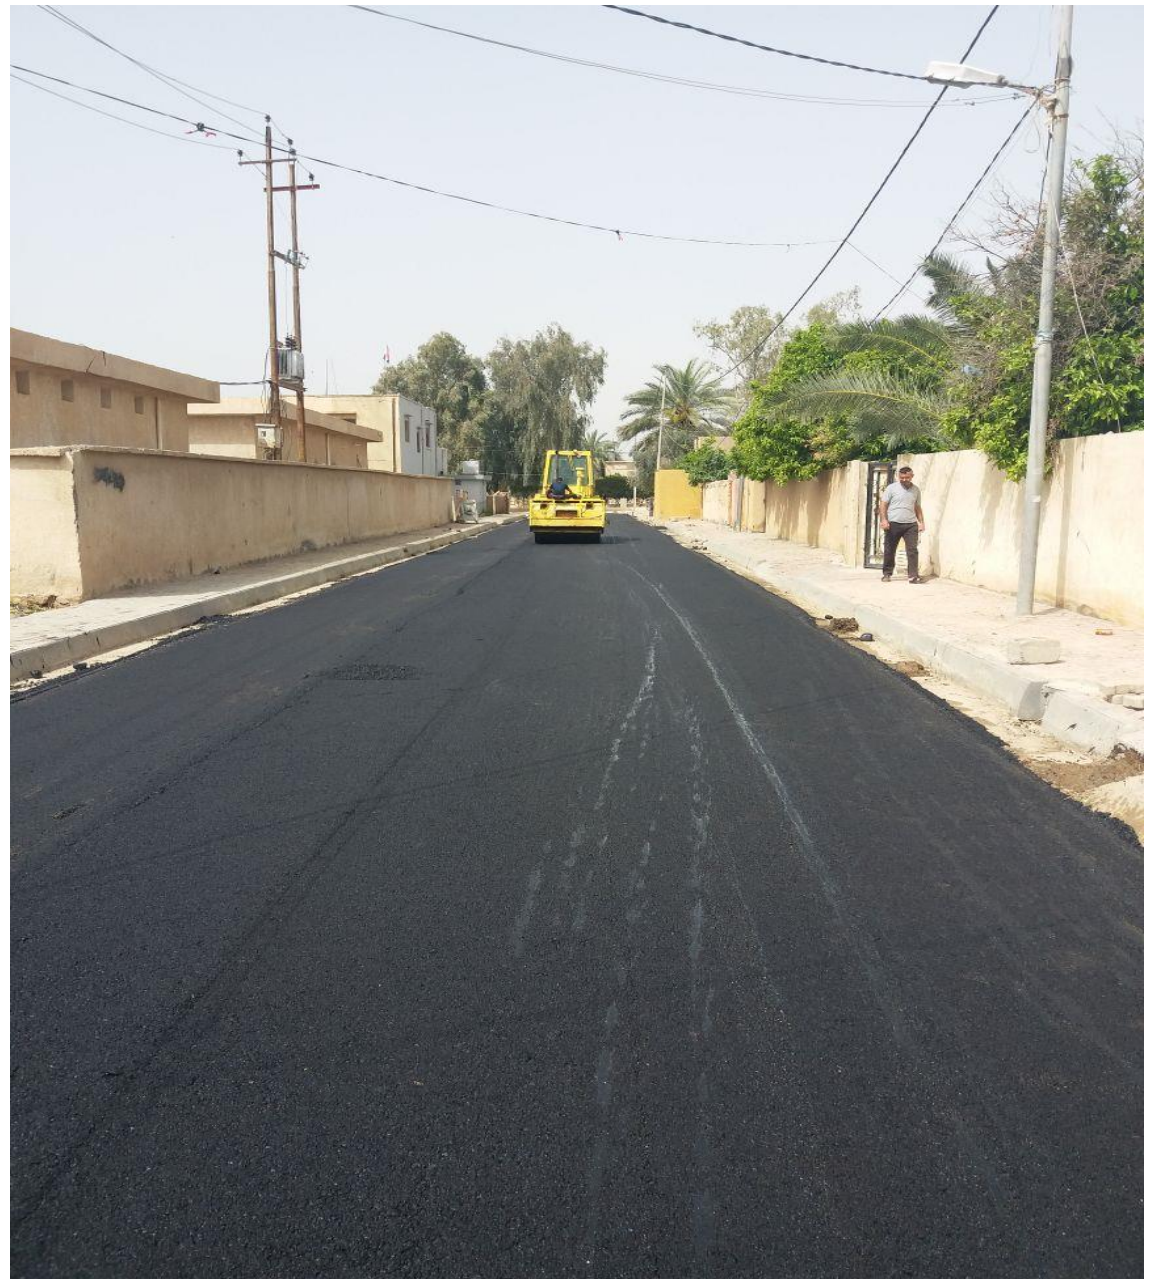

تبليط الشوارع وعمل أرصفة داخل الحدود البلدية بطول (1650 م) / المنصورية / ديالى





تأهيل وتبليط شارع السوق / السعدية / ديالى





مشاريع محافظة بابل / شمال بابل للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017														
ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تجهيز وفحص وتنفيذ خطوط جهد (11 كي.في) في قطاع المسيب / بابل كهرباء			11,568	150	819,788,000	819,788,000	21-11-2017	26/11/2018		0%	0%	0%	تم فسخ العقد رضائياً مع المقاول
	المجموع					819,788,000	819,788,000							
مشاريع محافظة بابل / شمال بابل للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017														
ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	صيانة طريق الحامية - صنيديج بطول 3,5 كم/جرف النصر/شمال بابل	طرق وجسور	43 22 34 X 36 27 763 Y	12,500	40	287,125,000	287,125,000	13-08-2017	13-08-2017	09-05-2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	مد واستبدال شبكة ماء متفرقة في حي المواطنين والحي العسكري/جرف النصر/شمال بابل	ماء	32 46 32.1N 44 15 48.3E	18,000	50	298,620,000	298,620,000	13-08-2017	14-08-2017	10-04-2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	مد واستبدال شبكة ماء الحامية/جرف النصر/شمال بابل	ماء	32 48 28.4 N 44 15 53.9 E											
4	مد واستبدال شبكة ماء القاطع الشمالي 1 (الفاضلية 1)/جرف النصر /شمال بابل	ماء	33 00 53.5N 44 09 56.1 E											
5	مد واستبدال شبكة ماء القاطع الشمالي 2 (الفاضلية 2)/جرف النصر/شمال بابل	ماء	33 00 49.6N 44 08 36 E											
6	صيانة طريق الخضر بمحاذاة نهر الفرات بطول 18 كيلو	طرق وجسور	43 46 70X 36 33 44 6Y	15,000	60	558,539,520	558,560,000	16-11-2017	19-11-2017	18/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			45,500		1,144,284,520	1,144,305,000							



استبدال شبكة الماء / شمال بابل



إعادة تاهيل الطريق (الحامية - صنديج) / جرف النصر / بابل



تاهيل طريق الخضر على طول نهر الفرات لمسافة 18 كم

محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

Baghdad Governorate Projects

الانبار



واسط



مشاريع محافظة بغداد/ حزام بغداد للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة حافظ ابراهيم الابتدائية 6 صف/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 195 557N 43 968 712E	360	59+70	349,240,000	380,255,000	23-07-2017	11-09-2017	24/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	مدرسة المسجد الأقصى الابتدائية 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 213 317N 43 892 967 E	600	170124+170	479,647,000	513,436,400	26-07-2017	11-09-2017	08-05-2018	100%	100%	87%	انجاز العمل
3	مدرسة ابراهيم طوقان الابتدائية 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 209 976N 43 930 087E	600	51+175	400,366,000	440,344,000	30-07-2017	11-09-2017	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة عز الدين القسام الابتدائية 18 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 216 750 N 43 879 541 E	900	105+200	827,057,000	815,204,000	30-07-2017	11-09-2017	17/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	مدرسة أسماء بنت أبو بكر 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 216 750 N 43 879 541 E	600	111+180	398,228,000	437,960,200	30-07-2017	11-09-2017	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	مدرسة الزخرف 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 219 497 N 43 911 557E	600	126+190	1,024,768,500	1,073,136,960	02-08-2017	11-09-2017	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	مدرسة الخوارزمي الابتدائية 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 394 093N 44 037 368E	600	124+180	425,137,000	466,368,600	03-08-2017	11-09-2017	15/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تاهيل ناظم صدر ابو غريب والناظم القاطع في كيلو (8) من القناة الموحدة والمنشآت الاخرى.	الموارد المائية		2,000,000	100+120	830,278,500	899,346,750	07-11-2017	20-11-2017	14/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			2,004,260		4,734,722,000	5,026,051,910							

مشاريع محافظة بغداد/ حزام بغداد للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تجهيز وتنفيذ ونصب شبكات كهرباء في ناحية النصر والسلام/ أبو غريب/حزام	كهرباء		2000	50	438,843,370	13-08-2017	24-08-2017	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	تاهيل شبكات كهرباء (تجهيز محولات) أبو غريب/حزام بغداد	كهرباء		15000	15	255,600,000	18-10-2017	قيد التنفيذ	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	انشاء جسر عودة الشكر في الرفوش	الطرق والجسور		25000	30	88,225,000		تنفيذ امانة	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	تاهيل محطات ماء (السعدان, الهيتاويين, فزع شنيتير)	ماء		10,000		284,350,000		تنفيذ امانة	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تطوير موقع الصندوق	دوائر حكومية				100,000,000		20-11-2017	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			52000		1,167,018,370							



جسر عودة الشكر / حزام أبو غريب / بغداد



إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرى أبو غريب / حزام بغداد





(إعادة تأهيل محطة ماء السعدان / أبو غريب / حزام بغداد)



(إعادة تأهيل محطة ماء الهيتاويين / أبو غريب / حزام بغداد)

**مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية
حسب المحافظات لعام 2018**

مشاريع محافظة نينوى



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / نينوى


ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	اعادة تاهيل مستشفى تلعفر العام	تلعفر	الصحة	منجز	100%	12	13/11/2018	180	2018/11/27	1,038,672,000
2	صيانة واعادة تاهيل القنطرة الصندوقية السداسية الواقعة على طريق موصل بغداد في المحطة (32+000) على وادي القصب ولممري الذهاب والاياب بطول 65م	القيارة	الطرق والجسور	منجز	100%	16	18/11/2018	180	2018/11/27	830,406,000
3	اعادة اعمار بناية المركز الطلابي و وحدة الرياضة الجامعية في الكلية التقنية	الموصل	التعليم العالي	منجز	100%	140	31/12/2018	200	2019/01/14	553,100,000
4	ترميم بناية المجمع الاذاعي والتلفزيوني / الفيصلية	الموصل	شبكة الاعلام العراقي	منجز	100%	28	29/11/2018	150	2018/12/03	589,560,000
5	اعادة تاهيل سقائف لمخزن المواد الغذائية الكرامة (1)	الموصل	التجارة	منجز	100%	35	4/12/2018	240	2018/12/18	2,254,676,800
6	تاهيل ابنية الاقسام الداخلية - مجمع القادسية / جامعة الموصل	الموصل	التعليم العالي	منجز	100%	111	19/12/2018	220	2019/01/02	509,927,000
7	تاهيل وصيانة جسر الحضر والاجزاء المتضررة في الطريق الرابط بين طريق (موصل - بغداد) والمنطقة الاثرية في الحضر (المرحلة الاولى)	الحضر	الطرق والجسور	منجز	100%	99	18/12/2018	240	1/1/2019	1,501,358,000
8	اعادة تاهيل المشروع الوطني لمديرية المرور في الشلالات / المرحلة الاولى	الموصل	الداخلية	قيد التنفيذ	50%	132	30/12/2018	550	2019/01/10	1,961,520,000
9	تاهيل بناية كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل	الموصل	التعليم العالي	قيد التنفيذ	94%	41	4/12/2018	200	2018/12/18	1,537,540,000
10	هدم واعادة بناء ثانوية تل واعي للبنين 12 صف	حمام العليل	التربية	منجز	100%	44	5/12/2018	240	2018/12/13	579,291,200
11	هدم واعادة بناء ثانوية ففيل 12 صف	تلكيف	التربية	منجز	100%	51	5/12/2018	240	2018/12/13	579,291,200
12	هدم واعادة بناء متوسطة علي بن ابي طالب للبنين 12 صف	الأيمن	التربية	منجز	100%	45	5/12/2018	240	2018/12/13	579,291,200

579,291,200	2018-12-16	240	4/12/2018	36	100%	منجز	التربية	الايسر	هدم واعادة بناء متوسطة المسعودي 12 صف	13
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	76	100%	منجز	التربية	تلعفر	هدم واعادة بناء مدرسة كركافر 12 صف	14
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	75	100%	منجز	التربية	الأيمن	هدم واعادة بناء مدرسة العامل للبنين 12 صف	15
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	74	100%	منجز	التربية	الأيمن	هدم واعادة بناء مدرسة الحدباء للبنين 12 صف	16
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	73	100%	منجز	التربية	الايسر	هدم واعادة بناء مدرسة العطاء للبنات 12 صف	17
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	88	100%	منجز	التربية	الأيمن	هدم واعادة بناء مدرسة القدس الابتدائية للبنين 12 صف	18
511,028,000	2018-12-27	220	26/12/2018	126	100%	منجز	التربية	الايسر	هدم واعادة بناء مدرسة ابن رشد للبنين 12 صف	19
2,775,071,200	2019-01-23	450	26/12/2018	125	88%	قيد التنفيذ	التجارة	الموصل	تاهيل مجمع مخازن الحرية وتاهيل مباني الشركة العامة لتصنيع الحبوب	20
1,530,000,000	2018-10-23	45	23/10/2018	8	100%	منجز	الكهرباء		تجهيز محولات قدرة 16 MVA لمحطات جهد 33/11 كف ومحولات توزيع جهد 0,4 / 11 كف	21
177,500,000		45	23/10/2018	7	100%	منجز			تجهيز محولات توزيع سعة KVA250	22
2,988,297,000	2019-01-12	360	30/12/2018	135	98%	قيد التنفيذ	الكهرباء	الموصل	تاهيل محطة كهرباء النسيج في الساحل الايمن	23
3,381,299,000	2018-12-17	360	4/12/2018	39	99%	قيد التنفيذ	الكهرباء	الموصل	تاهيل محطة كهرباء الدواسه في الساحل الايمن	24
3,281,763,000	2018-12-17	360	4/12/2018	38	97%	قيد التنفيذ	الكهرباء	الموصل	تاهيل محطة كهرباء باب البيض في الساحل الايمن	25
382,221,000	2018-11-27	100	30/12/2018	134	100%	منجز	الكهرباء	الأيمن	المعدات المطلوبة لورشة فحص وتصليح المحولات في الجانب الايمن	26
188,480,000	2018-06-19	60	5/6/2018	2	100%	منجز	البلديات	سنجار	صب ارسفة وبناء القوالب الجانبية للشارع الرئيسي في حي النصر وبربوش وصيانة الحفر والتخسفات في مناطق متفرقة / مركز قضاء سنجار	27
30,864,723,800									المجموع	

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / نينوى


ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تجهيز جهاز التصوير المقطعي عدد 2	الموصل	الصحة	منجز	100%	104	180	2019-01-02		1,700,000,000
2	تجهيز جهاز الرنين المغناطيسي عدد 2	الموصل	الصحة	منجز	100%	105	180	2019-01-02		2,560,000,000
3	تجهيز جهاز كرسي أسنان متكامل عدد(50)	عدة اقضية	الصحة	منجز	100%	110	180	2019-01-02		964,375,000
4	إعادة تأهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق حي الخضراء	الموصل	المجاري	منجز	100%	72	160	27/12/2018	2018-12-27	336,068,750
5	تاهيل المجرى الصندوقي في باب البيض	الموصل	الماء والمجاري	تنفيذ امانة / منجز	100%	تنفيذ امانة	60		2019-01-26	122,870,000
6	تاهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق اليرموك	الموصل	المجاري	منجز	100%	71	150	27/12/2018	2019-01-02	422,670,000
7	تاهيل بناية مخازن مديريةية المجاري مع انشاء مسقفات عدد/3 في وادي عكاب	الموصل	المجاري	منجز	100%	42	180	18/12/2018	2018-12-18	597,820,000
8	تاهيل بناية الهيئة العامة للضرائب في محافظة نينوى/ الجانب الايمن (عمارة التامين على الحياة)	الموصل	الادارة المحلية	تنفيذ امانة / الغي - مؤجل للعام القادم		تنفيذ امانة	60			197,495,000
9	تاهيل مخازن مركز تكنولوجيا البذور/ موقع الموصل	الموصل	العلوم والتكنولوجيا	تنفيذ امانة / منجز	100%	تنفيذ امانة	60		2019-01-03	221,525,000
10	اعادة تأهيل قسم بحوث نينوى		الزراعة	منجز	100%	47	100	19/12/2018	2018-12-19	232,313,000
11	إعادة اعمار بناية المعهد التقني نينوى		التعليم العالي	منجز	100%	13	180	27/11/2018	2018-11-26	747,647,600
12	اعادة اعمار بناية المختبرات العلمية في الكلية التقنية الزراعية / الموصل		التعليم العالي	منجز	100%	13				


322,399,200	2018-12-27	27/12/2018	150	87	100%	قيد التنفيذ	التربية	الموصل	تاهيل ابنية مدرسية في الموصل / الجانب الأيمن (البتول والمواهب)	13
574,228,000	2019-01-03	5/1/2019	180	114	100%	منجز	رئاسة الوزراء		تاهيل بناية مديرية المخابرات في نينوى	14
356,390,600	2019-01-10	2/1/2019	120	101	100%	منجز	الداخلية		إعادة تاهيل مراكز شرطة (اليرموك , الوقاص , النصر) المرحلة الثانية	15
				101	100%	منجز	الداخلية		تاهيل بناية الغرامات والحاسبة لمرور نينوى	16
471,636,000	2018-12-30	30/12/2018	180	90	88%	قيد التنفيذ	دوائر حكومية		أعادة بناء بناية مديرية مختبر نينوى الانشائي	17
598,800,000	2018-12-27	27/12/2018	180	89	100%	قيد التنفيذ	الطرق والجسور	تلعفر	صيانة و تاهيل جسر وادي المر على طريق (كسك - ربيعة)	18
370,080,000	2018-12-27	27/12/2018	100	83	100%	منجز	الطرق والجسور	تلعفر	تاهيل طرق ناحية العياضية	19
1,418,500,000	2018-12-23	من تاريخ استلام الدفعة المقدمة	45	117	100%	منجز	الكهرباء		تجهيز محولات كهربائية (تجهيز محولات سعة 400,250 kva عدد 185) محولة لمخزن الكرامة)	20
118,654,000	2019-01-03	3/1/2019	60	تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امانة / منجز	التربية	سنجار	تاهيل ابنية مدرسية في قضاء سنجان (مدرسة كوجو)	21
120,238,000	2019-01-21	18/11/2018	60	تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امانة / منجز	التربية	تلعفر	تاهيل ابنية مدرسية في قضاء تلعفر مدرسة (اميرة الجنة و المنتظر و الجزيرة)	22
12,453,710,150									المجموع	

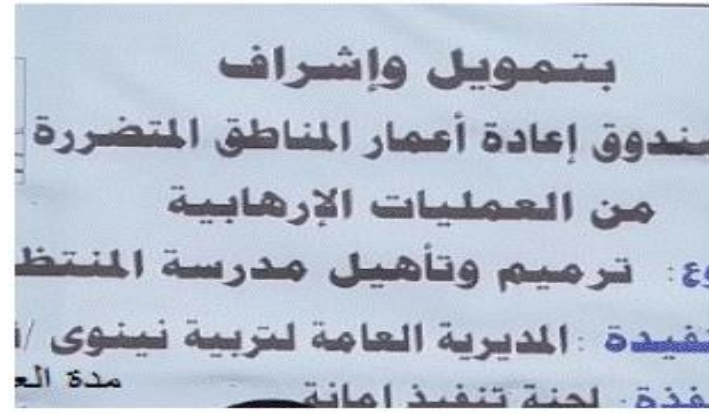

تأهيل الأبنية المدرسية لـ (مدرسة اميرة الجنة - الجزيرة -المنتظر)

قام صندوق إعادة اعمار
المناطق المتضررة من
العمليات الإرهابية بإعادة
اعمار مشروع تأهيل الأبنية
المدرسية وهو ضمن خطة
مشاريع عام 2018 مدة
العمل مشروع 75 يوم وقد
تم إنجاز العمل 100%
وحسب التوقيتات
الموضوعة في العقد

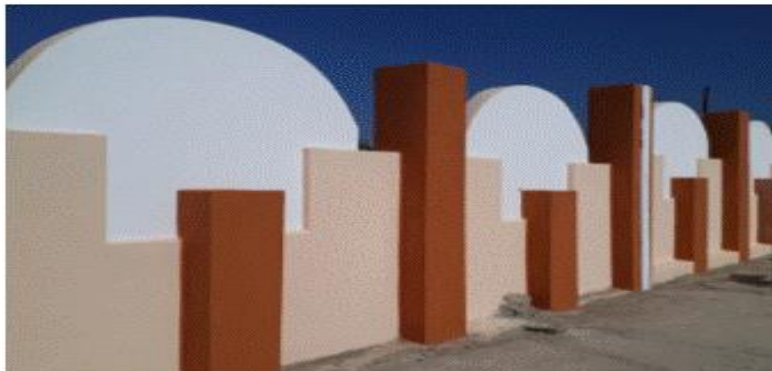

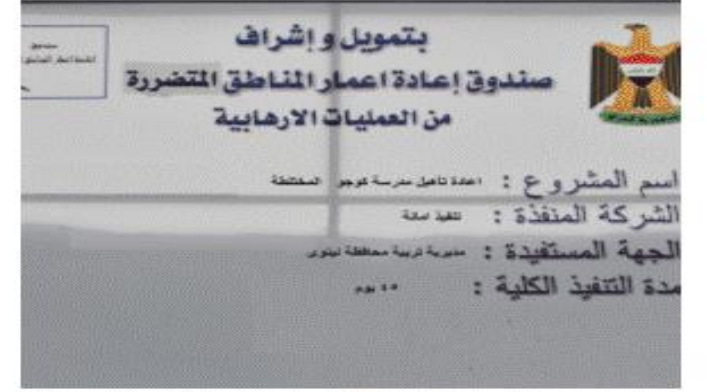

تأهيل مدرسة كوجو في قضاء سنجار

قام صندوق إعادة اعمار
المناطق المتضررة من
العمليات الإرهابية بإعادة
اعمار مشروع تأهيل
مدرسة كوجو وهو ضمن
خطة مشاريع عام 2018
مدة العمل مشروع 60 يوم
مستمر حالياً علماً ان نسبة
الإنجاز الفعلي 100%





إعادة تأهيل مراكز الشرطة وأبنية مرور نينوى

قام صندوق إعادة اعمار
المناطق المتضررة من
العمليات الإرهابية بإعادة
اعمار مشروع إعادة تأهيل
مراكز الشرطة وأبنية مرور
نينوى وهو ضمن خطة
مشاريع عام 2018 مدة
العمل مشروع 120 يوم
ومستمر به العمل حالياً
علماً ان نسبة الإنجاز
الفعلي 100%



تأهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق اليرموك

قام صندوق إعادة اعمار
المناطق المتضررة من
العمليات الإرهابية بإعادة
اعمار مشروع معالجة
المياه الثقيلة لشقق
الخضراء وهو ضمن خطة
مشاريع عام 2018 مدة
العمل مشروع 150 يوم
ومستمر به العمل حالياً
علماً ان نسبة الإنجاز
الفعلي 100%

مشروع محافظة الانبار

الانبار



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	هدم واعادة بناء مركز صحي ودار سكن البوزعيان	الخالدية	الصحة	منجز	100%	124	26/12/2018	200	8/1/2019	1,150,824,000
2	هدم واعادة بناء مركز صحي المضيق	الخالدية	الصحة	منجز	100%	124				
3	هدم واعادة بناء مركز صحي في البوبالي مع دار سكن	الخالدية	الصحة	منجز	100%	124				
4	هدم واعادة بناء جنسية راوه	راوه	الداخلية	منجز	100%	136	30/12/2018	180	12/1/2019	907,329,600
5	هدم واعادة بناء جنسية عنه	عنه	الداخلية	منجز	100%	136		180		
6	هدم واعادة بناء البطاقة الوطنية في القائم	القائم	الداخلية	منجز	100%	138	30/12/2018	150	13/1/2019	579,545,000
7	تاهيل دائرة البطاقة الوطنية في العبيدي		الداخلية	منجز	100%	138		150		
8	اعادة اعمار جسر وادي الفحيمي الاول	عنه	الطرق والجسور	منجز	100%	130	27/12/2018	180	7/1/2019	633,920,000
9	اعادة اعمار جسر وادي زغيدان	حديثه	الطرق والجسور	منجز	100%	122	26/12/2018	180	7/1/2019	467,200,000
10	اعادة اعمار جسر البغدادي العائم بطول 420متر		الطرق والجسور	منجز	100%	131	30/12/2018	360	12/1/2019	1,301,888,000
	المجموع									5,040,706,600

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	صيانة مجمع ماء البوسودة سعة (200م3/سا)	الخالدية	الماء والمجاري	منجز	100%	19	22/11/2018	90	16/12/2018	560,392,000
2	تجهيز ونصب وحدة مجمعة تقوية سعة 200م3/ساعة حي القدس والشهداء	الخالدية	الماء والمجاري	منجز	100%	19				
3	تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 100م3/ساعة (النساف/البوعلون /البوراشد)	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56	6/12/2018	120	20/12/2018	1,003,847,500
4	تأهيل مجمع ماء الاسباتي / الشهداء النعيمية	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56				
5	تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 200م3/ساعة لمناطق الصبيحات	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56				
6	صيانة وتأهيل مجمع ماء بني زيد سعة (200م3/س)	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56				
7	تاهيل مجمع ماء سويحل و النهضة الشرقية/ القائم	القائم	الماء والمجاري	منجز	100%	50	5/12/2018	55	2/1/2019	130,640,000
8	صيانة مجمع ماء الصروح سعة 300 م3/ساعة	هيت	الماء والمجاري	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	19/12/2018	125,670,000
9	تجهيز ونصب وحدة تقوية سعة مليون غالون لمجمع ماء الخسفة	حديثة	الماء والمجاري	منجز	100%	52	5/12/2018	90	3/1/2019	699,079,000
10	تاهيل مشروع ماء حديثة - حقلانية الموحد	حديثة	الماء والمجاري	منجز	100%	52				
11	تاهيل مجمع ماء حي الشرطة لناحية بروانة	حديثة	الماء والمجاري	منجز	100%	52				
12	صيانة مشروع ماء الجزيرة في الرمادي	الرمادي	الماء والمجاري	منجز	100%	62	11/12/2018	150	24/12/2018	743,927,500
13	مد شبكة ماء في الاحياء الجنوبية لمدينة الفلوجة	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	29	29/11/2018	80		560,939,200
14	تنفيذ خط دكتايل من ناقل الخزان الى الحي العسكري	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	29			24/12/2018	
15	مد شبكة ماء في حي الجمهورية وحي الشهداء	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	29				
16	أنشاء خزان كونكريتي سعة (750) م3 في قضاء الرطبة	الرطبة	الماء والمجاري	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	14/12/2018	197,212,000
17	تاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء حديثة	حديثة	الكهرباء	منجز	100%	100	18/12/2018	180	5/1/2019	529,287,500
18	تاهيل الشبكة الكهربائية في ناحية حصيبة الشرقية / قضاء الخالدية	الخالدية	الكهرباء	منجز	100%	30	29/11/2018	150	23/12/2018	202,198,000
19	تاهيل الشبكة الكهربائية في زوية غراب	الخالدية	الكهرباء	منجز	100%	30				
20	تاهيل الشبكات الكهربائية في قضاء الرطبة	الرطبة	الكهرباء	منجز	100%			60	26/12/2018	248,715,000

794,233,500	17/12/2018	120	5/12/2018	46	100%	منجز	الكهرباء	الكرمة	تاهيل الشبكة الكهربائية الهوائية المتضررة في قضاء الكرمة	21
22,000,000					100%	شراء مباشر / منجز	الكهرباء	القائم	تجهيز مولد كهرباء / قائمية القائم	22
28,000,000					100%	شراء مباشر / منجز	الكهرباء	القائم	تجهيز مولد كهرباء / تربية القائم	23
407,976,000	11/12/2018	150	2/12/2018	33	100%	منجز	الطرق والجسور	البغدادي	اعادة اعمار جسر البغدادي الخرساني على طريق رمادي-حديثة	24
202,400,000	20/12/2018	90	11/12/2018	61	100%	منجز	الطرق والجسور	الفلوجة	أعادة أعمار جسر الجعفي فوق سكة القطار/ الفلوجة	25
607,416,000	9/12/2018	120	27/11/2018	25	100%	منجز	التجارة	الرمادي	ترميم وصيانة مخازن عدد 6/ في سايلو الرمادي	26
573,888,800	2/1/2019	180	20/12/2018	112	100%	منجز	التربية والتعليم	الرمادي	هدم واعادة بناء مدرسة الداء/12 صف	27
552,765,000	28/12/2018	160	16/12/2018	91	100%	منجز	التربية والتعليم	عنه	تاهيل الورش لاعدادية صناعة عنة	28
581,613,500	16/12/2018	180	4/12/2018	40	100%	منجز	التربية والتعليم	الكرمة	هدم واعادة بناء مدرسة الفداء /12 صف	29
1,190,436,000	10/1/2019	180	20/12/2018	113	100%	منجز	التربية والتعليم	راوه	هدم وإعادة بناء مدرسة المواهب للبنين 12 صف	30
				113	100%	منجز	التربية والتعليم	راوه	هدم وإعادة بناء مدرسة ذو الجادين للبنين 12 صف	31
1,190,436,000	2/1/2019	180	19/12/2018	109	100%	منجز	التربية والتعليم	القائم	هدم وإعادة بناء مدرسة شط العرب للبنين 12 صف	32
				109	100%	منجز	التربية والتعليم	القائم	هدم وإعادة بناء مدرسة النهضة الشرقية للبنين 12 صف	33
694,910,500	27/12/2018	90	13/12/2018	69	100%	منجز	التربية والتعليم	الفلوجة	تاهيل الشقق السكنية للتدريسيين في جامعة الفلوجة	34
				69	100%	منجز	التربية والتعليم	الرمادي	تاهيل قسم السدود والكهرباء جامعة الانبار	35
447,038,400	3/1/2019	180	11/12/2018	66	100%	منجز	التربية والتعليم	الصقلاوية	هدم و اعادة بناء بناية العمادة/ المعهد التقني في الصقلاوية	36
858,323,200	27/12/2018	180	13/12/2018	85	100%	منجز	الداخلية	الرمادي	هدم وإعادة بناء مديرية شرطة الرمادي	37
691,500,000	30/1/2019	45	23/12/2018	116	100%	منجز	الكهرباء		تجهيز محولات كهرباء	38
91,690,000	26/12/2018	60			100%	منجز	الصحة	القائم	ترميم بناية الردهة المشتركة في مستشفى القائم العام	39
142,770,000	23/12/2018	60			100%	منجز	الكهرباء	راوه	تاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء راوة مع تاهيل بناية كهرباء راوه	40
		60			100%	منجز	الكهرباء	هيت	تاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء هيت	41
14,079,304,600			104						المجموع	

مشاريع محافظة صلاح الدين



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / صلاح الدين

ت	اسم المشروع	التاحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	إعادة تاهيل جسر الشرفاط الكونكريتي ومقترباته في محافظة صلاح الدين	الشرفاط	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	96%	17	21/11/2018	360	2018-12-12	3,948,780,000
2	هدم وإعادة بناء مدرسة العلياء الابتدائية للبنات 12 صف	بلد	التربية	منجز	100%	54	5/12/2018	180	2019-01-15	610,965,000
3	هدم وإعادة بناء ثانوية جمال عبدالناصر 12 صف	بلد	التربية	منجز	100%	43	4/12/2018	180	2019-01-15	528,360,000
4	هدم وإعادة بناء مدرسة المحزم الابتدائية للبنين 12 صف	تكريت	التربية	منجز	100%	67	12/12/2018	180	2018-12-25	607,200,000
5	هدم وإعادة بناء ثانوية الأريج للبنات 12 صف	بيجي	التربية	منجز	100%	37	4/12/2018	180	2019-01-20	573,400,000
6	إعادة تاهيل جسر البوجواري ورفع انقاض جسر سكة القطار المتضرر في قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين	بيجي	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	95%	20	22/11/2018	150	2018-12-08	579,632,000
7	هدم وإعادة بناء ثانوية بيجي للبنات 18 صف	بيجي	التربية	منجز	100%	80	13/12/2018	180	2019-01-20	980,658,750
8	هدم وإعادة بناء ثانوية الخضراء للبنين 18 صف	يثرب	التربية	منجز	100%	64	11/12/2018	180	2019-01-14	980,788,500
	المجموع									8,809,784,250

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / صلاح الدين

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	توسعة مركز صحي في الساحل الأيسر/ قضاء الشرفا	الشرفا	الصحة	منجز	100%	55	5/12/2018	150	2018-12-18	284,192,000
2	هدم و إعادة بناء مديرية بلدية سليمان بيك	سليمان بيك	البلدية	منجز	100%	103	19/12/2018	120	2019-01-02	467,699,000
3	أكساء شوارع متفرقة في قضاء سامراء	سامراء	البلدية	منجز	100%	49	5/12/2018	120	2018-12-23	548,060,000
4	هدم و إعادة بناء مديرية بلدية يثرب	يثرب	البلدية	منجز	100%	65	11/12/2018	160	2018-12-24	400,092,000
5	هدم و إعادة بناء مركز شرطة سليمان بيك	سليمان بيك	الداخلية	منجز	100%	58	11/12/2018	180	2018-12-27	563,272,900
6	هدم و إعادة بناء مديرية شرطة يثرب	يثرب	الداخلية	منجز	100%	34	2/12/2018	180	2018-12-20	834,784,000
7	هدم و إعادة بناء مركز شرطة المعتصم	المعتصم	الداخلية	منجز	100%	18	22/11/2018	180	2018-12-16	591,548,000
8	هدم و إعادة بناء مركز شرطة دجلة	دجلة	الداخلية	منجز	100%	23	27/11/2018	180	2018-12-24	589,857,500
9	إعادة تأهيل 4 جسور للمحطة (700+ +16) كم و المحطة (115+17) كم على طريق تكريت - بيجي	بيجي	الطرق والجسور	منجز	100%	77	13/12/2018	150	2018-12-26	457,400,000
10	تأهيل كهرباء محطات التوزيع الرئيسية / A - B جامعة تكريت	تكريت	الكهرباء	منجز	100%	106	19/12/2018	140	2019-01-03	1,017,611,200
	المجموع									5,754,516,600



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / كركوك

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	هدم وإعادة بناء مدرسة الاسكندرونة 12 صف في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	منجز	100%	15	18/11/2018	210	2018-11-19	557,435,000
2	تاهيل خطوط ابراج مغذي 33 كلف لتغذية محطة الرياض من محطة ملاعب الله	الحويجة	الكهرباء	منجز	100%	22	26/11/2018	160	2018-12-09	467,952,500
3	إعادة انشاء الجسر الكونكريتي على طريق (كركوك - تكريت)		الطرق والجسور	منجز	100%	21	26/11/2018	360	2018-12-06	1,249,294,000
4	صيانة جسور باي حسن		الطرق والجسور	منجز	100%	26	27/11/2018	180	2018-12-09	391,990,000
5	إعادة اعمار بنايات المعهد التقني - الحويجة (بناية العمادة, المركز الثقافي, ورش تدريب الطلاب)	الحويجة	التعليم العالي	قيد التنفيذ	85%	108	19/12/2018	150	2018-12-30	864,570,000
6	إعادة ترميم محكمة بداعة الرياض	الرياض	وزارة العدل	منجز	100%	115	23/12/2018	150	2019-01-03	362,528,000
7	إعادة انشاء بناية مركز شرطة الزاب	الزاب	الداخلية	قيد التنفيذ/ الانحراف بسبب 1- تلكو الشركة 2- تأخر صدور امر غيار	100%	121	23/12/2018	150	2019-05-19	380,882,400
8	إعادة تاهيل ثانوية الاوس في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	منجز / وجود ملاحظات الاستلام الاولي ستنتجز خلال 10 أيام	100%	84	13/12/2018	240	2018-12-27	401,301,000
9	تاهيل مشروع ماء تل علي القديم (400) م/3 ساعة - قضاء الحويجة	الحويجة	الماء	منجز	100%	92	16/12/2018	180	2018-12-30	706,112,001
10	إعادة اعمار محطات الدفع العالي لمشاريع ماء (غريب وشجرة) ناحية العباسي	العباسي	الماء	منجز	100%	98	18/12/2018	150	2018-12-30	264,000,000
11	هدم وإعادة بناء مدرسة البونجم 12 صف في دافوق	دافوق	التربية	قيد التنفيذ / سبب الانحراف 1- فحص تحريات التربة 2- الامطار 3- تلكو الشركة	64%	82	13/12/2018	300	2018-12-27	557,408,000
12	هدم وإعادة بناء مدرسة ام البنين في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	منجز	100%	96	17/12/2018	300	2018-12-31	557,410,000
13	هدم وإعادة بناء مدرسة البوبتير 6 صف في ناحية الملتقى	الملتقى	التربية	منجز	100%	95	17/12/2018	200	2018-12-31	325,332,000
14	هدم وإعادة بناء مدرسة المرة 6 صف في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	منجز	100%	95			2018-12-31	
15	صيانة الشوارع الرابط بين كيوان وناحية الملتقى	الملتقى	الطرق والجسور	منجز	100%	143	31/12/2018	60	10/1/2019	280,000,000
16	إعادة اكساء الطريق الرابط بين ناحية الرياض وقضاء الحويجة	الرياض	الطرق والجسور	منجز	100%	128	27/12/2018	60	2019-01-08	286,350,000
	المجموع									7,652,564,901

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / كركوك

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تبدیل رمل و حصی للفلاتر لمشروع ماء الحویجة الحدیث	الحویجة	الماء	منجز / تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امانة		60	27/12/2018	162,250,000
2	تاهیل مجمع ماء جدیدة السادة	الحویجة	الماء	منجز / تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امانة				
3	هدم واعادة بناء مركز الدفاع المدني فی قضاء الحویجة	الحویجة	الداخلية	قید التنفيذ / أسباب الاحراف 1- تأخر تحریات التربة 2- شدة الامطار 3- امر غیار 4- تلكو الشركة	89%	93	16/12/2018	180	30/12/2018	535,403,200
4	تجهیز مضخات لمحطات الماء فی المناطق المحررة/ الحویجة	الحویجة	الماء	منجز	100%	94	17/12/2018	50	31/12/2018	368,000,004
5	هدم واعادة بناء مركز شرطة الریاض	الریاض	الداخلية	منجز	100%	11	4/11/2018	180	18/11/2018	380,882,400
6	هدم واعادة بناء مركز شرطة الرشاد	الرشاد	الداخلية	منجز	100%	10	4/11/2018	180	16/12/2018	380,882,400
7	تجهیز مولدات لمشاریع الماء فی المناطق المحررة / كركوك		الماء	منجز	100%	142	31/12/2018	60	31/1/2019	748,500,000
8	هدم واعادة بناء بناية بلدية مجاری ناحية الریاض	الریاض	البلدية	متوقف / بسبب تلكو الشركة	83%	81	13/12/2018	150	26/12/2018	344,502,400
9	هدم واعادة بناء بناية بلدية مجاری ناحية الزاب	الحویجة	البلدية		83%	81	13/12/2018	150	26/12/2018	
10	تاهیل سایلو حبوب فی قضاء الحویجة	الحویجة	التجارة	منجز	100%	78	13/12/2018	183	26/12/2018	576,140,000
11	تاهیل سایلو حبوب فی ناحية الریاض	الریاض	التجارة	منجز	100%	78				
12	رفع الصبات الكونكریتية / سدة كركوك الحدیثة		الطرق والجسور	لم ینفذ / تم تحویله الى خطة عام 2019		تنفيذ امانة		25		70,800,000
	المجموع									3,567,360,404

مشاريع محافظة ديالى

Diyala Governorate Projects



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
1	تبليط واكساء شوارع متفرقة في مركز قضاء الخالص	الخالص	الطرق والجسور	منجز	100%	14	14/11/2018	90	21/11/2018	1,009,317,500
2	تجهيز مواد ومعدات لصيانة الشبكة الكهربائية في ناحية العظيم	العظيم	الكهرباء	منجز	100%	60	11/12/2018	60	28/1/2019	631,352,500
3	صيانة واكساء وتثبيت اكناف طريق الصدور - ناحية المنصورية بطول 13,500 كم		الطرق والجسور	منجز	100%	97	18/12/2018	120	2/1/2019	908,000,000
4	هدم واعادة بناء مدرسة شجرة اليبطين 12 صف في جلولاء	جلولاء	التربية	منجز	100%	123	26/12/2018	180	4/2/2019	540,411,500
5	اعادة تاهيل طريق قرية الجبل بطول 4كم في ناحية بهرز باعتبار المحطة (صفر+صفر) هي الشارع الرئيسي لطريق بعقوبة - النهروان	بعقوبة	الطرق والجسور	منجز	100%	119	23/12/2018	120	8/1/2019	404,240,000
6	اعادة تاهيل طرق (الزركانية - العوده - سفيط - دراويش) مع الطريق الفرعي لقرية الزركانية في الخالص من المحطة (صفر + صفر) سيطرة الجيش الى (100+3)	الخالص	الطرق والجسور	منجز	100%	120	23/12/2018	90	23/1/2019	308,040,000
7	صيانة واكساء الطريق الرابط لقرى الجبل الصاعد بطول 6كم من المحطة (صفر+صفر)الى (6+صفر) /ناحية بهرز	بهرز	الطرق والجسور	منجز	100%	139	31/12/2018	100	14/1/2019	518,640,000
8	إعادة تاهيل طريق التحويلة والقرى المحاذية لها		الطرق والجسور	منجز	100%	137	30/12/2018	120	13/1/2019	709,840,000
9	هدم واعدة بناء روضة اطفال السعدية النموذجية	السعدية	التربية	منجز	100%	133	30/12/2018	180	17/1/2019	426,670,000
10	صيانة واكساء وتبليط لقرى بلدروز (قرية عتبه 7.5 كم وقرية طعيمات 1.5 كم (مقاطعة 17	بلدروز	الطرق	منجز	100%	4	20/6/2018	120	3/7/2018	921,260,000
11	اكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية قره تبة و قصبته القديمة		الطرق	منجز	100%	9	28/10/2018	60	25/11/2018	320,000,000
12	تبليط شارع ام العظام العثمانية / بعقوبة بطول 2.15 كم	بعقوبة	الطرق	منجز	100%	5	25/6/2018	75	19/7/2018	227,020,000
13	تبليط شوارع بطول 11.8 كم لقرى خان بني سعد / بعقوبه / ربيع عطشاته / وعلي الهادي والشيماء	بعقوبة	الطرق	منجز	100%	6	25/6/2018	30	19/7/2018	185,040,000
14	تاهيل الشارع رقم 21 المار ضمن المحلة 311 و 313 بطول 1.4 كم للمقطع ما بين المستوصف الصحي القديم واستدارة دور الجاهزة في حي التحرير / بعقوبة	بعقوبة	الطرق	منجز	100%	1	5/6/2018	100	20/6/2018	195,720,000
15	تبليط الشارع الرئيسي داخل حدود بلدية السلام بطول 550 م	السلام	الطرق	منجز	100%	53	5/12/2018	75	13/1/2019	96,184,000
16	تاهيل انارة شوارع ناحية كنعان في ديالى	بعقوبة	الكهرباء	منجز	100%	3	7/6/2018	45	21/6/2018	111,220,000
	المجموع									7,512,955,500

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
1	تبليط طرق في قضاء بلدروز	بلدروز	البلدية	منجز	100%	129	27/12/2018	90	28/1/2019	448,757,500
2	اكساء الشوارع الرئيسية - هيهب		البلدية	منجز	100%	24	27/11/2018	90	27/12/2018	390,168,001
3	صيانة واكساء طريق جيزاني الجول-الخالص	الخالص	الطرق	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	24/12/2018	216,000,000
4	صيانة جسر بعقوبة الثالث		الطرق	منجز	100%	31	29/11/2018	90	11/12/2018	193,240,000
5	صيانة و اكساء مدخل قرية الزهيرات بطول 3 كم / ابو صيدا		الطرق	منجز	100%	48	5/12/2018	60	3/1/2019	257,600,000
6	صيانة واكساء و تثبيت اكتاف طريق قره تبة/ ناحية جبارة		الطرق	منجز	100%	32	2/12/2018	90	16/12/2018	692,320,014
7	تبليط طريق ناحية السلام		الطرق	منجز	100%	59	11/12/2018	120	9/1/2019	412,320,000
8	تجهيز مواد لتاهيل شبكة كهرباء احياء (الرمادية-الحرية-الجزيرة-النضال-ابو الدهن)	المقدادية	الكهرباء	منجز	100%					579,004,500
	أ- تجهيز قابلات واسلاك كهربائية / كهرباء المقدادية	المقدادية	الكهرباء	منجز	100%	107	19/12/2018	30	9/1/2019	87,796,000
	ب- تجهيز محولات كهرباء / كهرباء المقدادية	المقدادية	الكهرباء	منجز	100%	118	23/12/2018	45	21/1/2019	184,000,000
9	تبدال الخط الناقل المغذي من محطة تقوية ماء سيف سعد الى هيهب قطر 315 ملم	الخالص	الماء	تنفيذ امانة /منجز	100%			45	26/12/2018	167,800,000
10	تجهيز و نصب مجمع ماء الشاخرة في قضاء المقدادية	المقدادية	الماء	تنفيذ امانة /منجز	100%			60	30/12/2018	159,237,700
11	تاهيل مجمع ماء الشهيد غازي سعة 100 م3/ساعة مع تنفيذ خط ناقل سعة 250 ملم		الماء	منجز	100%	27	29/11/2018	120	9/12/2018	559,663,000
12	هدم و اعادة بناء مدرسة الرابطة (6) صف	خاتقين	التربية	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	26/12/2018	239,487,000
13	تجهيز مولدة لمستشفى جلولاء		الصحة	منجز	100%	141			31/1/2019	96,755,000
14	تبليط طريق كشكول الصغير و الكبير		الطرق	منجز	100%	86	13/12/2018	90	16/1/2019	386,900,000
15	هدم وإعادة بناء مدرسة ابن الهيثم 12 صف	الخالص	التربية	قيد التنفيذ	98%	79	13/12/2018	180		1,097,486,000
16	هدم وإعادة بناء مدرسة الاصاله 12 صف	الخالص	التربية	منجز	100%	79			4/2/2019	
17	تاهيل مجمع ماء السادة سعة 200م3/ساعة	بعقوبة	الماء	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	30/12/2018	221,429,100
18	هدم وإعادة بناء السياج الخارجي لمدرسة اعدادية مندلي	مندلي	التربية	تنفيذ امانة / منجز	100%			40	24/12/2018	75,125,000
	المجموع									6,465,088,815



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / شمال بابل												
ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	صيانة طريق مسيب - جرف النصر على اعتبار المحطة (صفر+صفر) تقاطع التحرير	جرف النصر	الطرق والجسور	2,860,369,360	انجز بتاريخ 8/8/2019	100%	68	12/12/2018	150	26/12/2018	27/12/2018	2,000,259,000
	المجموع			2,860,369,360								2,000,259,000

محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

Baghdad Governorate Projects

الانبار



واسط



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / حزام بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	هدم واعادة بناء مدرسة بن غازي الابتدائية 18 صف	الطارمية	التربية	1,207,253,080	منجز	100%	102	19/12/2018	240	2/1/2019	27/12/2018	840,178,000
2	هدم واعادة بناء مدرسة ابن النفيس الابتدائية 18 صف	المشاهدة	التربية	1,207,253,080	منجز	100%	127	26/12/2018	240	8/1/2019	8/1/2019	840,177,600
	المجموع			2,414,506,160								1,680,355,600

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تاهيل خط كهرباء (33 كي في) محطة الصمود/ مستودعات نطف المشاهدة	المشاهدة	الكهرباء	512,502,848	منجز	100%	57	9/12/2018	120	23/12/2018	507,471,500
2	ايرصال الماء الصافي الى قرية المزرفة في التاجي		الماء	99,800,000	تنفيذ اماتة / منجز	100%			25	21/10/2018	99,800,000
3	مجمع ماء الحركاوي الجنوبي سعة 200م3/س	اليوسفية	الماء	792,511,290	منجز	100%	70	13/12/2018	120	27/12/2018	718,103,100
4	تأهيل مجمع ماء عودة المفرجي سعة 200م3/س	اليوسفية	الماء		منجز	100%	70				
5	تأهيل مجمع ماء هور ابو فاضل سعة 200م3/س	اليوسفية	الماء		منجز	100%	70				
6	تبليط الشارع الرئيسي في حي الجزائر/ قضاء المحمودية	المحمودية	الطرق والجسور	230,270,000	تنفيذ اماتة / منجز	100%			45	24/12/2018	205,980,000
7	تاهيل خطوط تغذية الشبكة الكهربائية لمناطق الزيدان دوليية/ قضاء ابو غريب		الكهرباء	561,344,763	منجز	100%	63	11/12/2018	60	25/12/2018	508,638,400
8	انشاء كرفان دار مبيت اطباء سبع البور		الصحة	17,437,235	لجنة مشتريات / منجز	100%					19,750,000
9	إعادة تاهيل طريق الشاحنات / سيطرة بغداد - كوت	الرستمية	الداخلية	249,485,000	تنفيذ اماتة / منجز	100%			50	23/12/2018	200,332,000
10	إعادة تاهيل طريق الشاحنات / سيطرة بغداد - الشعب	الشعب	الداخلية	248,676,000	تنفيذ اماتة / منجز	100%			50	23/12/2018	199,704,000
11	تاهيل طريق قرية البوذياب واطراف الحماميات	التاجي	البلدية	250,000,000	تنفيذ اماتة / منجز	100%			45	24/12/2018	210,000,000
12	تاهيل طريق حنون	الشعب	البلدية	262,075,000	تنفيذ اماتة / منجز	100%			45	24/12/2018	229,915,000
13	تاهيل طريق السدة المحاذي لنهر دجلة / جسر ذراع دجلة لغاية جامع نور المصطفى / مقاطعة مزرفة وحصيوه	التاجي	البلدية	286,350,000	تنفيذ اماتة / منجز	100%			45	24/12/2018	240,900,000
14	ترميم ابنية مدرسية (مدرسة الامام الصادق وعظماء العرب)	النهروان	التربية	73,200,000	تنفيذ اماتة / منجز	100%			45	27/12/2018	73,200,000
15	توسعة مقر الصندوق		مباني حكومية	500,000,000	تنفيذ اماتة / منجز	100%			60	27/12/2018	250,000,000
16	توسعة القسم الهندسي / مقر الصندوق		مباني حكومية	50,000,000	لجنة مشتريات / منجز	100%			60		50,000,000
	المجموع			4,133,652,136							3,513,794,000

**مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية
حسب المحافظات لعام 2019**

مشاريع محافظة نينوى



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / نينوى											
ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	نوع التمويل	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفعلي	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
1	اعادة تاهيل ابنية الاقسام الداخلية في مجمع الفاروق / الساحل الايمن / جامعة الموصل	الجانب الايمن	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	68%	23	19/08/2019	365	2019-09-02	2,969,285,600
2	تجهيز المعدات المطلوبة لورشة فحص وتصليح المحولات في قضاء تلعفر	تلعفر	الكهرباء	استثماري	متوقف	40%	37	2019-09-01	180	2019-09-03	445,851,000
3	تاهيل بناية ادارة الدراسات والتصاميم الهندسية في الموصل	الجانب الايمن	الموارد المانية	استثماري	قيد التنفيذ	92%	45	2019-09-30	270	2019-10-06	606,156,800
4	اعادة انشاء كلية هندسة الكهرباء	الموصل	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	23%	55	24/10/2019	500	2019-10-30	5,444,672,000
5	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 3 / طب الموصل	الموصل	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	22%	66	2019-11-12	380	2019-11-18	2,416,492,800
6	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 2 / طب الموصل	الموصل	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	10%	84	08/12/2019	380	2019-12-22	2,416,202,800
7	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 4 / طب الموصل	الموصل	التعليم العالي	استثماري	متوقف	1%	90	11/12/2019	380	2019-12-24	2,355,423,000
8	اعادة انشاء عمادة كلية الطب جامعة الموصل	الموصل	التعليم العالي	استثماري	متوقف	0%	93	11/12/2019	380	2019-12-24	2,349,894,000
9	اعادة انشاء بناية مديرية بلديات نينوى	الموصل	البلديات	استثماري	قيد التنفيذ	22%	98	16/12/2019	360	2019-12-22	2,965,872,000
10	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 1 / طب الموصل	الموصل	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	23%	103	19/12/2019	380	2020-01-01	2,750,000,000
11	تبليط وفرش اكتاف الطريق الرابط من مشروع ري الجزيرة الشمالي الى قرية حردان بطول 12,5 كم	سنجار	البلدية والبلديات	استثماري	منجز	100%	105	19/12/2019	180	2020-01-01	1,148,480,000
12	انشاء وتبليط وإكساء شوارع داخلية متفرقة في قضاء تلعفر	تلعفر / تركمانية	البلدية والبلديات	استثماري	متوقف	46%	113	25/12/2019	180	2020-01-07	1,284,315,200
13	اعادة تاهيل المسفقات وبناية الادارة لسايلو تلعفر	تلعفر / تركمانية	التجارة	استثماري	قيد التنفيذ	23%	113	25/12/2019	180	2020-01-07	0
14	هدم واعادة بناء شعبة الموارد المانية في الموصل	الموصل	الموارد المانية	استثماري	قيد التنفيذ	90%	117	26/12/2019	210	2020-01-08	536,110,800
15	اعادة انشاء بناية المقر الرئيسي لمديرية زراعة نينوى	الموصل	الزراعة	استثماري	قيد التنفيذ	20%	130	26/12/2019	400	2020-01-19	3,990,968,000
16	هدم و إعادة انشاء مدرسة الأعدادية المركزية 24 صف الموصل/ الجانب الايمن	الموصل / الجانب الايمن	التربية	استثماري	قيد التنفيذ	44%	139	26-12-2-19	240	2020-01-20	1,123,049,200
17	اعادة تاهيل مطبعة جامعة الموصل	الموصل	التعليم العالي	استثماري	قيد التنفيذ	80%	142	26/12/2019	200	2020-01-08	651,606,000
18	هدم واعادة بناء متوسطة العقيدة للبنين 12 صف	الموصل	التربية	استثماري	قيد التنفيذ	42%	147	26/12/2019	210	2020-01-20	1,001,593,200
19	هدم واعادة بناء روضة الاريح 4 صف	الموصل	التربية	استثماري	قيد التنفيذ	43%	147	26/12/2019	210	2020-01-20	0
20	اعادة تاهيل المستشفى البيطري في باب سنجار- الجانب الايمن	الجانب الايمن	الزراعة	استثماري	قيد التنفيذ	77%	160	2019-12-26	210	2020-01-08	963,860,800
21	هدم واعادة بناء مدرسة عبدالرحمن الداخل 12 صف	الموصل	التربية	استثماري	قيد التنفيذ	67%	161	26/12/2019	210	2020-01-08	558,717,200
22	هدم واعادة بناء مجمع الكرامة 2/	الموصل	التجارة	استثماري	قيد التنفيذ	30%	165	26/12/2019	320	2020-01-27	3,472,866,240
23	تجهيز مواد لتاهيل واعمار وصيانة الشبكة الكهربائية - الجانب الايسر	الجانب الايسر	الكهرباء	استثماري	متوقف	68%	171	2019-12-30	150	2019-12-30	1,515,000,000
24	هدم واعادة بناء محطة الشفاء الثانوية (11/33) kv الجانب الايمن	الموصل	الكهرباء	استثماري	قيد التنفيذ	10%	178	31/12/2019	360	2020-02-02	2,700,319,000

809,862,000	2020-01-23	90	04/01/2020	179	100%	منجز		التربية	تلغفر / تركمانية	ترميم متوسطة تلغفر للبنين / تركمانية	25
0	2020-01-23	90	05/01/2020	179	100%	منجز		التربية	تلغفر / تركمانية	ترميم مدرسة المجد الابتدائية / تركمانية	26
0	2020-01-23	90	31/12/2019	179	100%	منجز	استثماري	التربية	تلغفر / تركمانية	ترميم مدرسة اليمامة للبنات / تركمانية	27
0	2020-01-23	90	01/01/2020	179	100%	منجز	استثماري	التربية	تلغفر / تركمانية	ترميم مدرسة سكيمة بنت الحسين الابتدائية للبنين / تركمانية	28
0	2020-01-23	90	02/01/2020	179	100%	منجز	استثماري	التربية	تلغفر / تركمانية	ترميم مدرسة ام القرى الابتدائية للبنين / تركمانية	29
0	2020-01-23	90	03/01/2020	179	100%	منجز	استثماري	التربية	تلغفر / تركمانية	ترميم اعدادية تلغفر للبنين / تركمانية	30
0	2020-01-23	90	04/01/2020	179	100%	منجز	استثماري	التربية	تلغفر / تركمانية	ترميم مدرسة العزة للبنات / تركمانية	31
0	2020-01-23	90	05/01/2020	179	100%	منجز	استثماري	التربية	تلغفر / تركمانية	بناء جناح إدارة في متوسطة اسيا / تركمانية	32
0	2020-01-23	90	06/01/2020	179	100%	منجز	استثماري	التربية	تلغفر / تركمانية	ترميم مدرسة تبوك للبنين / تركمانية	33
0	2020-01-23	90	07/01/2020	179	100%	منجز	استثماري	التربية	تلغفر / تركمانية	ترميم مدرسة الفضائل للبنين / تركمانية	34
824,975,000	2020-02-13	220	31/12/2019	180	41%	متوقف	استثماري	التربية	سنجار	هدم واعادة بناء اعدادية اسماعيل طالب /ناحية القيروان- 12 صف	35
922,000,000	2020-02-03	150	31/12/2019	181	100%	منجز	استثماري	الكهرباء	الموصل	تجهيز وتنفيذ مصادر جهد (33 kv) لمحطة كهرباء باب عشتار الثانوية من المحطة الرئيسية	36
261,985,000	2020-01-27	210	31/12/2019	202	90%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	سنجار	اعادة تاهيل بناية بلدية القيروان	37
4,525,160,000	2020-02-02	400	31/12/2019	203	1%	متوقف	استثماري	الكهرباء	الموصل	اعادة تاهيل مخازن كهرباء الكرامة	38
2,210,000,000	2020-01-21	210	2019-12-31	211	93%	متوقف	استثماري	البلدية والبلديات	تلغفر	تبليط وتاهيل وصيانة واكساء شوارع متفرقة داخل قضاء تلغفر	39
0	2020-01-21	210	31/12/2019	211	93%	قيد التنفيذ	استثماري	الطرق والجسور	تلغفر	تاهيل وتبديل القوالب الجانبية لشارع السوق من دورة القلعة الى دورة رأس الجادة في تلغفر مع تبليط شوارع بطول 1525م	40
339,240,000	2020-01-27	80	01/01/2020	218	50%	قيد التنفيذ		الشباب والرياضة	تلغفر / تركمانية	ترميم منتدى شباب تلغفر / تركمانية	41
3,201,436,000	2020-01-26	360	31/12/2019	221	8%	قيد التنفيذ	استثماري	التعليم العالي	الموصل	اعادة تاهيل ملعب جامعة الموصل	42
3,192,400,000	2020-01-20	320	31/12/2019	225	21%	قيد التنفيذ	استثماري	الموارد المائية	تلغفر	اعادة اعمار وتاهيل جسر موقع سد بادوش الحديدي	43
1,492,000,000	2020-01-24	220	31/12/2019	227	73%	قيد التنفيذ	استثماري	البلدية والبلديات	تلغفر	تبليط واكساء شوارع متفرقة في مركز قضاء تلغفر	44
459,497,000	2020-01-22	80	03/01/2020	228	100%	منجز		الزراعة	تلغفر + العياضية / تركمانية	اعادة بناء شعبة زراعة العياضية / قضاء تلغفر / تركمانية	45
2,886,905,000	2019-12-31	90	31/12/2019	234	61%	متوقف		الكهرباء	تلغفر / تركمانية	تجهيز محولات (400 KVA)لدائرة توزيع كهرباء تلغفر/ بعدد (100) محولة	46
0	2019-12-31	90	02/01/2020	234	61%	متوقف		الكهرباء	تلغفر + العياضية / تركمانية	تجهيز مواد الشبكة الكهربائية لاعادة تاهيل كهرباء قضاء تلغفر والقرى التابعة لها	47
0	2019-12-31	90	31/12/2019	234	0%	متوقف		الكهرباء	تلغفر / تركمانية	اعادة تاهيل مغذي 11 كي في حي الخضراء والجزيرة من محطة تلغفر الجديدة 33/11 كي في وبطول 5 كم	48
1,830,835,000	2020-02-08	180	31/12/2019	235	1%	متوقف	استثماري	الكهرباء	سنجار	اعادة تاهيل محطة كهرباء القيروان	49
1,888,570,000	2020-02-08	180	31/12/2019	238	1%	متوقف	استثماري	الكهرباء	البعاج	اعادة تاهيل محطة كهرباء البعاج سعة 2*16 مفا	50
	1900-01-00		31/12/2019	محال		محال / لم يوقع عقد	استثماري	مباني حكومية	تلغفر	تاهيل بناية شعبة احصاء تلغفر	51
	1900-01-00					مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط		مباني حكومية	تلغفر / تركمانية	تاهيل قاعة القانمقامية قضاء تلغفر مع بناء قاعة	52
68,511,600,640											

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / نينوى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	إعادة انشاء مركز صحي الوحدة	الموصل	الصحة	قيد التنفيذ	99%	12	23/7/2019	180	2019-08-05	455,116,000
2	إعادة تاهيل جسر الصابونية على طريق موصل - كسك	تلعفر	الجسور	متوقف	98%	17	08/05/2019	150	2019-08-19	601,200,000
3	إعادة تاهيل جسر المفري (حنكة - زمار)	زمار	الجسور	قيد التنفيذ	65%	17	08/05/2019	150	2019-08-19	
4	هدم و إعادة بناء ثانوية زمار للبنات 12 صف	زمار	التربية	قيد التنفيذ	54%	25	2019-08-20	180	2019-09-02	739,203,600
5	تأهيل مدرسة ابو خُشب /ناحية ربيعة مع بناء جناح (6) صف طابقين مع وحدات صحية عدد (4)	ناحية ربيعة	التربية	قيد التنفيذ	44%	25	2019-08-20	180	2019-09-02	
6	إعادة انشاء ورشة فحص المحولات ومركز صيانة كهرباء القاطع الجنوبي في تلعفر	تلعفر	الكهرباء	متوقف	35%	26	2019-08-20	210	2019-09-02	860,206,300
7	إعادة بناء مركز صيانة كهرباء القاطع الجنوبي / تلعفر	تلعفر	الكهرباء	متوقف	35%	26	20/08/2019	210	2019-09-02	
8	إعادة بناء القناطر في حي الامون	الموصل	المجاري	متوقف	0%	40	2019-09-03	150	2019-10-22	406,700,000
9	إعادة بناء القناطر في حي النجار	الموصل	المجاري	منجز	100%	40	2019-09-03	150	2019-11-22	
10	هدم و إعادة بناء جناح (6)صف طابقين + (4)صف + مجموعة صحية /مدرسة عبد الله بن مسعود / سنجار	سنجار	التربية	قيد التنفيذ	26%	72	24/11/2019	210	2019-12-07	944,158,800
11	هدم و إعادة بناء جناح (6)صف طابقين / مدرسة الفيروان / سنجار	سنجار	التربية	متوقف	9%	72	24/11/2019	210	2019-12-07	
12	هدم و إعادة بناء مدرسة ام الشبايط - 12 صف/سنجار	سنجار	التربية	متوقف	27%	72	25/11/2019	210	2019-12-07	
13	تجهيز جهاز تفتيت الحصى عدد (2)	الموصل	الصحة	قيد التنفيذ	85%	78	08/12/2019	180	2019-12-08	2,400,000,000
14	تاهيل مبنى الادارة و الجدار المحيطي لمعمل تنقية البذور	الموصل	الزراعة	متوقف	30%	94	11/12/2019	210	2019-12-24	648,128,000
15	تجهيز و نصب معمل تنقية البذور	الموصل	الزراعة	متوقف	12%	94	11/12/2019	210	2019-12-24	
16	تأهيل سايلو الموصل - وادي حجر لخرن الحبوب	الموصل	التجارة	قيد التنفيذ	82%	100	17/12/2019	270	2019-12-30	1,571,942,400
17	تأهيل مجمع تل عبطة لخرن الحبوب	الموصل	التجارة	قيد التنفيذ	82%	100	18/12/2019	270	2019-12-30	
18	صيانة وتاهيل ساحة الموصل لخرن الحبوب	الموصل	التجارة	قيد التنفيذ	82%	100	19/12/2019	270	2019-12-30	
19	إعادة تأهيل جمعية الحدياء لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة	الموصل	مباني حكومية	قيد التنفيذ	87%	104	2019-12-19	180	2020-01-01	275,000,000
20	تجهيز و تنصيب و تشغيل جهاز قسطرة عدد 1	الموصل	الصحة	قيد التنفيذ	96%	201	31/12/2019	180	2019-12-31	2,324,000,000
21	تجهيز و نصب اجهزة طبية	الموصل	الصحة	منجز	100%	240	31/12/2019	90	2019-12-31	435,000,000
										11,660,655,100

مشروع محافظة الانبار

الانبار



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	اكساء وتاهيل ارصفة في قضاء حديثة	حديثة	البلدية والبلديات	منجز	100%	16	2019-07-31	200	2019-08-11	1,545,240,000
2	اعادة تاهيل طرق في عموم احياء وقرى البغدادي	هيت	البلدية والبلديات	منجز	100%	16	2019-07-31	200	2019-08-11	
3	تاهيل شوارع حي الزيتون في منطقة 5 كيلو الرمادي	الرمادي	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	86%	21	18/8/2019	360	2019-09-01	2,773,520,000
4	اعادة تاهيل طريق بين حي البرموك وجسر التفاحة بطول 2900م	الفلوجة	البلدية والبلديات	متوقف / بانتظار امر الغيار	85%	21	18/8/2019	360	2019-09-01	
5	تاهيل طريق المدخل الشرقي للحي المدني (السي سي) من جهة حي العمال بطول اكم وعرض 25,5 متر	الجبائية	الطرق والجسور	منجز	100%	22	18/8/2019	120	2019-08-22	1,289,200,000
6	تاهيل طريق أبو فليس الحولي المحاذي لقاعدة الجبائية بطول 3425 م وعرض 30 متر	الجبائية	الطرق والجسور	متوقف / بسبب اعتراض القوات الأمنية		22	18/8/2019	120	2019-08-22	
7	تاهيل وصيانة محطة الدفع (14p التابعة الى مركز مجاري الفلوجة	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	24	20/8/2019	210	2019-09-02	1,104,560,000
8	اعادة بناء هيئة استثمار الانبار	الرمادي	مباني حكومية	قيد التنفيذ	88%	36	2019-01-09	360	2019-09-12	818,148,000
9	هدم واعادة بناء قطاع الرعاية الصحية الاولى في عنه	عنة	الصحة	منجز	100%	44	30/9/2019	180	2019-10-14	443,448,000
10	هدم واعادة بناء مديرية شرطة الانبار	الرمادي	الداخلية	قيد التنفيذ	40%	46	30/9/2019	730	2019-10-10	4,370,761,100
11	هدم واعادة انشاء محطة ماء الكرابلة /القائم	القائم	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	95%	48	2019-10-08	180	2019-10-13	789,244,000
12	اعادة اعمار جسور زنكورة الفوقاني كم (94+000) على طريق المرور السريع	الرمادي	الطرق والجسور	منجز	100%	57	31/10/2019	200	2019-11-13	655,650,000
13	تاهيل محطة اسالة مياه الشرب ومحطة المعالجة الثقيلة في العامرية - مجمع الاخاء	الفلوجة	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	55%	62	2019-03-11	240	2019-11-13	1,141,571,200
14	هدم واعادة بناء مدرسة التل الاخضر- الحميرة 12 صف	الرمادي	التربية	قيد التنفيذ	91%	69	2019-11-17	180	2019-11-24	2,823,356,000
15	هدم و اعادة بناء مدرسة دار العلم الابتدائية 12 صف في الرمادي / المركز	الرمادي	التربية	قيد التنفيذ	90%	69	2019-11-17	180	2019-12-05	
16	هدم و اعادة بناء مدرسة بغداد الابتدائية للبنين 12 صف	الرمادي	التربية	قيد التنفيذ	93%	69	2019-11-17	180	2019-11-25	
17	هدم و اعادة بناء مدرسة الشفانق الابتدائية للبنات /12 صف	الرمادي	التربية	قيد التنفيذ	92%	69	2019-11-17	180	2019-12-05	
18	هدم واعادة بناء مدرسة الفر المحجلين الابتدائية المختلطة 12 صف	الكرمة	التربية	قيد التنفيذ	78%	70	2019-11-17	180	2019-12-01	1,141,590,000
19	هدم واعادة بناء مدرسة الامين 12 صف- الفلوجة	الفلوجة	التربية	قيد التنفيذ	78%	70	2019-11-17	180	2019-12-01	
20	هدم واعادة بناء ثانوية التهذيب للبنات 12 صف - هيت	هيت	التربية	قيد التنفيذ	96%	71	2019-11-17	180	2019-11-30	2,271,912,000
21	هدم واعادة بناء مدرسة الحويبي الابتدائية 12 صف في البغدادي	هيت	التربية	قيد التنفيذ	96%	71	2019-11-17	180	2019-11-30	
22	هدم واعادة بناء مدرسة الاسكندرونة الابتدائية للبنين /12 صف	هيت	التربية	قيد التنفيذ	96%	71	2019-11-17	180	2019-11-30	
23	هدم و اعادة بناء مدرسة الاخاء الابتدائية المختلطة /12 صف	هيت	التربية	قيد التنفيذ	96%	71	2019-11-17	180	2019-11-30	
24	تاهيل مستشفى القائم العام	القائم	الصحة	قيد التنفيذ	58%	75	2019-12-08	310	2019-12-22	1,994,886,800
25	تاهيل شارع نهر فليح من شارع المنجزات الى محطة الماء باتجاه النهر/ الفلوجة	الفلوجة	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	30%	77	2019-08-12	360	2020-02-12	2,214,564,000
26	اعادة انشاء الشارع الخدمي في الخمسة كيلو في الرمادي	الرمادي	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	85%	79	2019-12-08	180	2019-12-21	1,474,000,000
27	هدم واعادة بناء ثانوية الوطن للبنين 18 صف الكرامة	الكرمة	التربية	قيد التنفيذ	49%	80	2019-12-08	300	2019-12-18	2,124,214,400
28	هدم واعادة بناء ثانوية الرشيد 18 صف	الخالدية	التربية	قيد التنفيذ	49%	80	2019-12-08	300	2019-12-18	
29	تاهيل شوارع عدد 7 لمديرية بلدية الرطبة	الرطبة	البلدية والبلديات	منجز	100%	85	2019-09-12	150	23/12/2019	599,928,800

1,912,832,000	2019-12-21	150	2019-12-09	86	97%	قيد التنفيذ	الكهرباء	القائم	تأهيل مغذي الصفرة ومغذي النهية	30
	2019-12-21	150	2019-12-09	86	97%	قيد التنفيذ	الكهرباء	القائم	تأهيل مغذي جريجب من محطة القنيطرة	31
	2019-12-21	150	2019-12-09	86	97%	قيد التنفيذ	الكهرباء	القائم	تأهيل مغذي الكرابلة من محطة سعده	32
	2019-12-21	150	2019-12-09	86	97%	قيد التنفيذ	الكهرباء	القائم	تأهيل الشبكة الكهربائية لقرى جريجب والفياضية والقنيطرة	33
	2019-12-21	150	2019-12-09	86	97%	قيد التنفيذ	الكهرباء	القائم	اعادة اوصول التيار الكهربائي الى المجمع السكني التابع الى الشركة العامة للفوسفات	34
	2019-12-21	150	2019-12-09	86	97%	قيد التنفيذ	الكهرباء	القائم	تأهيل مغذي سعده من محطة سعده	35
2,385,056,000	2019-12-24	180	2019-12-11	96	30%	قيد التنفيذ / تم تغيير الاسم والموقع من سومر الى الاحواز بحسب كتاب الصندوق المرقم 1613 في 2020/6/30	التربية	الرمادي	هدم واعادة بناء مدرسة سومر (الاحواز) الابتدائية / 12 صف	36
	2019-12-23	180	2019-12-11	96	61%	قيد التنفيذ	التربية	الرمادي	هدم و اعادة بناء مدرسة التلاحم الابتدائية 12 صف	37
	2019-12-23	180	2019-12-11	96	100%	منجز	التربية	الرمادي	هدم و اعادة بناء مدرسة الوهج الابتدائية 12 صف في زنكورة	38
	2019-12-23	180	2019-12-11	96	83%	قيد التنفيذ	التربية	الرمادي	هدم و اعادة بناء ثانوية ام سلمة 12 صف	39
524,432,000	2019-12-26	180	2019-12-19	101	100%	منجز	مباني حكومية	الرمادي	تأهيل بناية مديرية احصاء الاتبار	40
675,000,000	31/12/2019	200	19/12/2019	102	75%	قيد التنفيذ	مباني حكومية	القائم	اعادة بناء المجمع الحكومي في ناحية الرمانة	41
439,555,000	2020-01-02	200	2019-12-19	109	91%	متوقف / بانتظار امر غيار	مباني حكومية	القائم	اعادة اعمار محطة تعبئة وقود ناحية الكرابلة/الاتبار	42
3,186,564,000	2020-01-04	300	2019-12-25	112	69%	قيد التنفيذ	التربية	القائم	هدم واعادة بناء ثانوية الامالي للبنين 18 صف - القائم	43
	2020-01-04	300	2019-12-25	112	70%	قيد التنفيذ	التربية	القائم	هدم واعادة بناء مدرسة الجماهير الابتدائية للبنين / 18 صف	44
	2020-01-04	300	2019-12-25	112	72%	قيد التنفيذ	التربية	القائم	هدم واعادة بناء مدرسة المهدي الابتدائية للبنين/18 صف	45
1,062,188,000	2020-01-08	300	2019-12-26	118	81%	قيد التنفيذ	التربية	القائم	هدم و اعادة بناء ثانوية الناظم للبنين 18 صف	46
1,189,108,800	2020-01-09	270	2019-12-26	122	80.5%	قيد التنفيذ	الكهرباء	الرمادي	اعادة انشاء مديرية كهرباء الاتبار مع مخزن	47
1,099,946,750	2020-01-08	150	2019-12-26	123	71%	قيد التنفيذ	الكهرباء	هيت	تأهيل مغذي كهرباء المعسكر	48
2,271,912,000	2020-01-08	180	26/12/2019	125	100%	منجز	التربية	راوة	هدم واعادة بناء مدرسة الشعلة الابتدائية 12 صف - راوه	49
	2020-01-08	180	26/12/2019	125	100%	منجز	التربية	القائم	هدم واعادة بناء ثانوية الرحاب للبنات 12 صف - القائم	50
	2020-01-08	180	2019-12-26	125	100%	منجز	التربية	القائم	هدم واعادة بناء مدرسة الفلاح الابتدائية للبنين / 12 صف	51
	2020-01-08	180	2019-12-26	125	100%	منجز	التربية	القائم	هدم واعادة بناء مدرسة حلب الابتدائية للبنين/ 12 صف	52
2,398,284,000	2020-01-08	300	26/12/2019	126	65%	قيد التنفيذ	الطرق والجسور	الرمادي	تأهيل سدة جويبة باتجاه النشاف بطول 3 كم من المحطة 11+000 الى المحطة 14+000 باعتبار (صفر+صفر) جسر النافورة	53
425,981,600	2020-01-08	210	26/12/2019	129	78%	قيد التنفيذ	الداخلية	الرمادي	هدم واعادة بناء قاطع مرور الرمادي	54
388,055,000		120	2019-12-26	131		لم مباشر / وجود مخاضيات بين الصندوق ووزارة التخطيط حول تغير الموقع	الصحة	القائم	اعادة انشاء مركز صحي فرعي /العبيدي	55
596,160,000	2020-01-08	120	2019-12-26	133	15%	متوقف بانتظار امر الغيار	الطرق والجسور	الرمادي	تأهيل الطريق الرابط بين جسر المخازن الى نهاية الجسر المؤدي الى منطقة البوعيثة	56
2,124,376,000	2020-01-08	300	2019-12-26	134	95%	قيد التنفيذ	التربية	هيت	هدم و اعادة بناء مدرسة فاطمة البرناوي للبنات 18 صف في هيت/ كبيسة	57
	2020-01-08	300	2019-12-26	134	62%	قيد التنفيذ	التربية	الرمادي	هدم واعادة بناء اعدادية حليلة السعدية (ابن الاثير) للبنات /18 صف	58
536,652,000	2020-01-08	180	2019-12-26	150	100%	منجز / قيد تشكيل لجنة الاستلام الاولى	مباني حكومية	عنه	ترميم وتأهيل مبنى الدوائر الحكومية في عنه	59

1,222,113,600	2020-01-07	200	2019-12-26	151	68%	قيد التنفيذ	الماء والمجاري	القائم	تاهيل وتوسيع مجمع ماء النهضة الشرقية مع اضافة خط ناقل بطول 3500 متر	60
	2020-01-07	200	2019-12-26	151	68%	قيد التنفيذ	الماء والمجاري	القائم	تاهيل وتوسيع مشروع الماء المركزي في القائم	61
950,060,000	2020-01-08	120	2019-12-26	153	100%	منجز	الطرق والجسور	عنة	اعادة تاهيل مقطع من الطريق العام حديثة عنده	62
	2020-01-08	120	2019-12-26	153	100%	منجز	الطرق والجسور	عنة	اعادة تاهيل قنطرة صندوقية ثلاثية على طريق حصي -جباب وقنطرة عبدة انحدرية على طريق الشارع العام /قضاء عنة	63
2,165,133,600	2020-01-14	300	26/12/2019	162	55%	قيد التنفيذ	الماء والمجاري	الرمادي	تاهيل مشروع ماء ال 5 كيلو في الرمادي	64
4,477,492,000	2020-01-09	200	2019-12-26	163	68%	قيد التنفيذ	البلدية والبلديات	الفلوجة	تاهيل الشوارع الشريانية في حي الضباط /قضاء الفلوجة	65
	2020-01-09	200	2019-12-26	163	68%	قيد التنفيذ	البلدية والبلديات	الفلوجة	تاهيل الشوارع الشريانية في حي الشرطة والجيفي /قضاء الفلوجة	66
	2020-01-09	200	2019-12-26	163	68%	قيد التنفيذ	البلدية والبلديات	الفلوجة	تاهيل شارع المحيط الفاصل بين الحي العسكري وحي الشركة /قضاء الفلوجة	67
745,647,200	2020-01-12	240	30/12/2019	169	80%	قيد التنفيذ	البلدية والبلديات	الرمادي	هدم واعادة انشاء القسم البلدي في ناحية الوفاء	68
	2020-01-12	240	30/12/2019	169	80%	قيد التنفيذ	مباني حكومية	الفلوجة	هدم واعادة بناء مديرية ناحية الصقلاوية	69
566,500,000	2020-01-14	90	2019-12-31	173	93%	متوقف	الشباب والرياضة	هيت	اعادة تاهيل منتدى شباب هيت	70
812,784,000	2020-01-13	220	2019-12-31	174	29%	قيد التنفيذ	التربية	راوة	هدم و اعادة بناء قسم تربية راوة	71
567,978,000	2020-01-13	180	2019-12-31	175	30%	قيد التنفيذ	التربية	الكرمة	هدم واعادة انشاء مدرسة الصادق الامين (12) صف / الانبار	72
5,335,640,000	2020-01-12	240	2019-12-31	176	57%	قيد التنفيذ	البلدية والبلديات	الرمادي	اعادة تاهيل كورنيش الورار من جهة التاميم الرابط بين جسر الحوز الى جسر القاسم	73
1,484,752,000	2020-01-31	270	2019-12-31	182	72%	قيد التنفيذ	مباني حكومية	الربطية	هدم و اعادة بناء بناية قانمقامية الربطية	74
4,256,696,000	2020-01-13	360	2019-12-31	187	38%	قيد التنفيذ	التعليم العالي	القائم	هدم واعادة بناء بناية الأقسام العلمية /كلية التربية في القائم	75
	2020-01-13	360	2019-12-31	187	38%	قيد التنفيذ	التعليم العالي	القائم	اعادة انشاء بناية الأقسام الداخلية للطلاب لكلية التربية في القائم	76
1,382,400,000	2020-01-13	300	2019-12-31	189	34%	قيد التنفيذ	الماء والمجاري	هيت	صيانة وتاهيل محطات الدفع لمشروع ماء الصحراء الغربية - هيت B1,B2,B3,B4	77
812,784,000		220	2019-12-21	193	8%	متوقف / تلتك الشركة وتم توجيه كتاب انذار لها	التربية	الفلوجة	هدم و اعادة بناء قسم تربية الفلوجة	78
462,000,000	2020-01-13	120	2019-12-31	198	100%	منجز	الماء والمجاري	الكرمة	تجهيز ونصب مجمع ماء السعيد سعة 100 م3/ساعة	79
613,200,000	2020-01-13	150	2019-12-31	199	100%	منجز	الماء والمجاري	الرمادي	الغاء ميزل الحفرية بمد خط دفع لمحطة مجاري الاحتفالات والمخابرات / الرمادي	80
1,142,160,000	2020-01-10	200	2019-12-31	200	90%	قيد التنفيذ	الماء والمجاري	القائم	تاهيل وتوسيع مجمع ماء سعدة مع اضافة وحدة مجمعة 200م3/ساعة مع خط ناقل بطول 1500 متر	81
	2020-01-10	200	2019-12-31	200	90%	قيد التنفيذ	الماء والمجاري	القائم	تاهيل وتوسيع مشروع ماء الشرب للمدينة السكنية في القائم / العبيدي	82
	2020-01-10	200	2019-12-31	200	90%	قيد التنفيذ	الماء والمجاري	القائم	استبدال نواقل رئيسية لمغذي المدينة السكنية / العبيدي	83
459,746,784	2020-01-13	240	2019-12-31	204	84%	قيد التنفيذ	الكهرباء	هيت	هدم واعادة بناء بناية كهرباء هيت مع ورشة الصيانة	84
2,093,401,200	2020-01-13	240	2019-12-31	205	78%	قيد التنفيذ	الطرق والجسور	الخالدية	اعادة تاهيل طريق محطة البزل الرئيسية في المضيق باتجاه نهر الفرات مع طريق داخلي	85
2,255,600,000	2020-01-13	270	2019-12-31	212	35%	قيد التنفيذ	الطرق والجسور	الجبانية	صيانة وتاهيل جسر الخالدية الكونكريتي / قضاء الجبانية	86
588,930,000	2020-01-14	140	31/12/2019	219	88%	قيد التنفيذ	التعليم العالي	الفلوجة	تاهيل كلية العلوم الاسلامية / جامعة الفلوجة	87
881,490,000	2020-01-13	220	2019-12-31	229	58%	قيد التنفيذ	الماء والمجاري	الفلوجة	تاهيل وصيانة محطة (p10الفاو (امطار)	88
2,020,430,000	2020-01-13	270	2019-12-31	230	48%	قيد التنفيذ	التعليم العالي	الرمادي	تاهيل بنايتي عمادة كلية التربية لعلوم الصرفة وعمادة كلية التربية للعلوم الانسانية	89
703,530,800	2020-01-13	270	2019-12-31	230	48%	قيد التنفيذ	التعليم العالي	الرمادي	تاهيل عمادة كلية التربية الرياضية/بناية المساعد العلمي	90
		180	2019-12-26	132		متوقف بسبب ملكية الأرض	مباني حكومية	القائم	اعادة انشاء مبنى المجلس المحلي / قضاء القائم	91
4,400,960,000	2020-02-17	300	2019-12-31	243	22%	قيد التنفيذ	الطرق والجسور	الفلوجة	تاهيل شارع الثرثار الحولي من تقاطع النافورة الى شارع المحيط / الفلوجة	92
3,974,340,000	2020-06-22	270	2020-12-31	245	28%	قيد التنفيذ	البلدية والبلديات	القائم	تاهيل الطريق الخدمي في الكرابلة - سعدة سايدين - المرحلة الثانية	93
						مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط	مباني حكومية	هيت	اعادة انشاء بناية المجلس المحلي لقضاء هيت	94
						مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط	التربية		هدم واعادة انشاء مدرسة اغادير للبنين 12 صف / الانبار	95
						مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط	الكهرباء	اقضية متعددة	تجهيز مواد لدعم وتاهيل الشبكات الكهربائية لفرع توزيع كهرباء مركز الانبار في اقضية (الرمادي الخالدية هيت الربطية)	96
						مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط	الماء والمجاري	الكرمة	تجهيز ونصب وحدة مجمعة سعة 100م3/س في قرية بني زيد في الكرمة / الانبار	97
95,167,666,634										

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / الاتبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الانجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تاهيل الشبكة الكهربائية في جزيرة الخالدية	الخالدية	الكهرباء	منجز / تم استلام المشروع اوليا	100%	1	2019-07-18	150	2019-08-01	1,649,372,000
2	فك اختناق مغذيات احياء العسكري والزراشة والحي القديم	الزراشية	الكهرباء	منجز / تم استلام المشروع اوليا	100%	1	2019-07-18	150	2019-08-01	
3	تاهيل جزء من شبكة مغذي الزراشية	راوه	الكهرباء	منجز / تم استلام المشروع اوليا	100%	1	2019-07-18	150	2019-08-01	
4	تاهيل جزء من مغذي راوه القديمة	راوه	الكهرباء	منجز / تم استلام المشروع اوليا	100%	1	2019-07-18	150	2019-08-01	
5	تاهيل جزء من شبكة مغذي الحي العسكري	رمادي	الكهرباء	منجز / تم استلام المشروع اوليا	100%	1	2019-07-18	150	2019-08-01	
6	تاهيل شبكات الضغط العالي والواطيء في مركز الكرمه	الكرمة	الكهرباء	منجز / تم استلام المشروع اوليا	100%	1	2019-07-18	150	2019-08-01	
7	اعادة اعمار محطة كهرباء جنوب الفلوجة	الفلوجة	الكهرباء	منجز / تم استلام المشروع اوليا	100%	1	2019-07-18	150	2019-08-01	
8	اعادة اعمار محطة الدفع (p4لتصريف مياه الامطار في الفلوجة	الفلوجة	الماء والمجاري	متوقف بسبب تأخر الفقرات الاستيرادية	40%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
9	تاهيل مجمع ماء رميلة القديم سعة 50 م3/ساعة	فلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	2,474,805,800
10	تاهيل مجمع ماء البوعيثة البونجرس 200م3/ساعة	رمادي	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
11	تاهيل مجمع ماء سعة 250 غالون في الخفاجية	حديثه	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
12	استبدال الانابيب الخاصة بمجمع ماء الزنكورة التاسع	رمادي	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
13	تاهيل مجمع ماء الدواية سعة 200م3/ساعة	فلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
14	تاهيل مجمع ماء الزغريت الصقلاوية	فلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
15	تاهيل شبكات الماء في قضاء الكرمه	الكرمة	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
16	تاهيل مجمع ماء الزاوية 200م3/ساعة	حديثه	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
17	صيانة مجمعات الماء في العامرية	العامرية	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
18	اعادة تاهيل مجمع ماء البوشلال 200م3/ساعة في هيت	هيت	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
19	اعادة تبليط شوارع في حي العروبة قضاء الكرمه	الكرمة	البلديات	منجز	100%	7	2019-07-22	120	2019-08-04	849,935,000
20	مشروع اكساء مدخل ناحية النخيب من ثلاث محاور (كيلو 160 و كربلاء و الرطبة)	الرطبة	الطرق	منجز	100%	7	2019-07-22	120	2019-08-04	

21	تاهيل الشوارع من السوق القديم الى دائرة الكهرباء مع شوارع متفرقة - كيبسه	هيت	البلديات	منجز	100%	7	2019-07-22	120	2019-08-04	
22	اعادة انشاء شوارع في حي السلام في ناحية المحمدي	هيت	البلديات	منجز	100%	7	2019-07-22	120	2019-08-04	
23	اعادة انشاء شعبية الزراعة في الرمانة	القائم	الزراعة	قيد التنفيذ / متلكى	84%	9	2019-07-23	180	2019-08-05	1,093,879,000
24	اعادة انشاء مخازن كونكريتية عدد 3 في موقع سايلو الرمادي	الرمادي	التجارة	منجز	100%	9	2019-07-23	180	2019-08-05	
25	هدم واعادة بناء شعبية زراعة الرطبة	الرطبة	الزراعة	قيد التنفيذ / متلكى	85%	9	2019-07-23	180	2019-08-05	
26	اعادة انشاء بناية الرقابة التجارية و المالية - فرع الانبار	رمادي	التجارة	منجز / بانتظار امر غيار	100%	9	2019-07-23	180	2019-08-05	
27	تاهيل بناية شعبية زراعة راوه	راوه	الزراعة	منجز / بانتظار امر غيار	100%	9	2019-07-23	180	2019-07-23	
28	انشاء شعبية الموارد المائية في راوه	راوه	الموارد المائية	منجز / بانتظار امر غيار	100%	14	28/7/2019	210	2019-08-10	731,329,600
29	اعادة انشاء القناطر المتفجرة للمشاريع الاروانية	رمادي	الموارد المائية	منجز / بانتظار امر غيار	100%	14	28/7/2019	210	2019-08-10	
30	هدم واعادة بناء شعبية الموارد المائية في القائم	القائم	الموارد المائية	منجز / بانتظار امر غيار	100%	14	28/7/2019	210	2019-08-10	
31	هدم واعادة بناء مدرسة المكاسب الابتدائية للبنين	الرطبة	التربية	منجز	100%	59	31/10/2019	180	2019-11-14	567,981,000
32	انشاء طريق قرية زغيدان بطول 1800 م و عرض 9م	الصقلاوية	البلديات	منجز	100%	120	26/12/2019	180	2020-01-08	311,191,000
33	اعادة انشاء ملحق لمديرية ناحية الحقلانية	الحقلانية	مباني حكومية	قيد التنفيذ	97%	120	26/12/2019	180	2020-01-08	
34	هدم واعادة بناء مديرية بلدية القائم	القائم	البلديات	متوقف	22%	121	26/12/2019	180	2020-01-09	998,974,100
35	تأهيل الاقسام الداخلية في قضاء هيت	هيت	التعليم العالي	متوقف	10%	121	2019-12-26	180	2020-01-09	
36	اعادة بناء الجناح الاداري المهدم مع تاهيل الاجزاء المتضررة في مدرسة المسار /هيت	هيت	التربية	قيد التنفيذ	70%	121	26/12/2019	180	2020-01-09	
37	تاهيل المجمع الحكومي لناحية العبيدي في القائم	القائم	البلديات	متوقف	30%	121	26/12/2019	180	2020-01-09	
38	هدم واعادة انشاء مدرسة الخليج العربي (12) صف / الانبار	الخالدية	التربية	قيد التنفيذ	24%	154	2019-12-26	180	2020-01-08	567,978,000
39	اعادة بناء الجزء المتضرر للبنية مع القاعة الامامية في اعدادية هيت للبنات	هيت	التربية	قيد التنفيذ	90%	185	31/12/2019	90	2020-01-14	489,700,000
40	اعادة تاهيل بناية شبكة الاعلام العراقي	الرمادي	مباني حكومية	متوقف / بانتظار امر غيار	94%	186	31/12/2019	90	2020-01-13	226,730,000
41	اعادة بناء الطابق الاول لدائرة الجنسية في قضاء هيت	هيت	الداخلية	منجز / تنفيذ امانة	100%	الامر الاداري المرقم 1250	2019-12-12	75	2019-01-02	136,485,000
42	تاهيل شباب منتدى هيت	هيت	الشباب والرياضة	منجز / تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امانة				566,500,000
	المجموع									10,664,860,500

مشاريع محافظة صلاح الدين



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / صلاح الدين

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	إعادة تأهيل طريق تكريت - بييجي بطول 45 كم	عموم المحافظة	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	40%	35	26/8/2019	360	2019-09-07	3,289,200,000
2	هدم وإعادة بناء مركز شرطة المحطة في قضاء بلد	بلد	الداخلية	قيد التنفيذ	49%	39	2019-09-02	220	2019-09-16	1,085,670,400
3	هدم وإعادة بناء مركز شرطة الركة	سامراء	الداخلية	قيد التنفيذ	41%	39	2019-09-02	220	2019-09-16	
4	هدم وإعادة بناء مدرسة 12 صف ثانوية قتيبة المختلطة	بلد	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	48%	51	14/10/2019	210	2019-10-28	2,038,806,000
5	هدم وإعادة بناء مدرسة 12 صف التحدي الابتدائية	بلد	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	45%	51	14/10/2019	210	2019-10-28	
6	هدم وإعادة بناء مدرسة لبنان الابتدائية 12 صف	بلد	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	16%	51	14/10/2019	210	2019-10-28	
7	تأهيل وصيانة البنى التحتية لجامعة تكريت (كيبوسكات) مع قابلات الضغط الواطئ	تكريت	التربية والتعليم	قيد التنفيذ / لم يقدم برنامج تقدم عمل	50%	53	2019-10-17	150	2019-10-30	920,492,000
8	تأهيل وصيانة الصرف الصحي وشبكة تصريف مياه الامطار لجامعة تكريت	تكريت	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	50%	53	2019-10-17	150	2019-10-30	
9	هدم وإعادة بناء مركز صحي رئيس عزيز بلد	بييجي	الصحة	قيد التنفيذ	22.70%	54	17/10/2019	220	2019-10-30	2,698,634,400
10	هدم وإعادة بناء مركز صحي نموذجي بييجي	بييجي	الصحة	قيد التنفيذ	22.35%	54	17/10/2019	220	2019-10-30	
11	هدم وإعادة بناء مركز صحي نموذجي الحجاج	بييجي	الصحة	قيد التنفيذ	22.00%	54	17/10/2019	220	2019-10-30	
12	صيانة وتأهيل محطة تقوية الصينية سعة 3500/3 ساعة	الصينية	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	40%	124	26/12/2019	120	2020-01-08	430,000,000
13	إعادة تأهيل قطار عدد 7 على طريق بييجي - الشرقاط	الشرقاط	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	99%	67	2019-11-14	150	2019-11-27	1,285,004,000
14	إعادة تأهيل جسر صغيرة عدد 3 (جسري كبان والسيد غريب وجسر حاوي البور) في محافظة صلاح الدين	تكريت	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	65%	67	2019-11-14	150	27/11/2019	
15	هدم وإعادة بناء دار القضاء في الدور	الدور	مباني حكومية	قيد التنفيذ	13%	88	12/11/2019	220	22/12/2019	899,918,400
16	هدم وإعادة بناء دار القضاء في الضلوعية	الضلوعية	مباني حكومية	قيد التنفيذ	22%	95	12/11/2019	220	24/12/2019	1,799,836,800
17	هدم وإعادة بناء دار القضاء في يثرب	يثرب	مباني حكومية	قيد التنفيذ	36%	95	12/11/2019	220	24/12/2019	
18	هدم وإعادة بناء مدرسة 12 صف سليمان بيك الابتدائية	الطوز	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	53%	156	26/12/2019	180	2020-01-14	2,675,000,000
19	هدم وإعادة بناء مدرسة 12 صف بييجي الابتدائية للبنات	بييجي	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	45%	156	26/12/2019	180	2020-01-14	
20	هدم وإعادة بناء مدرسة 12 صف الخلفاء الابتدائية	سامراء	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	38%	156	26/12/2019	180	2020-01-14	
21	هدم وإعادة بناء مدرسة الفيض للبنين 12 صف	يثرب	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	32%	156	26/12/2019	180	2020-01-14	
22	هدم وإعادة بناء مدرسة الوادي الخصب 6 صف	الشرقاط	التربية والتعليم	متوقف	10%	192	31/12/2019	170	2020-01-14	286,529,600
23	تبليط الشوارع المجاورة لسايلو طوز في منطقة 77/قضاء الطوز	الطوز	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	95%	128	26/12/2019	120	2020-01-08	1,755,200,000
24	اعمال الارصف الجانبية واكساء الشوارع في حي الطيار	الطوز	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	95%	128	26/12/2019	120	2020-01-08	
25	إعادة تأهيل طريق كفري - سليمان بيك بطول 14.8 كم / صلاح الدين	الطوز	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	60%	135	26/12/2019	240	2020-01-08	2,254,560,000
26	تبليط طريق بييجي - مفرق الشرقاط المرحلة الاولى	بييجي	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	81%	158	26/12/2019	300	2020-01-08	2,673,348,000
27	صيانة واكساء طريق سامراء بين جسر الثرثار وجسر العباسية / صلاح الدين	سامراء	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	33%	224	2019-12-31	300	2020-01-13	4,004,200,000
28	إعادة تأهيل الشوارع المتضررة من جراء العمليات الارهابية في مركز امرلي / تركماتية	امرلي	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	71%	97	2019-12-15	200 +55	2019-12-29	3,746,771,002
29	صب طرق داخلية في قرى امرلي / تركماتية	امرلي	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	71%	97	2019-12-15	201 +55	2019-12-29	
30	إعادة تأهيل الشوارع الداخلية المتضررة في امرلي / تركماتية	امرلي	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	71%	97	2019-12-15	202 +55	2019-12-29	
31	صب الشوارع والطرق الضيقة بالكونكريت المسلح ب(B.R.C في قضاء الطوز / تركماتية	الطوز	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	71%	97	2019-12-15	203 +55	2019-12-29	
32	صب شوارع وطرق بالكونكريت المسلح داخل ناحية بنجة / قضاء الدوز / تركماتية	الطوز	البلدية والبلديات	منجز	100%	210	2019-12-31	90	2020-01-30	192,000,000
										32,035,170,602

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / صلاح الدين

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
1	مشروع معالجة و اكساء طريق (المدخل الشمالي) بطول 1700 م لمركز قضاء امرلي	امرلي	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	85%	20	2019-08-18	150	2019-09-01	905,440,000
2	اعادة تأهيل الشوارع الداخلية المتضررة من جراء العمليات الارهابية في قضاء امرلي	امرلي	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	85%	20	2019-08-18	150	2019-09-01	
3	هدم واعادة بناء بناية ناحية المعتصم	ناحية المعتصم	مباني حكومية	قيد التنفيذ	75%	10	2019-07-23	180	2019-08-05	782,609,500
4	تأهيل و صيانة منتدى شباب و رياضة بلد	بلد	الشباب والرياضة	منجز	100%	10	2019-07-23	180	2019-08-05	
5	هدم و اعادة بناء بناية ناحية مكحول	مكحول	مباني حكومية	قيد التنفيذ	75%	34	2019-08-26	220	2019-09-07	1,989,736,200
6	هدم و اعادة بناء بناية ناحية الصينية	الصينية	مباني حكومية	قيد التنفيذ	90%	34	2019-08-26	220	2019-09-07	
7	هدم و اعادة بناء مديرية بلدية الصينية	الصينية	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	80%	34	2019-08-26	220	2019-09-07	
8	هدم واعادة بناء بناية ناحية سليمان بيك	الطوز	مباني حكومية	قيد التنفيذ	93%	34	2019-08-26	220	2019-09-07	
9	اعادة تأهيل طريق الشهيدة امية الجبارة	العلم	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	65%	41	2019-09-03	120	2019-09-16	606,960,000
10	هدم و اعادة بناء بناية مركز ماء يثرب	يثرب	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	52%	127	26/12/2019	170	2020-01-08	705,174,400
11	هدم واعادة بناء بناية مركز ماء بيجي	بيجي	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	15%	127	26/12/2019	170	2020-01-08	
										4,989,920,100



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / كركوك

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	صيانة واكساء وتبليط الشوارع الداخلية في ناحية الرياض	الرياض	البلديات	منجز	100%	13	2019-07-25	100	2019-08-18	333,646,000
2	هدم واعادة بناء مدرسة اشبيلية 12 صف - مركز الحويجة	الحويجة	التربية	قيد التنفيذ	65%	15	2019-07-30	270	2019-08-22	2,369,721,600
3	هدم واعادة بناء مدرسة الربيع 12 صف- دافوق -قرية الصمود	دافوق	التربية	قيد التنفيذ	60%	15	2019-07-30	270	2019-08-22	
4	هدم واعادة بناء مدرسة كواز عرب الابتدائية 6 صف - ناحية الملتقى	الملتقى	التربية	قيد التنفيذ	30%	15	2019-07-30	270	2019-08-22	
5	هدم واعادة بناء مدرسة زمزم الابتدائية 6 صف - دافوق -طويلعة	دافوق	التربية	قيد التنفيذ	60%	15	2019-07-30	270	2019-08-22	
6	هدم واعادة بناء مدرسة تل الجول 6 صف - تازة	تازة	التربية	قيد التنفيذ	56%	15	2019-07-30	270	2019-08-22	
7	هدم واعادة بناء مدرسة الخندق 6 صف - الملتقى	الملتقى	التربية	قيد التنفيذ	52%	15	2019-07-30	270	2019-08-22	
8	هدم واعادة بناء مدرسة الزيتون الابتدائية 6 صف - الدبس	الدبس	التربية	قيد التنفيذ	37%	15	2019-07-30	270	2019-08-22	
9	هدم واعادة بناء مدرسة المصطفائية الابتدائية المختلطة 6 صف - الحويجة - المصطفائية	الحويجة	التربية	قيد التنفيذ	10%	15	2019-07-30	270	2019-08-22	
10	هدم واعادة بناء مدرسة اسماعيل اوة الابتدائية المختلطة 6 صف - الدبس- اسماعيل اوة	الدبس	التربية	قيد التنفيذ	38%	15	2019-07-30	270	2019-08-22	
11	هدم واعادة بناء مدرسة كواز كرد الابتدائية المختلطة 6 صف - الملتقى	الملتقى	التربية	قيد التنفيذ	10%	15	2019-07-30	270	2019-08-22	
12	تاهيل مجاري حي حطين في قضاء الحويجة	الحويجة	المجاري	منجز	100%	27	20/8/2019	330	2019-08-25	3,339,335,000
13	تاهيل مجاري حي النصر في قضاء الحويجة	الحويجة	المجاري	منجز	100%	27	20/8/2019	330	2019-08-25	
14	تاهيل مجاري حي النداء في قضاء الحويجة	الحويجة	المجاري	منجز	100%	27	20/8/2019	330	2019-08-25	
15	تاهيل شوارع حي النصر في قضاء الحويجة	الحويجة	البلديات	منجز	100%	27	20/8/2019	330	2019-08-25	
16	تاهيل شوارع حي حطين في قضاء الحويجة	الحويجة	البلديات	منجز	100%	27	20/8/2019	330	2019-08-25	
17	تاهيل شوارع حي النداء في قضاء الحويجة	الحويجة	البلديات	منجز	100%	27	20/8/2019	330	2019-08-25	
18	تاهيل شوارع القطاع الثالث في قضاء الحويجة	الحويجة	البلديات	قيد التنفيذ / الانحراف بسبب 1- تلكو الشركة 2- ضعف إمكانية الشركة المادية وقلة الكوادر والاليات	60%	31	21/8/2019	220	2019-09-05	1,998,406,800
19	تاهيل السوق الصغير وجزء من حي اليرموك	الحويجة	البلديات	قيد التنفيذ	85%	31	21/8/2019	220	2019-09-05	
20	هدم واعادة بناء ورشة مركزية لبلدية الحويجة	الحويجة	البلديات	قيد التنفيذ	50%	31	21/8/2019	220	2019-09-05	
21	تاهيل مجاري القطاع الثالث في قضاء الحويجة	الحويجة	المجاري	قيد التنفيذ	90%	31	21/8/2019	220	2019-09-05	

1,458,892,001	2019-12-24	200		63	70%	قيد التنفيذ	البلديات	تازة	صب الشوارع الداخلية بالكونكريت مع المجاري واسالة الماء قرب جامع الثقلين في مركز ناحية تازة / تركمانية	22
	2019-12-24	200		63	100%	منجز	البلديات	تازة	تبليط الشوارع الداخلية في مناطق متفرقة في قرية البشير في ناحية تازة / تركمانية	23
	2019-12-24	200		63	100%	منجز	البلديات	تازة	تبليط الشوارع الداخلية خلف مركز الشباب مع الفروع قرب حسينية علي الاكبر في ناحية تازة / تركمانية	24
289,100,000		45	24-11-2019	74	100%	منجز	الكهرباء	الحويجة	تجهيز محولات مع ملحقات و مواد تاهيل في قضاء الحويجة	25
3,250,000,000	2019-12-31	200	2019-12-19	106	80%	قيد التنفيذ	الطرق والجسور	الحويجة	اعادة تاهيل الطريق الرابط بين قضاء الحويجة ومفرق الصفرة	26
	2019-12-31	200	2019-12-19	106	95%	قيد التنفيذ	الطرق والجسور		تاهيل وصيانة الطرق الخارجية الرابطة بين الاقضية والمدن التابعة للمحافظة	27
406,845,600	2020-02-18	180	19-12-2019	110	7%	قيد التنفيذ	مباني حكومية	الحويجة	هدم واعادة بناء شعبية احصاء الحويجة	28
2,807,000,000	2020-01-28	180	25-12-2019	114	75%	قيد التنفيذ	البلديات	الحويجة	تاهيل مدخل المنزلة والاحياء المجاورة	29
	2020-01-28	180	25-12-2019	114	75%	قيد التنفيذ	البلديات	الحويجة	تاهيل مشروع مجاري مدخل المنزلة والاحياء المجاورة	30
1,269,760,000	2020-01-05	360	26-12-2019	116	86%	قيد التنفيذ	الطرق والجسور		صيانة جسر زغيتون على طريق كركوك - تكريت	31
692,200,000	2020-01-05	240	2019-12-26	137	95%	قيد التنفيذ	الطرق والجسور	كركوك	تاهيل جسر التون كوبري	32
462,400,000	2020-01-09	60	26-12-2019	143	100%	منجز	الماء	الحويجة	تجهيز مضخات ومعدات لمشاريع الماء للمناطق المحررة في كركوك	33
2,400,000,000	2020-01-08	180	26-12-2019	157	92%	قيد التنفيذ	الطرق والجسور	الحويجة	صيانة الطريق الرابط بين الشلالات وقرى النكارات	34
	2020-01-08	180	26-12-2019	157	70%	قيد التنفيذ	الطرق والجسور	الحويجة	اعادة تاهيل الطريق الرابط بين تل علي قرية مصطفى العباسي والقرية الغازية بطول 10 كم	35
780,884,000	2020-01-28	210	26-12-2019	166	65%	قيد التنفيذ	الماء والمجاري	الحويجة	بناء دائرة ومركز جباية ماء قضاء الحويجة مع تاهيل المخزن	36
886,635,040	2020-01-21	120	2019-12-31	188	98%	قيد التنفيذ	الكهرباء	الحويجة	تاهيل شبكات كهرباء في قرى متفرقة ومغذيات 11كف - السلام وباجوان مع تنفيذ مغذي جديد من محطة الطابوق في ناحية الملتقى	37
2,131,577,600	2020-02-10	220	2019-12-31	244	77%	قيد التنفيذ	الزراعة	الحويجة	هدم واعادة بناء مخازن عدد9 في قضاء الحويجة مع بناية الشعبة الزراعية والقاعة الارشادية	38
	2020-02-10	220	2019-12-31	244	66%	قيد التنفيذ	الزراعة	الحويجة	اعادة تاهيل منشأة محطة بستانة الحويجة	39
24,876,403,641										

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / كركوك

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
1	رفع الصبات الكونكريتية الجاهزة و المخلفات الحربية على كتف القناة الرئيسية ري كركوك و نقلها الى مطار كركوك	الحويجة	الموارد المائية	منجز	100%	4	2019-07-21	180	2019-08-05	1,910,400,000
2	صيانة واكساء طريق الحويجة - العباسي	الحويجة	الطرق والجسور	منجز	100%	4	2019-07-21	180	2019-08-05	
3	اكساء شوارع قرى (ابو الجيس - الرشيدية - النعيمية)	الحويجة	الطرق والجسور	قيد التنفيذ / 1-تلكو الشركة 2-امر غيار	72%	4	2019-07-21	180	2019-08-05	
4	صيانة طريق كركوك - تكريت	الحويجة	الطرق والجسور	منجز	100%	4	2019-07-21	180	2019-08-05	
5	هدم واعادة بناء مركز شرطة الماحوز - الحويجة	الحويجة	الداخلية	قيد التنفيذ	63%	8	23/7/2019	150	2019-09-02	461,959,000
6	هدم واعادة بناء مركز شرطة الشعب	الحويجة	الداخلية	قيد التنفيذ	82%	8	23/7/2019	150	2019-09-02	
7	هدم واعادة بناء قسم مكافحة الاجرام	الحويجة	الداخلية	قيد التنفيذ	88%	8	23/7/2019	13	2019-09-02	
8	تاهيل شارع القراغول في قضاء الحويجة	الحويجة	الطرق والجسور	منجز	100%	تنفيذ امانة		45	2019-12-22	67,490,000
9	تجهيز مواد احتياطية لمحطات الضخ الكبرى في محافظة كركوك	كركوك	الموارد المائية	قيد التنفيذ / معدات استيرادية	60%	215	2019-12-31	180	2020-01-28	370,000,000
										2,809,849,000

مشروع محافظة ديالى

Diyala Governorate Projects



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الاجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	صيانة واكساء وتبليط طرق في قرى الخالص (منصورية الشط بطول 5كم , الجيزاني الامام بطول 1,5 كم , السنديا بطول 1,4 كم , البوبالي بطول 1,5 كم)	الخالص	الطرق والجسور	منجز	100%	2	2019-07-21	210	2019-08-04	881,920,000
2	تبليط شوارع في قرية سنسل (عدنان اللهببي) وتبليط افرع الحسابية والحي العسكري وتبليط قرى الوسط وحمص وجرخي اسويد وصيانة طريق الوجهية	المقدادية	الطرق والجسور	منجز	100%	32	2019-08-22	180	2019-09-02	1,792,062,000
3	اكساء شوارع في ناحية ابي صيدا في قضاء المقدادية	المقدادية	البلدية والبلديات	منجز	100%	33	2019-08-22	240	2019-10-02	1,789,146,400
4	اعادة تاهيل تبليط شوارع في حي المعلمين في قضاء المقدادية	المقدادية	البلدية والبلديات	منجز	100%	33	2019-08-22	240	2019-10-02	
5	تاهيل شوارع في قضاء المقدادية (حي التاميم - حي اشور - الحي العصري - حي التحرير)	المقدادية	البلدية والبلديات	منجز	100%	33	2019-08-22	240	2019-10-02	
6	صيانة واكساء طريق اشوتكان وعرجان وتبليط طرق البكالي وسيف سعد في ناحية جبارة وقره تبه	الطرق والجسور	خانقين	منجز	100%	38	2019-09-02	210	2019-09-15	1,010,560,000
7	تبليط طرق في ناحية جديدة الشط والقرى التابعة لها وناحية بني سعد والقرى التابعة لها وتبليط طرق في قضاء الخالص وقراها وقضاء بعقوبة وقراها	الخالص	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	99%	47	2019-10-07	210	2019-10-09	1,511,600,000
8	تجهيز مواد لتاهيل وتحسين وفك اختناق الشبكة الكهربائية لناحية ابي صيدا وقراها	المقدادية	الكهرباء	قيد التنفيذ / 1-تلكو الشركة 2-توقف بسبب الحظر الصحي 3- تغيير د.م.م	80%	49	13/10/2019	90	2019-10-13	1,709,140,000
9	تجهيز مواد لتاهيل وتحسين وفك اختناق الشبكة الكهربائية في مناطق متفرقة في المقدادية	المقدادية	الكهرباء	قيد التنفيذ	80%	49	13/10/2019	90	2019-10-13	
10	تاهيل خط جهد 33 كي في وتحويله الى خط دبل سركت باستخدام اعمدة 14 م من محطة الغربية الى محطة جديدة الشط بطول 22 كم	الخالص	الكهرباء	تمت المباشرة بتاريخ 23/6/2020 بعد حل المشاكل بين الطرق والجسور و مديرية الكهرباء ولم تحل فقرة الاعددة وتم توجيه كتاب حث للضربة بتاريخ 29/9/2020	0%	50	2019-10-14	180	2020-06-23	1,184,010,000
11	اعادة تاهيل الجزيرة الوسطية طريق بغداد - كركوك في ناحية سد العظيم وتبليط شوارع في الجهة الشرقية والغربية للناحية	الخالص	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	68%	52	2019-10-16	120	2020-02-05	771,600,800
12	صيانة وتاهيل طرق في محافظة ديالى (رعد الفرج طامي , الزاوية , زركوش عسكرة)	المقدادية	الطرق والجسور	منجز / قيد الاستلام	100%	56	2019-10-27	180	2019-11-07	1,425,158,000
13	اعادة تاهيل شارع سايبين مع سايبين خدمي لمدخل قره تبه مع اكساء شوارع متفرقة لحياء(الصدر - الشرطة - الشهداء - المشروع)	خانقين	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ/ تلكو الشركة وتم توجيه كتاب حث عدد2/ وتوجيه اذار بتاريخ 29/9/2020	30%	61	2019-11-03	240	2019-11-14	1,947,480,000
14	اعادة تاهيل الشارع امام المجلس المحلي والشوارع المحيطة به مع اكمال كافة المتطلبات الخاصة به	خانقين	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ/ تلكو الشركة وتم توجيه كتاب حث عدد2/ وتوجيه اذار بتاريخ 29/9/2021	30%	61	2019-11-03	240	2019-11-14	
15	اعادة تاهيل شوارع في حي (الزهور والزهراء- المصطفى -الرسول والنور)قضاء بعقوبة بلدروز	بعقوبة	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ / تلكو الشركة وسيتم اصدار كتاب حث خلال 10 ايام في حال عدم تجاوز الاحراف	100%	64	2019-11-11	180	2020-01-16	1,266,747,000
16	اعادة تاهيل شوارع (الافراات -شوارع خلف محطة الغاز في الحي العسكري -شوارع حي المعلمين)	المقدادية	البلدية والبلديات	حي المعلمين منجز وتمت المباشرة ب الافراات والحي العسكري بتاريخ 24/9/2020 بسبب تدهور الوضع الأمني فيها وعدم استلام الموقع	76%	73	2019-11-24	100	2019-12-16	957,746,000
17	هدم واعادة بناء مركز شرطة جلولاء	السعدية	الداخلية	قيد التنفيذ / تلكو الشركة وتم توجيه كتاب حث	35%	83	2019-12-08	360	2020-01-19	1,519,200,800
18	هدم واعادة بناء مركز شرطة المنصورية	الخالص	الداخلية	قيد التنفيذ / تلكو الشركة وتم توجيه كتاب حث	30%	83	2019-12-08	360	2020-01-19	
19	تجهيز مواد لتاهيل وتشبيد خط 33كف دبل سركت اعمدة 14م من محطة بلدروز 33/11كف الى محطة مندلي 11/33كف بطول 45 كم	خانقين	الكهرباء	قيد التنفيذ	100%	87	2019-12-11	100	2020-01-26	1,599,006,400
20	تاهيل مستشفى بعقوبة التعليمي	بعقوبة	الصحة	قيد التنفيذ	41%	91	2019-12-11	180	2020-01-08	2,851,339,000
21	هدم واعادة بناء مدرسة الحليمية الابتدائية 12 صف	السعدية	التربية	قيد التنفيذ / تلكو الشركة المنفذة	83%	92	2019-12-11	180	2019-12-26	576,050,000
22	هدم واعادة بناء مدرسة الزهراوي 12 صف	خانقين	التربية	قيد التنفيذ / توجيه كتاب حث بتاريخ 29/9/2020	75%	99	2019-12-17	210	2020-02-03	1,620,712,160
23	هدم واعادة بناء مدرسة الفراهيدي 12 صف	خانقين	التربية	قيد التنفيذ / توجيه كتاب حث بتاريخ 29/9/2020	75%	99	2019-12-17	210	2020-02-03	
24	تاهيل مستشفى البتول التعليمي للنسائية والاطفال	بعقوبة	الصحة	قيد التنفيذ	40%	107	2019-12-19	210	2020-02-03	4,125,000,000
25	صب الاتزة وتبليط الشارع الحولي في القصبة القديمة قره تبه / تركمانية	قره تبه	البلدية والبلديات	منجز / قيد الاستلام	100%	111	2019-12-25	120	2020-01-08	466,640,000
26	اعادة تاهيل وصب الاتزة القديمة بالكونكريت في محلة العروبة - جلولاء / تركمانية	جلولاء	البلدية والبلديات	منجز / قيد الاستلام	100%	111	2019-12-25	120	2020-01-08	
27	تاهيل وتطوير طريق بعقوبة من تقاطع القدس الى مجسر الغالبية لمعمر الذهاب والاياب	بعقوبة	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	43%	140	2019-12-26	210	2020-01-09	2,790,800,000
28	تاهيل طريق الزركانية سفيط , العودة, الدراويش, المرحلة الثانية 5كم / قضاء الخالص	الخالص	البلدية والبلديات	منجز / قيد الاستلام	100%	141	2019-12-26	100	2020-01-09	728,000,000
29	تاهيل طرق الدائنية	الخالص	الطرق والجسور	منجز / قيد الاستلام	100%	141	2019-12-26	100	2020-01-09	

1,235,060,000	2020-01-06	200	2019-12-26	145	100%	منجز / قيد الاستلام	الطرق والجسور	خاتقين	صيانة طريق سليمان بيك - كفري /مقطع محافظة ديالى	30
613,560,000	2020-01-29	180	2019-12-26	148	69%	قيد التنفيذ	الطرق والجسور	بلدروز	تاهيل وتبليط شوارع في بلدروز	31
2,410,955,400	2020-01-09	180	2019-12-26	149	80%	قيد التنفيذ	الطرق والجسور	خاتقين	اعادة تاهيل الشارع الرئيسي لحي الضباط في جلولاء	32
	2020-01-09	180	2019-12-26	149	80%	قيد التنفيذ	الطرق والجسور	خاتقين	اعادة تاهيل الشوارع في حي السلام الثاني في جلولاء	33
	2020-01-09	180	2019-12-26	149	80%	قيد التنفيذ	الطرق والجسور	خاتقين	اعادة تاهيل الشوارع الاربعة خلف مركز الشباب في جلولاء	34
1,656,448,000	2020-01-08	200	2019-12-26	152	30%	قيد التنفيذ / قيد اصدار امر غيار	الطرق والجسور	الخالص	تاهيل طريق التحويلة من المحطة (صفر+صفر) تقاطع سيطرة ابو نخل المحطة (700+3)	35
	2020-01-08	200	2019-12-26	152	30%	قيد التنفيذ / قيد اصدار امر غيار	الطرق والجسور	الخالص	تاهيل شوارع قرية شبروين/ قضاء الخالص	36
	2020-01-08	200	2019-12-26	152	30%	قيد التنفيذ / قيد اصدار امر غيار	الطرق والجسور	الخالص	تاهيل طرق سراجق العزبان والمحاذي لنهر الخالص والحي العسكري/ المنصورية	37
1,767,181,600	2020-02-18	210	2019-12-26	155	56%	قيد التنفيذ	التربية	جلولاء	هدم واعادة بناء مدرسة التجنيد(12 صف)في ناحية جلولاء.	38
	2020-02-18	210	2019-12-26	155	52%	قيد التنفيذ	التربية	خاتقين	هدم واعادة بناء مدرسة هاشم بن عتبة في قضاء خاتقين	39
	2020-02-18	210	2019-12-26	155	47%	قيد التنفيذ	التربية	جلولاء	هدم واعادة مدرسة العلوم 6 صف	40
	2020-02-18	210	2019-12-26	155	48%	قيد التنفيذ	التربية	جلولاء	هدم واعادة مدرسة الفرات 6 صف	41
300,300,000	2020-01-26	90	2020-01-09	159	100%	قيد التنفيذ	الكهرباء	جلولاء	اعادة تاهيل انارة الشوارع في مدينة جلولاء / ديالى / ترمكمانية	42
969,442,400	2020-02-15	300	2019-12-30	170	49%	قيد التنفيذ	التربية	بعقوبة	هدم واعادة بناء قسم الاعداد والتدريب للتربية	43
1,171,138,000	2020-01-14	120	2019-12-31	172	74%	قيد التنفيذ	الماء والمجاري	خاتقين	تاهيل مشروع ماء خاتقين	44
	2020-01-14	120	2019-12-31	172	100%	قيد التنفيذ	الماء والمجاري	الخالص	تاهيل مشروع ماء المنصورية الموحد	45
	2020-01-14	120	2019-12-31	172	74%	قيد التنفيذ	الماء والمجاري		الخط الناقل قطره (225) ملم لمنطقة جلوة واعنا وخليفة مع مضخة الرفع	46
708,240,000	2020-01-14	150	2019-12-31	183	100%	قيد التنفيذ / توجيه كتاب حث	البلدية والبلديات	العظيم	تاهيل الطريق الريفي لقرية خان الغرقة بطول 7.5 كم وقرية الشيخ شنيف بطول 1.5 كم / ناحية العظيم	47
766,000,000	2020-02-09	90	2019-12-31	195	100%	منجز / قيد الاستلام	الماء والمجاري	السعدية	تاهيل محطة ضخ السعدية التابعة لمشروع سد حمربن (يوجد فرق بين مبلغ العقد والكشف التخميني) / ترمكمانية	48
449,940,000	2020-01-14	180	2019-12-31	197	100%	منجز / قيد الاستلام	الداخلية	بعقوبة	تاهيل بنائة مديرية الاحوال المدنية و الجوازات و الإقامة	49
429,936,000	2020-01-27	180	2019-12-31	206	88%	قيد التنفيذ	الصحة	المقدادية	تاهيل مركز صحي الشهيد حسين الشاجي وتحويله من مركز صحي فرعي الى مركز صحي رئيسي	50
900,000,000	2020-02-11	180	2019-12-31	207	26%	قيد التنفيذ	الماء والمجاري	العظيم	مشروع ماء خان الغرقة/العظيم	51
981,985,000			2019-12-31	214	100%	منجز / قيد الاستلام	الكهرباء	السعدية	تجهيز محولات واسلاك واعدة لقرى ناحية بني سعد	52
827,048,000	2020-02-03	150	2019-12-31	220	48%	قيد التنفيذ / توجيه كتاب حث	الطرق والجسور	بعقوبة	تاهيل طريق الدوربين في ناحية العبارة /قضاء بعقوبة	53
	2020-02-03	150	2019-12-31	220	48%	قيد التنفيذ / توجيه كتاب حث	الطرق والجسور	بعقوبة	تاهيل طرق في بهرز(خميس - علي الحمود)	54
1,500,000,000		180	2019-12-31	231	100%	منجز / قيد الاستلام	الطرق والجسور	الخالص	تاهيل طريق منصورية الجبل والقنطرة الصندوقية في قرية نوفل وتبليط قرية المنصورية	55
	2020-01-13	180	2019-12-31	231	100%	منجز / قيد الاستلام	الطرق والجسور	السعدية	تبليط طريق قرية بلاط الكبير وبلاط الصغير في ناحية قره تبة / ترمكمانية	56
888,000,000	2020-02-24	210	2019-12-31	232	92%	قيد التنفيذ	التربية	العظيم	هدم واعادة ثانوية السهول 12 صف	57
					0%	مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط	الطرق والجسور	خاتقين	اعادة تاهيل المدخل الشمالي لمدينة جلولاء (مرحلة اولى)	58
						مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط	البلدية والبلديات	قره تبة	تبليط طرق متفرقة في قره تبة -جبارة / ديالى	59
						مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط	البلدية والبلديات	قره تبة	عمار مزار السيد ابراهيم السمين في ناحية قره تبة / ديالى	60
50,099,152,960									المجموع	

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	ايصال الماء الصافي لقرية جبارة	ناحية بهرز	الماء والمجاري	منجز	100%	6	2019-07-22	120	2019-08-04	712,233,600
2	تجهيز ونصب محطة تحلية سعة 3م50 ساعة في قرية الشيخ طامي / ناحية بهرز	ناحية بهرز	الماء والمجاري	منجز	100%	6	2019-07-22	120	2019-08-04	
3	تأهيل مشروع ماء الحويش - جديدة الشط	جديدة الشط	الماء والمجاري	منجز	93%	11	23/7/2019	200	2019-08-06	1,315,643,110
4	تأهيل وصيانة مجمع ماء عتبة بطاقة نصف مليون غالون - بلدروز	بلدروز	الماء والمجاري	منجز	100%	11	23/7/2019	200	2019-08-06	
5	تأهيل مشروع ماء ابي صيدا	ابي صيدا	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	87%	11	23/7/2019	200	2019-08-06	
6	صيانة و تأهيل 4 كم من طريق السندية الرابط مع محافظة صلاح الدين	الخالص	طرق وجسور	منجز / قيد اكمال ملاحظات الاستلام	100%	18	2019-08-08	180	2019-08-21	1,153,920,000
7	تجهيز اعمدة كهربائية مع الملحقات لقرى شمال المقدادية	المقدادية	الكهرباء	منجز / قيد الاستلام ولوجود شكوى ضد الجهة المستفيدة تعذر الاستلام	100%	58	2019-10-31	60	2019-10-31	510,000,000
8	تجهيز محولات جهد 0,4/11 كف سعة 250 KVI عدد 40 لتأهيل شبكة كهرباء احياء المفرق و حي المعلمين و الكاطون	بعقوبة - المقدادية	الكهرباء	منجز / قيد الاستلام ولوجود شكوى ضد الجهة المستفيدة تعذر الاستلام	100%	58	2019-10-31	60	2019-10-31	
9	اعادة اعمار و تأهيل الشبكة الكهربائية للقرى المتضررة في ناحية العظيم و ناحية دلي عباس و ناحية المنصورية	العظيم - دلي عباس - المنصورية	الكهرباء	قيد التنفيذ	90%	65	2019-11-11	120	2019-12-09	1,461,010,000
10	اعادة اعمار و تأهيل الشبكة الكهربائية لحياء (313 و 303) مع تأهيل شبكة انارة الشوارع الرئيسية في التحرير / بعقوبة	بعقوبة	الكهرباء	قيد التنفيذ	90%	65	2019-11-11	120	2019-12-09	
11	اعادة تأهيل و تحسين و فك اختناق الشبكة الكهربائية لمناطق ناحية جلولاء قرى (الشموخ ,شيخ بابا, جميلة,الاصلاح,امين الحبيب ,حي السلام,انارة الشارع بين القصبه القديمة و حي المشروع)	جلولاء	الكهرباء	قيد التنفيذ	90%	65	2019-11-11	120	2019-12-09	
12	اعادة تأهيل مدرسة صفية في قضاء الخالص	الخالص	التربية	قيد التنفيذ	64%	119	2019-12-26	200	2020-02-20	701,772,500
13	اعادة تأهيل ثانوية سعد الواقعة في قضاء الخالص	الخالص	التربية	قيد التنفيذ	66%	119	2019-12-26	200	2020-02-20	
14	اعادة تأهيل ساحة (11) لاعب بمساحة (70*100) م	الخالص	الشباب والرياضة	قيد التنفيذ	67%	119	2019-12-26	200	2020-02-20	
15	استبدال الخط الناقل الرئيسي العائد لمشروع ماء ابي صيدا 500ملم بكتايل	المقدادية	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	95%	82	2019-12-08	160	2020-02-03	497,921,480
16	صيانة مجمعات ماءسعة نصف مليون غالون /جلبي/ابي صيدا	المقدادية	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	95%	82	2019-12-08	160	2020-02-03	
17	تأهيل مجمع ماء قرية شيخي سعة مليون غالون	المقدادية	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	95%	82	2019-12-08	160	2020-02-03	
	المجموع							140		6,352,500,690

محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

Baghdad Governorate Projects

الانبار



واسط



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تأهيل مغذي 33 كي في (مغذي ماء الكرخ - طارمية قديمة /طارمية جديدة وبنظام الدبل سيركت)	الطارمية	الكهرباء	منجز	100%	5	2019-07-21	120	2019-08-08	1,051,360,000
2	نقل خزان وتنفيذ خط ناقل لمنطقة 9 نيسان / النهروان	النهران	الماء	قيد التنفيذ	92%	237	2019-12-31	150	2020-02-16	1,240,000,000
3	تصليح وصيانة طريق مرمره وطريق البوصالح الاحمد بطول 8كم	الطارمية	البلدية والبلديات	منجز	100%	89	2019-12-11	100	2019-12-25	2,273,600,000
4	تأهيل طريق تل طاسة وطريق الثائر الثانية. الطارمية	الطارمية	البلدية والبلديات	منجز	100%	89	2019-12-11	100	2019-12-25	
5	تأهيل طريق تل طاسة وطريق الثائر الاولى وطريق البوفراس 8كم	الطارمية	البلدية والبلديات	منجز	100%	89	2019-12-11	100	2019-12-25	
6	تصليح واكساء طريق زملة حمدي في قضاء الطارمية بطول 1400م وعرض 6 متر	الطارمية	البلدية والبلديات	منجز	100%	89	2019-12-11	100	2019-12-25	
7	قلع وتوسيع واكساء طريق مدخل سجن التاجي المركزي من الشارع العام بغداد -موصل الى موقع السجن بطول 6000 متر وبعرض 8 م	التاجي	البلدية والبلديات	منجز	100%	146	26/12/2019	100	2020-01-30	2,298,000,000
8	قلع وتبليط طريق محطة الكهرباء الغازية ابتداء من طريق بغداد - الموصل الى منطقة السدة التابعة الى قضاء التاجي بطول 5000 متر وعرض 6 متر	التاجي	البلدية والبلديات	منجز	100%	146	26/12/2019	100	2020-01-30	
9	تصليح وتبليط واكساء طريق اللانين من سكة القطار الى سيطرة ام نجم ضمن مقاطعة 12 ضباعي التابعة الى مديرية ناحية التاجي الجديد بطول 1000متر وعرض 6 متر	التاجي	البلدية والبلديات	منجز	100%	146	26/12/2019	100	2020-01-30	
10	قلاع واعادة تبليط مع انبوب تصريف مياه الامطار لشوارع هور الباشا	التاجي	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	65%	138	26/12/2019	100	2020-01-02	2,663,000,000
11	تصليح واكساء طريق هور الباشا من شارع بغداد- موصل الى منطقة الشيخ عامر/قضاء التاجي	التاجي	البلدية والبلديات	متوقف	98%	138	26/12/2019	100	2020-02-12	
12	هدم واعادة بناء مدرسة البواسل 9 صف في قضاء الطارمية	الطارمية	التربية	قيد التنفيذ	87%	115	2019-12-26	250	2020-02-09	329,420,000
13	تأهيل واكساء طريق قرية الضحي	الطارمية	البلدية والبلديات	منجز	100%	167	2019-12-26	120	2020-01-03	272,400,000
14	صيانة واكساء الشارع الممتد من حي الباتوراما الى شارع البنية بطول 23000 م وعرض 7	المدائن	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	92%	164	26/12/2019	180	2020-01-25	1,976,000,000
15	تأهيل مركز صحي الخناسه	المدائن	الصحة	قيد التنفيذ	90%	223	2019-12-31	120	2020-02-09	325,220,000
16	هدم واعادة بناء مدرسة الرواشد	المحمودية	التربية	قيد التنفيذ	36%	136	26/12/2019	210	2020-02-13	1,636,111,350
17	هدم واعادة بناء مدرسة عباس بن فرانس	المحمودية	التربية	قيد التنفيذ	36%	136	26/12/2019	210	2020-02-13	
18	هدم واعادة بناء مدرسة المنامة	المحمودية	التربية	قيد التنفيذ	36%	136	26/12/2019	210	2020-02-13	
19	هدم واعادة بناء مدرسة الايتار الابتدائية 12 صف	الطارمية	التربية	قيد التنفيذ	85%	184	31/12/2019	180	2020-02-11	689,183,500
20	اعادة تأهيل شبكات كهرباء في قضاء المدائن والقرى والنواحي	المدائن	الكهرباء	منجز	100%	216	31/12/2019	90	2020-01-13	340,000,000
21	تأهيل طريق القرية الهولندية وطريق فيصل مريخ	النهران	البلدية والبلديات	منجز	100%	144	26/12/2019	210	2020-01-15	761,600,000
22	هدم واعادة بناء مدرسة العراق الجديد 12 صف	اللطيفية	التربية	قيد التنفيذ	88%	208	31/12/2019	180	2020-02-09	537,180,800
23	مشروع تأهيل اثاره ابو غريب القديم	أبو غريب	الكهرباء	منجز	100%	191	31/12/2019	100	2020-01-21	549,937,500
24	تصليح وصيانة طريق شيخ رافع حاتم والطرق المجاورة له بطول 7كم	الطارمية	البلدية والبلديات	مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط						
25	صيانة وتبليط طرق شاخه (1,2,3) / ناحية اللطيفية	اللطيفية	البلدية والبلديات	مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط						
26	صيانة وتصليح طريق الاسحاقي والطرق المجاورة لها في ناحية المشاهدة بطول 7 كم وعرض 5م / قضاء الطارمية	الطارمية	البلدية والبلديات	مؤجل / مدرج في وزارة التخطيط						
	المجموع					0		142		16,943,013,150

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / بغداد


ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلية	تكلفة العقد الأصلي
1	تبليط شوارع قرية المهجرين الثانية /النهروان	المدائن	البلدية والبلديات	منجز	100%	19	2019-08-08	90	2019-09-22	1,215,600,000
2	تبليط شوارع قرية المهجرين الاولى /النهروان	المدائن	البلدية والبلديات	منجز	100%	19	2019-08-08	90	2019-09-22	
3	تبليط طرق قرية الزيتية /النهروان	المدائن	البلدية والبلديات	منجز	100%	19	2019-08-08	90	2019-09-22	
4	تاهيل جسر السيارات المتضرر لناظم قاطع (8) كم وناظم صدر ابو غريب	ابو غريب	الموارد المائية	منجز	100%	42	2019-09-16	180	2019-10-28	284,972,000
5	تصليح الاضرار و مد شبكة امطار و صرف صحي في قرية الحرية	المدائن	الماء والمجاري	منجز	100%	60	2019-10-31	150	2019-11-23	1,056,200,000
6	تبليط شوارع قرية الامام الرضا (ع)	المدائن	البلدية والبلديات	منجز	100%	60	2019-10-31	150	2019-11-23	
7	تبليط طرق حي الصدرين خلف القرية النفطية و المفروشة بالسبب عن طريق محافظة بغداد بطول (2500م) و بعرض (5م)	المدائن	البلدية والبلديات	منجز	100%	60	2019-10-31	150	2019-11-23	
8	اعادة تاهيل مدرسة ابن الارقم الابتدائية	ابو غريب	التربية والتعليم	متوقف بانتظار امر غيار	95%	68	2019-11-14	60	2019-12-27	536,943,000
9	اعادة تاهيل مدرسة اعياد الربيع	ابو غريب	التربية والتعليم	متوقف بانتظار امر غيار	50%	68	2019-11-14	60	2019-12-27	
10	اعادة تاهيل مدرسة الحضارة للبنات	ابو غريب	التربية والتعليم	متوقف بانتظار امر غيار	40%	68	2019-11-14	60	2019-12-27	
11	اعادة تاهيل مدرسة نور العلم	ابو غريب	التربية والتعليم	متوقف بانتظار امر غيار	90%	68	2019-11-14	60	2019-12-27	
12	اعادة تاهيل مدرسة القبة الزرقاء الابتدائية	ابو غريب	التربية والتعليم	متوقف بانتظار امر غيار	95%	68	2019-11-14	60	2019-12-27	
13	اعادة تاهيل ثانوية ابي غريب للبنات	ابو غريب	التربية والتعليم	متوقف بانتظار امر غيار	95%	68	2019-11-14	60	2019-12-27	
14	اعادة تاهيل مدرسة المنامة الابتدائية	ابو غريب	التربية والتعليم	متوقف بانتظار امر غيار	95%	68	2019-11-14	60	2019-12-27	
15	تاهيل مركز صحي النصر و السلام	ابو غريب	الصحة	متوقف بانتظار امر غيار	95%	81	2019-12-08	100	2020-01-20	905,006,000
16	تاهيل بناية الجوازات	ابو غريب	الداخلية	متوقف بانتظار امر غيار	95%	81	2019-12-08	100	2020-01-20	
17	توسيع و تاهيل مركز صحي عكر كوف	ابو غريب	الصحة	متوقف بانتظار امر غيار	60%	81	2019-12-08	100	2020-01-20	
18	توسيع و تاهيل مركز صحي الزيتون	ابو غريب	الصحة	متوقف بانتظار امر غيار	60%	81	2019-12-08	100	2020-01-20	
19	تاهيل مجمع ماء صالح الاحمد 3م50/ساعة	المدائن	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	75%	108	19/12/2019	150	2020-02-24	645,424,000
20	مشروع مد انبوب ناقل للماء الصالح للشرب في منطقة شاطيء التاجي و بطول (40000م) و قطر (8 انج) في ناحية الحماميات	التاجي/ الحماميات	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	20%	108	19/12/2019	150	2020-02-24	
21	تاهيل مجمع ماء المشاهدة 200م3/ساعة	المشاهدة	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	75%	108	19/12/2020	150	2020-02-24	
22	صيانة مجمعات ماء النهروان ومشروع التوسعة ومحطة الخام	المدائن	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	75%	108	19/12/2021	150	2020-02-24	
23	تاهيل طريق قرية العفو بطول 3م / ناحية النصر و السلام في قضاء ابو غريب	ابو غريب	البلدية والبلديات	منجز / تنفيذ امانة	100%					250,000,000
24	اضافة وحدة الارشفة في مقر الصندوق		مباني حكومية	منجز / تنفيذ امانة	100%					250,000,000
25	شراء انابيب لاكمال مشروع طريق حنون		البلدية والبلديات	منجز / تنفيذ امانة	100%					9,288,000
26	تاهيل و اكساء طرق في قرية الامام السجاد خلف قرية المهجرين الثانية في ناحية النهروان بطول 2500 م	المدائن	البلدية والبلديات	منجز / تنفيذ امانة	100%					180,000,000
27	تاهيل و اكساء طرق في قرية الامام الصادق / ناحية النهروان - قضاء المدائن بطول 1500م	المدائن	البلدية والبلديات	منجز / تنفيذ امانة	100%					161,250,000
	المجموع					0		143		5,494,683,000



الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / بابل

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم المناقصة	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تاريخ الإنجاز الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تاهيل طريق المسيب - الصويرة	جرف النصر	الطرق والجسور	منجز	100%	تنفيذ امانة	75	75	2019-08-27	2019-11-10	197,190,000
	المجموع										197,190,000

مشاريع المنح والقروض التي يعمل الصندوق
كمشرف ومنسق لها



مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي EODP

قرض البنك الدولي الطارئ / الأول M\$350

الملاحظات	المبلغ المتبقي (USD))	المبلغ المصروف (USD))	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص (USD))	القطاع
	2,713,039.16	67,286,960.84	28	28	28	70,000,000.00	الكهرباء
	28,314,737.60	108,685,262.40	35	35	35	137,000,000.00	الطرق والجسور
	12422078.63	49,577,921.37	45	45	45	62,000,000.00	البلديات
	12,971,403.85	15,028,596.15	3	3	3	28,000,000.00	الصحة
	11,906,073.00	93,927.00	0	6	6	12,000,000.00	دائرة المباني
-	29,935,583.00	64,417.00	0	0	14	30,000,000.00	الموارد المائية
	98,262,915.24	240,737,084.76	<u>111</u>	<u>117</u>	<u>131</u>	339,000,000.00	المجموع

قرض البنك الدولي الطارئ / الاضافى M\$400

الملاحظات	المبلغ المتبقي ((USD))	المبلغ المصروف ((USD))	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص ((USD))	القطاع
	48,948,728.17	1051271.83	0	6	20	50,000,000.00	الكهرباء
	107,231,560.11	3768439.89	0	1	24	111,000,000.00	الطرق والجسور
	47,500,000.00	0.00	0	0	12	47,500,000.00	البلديات
	28,000,000.00	0.00	0	0	1	28,000,000.00	الصحة
-	30,000,000.00	0.00	0	6	7	30,000,000.00	الموارد المائية
	5,000,000.00	0.00	0	0	7	5,000,000.00	النقل
	32,000,000.00	0.00	0	0	26	32,000,000.00	التربية والتعليم
	32,000,000.00	0.00	0	0	17	32,000,000.00	الزراعة
	15,916,380.68	4,083,619.32	1	4	8	20,000,000.00	محافظة الانبار / المكون العاشر
	20,000,000.00	0.00	1	7	7	20,000,000.00	محافظة نينوى / المكون العاشر
	9,332,303.00	667697.00	1	4	9	10,000,000.00	محافظة ديالى / المكون العاشر
	10,000,000.00	0	0	0	3	10,000,000.00	محافظة صلاح الدين / المكون العاشر
	385,928,971.96	9,571,028.04	<u>1</u>	<u>28</u>	<u>141</u>	395,500,000.00	<u>المجموع</u>

القرض الالمانى M€500

الملاحظات	المبلغ المتبقي Euro	المبلغ المصروف Euro	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص / Euro	القطاع
	18,687,570.10	26,312,429.90	4	8	8	45,000,000.00	وزارة الكهرباء المرحلة الأولى
	172,200,454.43	7,799,545.57	0	1	6	180,000,000.00	وزارة الكهرباء المرحلة الثانية
	44,033,554.00	966,446.00	0	4	6	45,000,000.00	وزارة الاعمار والإسكان والاشغال العامة / الطرق والجسور
	45,000,000.00	0	0	0	24	45,000,000.00	وزارة الاعمار والإسكان والاشغال العامة / دائرة المشاريع الممولة خارجيا (الماء والمجاري)
	185,000,000.00	0	0	0	4	185,000,000.00	وزارة الصحة الصحة
-	<u>464,921,578.53</u>	<u>27,278,875.90</u>	<u>2</u>	<u>13</u>	<u>48</u>	<u>500,000,000.00</u>	<u>المجموع</u>

المنحة الكويتية – خاصة لقطاع الصحة / المرحلة الاولى M\$15

الملاحظات	المبلغ المتبقي (USD))	المبلغ المصروف (USD))	المنجز	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص (USD))	القطاع
	13,442,245.00	1,557,755	0	19	19	15,000,000.00	الصحة
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	15,000,000.00	المجموع

المنحة الكويتية – خاصة لقطاع الصحة / المرحلة الثانية M\$85

الملاحظات	المبلغ المتبقي (USD))	المبلغ المصروف (USD))	المنجز	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص (USD))	القطاع
	85,000,000.00	0	0	0	36	85,000,000.00	الصحة
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36</u>	85,000,000.00	المجموع

المنحة الصينية / منحة عينية لقطاع البلديات / بمبلغ ستون يوان (\$ 9,000,000)

ملاحظات	أدوات احتياطية	عدد الآليات	المحافظة
تم تجهيز جميع الآليات والأدوات الاحتياطية	105 صندوق أدوات احتياطية	36	نينوى
		36	الانبار
		18	صلاح الدين
		9	كركوك
		11	ديالى
		7	بغداد
		1	بابل
		<u>118</u>	<u>المجموع</u>

منحة البنك الإسلامي للتمنية \$1,250,000

الملاحظات	المبلغ المتبقي (USD))	المبلغ المصرف (USD))	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص (USD))	القطاع
	1,250,000.00	0	0	0	1	1,250,000	الماء والصرف الصحي
	0	0	0	0	1	1,250,000	المجموع

المنحة الماليزية \$100,000

الملاحظات	المبلغ المتبقي (USD))	المبلغ المصرف (USD))	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص (USD))	القطاع
	100,000.00	0	0	0	1	100,000	وزارة الصحة
		0	0	0	1	100,000	المجموع

المنحة التشيكية \$458,421.2

الملاحظات	المبلغ المتبقي (USD))	المبلغ المصروف (USD))	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص (USD))	القطاع
	103,161.20	77,460	1	2	3	180,621	الكهرباء
	277,800.00	0	0	3	4	277,800	الصحة
		<u>77,460</u>	<u>1</u>	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>458,421</u>	<u>المجموع</u>

اليات المنحة الصينية



صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية



صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية

Ninewa

Mancibility Machinery grant for Iraq of the people's Republic of China



صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية

Ninewa

Mancibility Machinery grant for Iraq of the people's Republic of China



صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية

Mancibility Machinery grant for Iraq of the people's Republic of China



صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية

Mancibility Machinery grant for Iraq of the people's Republic of China



صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية

Salah ad Din

Mancibility Machinery grant for Iraq of the people's Republic of China



جسر عمر بن عبد العزيز / الرمادي / الأنبار





إعادة تأهيل جسر شيشين | صلاح الدين



تجهيز محطات متنقلة للمحافظات



تجهيز اليات تخصصية للمحافظات المحررة



42.5 كم شارع نفط خانة - مندلي



إعادة تأهيل جسر القاسم ومقاربه



حل مؤقت لجسر الموصل الرابع

תודה
Dankie Gracias
Спасибо شكراً
Merci Takk
Köszönjük Terima kasih
Grazie Dziękujemy Děkojame
Ďakujeme Vielen Dank Paldies
Kiitos Tänname teid 谢谢
Thank You Tak
感謝您 Obrigado Teşekkür Ederiz
Σας ευχαριστούμε 감사합니다
ขอบคุณ
Bedankt Děkujeme vám
ありがとうございます
Tack
