

صندوق
إعادة اعمار المناطق المتضررة

Re
F
AA
T
O

التقرير الفني لمشاريع
صندوق إعادة الاعمار
منذ تأسيسه و لغاية
2019/6/30
الجزء (العشرون)
حزيران 2019

A vertical rectangular panel with a repeating pattern of green and white concentric circles, similar to the orange pattern in the adjacent panel.

المقدمة

- تأسس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وفق المادة (28) من قانون الموازنة الفدرالية العامة لعام 2015. اعقبه صدور نظام الصندوق رقم (2) لسنة 2015، وقد نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددها (4352) في 16/2/2015 وقد جاء فيها (يؤسس صندوق إعادة اعمار المناطق التي دمرها الإرهاب ويمول من المنح والمساعدات الدولية، ويخصص له مبلغ من الموازنة الاتحادية).
- وفي عام 2017 تم تعديل بعض فقرات النظام وحددت الهيكلية الإدارية وصدر النظام رقم (3) في جريدة الوقائع العراقية بعددها (4441).
- وقد حددت مناطق عمل الصندوق في المدن التي دمرها الإرهاب في كل من الانبار، ديالى، صلاح الدين، نينوى، شمال بابل، حزام بغداد (أبو غريب) وبعض المناطق الجنوبية من كركوك.
- هذا الكراس وهو تقريراً فنياً والذي يصدر كل شهر لمشاريع التي ينفذها الصندوق من الموازنة الفدرالية بشقيها الاستثماري والبرامج الخاصة، ويتم التوثيق بإحداثيات الـ (GPS) إضافة الى صور ومراحل الإنجاز بصورة دقيقة، كما ويحتوي هذا الكراس على المشاريع التي تنفذها الوزارات القطاعية كجزء من واجبات الصندوق في التدقيق المالي والفني التي يشرف عليها مدققون عالميون معينين من قبل الصندوق من خلال البنك الدولي والبنك الألماني.
- نأمل ان ترسم هذه السلسلة الشهرية من الكراسات خارطة إعادة الاعمار المترتبة.
- والله ولي التوفيق.

هدفه انشاء الصندوق:-

- 1- إعادة اعمار وتأهيل المناطق التي دمرها الإرهاب وإزالة آثارها.
- 2- معالجة الاضرار الحاصلة في البنى التحتية.
- 3- تعويض الفرص التنموية.

آلية عمل الصندوق:

يعمل الصندوق كمنسق ومراقب على تنفيذ القروض التي تقدم للعراق مثل قرض البنك الدولي وقرض بنك التنمية الألماني والتي تنفذ من قبل الوزارات القطاعية او من خلال المنح (المنحة الكويتية للقطاع الصحي والمنحة الصينية لأليات البلديات والمنحة التشيكية).

كما ويعمل الصندوق كمنفذ للمشاريع التي تقدم له من المحافظات المتضررة من خلال المبالغ المرصودة من الموازنة الاتحادية

مهام صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وفق نظام رقم (3) لسنة 2017

- حسب المادة اولا من نظام صندوق إعادة الاعمار يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بشخصية معنوية وذات استقلال مالي واداري.

وفق المادة (5) يمارس الصندوق المهام الآتية:-

- التنسيق مع الجهات المعنية لوضع أولويات المشاريع في المحافظات المتضررة.
- السعي الى جلب المنح والهبات والمساعدات والقروض.
- القيام بإجراءات التعاقد ومتابعة تنفيذ المشاريع.
- متابعة تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار الممولة من المنح والقروض.
- تقديم الخطط اللازمة لإعادة الاعمار ووضع السياسات اللازمة لتحقيق اهداف الدولة.
- تنظيم ورعاية المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية المتعلقة بإعادة الاعمار وذلك سعيا لجلب المنح والهبات والمساعدات.

صندوق إعادة الاعمار

- الرؤيا:

بناء الثقة بين العراقيين والدولة من جهة وبين العراق والمجتمع الدولي من جهة أخرى.

- الرسالة:

إعادة بناء الانسان والجدران وادامة العجلة الاقتصادية في المدن المتضررة من العمليات الإرهابية.

وتتم من خلال الابعاد التالية:-

1- البعد الاجتماعي:

تجديد العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين على المصداقية والثقة في جهود إعادة

الاعمار.

2- البعد الاقتصادي:

ادامة العجلة الاقتصادية في المناطق المتضررة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة

3- البعد الفيزيائي وإعادة الخدمات:

إعادة اعمار المنشآت العامة والخاصة والمتضررة من العمليات الارهابية

القسم الأول

ملخص مشاريع الصندوق على الموازنة الفدرالية

عدد المشاريع المخطط لها والمنفذة والمنجزة والمستمرة للأعوام 2016 ، 2017 ، 2018 للموازنة الفيدرالية

السنة	المبلغ المخصص / مليار دينار	عدد المشاريع المخطط لها	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المستمرة	نسبة المشاريع المنجزة من المتعاقد عليها
2016	155	150	150	150	—	100%
2017	150	163	159	154	5	97%
2018	150	198	198	91	107	46%
المجموع	455	511	507	395	112	78%

جدول يمثل مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات من 2016 - 2018

المجموع		القطاعات																								المحافظات	
		دوائر حكومية		الموارد المائية		الماء والمجاري		الكهرباء		الطرق والجسور		الصحة		الزراعة		الداخلية		التعليم العالي		التربية		التجارة		البلدية و البلديات			
المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية
195	216	4	4	7	9	95	96	12	14	6	8	6	9	0	0	4	9	23	24	30	35	1	1	7	7	الاتنبار	
19	21	0	0	0	0	17	17	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	شمال بابل
35	37	3	3	1	1	5	5	10	10	2	2	1	1	0	0	2	2	0	0	8	10	0	0	3	3	حزام بغداد	
38	54	0	0	0	0	6	7	3	4	23	30	1	1	0	0	0	0	0	0	3	9	0	0	2	3	ديالى	
33	49	0	0	0	0	5	5	2	3	0	3	0	1	0	0	7	10	2	2	6	12	0	0	11	13	صلاح الدين	
24	42	0	1	0	0	9	10	3	4	4	6	0	0	0	0	2	6	0	1	2	8	2	2	2	4	كركوك	
48	92	1	5	0	0	3	6	5	9	1	4	2	6	0	1	4	7	9	17	7	19	1	3	15	15	نينوى	
392	511	8	13	8	10	140	146	35	45	38	56	10	18	0	1	19	34	34	44	56	93	4	6	40	45	الإجمالي الكلية	

القسم الثاني

مشاريع المنح والقروض التي يعمل الصندوق كمشرف ومنسق لها

عدد المشاريع المخطط لها والمنفذة والمنجزة والمستمرة						
نسبة المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المستمرة	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص / دولار	نوع التمويل
74.60%	37	<u>98</u>	<u>137</u>	<u>137</u>	\$350,000,000	قرض البنك الدولي الطارئ- EODP
-	-	-	-	<u>~140</u>	\$400,000,000	قرض البنك الدولي الطارئ-الإضافي EODP
-	-	-	<u>9</u>	<u>~46</u>	\$550,000,000	القرض الألماني - GFCI
			-	<u>10</u>	\$458,000,000	المنحة التشيكية
100%	0	<u>118</u>	<u>118</u>	<u>118</u>	\$9,000,000	المنحة الصينية (118) آلية
-	-	-	-	<u>51</u>	\$100,000,000	المنحة الكويتية

ملخص بأعداد مشاريع المنح والقرض - التي يعمل الصندوق الأعمار كمشرف ومنسق لها / حسب المحافظات والقطاعات

المجموع	القطاعات																												المحافظة
	الشباب والرياضة		المباني الحكومية		الموارد المائية		الماء		الكهرباء		الطرق والجسور		الصحة		الزراعة		الداخلية		التعليم العالي		التربية		التجارة		البلديات				
	مجموع المنجز	المخطط المنجز	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	
57	121	0	0	0	0	0	4	0	1	9	20	5	12	0	15	0	3	0	0	0	1	0	5	0	0	43	60	الأنبار	
4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	شمال بابل	
8	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	7	7	حزام بغداد	
45	73	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	9	12	0	8	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	25	38	ديالى	
51	118	0	1	0	0	0	6	0	1	16	24	6	11	0	20	0	2	0	0	0	1	0	3	0	0	29	49	صلاح الدين	
9	39	0	0	0	0	0	3	0	0	0	7	0	1	0	7	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	9	18	كركوك	
42	140	0	0	0	0	0	1	0	0	3	29	3	13	0	10	0	2	0	0	0	1	0	9	0	0	36	75	نينوى	
216	512	0	1	0	0	0	14	0	3	39	91	24	52	0	62	0	8	0	0	0	4	0	26	0	0	153	251	المجموع	

ملاحظة :- حقول المشاريع المنجزة تشمل (البنك الدولي المرحلة الاولى + المنحة الصينية)

جدول يمثل اعداد مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات لعام 2016 / منجزة

الإجمالي الكلي	القطاعات											المحافظات
	الموارد المائية	المحافظة	الماء	الكهرباء	القضاء	الصحة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة	البلديات	المحافظات
113	4	2	78	1	1	5	3	18			1	الانبار
13			13									بابل
6				6								بغداد
4							4					صلاح الدين
3			1				2					كركوك
11			2	2		2			2	1	2	نينوى
2				2								عقود محولات وقابلات لجميع المحافظات
152	4	2	94	11	1	7	9	18	2	1	3	الإجمالي الكلي

جدول يمثل توزيع مبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية على المحافظات والقطاعات لعام 2016 / منجزة

الإجمالي الكلي	القطاعات											المحافظات
	الموارد المائية	المحافظة	الماء	الكهرباء	القضاء	الصحة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة	البلديات	
9,306,587,480	328,310,000	199,349,990	6,248,522,000	93,306,000	79,550,000	499,601,000	169,248,000	1,621,700,490			67,000,000	الانبار
1,083,000,000			1,083,000,000									بابل
599,591,000				599,591,000								بغداد
263,340,000							263,340,000					صلاح الدين
285,023,500			95,000,000				190,023,500					كركوك
542,971,250			121,000,000	39,078,500		27,000,000			63,142,750	98,000,000	194,750,000	نينوى
7,703,490,000				7,703,490,000								عقود محولات وقابلوات لجميع المحافظات
19,784,003,230	328,310,000	199,349,990	7,547,522,000	8,435,465,500	79,550,000	526,601,000	622,611,500	1,621,700,490	63,142,750	98,000,000	261,750,000	الإجمالي الكلي

جدول يمثل اعداد مشاريع الصندوق على الموازنة الفدرالية حسب المحافظات و القطاعات ونوع التمويل لعام 2017

المجموع		دوائر حكومية		قطاع الموارد مانية		قطاع الطرق والجسور		قطاع الماء		قطاع الكهرباء		قطاع الداخلية		قطاع التعليم العالي		قطاع التربية		قطاع البلديات		المحافظة
		المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	
30	33	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	9	12	4	4	12	12	نينوى
15	15															4	4	11	11	استثماري
15	18									1	1	4	4	9	12			1	1	تشغيلي
11	11	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	0	0	0	0	2	2	2	2	كركوك
2	2															2	2			استثماري
9	9					1	1	3	3	3	3							2	2	تشغيلي
26	27	0	0	0	0	0	0	5	5	2	2	2	2	2	2	6	6	9	10	صلاح الدين
10	10									1	1			2	2	6	6	1	1	استثماري
16	17							5	5	1	1	2	2					8	9	تشغيلي
19	20	0	0	0	0	12	12	3	3	1	1	0	0	0	0	2	3	1	1	ديالى
15	16					12	12			1	1					2	3			استثماري
4	4							3	3									1	1	تشغيلي
6	7	0	0	0	0	2	2	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	بابل
0	1										1									استثماري
6	6					2	2	4	4											تشغيلي
49	52	1	1	3	5	3	3	2	2	2	3	1	1	3	3	28	28	6	6	الانبار
29	31				2	1	1									28	28			استثماري
20	21	1	1	3	3	2	2	2	2	2	3	1	1	3	3			6	6	تشغيلي
13	13	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	7	7	0	0	بغداد
8	8			1	1											7	7			استثماري
5	5	1	1			1	1	1	1	2	2									تشغيلي
154	163	3	3	7	11	37	37	35	35	20	24	14	14	28	34	91	93	60	62	المجموع الكلي

جدول يمثل توزيع مبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفدرالية على المحافظات و القطاعات لعام 2017

المجموع	دوائر حكومية	قطاع الموارد مائية	قطاع الطرق والجسور	قطاع الماء	قطاع الكهرباء	قطاع الداخلية	قطاع التعليم عالي	قطاع التربية	قطاع البلديات	المحافظة
16,583,191,450					731,600,000	519,926,500	9,418,039,550	2,885,667,900	3,027,957,500	نينوى
2,908,337,000			63,200,000	196,481,000	1,842,734,000			616,582,000	189,340,000	كركوك
12,547,743,900				1,713,600,000	1,628,400,000	779,982,000	1,214,602,000	3,491,996,900	3,719,163,000	صلاح الدين
6,825,722,350			4,196,530,750	385,400,000	111,220,000			2,025,821,600	106,750,000	ديالى
1,964,072,520			845,664,520	298,620,000	819,788,000					بابل
50,522,074,002	99750000	15612422000	2,507,415,000	136,800,000	3,614,782,980	1052385000	621812300	21,853,665,597	5,023,041,125	الانبار
6,193,070,280	100,000,000	899,346,750	88,225,000	284,350,000	694,443,370			4,126,705,160		بغداد
97,544,211,502	199,750,000	16,511,768,750	7,701,035,270	3,015,251,000	9,442,968,350	2,352,293,500	11,254,453,850	35,000,439,157	12,066,251,625	المجموع

جدول يمثل مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات لعام 2018

المجموع		القطاعات																				المحافظات		
		دوائر حكومية		الماء والمجاري		الكهرباء		الطرق والجسور		الصحة		الزراعة		الداخلية		التعليم العالي		التربية		التجارة			البلدية و البلديات	
المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	نوع التمويل
36	51	0	0	15	16	9	10	3	5	4	4	0	0	0	5	2	3	2	7	1	1	0	0	الانبار
4	10							1	3	3	3				4									استثماري
32	41			15	16	9	10	2	2	1	1				1	2	3	2	7	1	1			تشغيلي
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	شمال بابل
0	1								1															استثماري
16	18	2	2	4	4	2	2	1	1	1	1	0	0	2	2	0	0	1	3	0	0	3	3	حزام بغداد
0	2																		2					استثماري
16	16	2	2	4	4	2	2	1	1	1	1			2	2			1	1			3	3	تشغيلي
19	34	0	0	3	4	2	3	11	18	1	1	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	1	2	ديالى
10	16					1	2	9	12										2					استثماري
9	18			3	4	1	1	2	6	1	1							1	4			1	2	تشغيلي
3	18	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	1	4	0	0	0	6	0	0	2	3	صلاح الدين
0	8								2										6					استثماري
3	10					1		1	1		1			1	4							2	3	تشغيلي
10	28	0	1	5	6	0	1	3	5	0	0	0	0	0	4	0	1	0	6	2	2	0	2	كركوك
4	16		1	1	2		1	3	4						1		1		6					استثماري
6	12			4	4				1						3					2	2		2	تشغيلي
7	48	1	5	1	4	2	6	1	4	0	4	0	1	0	3	0	5	1	13	0	2	1	1	نينوى
2	26		1			1	5		2		1				1		3		10		2	1	1	استثماري
5	22	1	4	1	4	1	1	1	2		3		1		2		2	1	3					تشغيلي
91	198	3	8	28	34	15	23	19	37	6	11	0	1	3	18	2	9	5	41	3	5	7	11	الإجمالي الكلية

جدول يمثل توزيع مبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية على المحافظات والقطاعات لعام 2018

الإجمالي الكلي	المحافظات											
	دوائر حكومية	الماء والمجاري	الكهرباء	الطرق والجسور	الصحة	الزراعة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة	البلدية و البلديات	نوع التمويل
19,120,011,200		4,021,707,200	2,658,704,000	3,013,384,000	1,242,514,000		2,345,197,800	1,141,948,900	4,089,139,300	607,416,000		الانبار
5,040,706,600				2,403,008,000	1,150,824,000		1,486,874,600					استثماري
14,079,304,600		4,021,707,200	2,658,704,000	610,376,000	91,690,000		858,323,200	1,141,948,900	4,089,139,300	607,416,000		تشغيلي
2,000,259,000				2,000,259,000								بابل
2,000,259,000				2,000,259,000								استثماري
5,194,149,600	300,000,000	817,903,100	1,016,109,900	205,980,000	19,750,000		400,036,000		1,753,555,600	680,815,000		بغداد
1,680,355,600									1,680,355,600			استثماري
3,513,794,000	300,000,000	817,903,100	1,016,109,900	205,980,000	19,750,000		400,036,000		73,200,000	680,815,000		تشغيلي
13,705,639,215		1,107,700,700	1,321,577,000	7,961,501,514	96,755,000				2,379,179,500	838,925,501		ديالى
7,512,775,500			742,572,500	5,803,121,500					967,081,500			استثماري
6,192,863,715		1,107,700,700	579,004,500	2,158,380,014	96,755,000				1,412,098,000	838,925,501		تشغيلي
14,564,300,850			1,017,611,200	4,985,812,000	284,192,000		2,579,462,400		4,281,372,250	1,415,851,000		صلاح الدين
9,827,395,450			1,017,611,200	4,528,412,000					4,281,372,250			استثماري
4,736,905,400				457,400,000	284,192,000		2,579,462,400			1,415,851,000		تشغيلي
11,219,925,305	362,528,000	2,248,862,005	467,952,500	2,278,434,000			1,678,050,400	864,570,000	2,398,886,000	576,140,000	344,502,400	كركوك
7,652,564,901	362,528,000	970,112,001	467,952,500	2,207,634,000			380,882,400	864,570,000	2,398,886,000			استثماري
3,567,360,404		1,278,750,004		70,800,000			1,297,168,000			576,140,000	344,502,400	تشغيلي
43,318,433,950	2,054,444,000	1,479,428,750	13,159,580,000	3,300,644,000	6,263,047,000	232,313,000	2,317,910,600	3,348,214,600	5,944,624,000	5,029,748,000	188,480,000	نينوى
30,864,723,800	589,560,000		11,741,080,000	2,331,764,000	1,038,672,000		1,961,520,000	2,600,567,000	5,383,332,800	5,029,748,000	188,480,000	استثماري
12,453,710,150	1,464,884,000	1,479,428,750	1,418,500,000	968,880,000	5,224,375,000	232,313,000	356,390,600	747,647,600	561,291,200			تشغيلي
109,122,719,120	2,716,972,000	9,675,601,755	19,641,534,600	23,746,014,514	7,906,258,000	232,313,000	9,320,657,200	5,354,733,500	20,846,756,650	6,213,304,000	3,468,573,901	الإجمالي الكلي

**مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية
حسب المحافظات لعام 2016**

مشروع محافظة الانبار

الانبار



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة الانبار

ت	القطاع	اسم المشروع	القضاء / الناحية	المبلغ
1	الماء	صيانة مجمع ماء الجبور / القرية العصرية سعة 100م ³ / ساعة + تأهيل مجمع زويغير سعة 200م ³ / ساعة	الرمادي	58,320,000
2	الماء	صيانة مجمع ماء زويغير الثاني سعة 200م ³ في الرمادي	الرمادي	69,525,000
3	الماء	صيانة مجمع ماء البوعيثة الخامس سعة 100م ³ + تأهيل مجمع ماء البوعيثة الرابع سعة 50م ³ / ساعة	الرمادي	55,534,000
4	الماء	تجهيز مولدة 150 كي في اي + مولدة 250 كي في اي لمشروع ماء تل اسود (عبد مخيلف) وتل اسود (عبد مناور)	هيت / الفرات	86,000,000
5	الماء	صيانة مجمع ماء الحامضية القديم سعة 200م ³ / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	96,515,000
6	الماء	صيانة مجمع العدنان في قضاء الرمادي	الرمادي	76,570,000
7	الماء	تجهيز مولدة كهرباء 250 كي في اي لمجمع اليونسييف + تجهيز مولدة كهرباء لمجمع ماء زنكورة الثالث	الرمادي	90,000,000
8	الماء	تجهيز مولدة 250 كي في اي مع هيكل السحب لمجمع العدنان في قضاء الرمادي	الرمادي	66,000,000
9	الماء	صيانة مجمع ماء البوغضبان + تجهيز مولدة ببيركنز 250 كي في اي	الرمادي	81,167,000
10	الماء	صيانة ماء طوي البوجراد	الرمادي	72,500,000
11	الماء	صيانة مجمع ابو طيبان / صعب الحردان القصر سعة 200م ³ / ساعة + تأهيل مجمع ماء زنكورة الاول سعة 200م ³ / ساعة	الرمادي	75,850,000
12	الماء	صيانة مجمع ماء البوعبيد الجديد سعة 200م ³ / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	84,960,000
13	الماء	صيانة مجمع ماء البوكاطع + تجهيز مولدة 250 كي في اي لمجمع ماء البوذيات الحويجة	الرمادي	93,000,000
14	الماء	صيانة مجمع ماء البوعبيد (طالب عفات) + تأهيل مجمع ماء البوذيات القصر سعة 200م ³ / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	73,280,000
15	الماء	تجهيز مولدة قدرة 250 كي في اي لمجمع ماء المداليس + تجهيز مولدة 250 كي في اي في البوذيات الجنابيين	الرمادي	90,000,000
16	الماء	صيانة مجمع ماء الحامضية الجديد سعة 200م ³ / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	42,890,000
17	الماء	استبدال الاتابيب الواقعة في منطقة الحوز شارع النهر الشارع الرابط بين جسر الحوز ومجسر الزيوت الجانب الايمن في الرمادي	الرمادي	68,495,000
18	الماء	استبدال الاتابيب الواقعة في منطقة الحوز شارع النهر الشارع الرابط بين جسر الحوز ومجسر الزيوت الجانب الايسر في الرمادي	الرمادي	66,295,000
19	الماء	صيانة مجمعات اليونسييف / الدوار في قضاء الرمادي	الرمادي	72,960,000
20	البلديات	تأهيل الشارع الرابط بين شارع البوذيات وجسر الحوز في الرمادي	الرمادي	67,000,000

82,778,000	الرمادي	تاهيل الجناح الاداري والواجهة الخارجية لمديرية جنسية محافظة الانبار	الداخلية	21
40,950,000	الرمادي	ترميم وتاهيل جنسية واحوال الرمادي	الداخلية	22
82,120,000	الرمادي	صيانة مجمع ماء الدوار / عبد الصالح	الماء	23
75,493,000	الرمادي	صيانة مجمع ماء البو شعبان قرب مدرسة سمية + صيانة مجمع ماء البو شعبان 2	الماء	24
51,800,000	الرمادي	اىصال التيار الكهربائي المغذي لمحطات ضخ الماء في الموقع الجامعي لجامعة الانبار	الماء	25
99,325,000	الرمادي	تاهيل مبنى كلية الادارة والاقتصاد - القاعات الدراسية لجامعة الانبار	التعليم العالي	26
45,800,000	الرمادي	تاهيل محطة ري البوذباب المساعدة (البوهايس)	الموارد المائية	27
86,810,000	الرمادي	تجهيز محولات KVA 630 في محطة ري القطنية المساعدة ومحطة ري بزايذ ابو طيبان	الموارد المائية	28
97,235,000	الرمادي	صيانة وتاهيل محطة تصفية وتعقيم ماء الجامعة ومحطات الضخ لجامعة الانبار	التعليم العالي	29
87,740,000	الرمادي	تاهيل مبنى شؤون الطلبة لجامعة الانبار	التعليم العالي	30
99,999,990	الرمادي	اعادة تاهيل بناية الاقسام الادارية في المحافظة	التعليم العالي	31
45,520,000	الرمادي	اعادة تاهيل بناية دائرة حماية المنشاة في الرمادي	الداخلية	32
99,350,000	الرمادي	اعادة تاهيل بناية الاشراف الهندسي	المحافظة	33
83,660,000	الرمادي	صيانة مجمع ماء البوعيثة الاول بسعة 200م ³ في قضاء الرمادي	الماء	34
99,500,000	الرمادي	تاهيل القناة الناقلة لشارع اربعين في الرمادي	الموارد المائية	35
99,999,990	الرمادي	اعادة تاهيل بناية الاقسام الفنية في المحافظة	المحافظة	36
96,200,000	الرمادي	تاهيل المحطة المساعدة الغربية لمحطة ري البوذباب	الموارد المائية	37
19,638,000	الفلوجة	صيانة مجمع ماء البو كريطي	الماء	38
44,930,000	الفلوجة	تجهيز ونصب وتشغيل مولد 250 كي في اي لمجمع ماء ابو سديرة القديم	الماء	39
96,500,000	الفلوجة	تجهيز مواد لصيانة مشاريع وشبكات للمجمعات المائية في الفلوجة	الماء	40

58,405,000	هيئة / الفرات	صيانة مجمع ماء جبيل سعة 200م ³ /ساعة	الماء	41
94,650,000	الفلوجة	صيانة مجمع ماء البوعبد الحسن في الفلوجة	الماء	42
78,500,000	الفلوجة	تاهيل مجمع ماء الشهداء القديم سعة 200م ² /ساعة في قضاء الفلوجة	الماء	43
73,000,000	الفلوجة	صيانة مجمع ماء الفلاحات وصبيحات القديم والهيثاويين في الفلوجة	الماء	44
86,950,000	الفلوجة	صيانة مجمع الفلاحات الجفة في قضاء الفلوجة	الماء	45
97,760,000	الفلوجة	تاهيل مجمع ماء البوخميس سعة 200م ³ /ساعة+تاهيل مجمع ماء البويوسف	الماء	46
67,195,000	الفلوجة	صيانة مجمعات ماء البوعزام والفلاحات الجفة والبوزياب في قضاء الفلوجة	الماء	47
75,180,000	الفلوجة	صيانة مجمع ماء البوشمخان الحلابسة والبشويش الحلابسة والشيخ نعيم والبوعلوان 1 في الفلوجة	الماء	48
99,900,000	الفلوجة	تجهيز الاجهزة الطبية لكلية الطب والطب البيطري لجامعة الفلوجة	التعليم العالي	49
79,550,000	الفلوجة	تأهيل وترميم بناية محكمة الفلوجة	القضاء	50
90,000,000	الفلوجة	تجهيز مولدات عدد (2) اثنان لكلية الطب والطب البيطري جامعة الفلوجة	التعليم العالي	51
55,905,000	هيئة	مجمع ماء تل اسود المكاشير وعودة الرجب	الماء	52
43,200,000	هيئة	مد الخط الناقل لاهياء الحلبسية و فرات وسيطرة ماجد في هيئة	الماء	53
84,505,000	هيئة	اعادة تأهيل وصيانة مجمع ماء المحمدي القديم سعة 200م ³ /ساعة	الماء	54
93,306,000	هيئة	تجهيز وتنصيب مواد صيانة الكهرباء لناحية المحمدي مركز المدينة	الكهرباء	55
67,000,000	هيئة / الفرات	صيانة مجمع ماء البومانع سعة 200م ³ /ساعة	الماء	56
58,405,000	هيئة	صيانة مجمع ماء حي البكر الشرقي سعة 200م ³	الماء	57
42,000,000	هيئة	تاهيل مشروع ماء المؤسسة	الماء	58
97,500,000	هيئة	تاهيل مشروع ماء قرى هيئة	الماء	59
90,350,000	هيئة / الفرات	صيانة مجمع ماء زوية الشرقية + مجمع ماء بكرة البو غانم	الماء	60

84,810,000	هيت	صيانة مولدة مشروع ماء هيت- كيبسة الموحد قدرة 1100 كي في اي	الماء	61
92,620,000	هيت	تجهيز مواد صيانة شبكات لمركز ماء هيت	الماء	62
99,080,000	هيت / الفرات	صيانة مجمع ماء تل اسود (مخلف المحل) + صيانة مجمع ماء تل اسود (عبد مناور)	الماء	63
95,700,000	هيت	صيانة المجمعات المائية في ناحية البغدادي + تجهيز ونصب مضخة قدرة 250 م ³ /ساعة * 80م ومد خط ناقل قطر 160 ملم لمنطقة شرق البغدادي قرب مدرسة الثواب في قضاء هيت	الماء	64
99,877,000	هيت	اعادة تأهيل ردهات الاطفال في مستشفى هيت	الصحة	65
99,928,000	هيت	اعادة تأهيل صالة العمليات الكبرى في مستشفى هيت العام	الصحة	66
99,972,000	هيت	اعادة تأهيل جناح الطوارئ في مستشفى هيت العام	الصحة	67
99,947,000	هيت	اعادة تأهيل صالة عمليات الولادة والاطفال في مستشفى هيت العام	الصحة	68
99,877,000	هيت	اعادة تأهيل ردهات الرجالية في مستشفى هيت العام	الصحة	69
96,500,000	هيت	تاهيل مشروع ماء هيت /كيبسة الموحد سعة 1000م ³ /ساعة	الماء	70
86,240,000	هيت / الفرات	صيانة ماء الغرير سعة 50م ³ /ساعة	الماء	71
84,769,000	هيت	صيانة واعادة تأهيل بناية كلية العلوم التطبيقية / جامعة الانبار في هيت	التعليم العالي	72
93,210,000	هيت	اعادة تأهيل وصيانة مجمع ماء المحمدي الجديد سعة 200م ³ / ساعة	الماء	73
97,000,000	حديثة	تجهيز مضخات ومحركات لمشاريع ومجمعات حديثة ونواحيها	الماء	74
97,500,000	حديثة	تجهيز مضخات ومحركات لمحطة توزيع مشروع حديثة / حقلانية الموحد	الماء	75
93,800,000	حديثة	تاهيل مشروع ماء البوحيات الشرقي سعة 50م ³ /ساعة	الماء	76
75,780,000	حديثة	تاهيل مشروع ماء البوحيات الوسطي بطاقة 50م ³ /ساعة	الماء	77
80,750,000	حديثة	تاهيل مجمع ماء الخسفة	الماء	78
80,650,000	حديثة	اعادة تأهيل مجمع ماء البوحيات الغربي 50م ³ /ساعة	الماء	79
76,250,000	حديثة	تاهيل مجمع ماء الشاعي سعة 100م ³ /ساعة	الماء	80

95,445,000	حديثة	تأهيل بناية القاعات الدراسية لكلية التربية الاساسية حديثة / الخدمات والتابعة لجامعة الانبار	التعليم العالي	81
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء البو تايه سعة 200م ³ في الكرمة	الماء	82
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء اللهب 2	الماء	83
98,260,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء اللهب 1 بسعة 100م ³	الماء	84
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء الغرير سعة 200م ³ في الكرمة	الماء	85
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء المصالحة سعة 200م ³	الماء	86
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء ذراع دجلة سعة 200م ³	الماء	87
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء البودخيل	الماء	88
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء بني زيد الاول	الماء	89
94,750,000	الخالدية	صيانة مجمع البوبالي رقم 3 مع تجهيز مولدة 250 كي في اي في قضاء الرمادي	الماء	90
95,650,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء ابو زعيان في الخالدية	الماء	91
99,800,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء البوشهاب + تجهيز مولدة بيركنز 250 كي في اي	الماء	92
91,750,000	الخالدية	تجهيز مولدة كهرباء نوع بيركنز 500 كي في اي وبورد كهربائي لمشروع قرى الحباتية في قضاء الخالدية	الماء	93
96,700,000	الخالدية	صيانة مولدة 250 كي في اي لمجمع ماء البو شعبان 1 + صيانة مجمع ماء البو عبد المحسن + تجهيز ونصب مولدة 250 كي في اي	الماء	94
90,400,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء البوبالي الاول في الخالدية	الماء	95
99,700,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء الكرابلة+تجهيز ونصب مولدة بيركنز 250 كي في اي	الماء	96
63,520,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء سن الذبان سعة 200م ³ /ساعة	الماء	97
87,200,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء الملاحمة + تجهيز ونصب مولدة بيركنز 250 كي في اي	الماء	98
93,300,000	الخالدية	صيانة مجمع البوبالي الثاني في الخالدية	الماء	99
95,000,000	الرطوبة	تجهيز طواقم ضخ عمودية خاصة بالابار لمركز ماء الرطوبة والوليد ومركز ماء النخيب ومركز ماء عرعر	الماء	100

84,000,000	الرطوبة	صيانة الفلاتر في المحطة الرئيسية لمشروع ماء الصحراء الغربية في الرطوبة	الماء	101
53,800,000	طربيل	تأهيل وجدة التحلية رقم (3) في مركز ماء طربيل الرئيسي	الماء	102
96,500,000	طربيل	استخراج البئر الساقط في منفذ طربيل الحدودي وبعمق 450 متر	الماء	103
82,175,000	الصقلاوية	تأهيل بناية الاقسام العلمية ومختبرات القسم المدني في المعهد التقني	التعليم العالي	104
88,700,000	الصقلاوية	تجهيز المتطلبات المهمة لضخ وتصفية وتوزيع الماء في المعهد التقني	التعليم العالي	105
90,334,000	الصقلاوية	انشاء مجموعتي حمامات للطلبة + انشاء ملحق قاعة دراسية سندويج بئل في المعهد التقني	التعليم العالي	106
87,455,000	الصقلاوية	تأهيل قسم الكهرباء والقسم المدني في المعهد التقني	التعليم العالي	107
70,900,000	الصقلاوية	اعادة ربط الكهرباء الوطنية لموقع المعهد التقني	التعليم العالي	108
97,060,000	الصقلاوية	توليد وايصال وتوزيع الكهرباء لموقع المعهد التقني	التعليم العالي	109
93,180,000	الصقلاوية	انشاء مسقف استراحة الطلاب في المعهد التقني	التعليم العالي	110
66,622,500	الصقلاوية	تأهيل وانشاء قاعة دراسية مرسوم المعهد التقني	التعليم العالي	111
93,860,000	الصقلاوية	عزل المواقع الغير مؤمنة في المعهد + تأهيل بناية قاعات قسم الكهرباء والورش الهندسية في المعهد التقني	التعليم العالي	112
97,000,000	الصقلاوية	تجهيز الاثاث المدرسي المطلوب لابنية موقع المعهد التقني	التعليم العالي	113
9,306,587,480		المجموع		

مشاريع محافظة نينوى



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة نينوى

ت	اسم المشروع	القضاء	القطاع	المبلغ
1	اعمار البئر الارتوازي في ناحية الشمال	سنجار	الماء	22,000,000
2	اعمار مدرسة (برج ابة لة ك) في ناحية شنكال	سنجار	التربية	45,886,000
3	اعمار مستوصف في مركز ناحية الشمال	سنجار	الصحة	8,000,000
4	اعمار القنطرة الصندوقية في وادي سنجار	سنجار	البلديات	95,000,000
5	اعمار مستوصف مجمع دوكري في ناحية الشمال	سنجار	الصحة	19,000,000
6	اعمار سايلو سنجار	سنجار	التجارة	98,000,000
7	محطة كهرباء الشمال في ناحية الشمال	سنجار	الكهرباء	19,078,500
8	شراء اليات تخصصية لبلدية سنجار	سنجار	البلديات	99,750,000
9	اعمار مركز تشغيل ماء سنجار	سنجار	الماء	99,000,000
10	بنابة دائرة كهرباء الشمال في ناحية الشمال	سنجار	الكهرباء	20,000,000
11	اعمار مدرسة كوهبةل في ناحية الشمال	سنجار	التربية	17,256,750
	المجموع			542,971,250

مشاريع محافظة صلاح الدين



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة صلاح الدين

ت	القطاع	اسم المشروع	القضاء	المبلغ
1	الداخلية	تأهيل وصيانة قسم شرطة الاسحافي ومركز شرطة السجلة	الدجيل	79,120,000
2	الداخلية	اعادة تأهيل وصيانة مقر فوج طوارئ الدجيل	الدجيل	61,820,000
3	الداخلية	اعادة تأهيل وصيانة قسم الكلاب البوليسية وقسم مكافحة الاجرام وقسم شؤون الميرة	تكريت	56,200,000
4	الداخلية	اعادة تأهيل وصيانة قسم الادلة الجنائية ومركز شرطة تكريت	تكريت	66,200,000
		المجموع		263,340,000

مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة كركوك

المبلغ	اسم المنطقة	اسم المشروع	القطاع	ت
92,310,500	تازة	اعمار مركز شرطة البشير في ناحية تازة	الداخلية	1
95,000,000	تازة	اعمار شبكة ماء البشير في ناحية تازة	الماء	2
97,713,000	الملتقى	اعمار مركز شرطة ناحية الملتقى	الداخلية	3
285,023,500	المجموع			

مشاريع محافظة بابل

Babil Governorate projects

المسيب

المحلويل

الحلة

الهاشمية



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة بابل

ت	القطاع	اسم المشروع	اسم المنطقة	المبلغ
1	الماء	تأهيل مجمعات ماء الدوريين 14م ³ / ساعة	الاسكندرية	70,500,000
2	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الغربية)	الاسكندرية	82,500,000
3	الماء	تأهيل مجمع ماء الشيحة 14م ³ / ساعة	الاسكندرية	76,500,000
4	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الشرقية)	الاسكندرية	79,200,000
5	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الشمالية)	الاسكندرية	88,000,000
6	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الجنوبية)	الاسكندرية	80,300,000
7	الماء	تأهيل مجمعات ماء الحويجة 14م ³ / ساعة	الاسكندرية	70,500,000
8	الماء	تأهيل مجمع ماء ابو شمسي سعة 200م ³ / ساعة	الاسكندرية	92,000,000
9	الماء	تأهيل مجمع ماء الخضر سعة 200م ³ / ساعة	الاسكندرية	92,000,000
10	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (3) سعة 50م ³ / ساعة	جرف النصر	88,000,000
11	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (2) سعة 50م ³ / ساعة	جرف النصر	88,000,000
12	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (4) سعة 50م ³ / ساعة	جرف النصر	88,000,000
13	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (1) سعة 50م ³ / ساعة	جرف النصر	87,500,000
المجموع				1,083,000,000

محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

Baghdad Governorate Projects

الانبار



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / حزام بغداد

ت	القطاع	اسم المشروع	اسم المنطقة	المبلغ
1	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية السعدان (1)	النصر والسلام	99,962,500
2	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية السعدان (2)	النصر والسلام	99,956,000
3	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العجاج	النصر والسلام	99,881,000
4	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العناز (1)	النصر والسلام	99,950,500
5	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العناز (2)	النصر والسلام	99,915,500
6	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية عودة الشكر	النصر والسلام	99,925,500
المجموع				599,591,000

**مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية
حسب المحافظات لعام 2017**

مشاريع محافظة نينوى



مشاريع محافظة نينوى على الموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة الشورة الابتدائية 12 صف/ القيارة / نينوى	التربية	35° 59'43.8"N 43° 13'18.5"E	600	38+170	715,512,000	716,492,000	2017-08-02	2017-08-16	7/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	اعدادية القيارة للبنين 12 صف / القيارة / نينوى	التربية	35° 47'23.1"N 43° 17'23.4"E	600	28+180	687,989,900	684,563,900	2017-08-02	2017-08-16	5/12/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	ثانوية الشورة للبنين 12 صف/ القيارة / نينوى	التربية	36° 00'03.8"N 43° 13'36.0"E	600	18+170	750,236,000	748,708,000	2017-08-02	2017-08-16	18/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة اجحلة الابتدائية للبنين 12 صف/ القيارة/ نينوى	التربية	35° 42'31.9"N 43° 17'58.5"E	600	28+160	737,710,000	735,904,000	2017-08-02	2017-08-13	5/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	صب ارسفة وبناء القوالب الجانبية للشارع الرئيسي / حي النصر وبربوش /مركز قضاء سنجار/نينوى	البلديات			60	188,480,000	188,480,000	2018-05-06	25L6L2016	16/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	تأهيل شوارع وصيغ القوالب في الشورة	البلديات												
7	إعادة تأهيل وأكساء شوارع رئيسية في حمام العليل	البلديات												
8	كشف أعمال تأهيل و أكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية القيارة	البلديات												
9	تأهيل وإكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية القيارة	البلديات		400,000	28+70	1,527,640,000	1,570,680,000	2017-11-05	2017-11-20	16/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	إعادة تأهيل المدخل الجنوبي للقصة (شارع الصلاحية) مع تحويل العارض (أنبوب الماء) الموجود في وسط الشارع في ناحية حمام العليل/ المرحلة الاولى	البلديات												
11	إكساء شوارع داخل ناحية الشورة	البلديات												
12	إكساء طرق داخلية في ناحية بعشيقه													
13	صيانة شوارع متفرقة في ناحية بعشيقه													
14	بناء القوالب الجانبية وصب الارصفة والقسالس في برطلة													
15	تبليط مسارات شبكة مجاري في برطلة													
	المجموع					5,638,612,900	5,553,547,900							

مشاريع محافظة نينوى على الموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	صيانة وتأهيل ابنية كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36 22.897'N 43 8.592'E	2000	45+140	900,000,000	985,290,000	2017-08-02	2017-08-20		100%	100%	0%	انجاز العمل
2	تأهيل شبكات الكهرباء / الموصل	الكهرباء	36 21 34 05N 43 01 34 28E	25,000	30	731,600,000	731,600,000	2017-10-18	منجز		100%	100%	0%	انجاز العمل
3	تأهيل وصيانة طرق في قضاء الحمدانية وناحية النمرود	البلديات		85,000	4+50	275,012,500	275,012,500	2017-11-02	2017-11-16	29/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	تأهيل بناية مركز شرطة الوقاص	الداخلية		150000	12+50	303428000	327096500	2017-11-20	2017-12-04		100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تأهيل بناية مركز شرطة اليرموك	الداخلية		200000	12+50	175316000	192830000	2017-11-21	2017-12-03	2/11/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	تأهيل بناية مركز الدفاع المدني الجزائر	الداخلية		4000	40+154	1,414,930,000	1,539,455,000	2017-08-02	2017-10-08	16/5/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	تأهيل ابنية كلية الآداب / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36° 23.126'N 43° 8.471'E	4000	34+140	1,627,784,000	1,785,149,550	2017-09-25	2017-10-03	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تأهيل ابنية كلية التقانات وعلوم البيئة / جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي	36° 22.574'N 43° 8.948'E	4000	36+140	1,627,784,000	1,785,149,550	2017-09-25	2017-10-03	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	تأهيل ابنية كلية التمريض / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36° 22.696'N 43° 8.696'E	4000	28+140	1,464,915,000	1,611,067,000	2017-10-15	2017-10-29	26/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تأهيل ابنية كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36° 23.197'N 43° 8.919'E	2500	28+140	1,464,915,000	1,611,067,000	2017-10-15	2017-10-29	26/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تأهيل ابنية كلية الصيدلة/ جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي	36° 22.491'N 43° 8.637'E	2500	28+140	1,464,915,000	1,611,067,000	2017-10-15	2017-10-29	26/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	تأهيل بناية قسم الاعمار والمشاريع/جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي	36° 22.552'N 43° 8.762'E	4250	45+105	1,624,462,000	1,784,852,000	2017-09-28	2017-10-11	مستمر	100%	97%	3%	تلكو الشركة المنفذة , وتم توجيهه كتاب انذار
13	تأهيل ابنية كلية العلوم/جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36° 22.557'N 43° 8.579'E	4250	45+105	1,624,462,000	1,784,852,000	2017-09-28	2017-10-11	مستمر	100%	97%	3%	تلكو الشركة المنفذة , وتم توجيهه كتاب انذار
14	تأهيل ابنية المراكز البحثية/ جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي		4250	61+110	1,571,950,000	1,712,226,000	2017-10-30	2017-11-14	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
15	تأهيل ابنية كلية التربية / جامعة الموصل	التعليم العالي		4250	61+110	1,571,950,000	1,712,226,000	2017-10-30	2017-11-14	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
16	تأهيل ابنية كلية الهندسة / جامعة الموصل	التعليم العالي		4250	61+110	1,571,950,000	1,712,226,000	2017-10-30	2017-11-14	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
				481000		10089401500	10,944,578,550							




ثانوية الشورة / الشورة / نينوى



اعدادية القيارة / القيارة / نينوى



كلية طب الأسنان / جامعة الموصل / نينوى

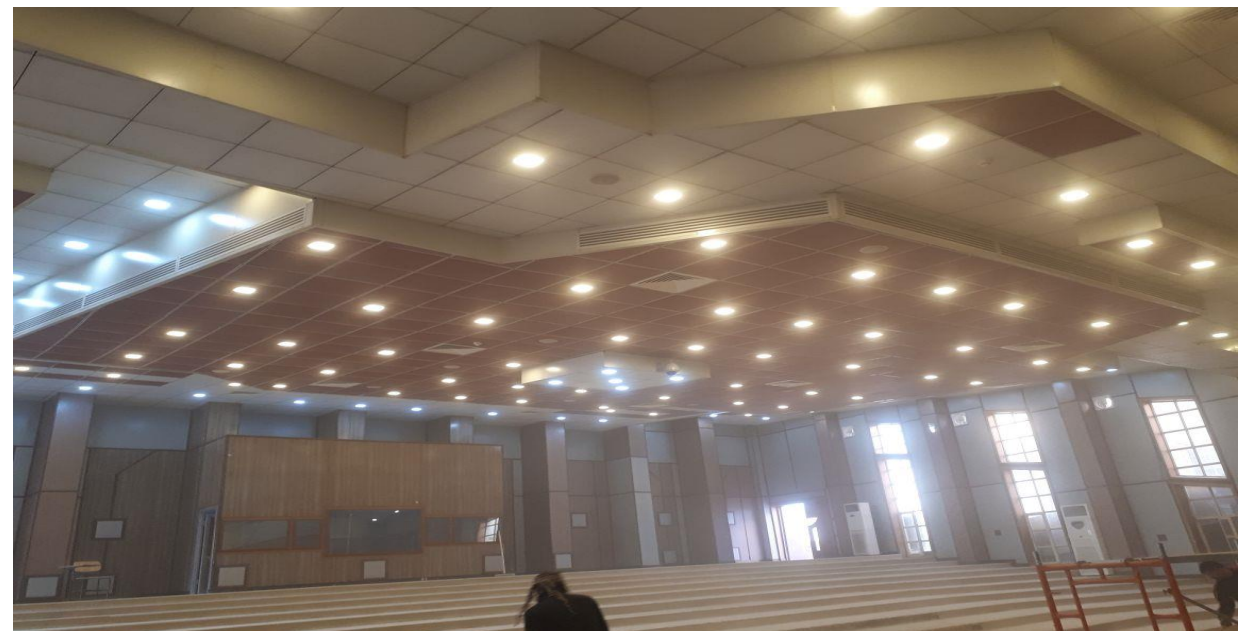

كلية طب الأسنان / جامعة الموصل / نينوى



إعادة تأهيل طرق الحمدانية والنمرود / نينوى





تاهيل وتبليط مسارات شبكة مجاري في برطلة و بعشيقه





كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى



كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى



كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى



كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل / نينوى



44



كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل / نينوى



تجهيز محولات إلى الجانب الأيمن / الموصل

مشروع محافظة الانبار

الانبار



مشاريع محافظة الانبار للموازنة الاستثمارية / الخطة الاستثمارية 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	ثانوية العلا للبنات / 18 صف الرمادي/الانبار	التربية	33 25 13.0N 43 18 28.2E	650	95+210	1,066,033,000	2017-07-23	2017-08-06	18/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	ثانوية الكواكب للبنات /ثانوية/18 صف/الرمادي/الانبار	التربية	33 ° 24 37.3N 43° 16 42.6E	450	80+190	1,070,000,000	2017-07-24	2017-08-09	26/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	ثانوية دار السلام للبنين /ثانوية/18 صف /هيت /الانبار	التربية	33 39 03.0N 42 49 48.3E	650	78+190	1,144,525,000	2017-07-30	2017-08-21	15/5/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة أبو أيوب الانصاري للبنين /ابتدائية/12 صف/الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 23 31.4N 43 52 50.8E	450	177+160	659,631,000	2017-07-30	2017-08-17	2018-07-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	مدرسة صعدة الابتدائية المختلطة الابتدائية 12 صف/الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 33 14.7N 44 06 14.5E	450	166+170	585,985,000	2017-07-31	2017-08-13	18/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	مدرسة الوفاء الابتدائية للبنين 12 صف /الرمادي/ الانبار	التربية	33° 25 50.2N 43° 21 22.0E	450	83+165	598,000,000	2017-08-02	2017-08-15	2018-10-05	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	ثانوية الرشاد للبنين الثانوية 18 صف/الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 23 57.2N 43 36 01.7E	650	96+210	1,093,229,000	2017-08-02	2017-08-17	2/1/2019	100%	100%	0	انجاز العمل
8	مدرسة الافنان الابتدائية للبنين 12 صف /جزيرة الرمادي/ الانبار	التربية	33 28 03.5N 43 18 04.6E	450	153+180	611,468,000	2017-08-02	2017-08-15	2018-01-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	اعدادية حليلة السعدية للبنات 12 صف /الرمادي/ الانبار	التربية	33° 26' 00.0N 43° 22' 05.6E	450	103+180	599,981,000	2017-08-03	2017-08-08	30/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	مدرسة الصمد الابتدائية 12 صف/ هيت/ الانبار	التربية	33 37 55.3N 42 50 26.8E	450	63+170	639,571,000	2017-08-03	2017-08-21	2018-12-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	متوسطة المامون 18 صف /الرمادي/الانبار	التربية	33 25 17.0N 43 19 57.9E	650	29+210	1,266,865,000	2017-08-03	2017-08-15	2018-05-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	مدرسة دجلة الابتدائية للبنين 12 صف/ الرمادي/ الانبار	التربية	33 25 39.2N 43 17 01.6E	450	20+170	592,525,000	2017-08-03	2017-08-16	25/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
13	اشبيلية الابتدائية المختلطة 12 صف /الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 29 46.6N 44 06 14.5E	450	143+160	614,777,000	2017-08-03	2017-08-13	20/12/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
14	مدرسة الخضر الابتدائية 12 صف /الصقلاوية/الفلوجة/الانبار	التربية	33 27 50.4N 43 36 27.3E	450	150+150	573,888,800	2017-08-03	2017-10-25	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
15	مدرسة السلوى الابتدائية 18 صف/ الفلوجة/ الانبار	التربية	33 19 49.2N 43 47 49.5E	650	161+210	1,078,596,000	2017-08-03	2017-08-15	19/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل

انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-05-02	2017-08-09	2017-08-03	631,520,000	93+180	450	33 27 29.1N 43 16 17.7E	التربية	مدرسة ابي ذر الغفاري الابتدائية للبنات 12 صف /جزيرة الرمادي/ الانبار	16
انجاز العمل	0%	100%	100%	20/12/2018	2017-08-23	2017-08-13	595,000,000	134+180	450	33 25 31.6N 43 43 10.7E	التربية	مدرسة المروج الخضراء الابتدائية 12 صف/ الفلوجة/ الانبار	17
انجاز العمل	0%	100%	100%	20/3/2018	2017-09-05	2017-08-13	688,586,000	15+170	450	33 00 16.3N 42 26 13.6E	التربية	مدرسة عامر بن ربيعة 12 صف/ حديثة/ الانبار	18
انجاز العمل	0%	100%	100%	14/7/2018	2017-09-10	2017-08-13	651,962,500	129+170	450	33 26 49.3N 43 44 37.4E	التربية	مدرسة الخالد الابتدائية 12 صف /الفلوجة/ الانبار	19
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-01-07	2017-08-23	2017-08-13	594,113,000	134+180	450	33 26 00.0N 43 22 05.6E	التربية	مدرسة الفتوة الابتدائية للبنين 12 صف/ الرمادي/ الانبار	20
انجاز العمل	4%	96%	100%	23/9/2018	2017-08-23	2017-08-13	575,131,000	101+160	450	33 54 33.0N 42 33 04.6E	التربية	ثانوية جبة للبنين 12 صف / البغدادي/ هيت/ الانبار	21
انجاز العمل	0%	100%	100%	19/8/2018	2017-08-27	2017-08-13	611,635,000	20+170	450	33 24 44.5N 43 18 24.5E	التربية	مدرسة دار العلم الابتدائية 12 صف / الرمادي/ الانبار	22
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-08-20	2017-08-13	669,928,000	114+180	450	33 42 17.7N 43 55 18.8E	التربية	متوسطة خالد بن الوليد 12 صف/ الكرمة/ الفلوجة/ الانبار	23
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-08-27	2017-08-13	672,513,500	145+160	450	33 23 02.4N 43 51 59.1E	التربية	ثانوية الشهابي للبنين 12 صف/ الفلوجة/ الانبار	24
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-09-07	2017-09-06	2017-08-14	577,451,000	20+165	450	33 24 04.0N 43 19 58.1E	التربية	ثانوية الرشيدية للبنين 12 صف /الرمادي/ الانبار	25
انجاز العمل	0%	100%	100%	25/4/2018	2017-09-06	2017-08-15	573,900,500	71+170	450	33 25 54.3N 43 12 40.1E	التربية	مدرسة جنة الماوى الابتدائية للبنين 12 صف /الرمادي/ الانبار	26
انجاز العمل	0%	100%	100%	30/1/2018	2017-08-23	2017-08-23	667,409,500	180	450	33 38 16.8N 42 49 34.1E	التربية	متوسطة الشيماء للبنات 12 صف/ هيت/ الانبار	27
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-10-11	2017-08-24	1,195,056,000	162+180	650	33 24 02.3N 43 42 05.6E	التربية	اعدادية صناعة الصقلاوية 18 صف/ الصقلاوية/الفلوجة/ الانبار	28
	-3%	90%	93%	مستمر	2017-11-19	2017-11-07	7,038,189,000	25+570	10,000,000	33° 26.057'N 43° 15.928'E	موارد مائية	مشروع ناظم الورار	29
الانحراف بسبب تأخر وصول المعدات الاستيرادية من تركيا .	-13%	82%	95%	مستمر	2017-11-19	2017-11-07	6,911,239,000	25+570	10,000,000	33° 26.444'N 43° 16.138'E	موارد مائية	اعادة اعمار ناظم سدة الرمادي على نهر الفرات	30
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-12-17	2017-12-07	1,983,315,000	180	200000		طرق وجسور	اعادة تاهيل جسر هيت الحديدي	31
							36,832,023,800		20,213,800			المجموع	

مشاريع محافظة الانبار للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	اصلاح وتاهيل طريق الرمادي- هيت/ الرمادي/ الانبار	طرق وجسور	33 25 36.6N 42 58 36.1E	400,000	145	285,000,000	312,200,000	2017-07-30	2017-08-21	2018-03-01	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	إعادة انشاء القسم البلدي السادس/ الرمادي الانبار	البلديات	33 24 46.0N 43 12 51.0E	100,000	180	220,575,000	242,575,000	2017-08-02	2017-08-29	25/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	تاهيل بناية الاقسام الداخلية في قضاء الفلوجة/ الانبار	التعليم العالي		500.00	80	211,829,000	229,851,000	2017-10-15	2017-10-29	2018-05-02	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	تأهيل المحطات الاروانية في جزيرة موارد وشامية الرمادي/ الانبار	موارد مانية												
5	تأهيل محطات البزل في جزيرة وشامية الرمادي / الانبار	موارد مانية			25+90	877,170,000	920,790,000	2017-10-17	2017-10-29	19/2/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	اعادة انشاء قناطر في البوعينة	موارد مانية												
7	اعادة انشاء السياج الامني لقضاء هيت / الانبار	دوائر حكومية		150,000		99,750,000	99,750,000	تنفيذ امانة	\	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	مجمع ماء الحميدية	ماء		12000		100,000,000	100,000,000	تنفيذ امانة	\	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	مجمع ماء الصبيحات	ماء		10000		36,800,000	36,800,000	تنفيذ امانة	\	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تجهيز وتنفيذ وتنصيب محطة تحويل الحصرة 33/11 كي في سعة 2*31.5 ام في أي / هيت/الانبار	كهرباء		200,000	25+90	361,000,000	396,779,980	2017-10-18	2017-10-30	17/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تاهيل شارع المعارض الى تقاطع الفرسان في الرمادي/ الانبار	البلدية		100,000	60+140	2,123,020,000	2,250,940,000	2017-10-22	2017-11-05	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	تاهيل شارع من تقاطع الفرسان الى تقاطع شارع (20) الرمادي/الانبار	البلدية		100,000	25+140	967,828,000	1,037,349,000	2017-10-22	2017-11-06	2018-04-06	100%	100%	0%	انجاز العمل

انجاز العمل	0%	100%	100%	14/4/2018	2017-11-14	2017-10-22	507,653,000	472,473,000	25+140	150,000		13	تجهيز ونصب محطة تحويل المشتل كهرباء 33/11 كي في /هيت/الانبار
سحب عمل من المقاول بموجب قرار محكمة			0%		2017-11-14	2017-10-25	2,710,350,000	2,710,350,000	140	1,500,000		14	إعادة تأهيل خط كهرباء غرب بغداد - حديثة 400 كي في /عموم محافظة الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-05-07	2017-11-06	2017-10-26	410,812,000	373,752,000	70+170	200,000		15	تأهيل ابنية دائرة البلدية /القسم البلدي الثاني/الرمادي/الانبار
												16	تأهيل انية دائرة البلدية القسم البلدي الرابع/ الرمادي الانبار
انجاز العمل	0%	100%	100%	24/5/2018	2017-11-19	2017-10-30	1,052,385,000	974,585,000	25+150	250,000		17	اعادة انشاء مديرية شرطة نموذجية في قضاء الفلوجة
انجاز العمل	0%	100%	100%	19/6/2018	2017-11-14	2017-11-12	1,081,365,125	983,270,000	30+120	100,000		18	الشارع الرابط بين تقاطع شارع عشرين الى شارع الملعب
انجاز العمل	0%	100%	100%	23/12/2017	2017-11-23	2017-11-14	211,900,000	194,400,000	30	75,000		19	العبارة النهريه في هيت (الباتونات)
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-04-07		2017-12-04	391,961,300	360,895,000	25+75	8,000		20	تأهيل بناية قسمي الفيزياء والعربي في كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة الانبار
												21	تأهيل بناية القاعات الدراسية في كلية الزراعة / جامعة الانبار
							11,993,461,405	11,352,697,000		3,355,500			المجموع



مدرسة دار السلام / هيت / الانبار

مدرسة دار السلام / هيت / الانبار (صعب نقل مواد البناء)



مدرسة دار السلام / هيت / (قبل الاعمار)




اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت ⁵¹



اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت (انفجار عبوة)



اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت

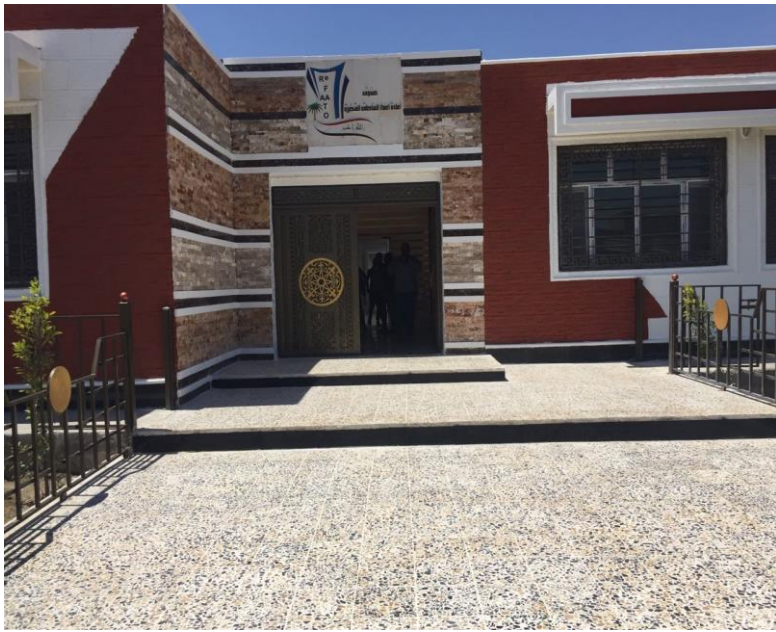

مدرسة السلوى / الفلوجة الانبار



مدرسة جنة الماوى / الرمادي / الانبار



مدرسة الصمد / هيت / الانبار



مدرسة المأمون / الرمادي / الانبار




إعادة تاهيل مستشفى هيت العام





إعادة تأهيل جسر هيت

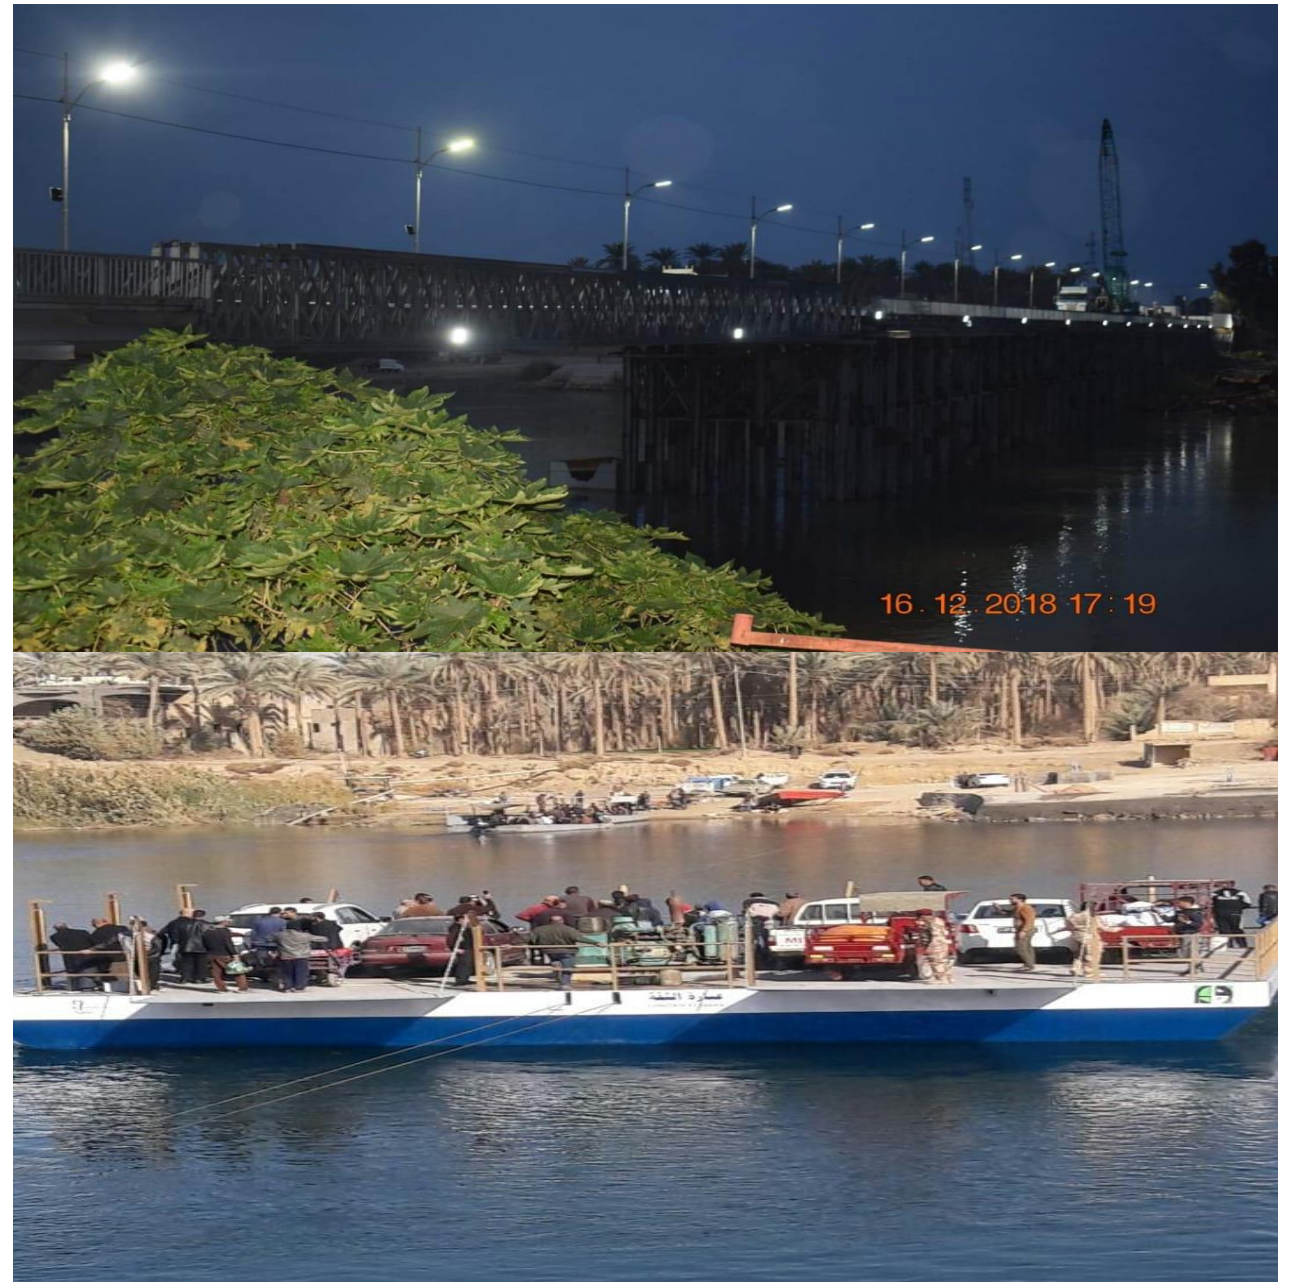

العبارة (حل مؤقت أثناء إعادة تأهيل الجسر)





هدم وإعادة بناء القسم البلدي السادس / الرمادي / الأنبار



هدم وإعادة بناء مدرسة الفتوة / الأنبار



إعادة بناء سدة الرمادي على نهر الفرات / الرمادي / الأنبار



مشاريع محافظة صلاح الدين



مشاريع محافظة صلاح الدين للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة الدور الأولى للبنات 12 صف/ الدور - صلاح الدين	التربية	34 27 26.2N 47 47 18.5 E	450	92+180	716,944,000	729,733,400	2017-07-25	2017-08-05	2018-05-08	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	ثانوية الفرقان 18 صف/ تكريت /صلاح الدين	التربية	34 26 18.0N 43 40 35.5E	700	120+170	1,119,644,000	1,194,869,900	2017-07-30	2017-08-28	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	مدرسة حفص الدوري للبنين 6 صف/ الدور/ صلاح الدين	التربية	34 27 42.8N 43 50 31.3E	255	12+120	330,000,000	339,733,500	2017-08-03	2017-08-21	2018-07-03	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية 6 صف/تكريت صلاح الدين	التربية	34 26 42.9N 43 44 05.2E	250	33+180	303,645,000	303,645,000	2017-08-13	2017-08-22	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	روضة الفارس العربي 4 صف/ تكريت / صلاح الدين	التربية	34 36 06.9 N 43 40 32.9 E	350	96+180	417,595,000	417,595,000	2017-08-13	2017-08-28	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	مدرسة الاشواس للبنين 9 صف/ ناحية مكيشيفة/ تكريت/	التربية	34 18 23.4N 43 46 59.1E	140	95+180	469,258,000	506,420,100	2017-08-24	2017-09-11	25/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	تاهيل اقسام داخلية للطالبات وقاعة الدري لمعهد الدور التقني /الدور -صلاح الدين	التعليم العالي	34 27 36N 43 48 34E	3000	10+150	484,140,000	484,140,000	2017-09-25	2017-10-04	2018-12-09	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	مد شبكة مياه تصريف الامطار واعمال الانارة والتبليط للطريق من مستشفى الحارث الى الوادي وبطول 1800 م طول / الضلوعية - صلاح الدين	البلديات	37 68 92N 42 77 17 E	25,000	80+150	994,050,000	1,083,067,000	2017-09-26	2017-10-10	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	اعمال اعادة بناء اقسام داخلية للطلاب عدد/4 جامعة تكريت	التعليم العالي	34° 40.717'N 43° 38.914'E	4,000	78+240	754,370,000	730,462,000	2017-12-11	2017-12-20	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تجهيز مواد لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم صلاح الدين (أعمدة)	كهرباء		50,000	20	144,600,000	144,600,000	2017-12-14		منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	تجهيز مواد لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم صلاح الدين (محولات)	كهرباء		25,000	30	939,000,000	939,000,000	2017-12-14		منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			109,145		6,673,246,000	6,873,265,900							

مشاريع محافظة صلاح الدين للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف	
1	تاهيل وتشغيل وحدة ماء العيثة سعة 200م3/ساعة/ الشرايط /صلاح الدين	ماء	35 63 864N 43 24 181E	27,000	120	257900000	257900000	2017-07-25	2017-08-06	17/12/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل	
	2	تاهيل وتشغيل وحدة ماء الحجاج سعة 200م3/ساعة/بيجي/ صلاح الدين	ماء												34 85 308N 43 54 104E
3	اكساء شارع معهد الدور في قضاء الدور/صلاح الدين	البلديات	34 28 12N 43 47 38.16E	10,000	80	435,000,000	435,000,000	2017-09-17	2017-09-26	منجز	100%	100%	0%	نجاز العمل	
4	تاهيل واكمال بناية شرطة الدور وسيطرة العلم/العلم/ صلاح الدين	الداخلية	21 49 34 .27N 26 76 43 47E	40,000	10+90	307,000,000	324,387,000	2017-09-17	2017-10-01	16/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل	
5	تأهيل مقرات مديريات (التدخل السريع (سوات) ومكافحة المتفجرات وانضباط الشرطة) وقاعة الشهيد صالح عويد/ تكريت/ صلاح الدين	الداخلية	3.21 34 37N 23.44 43 40E	30,000	85	455,595,000	455,595,000	2017-09-25	2017-10-05	20/12/2017	100%	100%	0	انجاز العمل	
6	تاهيل الشارع الرابط بين شارع الزهور والشارع الحولي/ تكريت/ صلاح الدين	البلديات	34 35 159N 43 40 425E	150,000	20+80	762,737,000	767,215,000	2017-09-25	2017-10-02	26/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل	
	7	إعادة تاهيل الشارع الممتد من تقاطع المجلس القديم باتجاه القادسية بطول 680 م/ تكريت /صلاح الدين	البلديات												37 68 92N 42 77 17 E
8	تاهيل مبنى مختبر صلاح الدين الاتشاني/ تكريت /صلاح الدين	البلديات	43 40 58.16E 34 34 47.29N	180,000	84	872,881,000	872,881,000	2017-10-03	2017-10-17	15/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل	
															9
10	تاهيل مديرية إحصاء صلاح الدين/ تكريت / صلاح الدين	البلديات	43 41 02.27E 34 35 13.79N	180,000	84	872,881,000	872,881,000	2017-10-03	2017-10-17	15/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل	
11	تاهيل بناية ناحية دجلة المتضررة من الاعمال الإرهابية/سامراء/صلاح الدين	البلديات	43 44 11.1E 34 23 39.25N	180,000	84	872,881,000	872,881,000	2017-10-03	2017-10-17	15/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل	
12	تاهيل مديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين	البلديات	43 41 01.15E 34 35 00.27N	180,000	84	872,881,000	872,881,000	2017-10-03	2017-10-17	15/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل	
13	تجهيز مولدة مختلفة السعات لمشاريع الماء	ماء	مناطق متفرقة	80,000	90	561,000,000	1,173,000,000	2017-11-26	منجز	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل	
	14	تجهيز مولدة مختلفة السعات لمحطات الرفع والضخ لمشاريع الصرف الصحي													البلديات
15	تجهيز غواطس عدد 5 لمحطات ضخ مياه الامطار الأولى والثانية في قضاء الدجيل - صلاح الدين	ماء	مناطق متفرقة	75,000	30	95,450,000	95,450,000	2017-12-04	2017-12-04	30/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل	
16	تجهيز غواطس نهريّة ومضخات الدفع لمجمعات الماء في شاطئ الجدر وهيجل الكبير والفياض الثاني وشهيد احمد وسديرة الوسطى	ماء	مناطق متفرقة	50,000	45	187,250,000	187,250,000	2017-12-10	2017-12-10	22/2/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل	
17	تجهيز مواد لصيانة شبكة كهرباء مركز قضاء الطوز وامرلي (اعمدة)	كهرباء	مناطق متفرقة	50,000	20	75,300,000	75,300,000	2017-12-14	2017-12-14	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل	
	تجهيز مواد لصيانة شبكة كهرباء مركز قضاء الطوز وامرلي (محولات)	كهرباء	مناطق متفرقة	50,000	30	469,500,000	469,500,000	2017-12-14	2017-12-14	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل	
							5,674,478,000	5,652,613,000							المجموع



مدرسة حفص الدوري / قرية أبي دلف / الدور / صلاح الدين



مدرسة الدور الأولى / الدور / صلاح الدين



قاعة الشهيد صالح عويد / تكريت / صلاح الدين



إعادة تأهيل مقر إدارة (سوات)



مركز شرطة الدور / صلاح الدين



ثانوية الفرقان / صلاح الدين



إعادة تأهيل بناية ناحية دجلة / سامراء / صلاح الدين



تأهيل مديرية الزراعة / صلاح الدين



تأهيل الأقسام الداخلية للطالبات | المعهد الفني / الدور / صلاح الدين



إعادة تأهيل شارع معهد الدور / صلاح الدين



محطة ماء الحويجة / تكريت / صلاح الدين

مشروع محافظة كركوك



مشاريع محافظة كركوك للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	كلفة المشروع بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	هدم وإعادة بناء مدرسة الشهيد الابتدائية 6 صف/كركوك	التربية	35 14.653N 44 16.121E	180	165	306,926,000	306,926,000	2017-07-23	2017-08-03	29/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	هدم وإعادة بناء مدرسة الامام حسن الابتدائية 6 صف/ كركوك	التربية	35 13.101N 44 16.902E	180	165	309,656,000	306,926,000	2017-07-23	2017-08-03	27/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			360		616,582,000	613,852,000							

مشاريع محافظة كركوك للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	إعادة تاهيل الشبكات الكهربائية	كهرباء	35 27.117N 44 11.325E	5,200	30	153,734,000	153,734,000	2017-07-31	2017-08-10	31/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	إعادة تاهيل الشبكات الكهربائية في قرى ملا عبدالله وادريس خباز وادريس خزعل والهندية 1,2/كركوك													
3	تاهيل وتشغيل مجمع ماء بطاقة (50)م/3 ساعة في قرية قرنية- ناحية يابجي/كركوك	ماء	35 24.107N 44 21.151E	3,800	85	71,281,000	71,281,000	2017-07-31	2017-08-03	14/11/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	صيانة طريق الشمسية/كركوك	البلديات	35 14.511N 44 16.217E	4,000	55	189,340,000	189,340,000	2017-08-03	2017-08-03	24/9/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تبليط شوارع داخلية بالكونكريت قرب مدرسة البلديات الوقف الشيعي في قصر البشير // كركوك													
6	تجهيز محولات الى قضاء الحويجة	كهرباء		250,000	30	1,689,000,000	1,689,000,000	2017-12-14			100%	100%	0%	انجاز العمل
7	ايصال الماء الى قرية الهندية الجديدة / ناحية الملتقى	ماء		20,000		55,600,000	55,600,000		تنفيذ امانة	15/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تاهيل وتبليط طريق كركوك الحويجة قرب مجسر خالد	طرق وجسور		75,000		63,200,000	63,200,000		تنفيذ امانة	24/12/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	تاهيل محطة ماء مزر العاصي/ الحويجة	ماء		12,500		69,600,000	69,600,000		تنفيذ امانة	25/12/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			370,500		2,291,755,000	2,291,755,000							



إعادة تأهيل وتبليط طريق كركوك - الحويجة بالقرب من مجسر خالد



إعادة تأهيل محطة ماء مزهر العاصي / الحويجة



أعادة بناء مدرسة الشهيد الابتدائية / البشير / كركوك



تاهيل شبكة ماء قرية الهندية الجديدة / الملتقى / كركوك



إعادة تأهيل وصب شوارع في قرية البشير / كركوك



إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في قرية الملا عبد الله / كركوك

مشاريع محافظة ديالى

Diyala Governorate Projects




مشاريع محافظة ديالى للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)+المدة الإضافية	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة امر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة المامون / 12 صف/ العظيم/الخالص/ديالى	التربية	34.273507 N 44. 542155E	720	107+180	752,704,000	745,105,400	2017-07-23	2017-09-26		100%	100%	0%	انجاز العمل
2	مدرسة الهديل / 9 صف/الصدور/المقدادية/ديالى	التربية	34 03 44.1N 44 59 00.6E	600	168+63	461,667,000	505,058,200	2017-07-25	2017-09-24	2019-02-18	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	مدرسة ابن زيدون	التربية	34 01 30N 44 57 32.1E	600	160	775,658,000	775,658,000				0%	0%	0%	تم فسخ العقد رضائياً مع المقاول
4	تبليط شارع من جسر محمود العلي الى جسر سراجق دلي عباس بطول (6 كم)	الطرق	34 01 41.7N 44 45 17.4E	2,200	120	449,000,000	449,000,000	2017-11-12	2017-11-29	2018-04-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تبليط واكساء شوارع في منطقة الشرقية والغربية في ناحية سد العظيم (تبليط شوارع داخل حدود البلدية ناحية سد/العظيم)	الطرق		3800	60	390,420,000	390,420,000	2017-11-13	2017-12-25	13/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	صب شوارع حي الاسراء في السعدية	الطرق	34 11 18.24N 45 07 08.5E	2,500	45	116,040,000	116,040,000	2017-11-13	2017-12-04	17/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	تبليط طرق في المقدادية بطول (5 كم)	الطرق		10,000	60	348,860,000	348,860,000	2017-11-13	2017-12-13	28/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تأهيل الشارع العام لمدينة جلولاى الرئيسي	الطرق	34 15 41.59N 45 9 29.47E	200000	90	259,563,500	259,563,500	2017-11-13	2018-01-02	20/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	فرش خابط بطول (12 كم) من جسر شارقاق – قرية العباسية الى قرية العالي وزحام الاسيود	الطرق		2000	90	168,750,000	168,750,000	2017-11-07	2017-11-19	2018-08-02	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تبليط شوارع داخل حدود البلدية /بلدية المنصورية بطول 1650 م	الطرق		8000	40	375,373,250	375,373,250	2017-11-22	2017-12-06	25/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تبليط شوارع في قرى شيروين بطول 6,5 كم / المنصورية شيروين/ ديالى	الطرق	34 04 13 N 44 88 08E	10000	12+180	559,485,000	559,484,000	2017-11-13	2017-11-19	24/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	تأهيل الشارع رقم 21 المار ضمن م311 و 313 بطول 1,4 كم للمقطع ما بين المستوصف الصحي واستدارة الدور الجاهزة في حي التحرير/بعقوبة/ديالى	الطرق	46 82 27.411E 37 32 93 2.28N	4500	100	195,720,000	195,720,000	2018-05-06	20/6/2018	2019-02-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
13	مشروع تأهيل شبكة انارة شوارع ناحية كنعان- بعقوبة/ديالى	الكهرباء			45	111,220,000	111,220,000	2018-07-06	21/6/2018	29/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
14	مشروع صيانة واكساء وتبليط طرق وقرى بلد روز- قرية عتبه بطول 7,5 كم - قرية اطعيمات 1,5 قضاء بلدروز/ديالى	الطرق	33 40 39.7N 45 01 36.3E	8000	120	921,260,000	921,260,000	20/6/2018	2018-04-07	31/10/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
15	مشروع تبليط شارع ام العظام العثمانية بطول 2,15 كم قضاء بعقوبة/ديالى	الطرق	33 39 19N 44 44 37 35.7E	1000	75	227,020,000	227,020,000	25/6/2018	19/7/2018	2018-03-10	100%	100%	0%	انجاز العمل
16	مشروع تبليط شوارع بطول 1,8 كم لقرى خان بني سعد - بعقوبة (ربيع عطشانة وعلي الهادي والشيماء)/ديالى	الطرق	33 56 6 87N 44 44 54 89 57E	2500	30	185,040,000	185,040,000	25/6/2018	19/7/2018	2018-09-08	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع					6,333,572,350	6,297,780,750							

مشاريع محافظة ديالى للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تاهيل مجمع ماء سويد وزحام والعالى وبسعة 200 م ³ / ساعة/المقدادية/ ديالى	ماء	34 03 46 N 44 58 35 E											
2	تاهيل مجمع ماء نوفل والصدور والهارونية سعة 200 م ³ / ساعة / المقدادية /ديالى	ماء	34 02 79.1N 44 58 54.3E	13,500	60	385,400,000	385,400,000	2017-07-20	2017-08-27	26/10/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	تجهيز ونصب محطة تحلية بطاقة 200م ³ / ساعة قرية حد مزيد/ بعقوبة/ديالى	ماء	33 48 06 N 44 44 09 E											
4	تاهيل شارع السوق في ناحية السعدية/ديالى	البلديات	30 11 23.01N 45 07 13.63E	35,000	35	106,750,000	106,750,000	2017-07-31	2017-09-14	18/10/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
		المجموع		48,500		492,150,000	492,150,000							



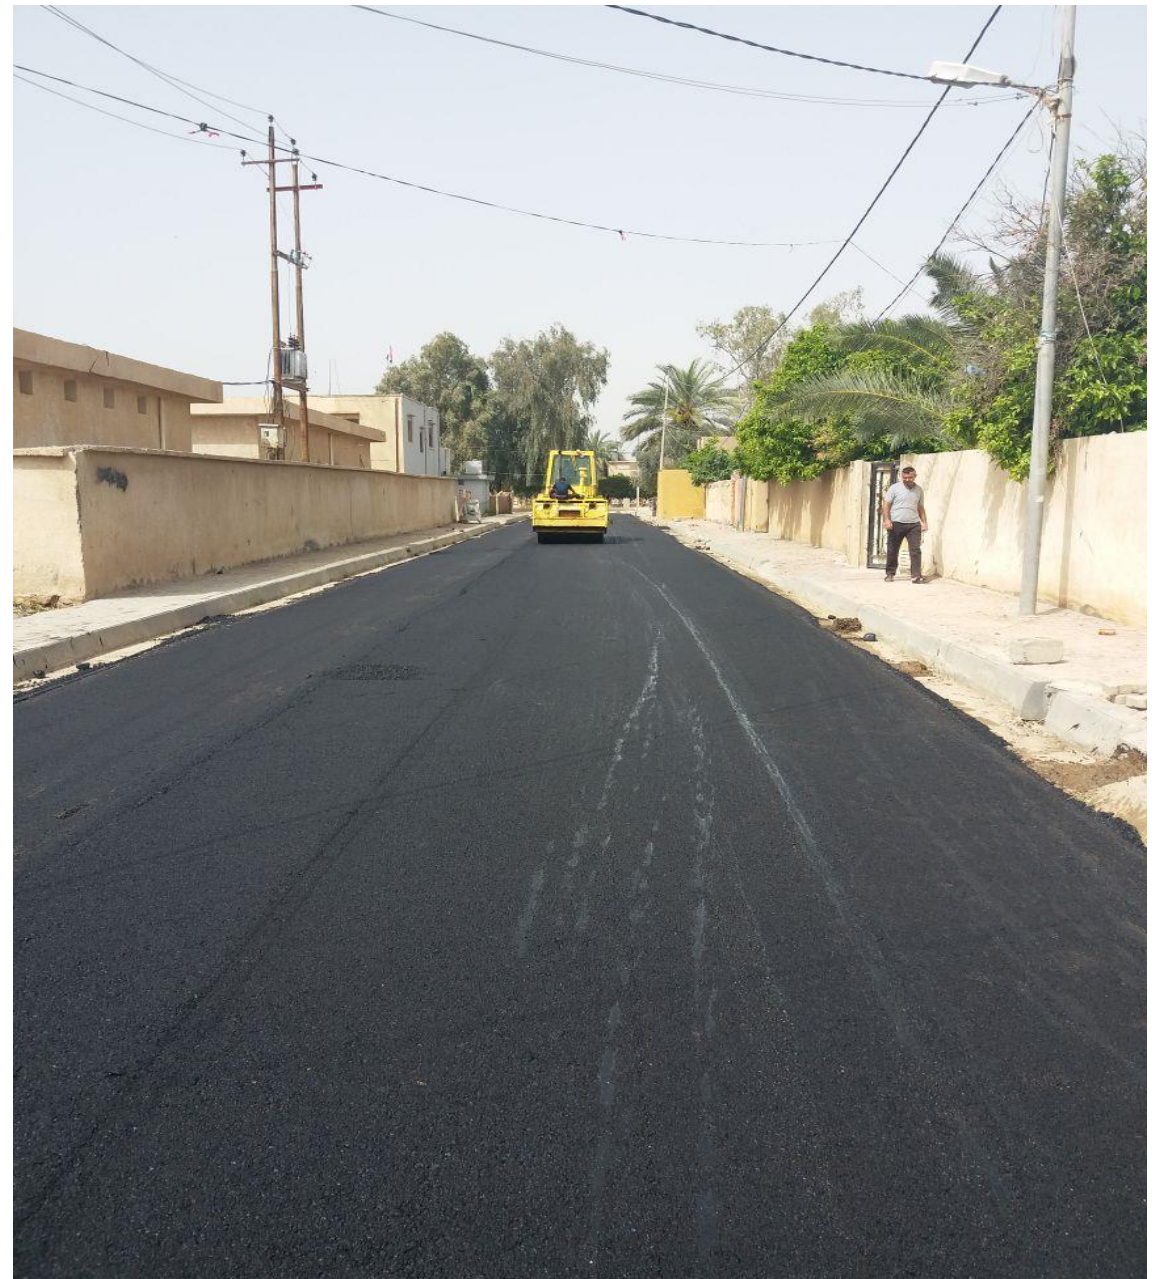

تبليط الشوارع وعمل أرصفة داخل الحدود البلدية بطول (1650 م) / المنصورية / ديالى





تأهيل وتبليط شارع السوق / السعدية / ديالى





مشروعات محافظة بابل / شمال بابل للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	تكلفة المشروع	التكلفة الكلية بعد اضافة اوامر التغيير	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تجهيز وفحص وتنفيذ خطوط جهد (11 كي.في) في قطاع المسيب / بابل	كهرباء		11,568	150	819,788,000	819,788,000	21-11-2017	26/11/2018		0%	0%	0%	متوقف منذ تاريخ توقيع العقد بسبب وجود مشاكل فنية
	المجموع					819,788,000	819,788,000							

مشروعات محافظة بابل / شمال بابل للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	تكلفة المشروع	التكلفة الكلية بعد اضافة اوامر التغيير	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	صيانة طريق الحامية - صنيديج بطول 3,5 كم/جرف النصر/شمال بابل	طرق وجسور	43 22 34 X 36 27 763 Y	12,500	40	287,125,000	287,125,000	13-08-2017	13-08-2017	09-05-2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	مد واستبدال شبكة ماء متفرقة في حي المواطنين والحي العسكري/جرف النصر/شمال بابل	ماء	32 46 32.1N 44 15 48.3E	18,000	50	298,620,000	298,620,000	13-08-2017	14-08-2017	10-04-2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	مد واستبدال شبكة ماء الحامية/جرف النصر/شمال بابل	ماء	32 48 28.4 N 44 15 53.9 E											
4	مد واستبدال شبكة ماء القاطع الشمالي 1 (الفاضلية 1)/جرف النصر /شمال بابل	ماء	33 00 53.5N 44 09 56.1 E											
5	مد واستبدال شبكة ماء القاطع الشمالي 2 (الفاضلية 2)/جرف النصر/شمال بابل	ماء	33 00 49.6N 44 08 36 E											
6	صيانة طريق الخضر بمحاذاة نهر الفرات بطول 18 كيلو	طرق وجسور	43 46 70X 36 33 44 6Y											
	المجموع			45,500		1,144,284,520	1,144,305,000							



استبدال شبكة الماء / شمال بابل



إعادة تاهيل الطريق (الحامية - صنديج) / جرف النصر / بابل



تاهيل طريق الخضر على طول نهر الفرات لمسافة 18 كم

محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

Baghdad Governorate Projects

الانبار



مشاريع محافظة بغداد/ حزام بغداد للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة حافظ ابراهيم الابتدائية 6 صف/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 195 557N 43 968 712E	360	59+70	349,240,000	380,255,000	23-07-2017	11-09-2017	24/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	مدرسة المسجد الأقصى الابتدائية 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 213 317N 43 892 967 E	600	170124+170	479,647,000	513,436,400	26-07-2017	11-09-2017	08-05-2018	100%	100%	87%	انجاز العمل
3	مدرسة ابراهيم طوقان الابتدائية 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 209 976N 43 930 087E	600	51+175	400,366,000	440,344,000	30-07-2017	11-09-2017	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة عز الدين القسام الابتدائية 18 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 216 750 N 43 879 541 E	900	105+200	827,057,000	815,204,000	30-07-2017	11-09-2017	17/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	مدرسة أسماء بنت أبو بكر 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 216 750 N 43 879 541 E	600	111+180	398,228,000	437,960,200	30-07-2017	11-09-2017	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	مدرسة الزخرف 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 219 497 N 43 911 557E	600	126+190	1,024,768,500	1,073,136,960	02-08-2017	11-09-2017	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	مدرسة الخوارزمي الابتدائية 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 394 093N 44 037 368E	600	124+180	425,137,000	466,368,600	03-08-2017	11-09-2017	15/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تاهيل ناظم صدر ابو غريب والناظم القاطع في كيلو (8) من القناة الموحدة والمنشآت الاخرى.	الموارد المائية		2,000,000	100+120	830,278,500	899,346,750	07-11-2017	20-11-2017	14/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			2,004,260		4,734,722,000	5,026,051,910							

مشاريع محافظة بغداد/ حزام بغداد للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تجهيز وتنفيذ ونصب شبكات كهرباء في ناحية النصر والسلام/ أبو غريب/حزام	كهرباء		2000	50	438,843,370	13-08-2017	24-08-2017	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	تاهيل شبكات كهرباء (تجهيز محولات) أبو غريب/حزام بغداد	كهرباء		15000	15	255,600,000	18-10-2017	قيد التنفيذ	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	انشاء جسر عودة الشكر في الرفوش	الطرق والجسور		25000	30	88,225,000		تنفيذ امانة	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	تاهيل محطات ماء (السعدان, الهيتاويين, فزع شنيتر)	ماء		10,000		284,350,000		تنفيذ امانة	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تطوير موقع الصندوق	دوائر حكومية				100,000,000		20-11-2017	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			52000		1,167,018,370							



جسر عودة الشكر / حزام أبو غريب / بغداد



إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرى أبو غريب / حزام بغداد





(إعادة تأهيل محطة ماء السعدان / أبو غريب / حزام بغداد)



(إعادة تأهيل محطة ماء الهيتاويين / أبو غريب / حزام بغداد)

**مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية
حسب المحافظات لعام 2018**

مشاريع محافظة نينوى



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / نينوى


ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	اعادة تاهيل مستشفى تلعفر العام	تلعفر	الصحة	قيد التنفيذ	83%	12	13/11/2018	180	2018/11/27	1,038,672,000
2	صيانة واعادة تاهيل القنطرة الصندوقية السداسية الواقعة على طريق موصل بغداد في المحطة (32+000) على وادي القصب ولممري الذهاب والاياب بطول 65م	القيارة	الطرق والجسور	متوقف	32%	16	18/11/2018	180	2018/11/27	830,406,000
3	اعادة اعمار بناية المركز الطلابي و وحدة الرياضة الجامعية في الكلية التقنية	الموصل	التعليم العالي	قيد التنفيذ	60%	140	31/12/2018	200	2019/01/14	553,100,000
4	ترميم بناية المجمع الاذاعي والتلفزيوني / الفيصلية	الموصل	شبكة الاعلام العراقي	قيد التنفيذ	95%	28	29/11/2018	150	2018/12/03	589,560,000
5	اعادة تاهيل سقائف لمخزن المواد الغذائية الكرامة (1)	الموصل	التجارة	قيد التنفيذ	40%	35	4/12/2018	240	2018/12/18	2,254,676,800
6	تاهيل ابنية الاقسام الداخلية – مجمع القادسية / جامعة الموصل	الموصل	التعليم العالي	قيد التنفيذ	60%	111	19/12/2018	220	2019/01/02	509,927,000
7	تاهيل وصيانة جسر الحضر والاجزاء المتضررة في الطريق الرابط بين طريق (موصل – بغداد) والمنطقة الاثرية في الحضر (المرحلة الاولى)	الحضر	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	7%	99	18/12/2018	240	1/1/2019	1,501,358,000
8	اعادة تاهيل المشروع الوطني لمديرية المرور في الشلالات / المرحلة الاولى	الموصل	الداخلية	قيد التنفيذ	12%	132	30/12/2018	550	2019/01/10	1,961,520,000
9	تاهيل بناية كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل	الموصل	التعليم العالي	متوقف / لاسباب تعود الى المفاوض	35%	41	4/12/2018	200	2018/12/18	1,537,540,000
10	هدم واعادة بناء ثانوية تل واعي للبنين 12 صف	حمام العليل	التربية	قيد التنفيذ	35%	44	5/12/2018	240	2018/12/13	579,291,200
11	هدم واعادة بناء ثانوية فليل 12 صف	تلكيف	التربية	قيد التنفيذ	59%	51	5/12/2018	240	2018/12/13	579,291,200
12	هدم واعادة بناء متوسطة علي بن ابي طالب للبنين 12صف	الأيمن	التربية	قيد التنفيذ	24%	45	5/12/2018	240	2018/12/13	579,291,200

579,291,200	2018-12-16	240	4/12/2018	36	48%	قيد التنفيذ	التربية	الايسر	هدم واعادة بناء متوسطة المسعودي 12 صف	13
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	76	10%	قيد التنفيذ	التربية	تلعفر	هدم واعادة بناء مدرسة كركافر 12 صف	14
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	75	35%	قيد التنفيذ	التربية	الأيمن	هدم واعادة بناء مدرسة العامل للبنين 12 صف	15
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	74	25%	قيد التنفيذ	التربية	الأيمن	هدم واعادة بناء مدرسة الحدباء للبنين 12 صف	16
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	73	23%	قيد التنفيذ	التربية	الايسر	هدم واعادة بناء مدرسة العطاء للبنات 12 صف	17
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	88	37%	قيد التنفيذ	التربية	الأيمن	هدم واعادة بناء مدرسة القدس الابتدائية للبنين 12 صف	18
511,028,000	2018-12-27	220	26/12/2018	126	48%	قيد التنفيذ	التربية	الايسر	هدم واعادة بناء مدرسة ابن رشد للبنين 12 صف	19
2,775,071,200	2019-01-23	450	26/12/2018	125	40%	قيد التنفيذ	التجارة	الموصل	تاهيل مجمع مخازن الحرية و تاهيل مباني الشركة العامة لتصنيع الحبوب	20
1,530,000,000		45	23/10/2018	8	100%	منجز	الكهرباء		تجهيز محولات قدرة 16 MVA لمحطات جهد 33/11 كف ومحولات توزيع جهد 0,4 /11 كف	21
177,500,000		45	23/10/2018	7	100%	منجز			تجهيز محولات توزيع سعة KVA250	
2,988,297,000	2019-01-12	360	30/12/2018	135	5%	قيد التنفيذ	الكهرباء	الموصل	تاهيل محطة كهرباء النسيج في الساحل الايمن	22
3,381,299,000	2018-12-17	360	4/12/2018	39	5%	قيد التنفيذ	الكهرباء	الموصل	تاهيل محطة كهرباء الدواسه في الساحل الايمن	23
3,281,763,000	2018-12-17	360	4/12/2018	38	5%	قيد التنفيذ	الكهرباء	الموصل	تأهيل محطة كهرباء باب البيض في الساحل الايمن	24
382,221,000		100	30/12/2018	134	90%	قيد التنفيذ	الكهرباء	الأيمن	المعدات المطلوبة لورشه فحص وتصليح المحولات في الجانب الايمن	25
188,480,000	2018-06-19	60	5/6/2018	2	100%	منجز	البلديات	سنجار	صب ارضفة وبناء القوالب الجانبية للشارع الرئيسي في حي النصر وبربوش وصيانة الحفر والتخسفات في مناطق متفرقة / مركز قضاء سنجار	26
30,864,723,800									المجموع	

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / نينوى


ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تجهيز جهاز التصوير المقطعي عدد 2	الموصل	الصحة	قيد التنفيذ	95%	104	19/12/2018	180	19/12/2018	1,700,000,000
2	تجهيز جهاز الرنين المغناطيسي عدد 2	الموصل	الصحة	قيد التنفيذ	90%	105	19/12/2018	180	19/12/2018	2,560,000,000
3	تجهيز جهاز كرسي أسنان متكامل عدد(50)	عدة اقضية	الصحة	قيد التنفيذ	80%	110	19/12/2018	180	19/12/2018	964,375,000
4	إعادة تأهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق حي الخضراء	الموصل	المجاري	قيد التنفيذ	70%	72	13/12/2018	160	2018-12-27	336,068,750
5	تاهيل المجرى الصندوقي في باب البيض	الموصل	الماء والمجاري	تنفيذ امانة / منجز	100%	تنفيذ امانة		60	2018-12-24	122,870,000
6	تاهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق اليرموك	الموصل	المجاري	قيد التنفيذ	66%	71	13/12/2018	150	2018-12-27	422,670,000
7	تاهيل بناية مخازن مديريةية المجاري مع انشاء مسقفات عدد/3 في وادي عكاب	الموصل	المجاري	متوقف	30%	42	4/12/2018	180	2018-12-18	597,820,000
8	تاهيل بناية الهيئة العامة للضرائب في محافظة نينوى/ الجانب الايمن (عمارة التامين على الحياة)	الموصل	الادارة المحلية	تنفيذ امانة / الغي او مؤجل للعام القادم	صفر	تنفيذ امانة		60	2018-12-24	197,495,000
9	تاهيل مخازن مركز تكنولوجيا البذور/ موقع الموصل	الموصل	العلوم والتكنولوجيا	تنفيذ امانة / منجز	100%	تنفيذ امانة		60	2018-12-24	221,525,000
10	اعادة تأهيل قسم بحوث نينوى		الزراعة	قيد التنفيذ	91%	47	5/12/2018	100	2018-12-16	232,313,000
11	إعادة اعمار بناية المعهد التقني نينوى		التعليم العالي	قيد التنفيذ	88%	13	13/11/2018	180	2018-11-25	747,647,600
12	اعادة اعمار بناية المختبرات العلمية في الكلية التقنية الزراعية / الموصل		التعليم العالي	قيد التنفيذ	88%	13				


322,399,200	2018-12-27	150	13/12/2018	87	67%	قيد التنفيذ	التربية	الموصل	تاهيل ابنية مدرسية في الموصل / الجانب الأيمن (البتول والمواهب)	13
574,228,000	2019-01-03	180	23/12/2018	114	80%	قيد التنفيذ	رئاسة الوزراء		تأهيل بناية مديرية المخابرات في نينوى	14
356,390,600	2019-01-03	120	19/12/2018	101	99%	قيد التنفيذ	الداخلية		إعادة تاهيل مراكز شرطة (اليرموك , الوقاص , النصر) المرحلة الثانية	15
				101	99%	قيد التنفيذ	الداخلية		تاهيل بناية الغرامات والحاسبة لمرور نينوى	16
471,636,000	2018-12-30	180	16/12/2018	90	45%	قيد التنفيذ	دوائر حكومية		أعادة بناء بناية مديرية مختبر نينوى الاتشائي	17
598,800,000	2018-12-27	180	13/12/2018	89	15%	قيد التنفيذ	الطرق والجسور		صيانة و تاهيل جسر وادي المر على طريق (كسك - ربيعة)	18
370,080,000	2018-12-27	100	13/12/2018	83	100%	منجز	الطرق والجسور	تلعفر	تاهيل طرق ناحية العياضية	19
1,418,500,000	2019-01-21	45	23/12/2018	117	100%	منجز	الكهرباء		تجهيز محولات كهربائية (تجهيز محولات سعة(400,250) kva عدد (185) محولة لمخزن الكرامة)	20
118,654,000	2018-12-24	60			95%	تنفيذ امانة / قيد التنفيذ	التربية	سنجار	تاهيل ابنية مدرسية في قضاء سنجار (مدرسة كوجو)	21
120,238,000	2018-12-24	60			100%	تنفيذ امانة / منجز	التربية	تلعفر	تاهيل ابنية مدرسية في قضاء تلعفر مدرسة (اميرة الجنة و المنتظر و الجزيرة)	22
12,453,710,150									المجموع	



تأهيل الأبنية المدرسية لـ (مدرسة اميرة الجنة - الجزيرة -المنتظر)

قام صندوق إعادة اعمار
المناطق المتضررة من
العمليات الإرهابية بإعادة
اعمار مشروع تأهيل الأبنية
المدرسية وهو ضمن خطة
مشاريع عام 2018 مدة
العمل مشروع 75 يوم وقد
تم إنجاز العمل 100%
وحسب التوقيتات
الموضوعة في العقد

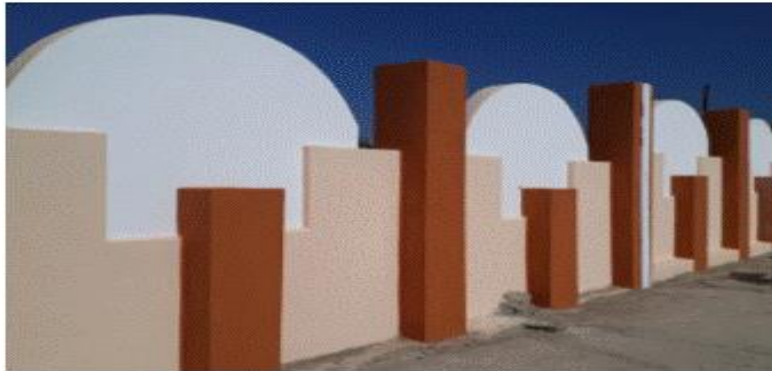


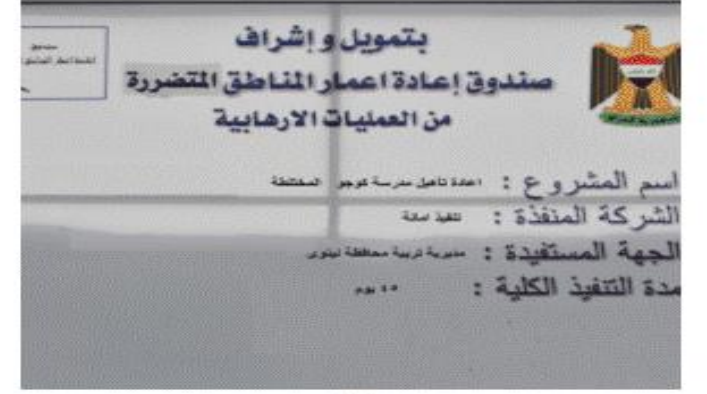

تأهيل مدرسة كوجو في قضاء سنجار

قام صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بإعادة اعمار مشروع تأهيل مدرسة كوجو وهو ضمن خطة مشاريع عام 2018 مدة العمل مشروع 60 يوم مستمر حالياً علماً ان نسبة الإنجاز الفعلي 95%



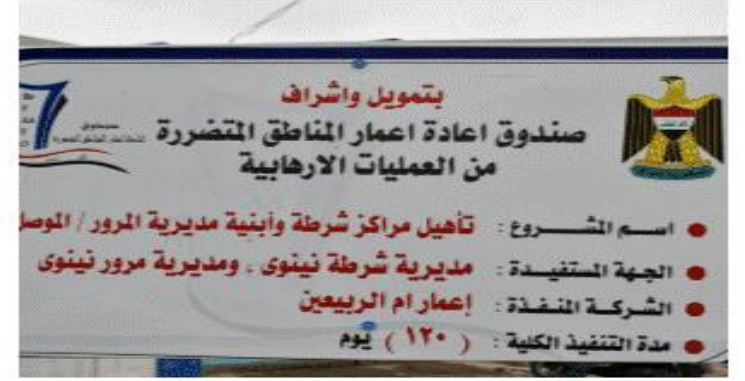

إعادة تأهيل مراكز الشرطة وأبنية مرور نينوى

قام صندوق إعادة اعمار
المناطق المتضررة من
العمليات الإرهابية بإعادة
اعمار مشروع إعادة تأهيل
مراكز الشرطة وأبنية مرور
نينوى وهو ضمن خطة
مشاريع عام 2018 مدة
العمل مشروع 120 يوم
ومستمر به العمل حالياً
علماً ان نسبة الإنجاز
الفعلي 99%



تأهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق اليرموك

قام صندوق إعادة اعمار
المناطق المتضررة من
العمليات الإرهابية بإعادة
اعمار مشروع معالجة
المياه الثقيلة لشقق
الخضراء وهو ضمن خطة
مشاريع عام 2018 مدة
العمل مشروع 150 يوم
ومستمر به العمل حالياً
علماً ان نسبة الإنجاز
الفعلي 70%

مشروع محافظة الانبار

الانبار



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
1	هدم واعادة بناء مركز صحي ودار سكن البوزعيان	الخالدية	الصحة	منجز	100%	124	26/12/2018	200	8/1/2019	1,150,824,000
2	هدم واعادة بناء مركز صحي المضيق	الخالدية	الصحة	منجز	100%	124				
3	هدم واعادة بناء مركز صحي في البوبالي مع دار سكن	الخالدية	الصحة	منجز	100%	124				
4	هدم واعادة بناء جنسية راوه	راوه	الداخلية	قيد التنفيذ	56%	136	30/12/2018	180	12/1/2019	907,329,600
5	هدم واعادة بناء جنسية عنه	عنه	الداخلية	قيد التنفيذ	16%	136		180		
6	هدم واعادة بناء البطاقة الوطنية في القائم	القائم	الداخلية	قيد التنفيذ	93%	138	30/12/2018	150	13/1/2019	579,545,000
7	تاهيل دائرة البطاقة الوطنية في العبيدي		الداخلية	قيد التنفيذ	93%	138		150		
8	اعادة اعمار جسر وادي الفحيمي الاول	عنه	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	90%	130	27/12/2018	180	7/1/2019	633,920,000
9	اعادة اعمار جسر وادي زغيدان	حديثه	الطرق والجسور	منجز	100%	122	26/12/2018	180	7/1/2019	467,200,000
10	اعادة اعمار جسر البغدادي العائم بطول 420متر		الطرق والجسور	قيد التنفيذ	73%	131	30/12/2018	360	12/1/2019	1,301,888,000
	المجموع									5,040,706,600

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	صيانة مجمع ماء البوسودة سعة (200م3/سا)	الخالدية	الماء والمجاري	منجز	100%	19	22/11/2018	90	16/12/2018	560,392,000
2	تجهيز ونصب وحدة مجمعة تقوية سعة 200م3/ساعة حي القدس والشهداء	الخالدية	الماء والمجاري	منجز	100%	19				
3	تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 100م3/ساعة (النساف/البوعنوان/البوراشد)	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56	6/12/2018	120	20/12/2018	1,003,847,500
4	تأهيل مجمع ماء الاسباتي/ الشهداء النعيمية	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56				
5	تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 200م3/ساعة لمناطق الصبيحات	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56				
6	صيانة وتأهيل مجمع ماء بني زيد سعة (200)م3/س	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56				
7	تاهيل مجمع ماء سويحل و النهضة الشرقية/ القائم	القائم	الماء والمجاري	منجز	100%	50	5/12/2018	55	2/1/2019	130,640,000
8	صيانة مجمع ماء الصروح سعة 300 م3/ساعة	هيت	الماء والمجاري	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	19/12/2018	125,670,000
9	تجهيز ونصب وحدة تقوية سعة مليون غالون لمجمع ماء الخسفة	حديثة	الماء والمجاري	منجز	100%	52	5/12/2018	90	3/1/2019	699,079,000
10	تاهيل مشروع ماء حديثة - حقلانية الموحد	حديثة	الماء والمجاري	منجز	100%	52				
11	تاهيل مجمع ماء حي الشرطة لناحية بروانة	حديثة	الماء والمجاري	منجز	100%	52				
12	صيانة مشروع ماء الجزيرة في الرمادي	الرمادي	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	84%	62	11/12/2018	150	24/12/2018	743,927,500
13	مد شبكة ماء في الاحياء الجنوبية لمدينة الفلوجة	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	29	29/11/2018	80		560,939,200
14	تنفيذ خط دكتايل من ناقل الخزان الى الحي العسكري	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	29			24/12/2018	
15	مد شبكة ماء في حي الجمهورية وحي الشهداء	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	29				
16	أنشاء خزان كونكريتي سعة (750) م3 في قضاء الرطبة	الرطبة	الماء والمجاري	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	14/12/2018	197,212,000
17	تاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء حديثة	حديثة	الكهرباء	قيد التنفيذ	95%	100	18/12/2018	180	5/1/2019	529,287,500
18	تأهيل الشبكة الكهربائية في ناحية حصيبة الشرقية / قضاء الخالدية	الخالدية	الكهرباء	منجز	100%	30	29/11/2018	150	23/12/2018	202,198,000
19	تأهيل الشبكة الكهربائية في زوية غراب	الخالدية	الكهرباء	منجز	100%	30				
20	تاهيل الشبكات الكهربائية في قضاء الرطبة	الرطبة	الكهرباء	منجز	100%			60	26/12/2018	248,715,000

794,233,500	17/12/2018	120	5/12/2018	46	100%	منجز	الكهرباء	الكرمة	تاهيل الشبكة الكهربائية الهوائية المتضررة في قضاء الكرمة	21
22,000,000					100%	شراء مباشر / منجز	الكهرباء	القائم	تجهيز مولد كهرباء / قائمقامية القائم	22
28,000,000					100%	شراء مباشر / منجز	الكهرباء	القائم	تجهيز مولد كهرباء / تربية القائم	23
407,976,000	11/12/2018	150	2/12/2018	33	100%	منجز	الطرق والجسور	البيгдаي	اعادة اعمار جسر البيгдаي الخرساني على طريق رمادي-حديثة	24
202,400,000	20/12/2018	90	11/12/2018	61	100%	منجز	الطرق والجسور	الفلوجة	أعادة أعمار جسر الجعفي فوق سكة القطار/ الفلوجة	25
607,416,000	9/12/2018	120	27/11/2018	25	100%	منجز	التجارة	الرمادي	ترميم وصيانة مخازن عدد 6/ في سايلو الرمادي	26
573,888,800	2/1/2019	180	20/12/2018	112	77%	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	الرمادي	هدم وإعادة بناء مدرسة الدعاء/12 صف	27
552,765,000	28/12/2018	160	16/12/2018	91	100%	منجز	التربية والتعليم	عنه	تاهيل الورش لاعدادية صناعة عنة	28
581,613,500	16/12/2018	180	4/12/2018	40	100%	منجز	التربية والتعليم	الكرمة	هدم وإعادة بناء مدرسة الفداء /12 صف	29
1,190,436,000	10/1/2019	180	20/12/2018	113	80%	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	راوه	هدم وإعادة بناء مدرسة المواهب للبنين 12 صف	30
				113	90%		التربية والتعليم	راوه	هدم وإعادة بناء مدرسة ذو الجادين للبنين 12 صف	31
1,190,436,000	2/1/2019	180	19/12/2018	109	95%	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	القائم	هدم وإعادة بناء مدرسة شط العرب للبنين 12 صف	32
				109	95%		التربية والتعليم	القائم	هدم وإعادة بناء مدرسة النهضة الشرقية للبنين 12 صف	33
694,910,500	27/12/2018	90	13/12/2018	69	100%	منجز	التربية والتعليم	الفلوجة	تاهيل الشقق السكنية للتدريسيين في جامعة الفلوجة	34
				69	100%	منجز	التربية والتعليم	الرمادي	تاهيل قسم السدود والكهرباء جامعة الانبار	35
447,038,400	3/1/2019	180	11/12/2018	66	98%	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	الصقلاوية	هدم و اعادة بناء بناية العمادة/ المعهد التقني في الصقلاوية	36
858,323,200	27/12/2018	180	13/12/2018	85	78%	قيد التنفيذ	الداخلية	الرمادي	هدم وإعادة بناء مديرية شرطة الرمادي	37
691,500,000	30/1/2019	45	23/12/2018	116	100%	منجز	الكهرباء		تجهيز محولات كهرباء	38
91,690,000	26/12/2018	60			100%	منجز	الصحة	القائم	ترميم بناية الردهة المشتركة في مستشفى القائم العام	39
142,770,000	23/12/2018	60			100%	منجز	الكهرباء	راوه	تاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء راوة مع تاهيل بناية كهرباء راوه	40
		60			100%	منجز	الكهرباء	هيت	تاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء هيت	41
14,079,304,600									المجموع	

مشاريع محافظة صلاح الدين



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / صلاح الدين

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	إعادة تاهيل جسر الشرفاط الكونكريتي ومقترباته في محافظة صلاح الدين	الشرفاط	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	18%	17	21/11/2018	360	12/12/2018	3,948,780,000
2	هدم وإعادة بناء مدرسة العلياء الابتدائية للبنات 12 صف	بلد	التربية	قيد التنفيذ	51%	54	5/12/2018	180	15/1/2019	610,965,000
3	هدم وإعادة بناء ثانوية جمال عبدالناصر 12 صف	بلد	التربية	قيد التنفيذ	60%	43	4/12/2018	180	15/1/2019	528,360,000
4	هدم وإعادة بناء مدرسة المحزم الابتدائية للبنين 12 صف	تكريت	التربية	قيد التنفيذ	87%	67	12/12/2018	180	25/12/2018	607,200,000
5	هدم وإعادة بناء ثانوية الأريج للبنات 12 صف	بيجي	التربية	قيد التنفيذ	60%	37	4/12/2018	180	20/1/2019	573,400,000
6	إعادة تاهيل جسر البوجواري ورفع انقاض جسر سكة القطار المتضرر في قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين	بيجي	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	60.0%	20	22/11/2018	150	8/12/2018	579,632,000
7	هدم وإعادة بناء ثانوية بيجي للبنات 18 صف	بيجي	التربية	قيد التنفيذ	67%	80	13/12/2018	180	20/1/2019	980,658,750
8	هدم وإعادة بناء ثانوية الخضراء للبنين 18 صف	يثرب	التربية	قيد التنفيذ	64%	64	11/12/2018	180	14/1/2019	980,788,500
	المجموع									8,809,784,250

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / صلاح الدين

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	توسعة مركز صحي في الساحل الأيسر/ قضاء الشرفا	الشرفا	الصحة	قيد التنفيذ	58%	55	5/12/2018	150	18/12/2018	284,192,000
2	هدم و إعادة بناء مديرية بلدية سليمان بيك	سليمان بيك	البلدية	منجز	100%	103	19/12/2018	120	2/1/2019	467,699,000
3	أكساء شوارع متفرقة في قضاء سامراء	سامراء	البلدية	منجز	100%	49	5/12/2018	120	23/12/2018	548,060,000
4	هدم و إعادة بناء مديرية بلدية يثرب	يثرب	البلدية	قيد التنفيذ	93%	65	11/12/2018	160	24/12/2018	400,092,000
5	هدم و إعادة بناء مركز شرطة سليمان بيك	سليمان بيك	الداخلية	قيد التنفيذ	73%	58	11/12/2018	180	27/12/2018	563,272,900
6	هدم و إعادة بناء مديرية شرطة يثرب	يثرب	الداخلية	قيد التنفيذ	69%	34	2/12/2018	180	20/12/2018	834,784,000
7	هدم و إعادة بناء مركز شرطة المعتصم	المعتصم	الداخلية	قيد التنفيذ	81%	18	22/11/2018	180	16/12/2018	591,548,000
8	هدم و إعادة بناء مركز شرطة دجلة	دجلة	الداخلية	منجز	100%	23	27/11/2018	180	24/12/2018	589,857,500
9	أعادة تأهيل 4 جسور للمحطة (700+ +16) كم و المحطة (115+17) كم على طريق تكريت - بيجي	بيجي	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	98%	77	13/12/2018	150	26/12/2018	457,400,000
10	تاهيل كهرباء محطات التوزيع الرئيسية / A - B جامعة تكريت	تكريت	الكهرباء	قيد التنفيذ	90%	106	19/12/2018	140	3/1/2019	1,017,611,200
	المجموع									5,754,516,600



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / كركوك

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	هدم واعادة بناء مدرسة الاسكندرونة 12 صف في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	قيد التنفيذ	90%	15	18/11/2018	210	19/11/2018	557,435,000
2	تاهيل خطوط ابراج مغذي 33 كف لتغذية محطة الرياض من محطة ملاعبالله	الحويجة	الكهرباء	قيد التنفيذ/ توجيه حث / الانحراف بسبب تاخر فحوصات المواد	84%	22	26/11/2018	160	9/12/2018	467,952,500
3	اعادة انشاء الجسر الكونكريتي على طريق (كركوك - تكريت)		الطرق والجسور	قيد التنفيذ	85%	21	26/11/2018	360	6/12/2018	1,249,294,000
4	صيانة جسر باي حسن		الطرق والجسور	منجز	100%	26	27/11/2018	180	9/12/2018	391,990,000
5	اعادة اعمار بنايات المعهد التقني - الحويجة (بناية العمادة, المركز الثقافي, ورش تدريب الطلاب)	الحويجة	التعليم العالي	قيد التنفيذ / توجيه حث	75%	108	19/12/2018	150	30/12/2018	864,570,000
6	اعادة ترميم محكمة بداءة الرياض	الرياض	وزارة العدل	قيد التنفيذ	57%	115	23/12/2018	150	3/1/2019	362,528,000
7	اعادة انشاء بناية مركز شرطة الزاب	الزاب	الداخلية	قيد التنفيذ/ مباشرة بعد التوقف بسبب تغيير موقع المشروع	15%	121	23/12/2018	150	2019-05-19	380,882,400
8	اعادة تاهيل ثانوية الاوس في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	قيد التنفيذ / توجيه حث	50%	84	13/12/2018	240	27/12/2019	401,301,000
9	تاهيل مشروع ماء تل علي القديم (400) م/3 ساعة - قضاء الحويجة	الحويجة	الماء	قيد التنفيذ	89%	92	16/12/2018	180	30/12/2018	706,112,001
10	إعادة اعمار محطات الدفع العالي لمشاريع ماء (غريب وشجرة) ناحية العباسي	العباسي	الماء	منجز	100%	98	18/12/2018	150	30/12/2018	264,000,000
11	هدم واعادة بناء مدرسة البونجم 12 صف في دافوق	دافوق	التربية	قيد التنفيذ / توجيه حث	20%	82	13/12/2018	300	27/12/2018	557,408,000
12	هدم واعادة بناء مدرسة ام البنين في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	قيد التنفيذ	63%	96	17/12/2018	300	31/12/2018	557,410,000
13	هدم واعادة بناء مدرسة البوبتير 6 صف في ناحية الملتقى	الملتقى	التربية	قيد التنفيذ / توجيه حث	74%	95	17/12/2018	200	31/12/2018	325,332,000
14	هدم واعادة بناء مدرسة المرة 6 صف في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	قيد التنفيذ / توجيه حث	72%	95				
15	صيانة الشارع الرابط بين كيوان وناحية الملتقى	الملتقى	الطرق والجسور	منجز	100%	143	31/12/2018	60	10/1/2019	280,000,000
16	إعادة اكساء الطريق الرابط بين ناحية الرياض وقضاء الحويجة	الرياض	الطرق والجسور	منجز	100%	128	27/12/2018	60		286,350,000
	المجموع									7,652,564,901

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / كركوك

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تبدیل رمل و حصی للفلاتر لمشروع ماء الحویجة الحدیث	الحویجة	الماء	منجز / تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امانة		60	27/12/2018	162,250,000
2	تاهیل مجمع ماء جدیدة السادة	الحویجة	الماء	منجز / تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امانة				
3	هدم واعادة بناء مركز الدفاع المدني فی قضاء الحویجة	الحویجة	الداخلية	قید التنفيذ / توجيه كتاب حث/ أسباب الحیود 1- تأخر تحریات التربة 2- شدة الامطار	50%	93	16/12/2018	180	30/12/2018	535,403,200
4	تجهیز مضخات لمحطات الماء فی المناطق المحررة/ الحویجة	الحویجة	الماء	منجز	100%	94	17/12/2018	50	31/12/2018	368,000,004
5	هدم واعادة بناء مركز شرطة الریاض	الریاض	الداخلية	قید التنفيذ	77%	11	4/11/2018	180	18/11/2018	380,882,400
6	هدم واعادة بناء مركز شرطة الرشاد	الرشاد	الداخلية	قید التنفيذ	77%	10	4/11/2018	180	16/12/2018	380,882,400
7	تجهیز مولدات لمشاريع الماء فی المناطق المحررة / كركوك		الماء	منجز	100%	142	31/12/2018	60	31/1/2019	748,500,000
8	هدم واعادة بناء بناية بلدية مجاری ناحية الریاض	الریاض	البلدية	قید التنفيذ / تم توجيه كتاب حث/ التأخر بسبب تغییر تصامیم الأساس حسب تقرير فحص التربة	30%	81	13/12/2018	150	26/12/2018	344,502,400
9	هدم واعادة بناء بناية بلدية مجاری ناحية الزاب	الحویجة	البلدية		30%	81				
10	تاهیل سابلو حبوب فی قضاء الحویجة	الحویجة	التجارة	منجز	100%	78	13/12/2018	183	26/12/2018	576,140,000
11	تاهیل سابلو حبوب فی ناحية الریاض	الریاض	التجارة	منجز	100%	78				
12	رفع الصبات الكونكريتية / سدة كركوك الحدیثة		الطرق والجسور	لم ینفذ / تم تحويله الى خطة عام 2019		تنفيذ امانة		25		70,800,000
	المجموع									
	3,567,360,404									

مشاريع محافظة ديالى

Diyala Governorate Projects



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تبليط واكساء شوارع متفرقة في مركز قضاء الخالص	الخالص	الطرق والجسور	منجز	100%	14	14/11/2018	90	21/11/2018	1,009,317,500
2	تجهيز مواد ومعدات لصيانة الشبكة الكهربائية في ناحية العظيم	العظيم	الكهرباء	متوقف / امر غير	95%	60	11/12/2018	60	28/1/2019	631,352,500
3	صيانة واكساء وثثبيت اكتاف طريق الصدور - ناحية المنصورية بطول 13,500 كم		الطرق والجسور	قيد التنفيذ	98%	97	18/12/2018	120	2/1/2019	908,000,000
4	هدم واعادة بناء مدرسة شجرة اليقطين 12 صف في جلولاء	جلولاء	التربية	قيد التنفيذ	92%	123	26/12/2018	180	4/2/2019	540,411,500
5	اعادة تاهيل طريق قرية الجبل بطول 4كم في ناحية بهرز باعتبار المحطة (صفر+صفر) هي الشارع الرئيسي لطريق بعقوبة - النهروان	بعقوبة	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	97%	119	23/12/2018	120	8/1/2019	404,240,000
6	اعادة تاهيل طرق (الزركانية - العوده - سفيط - دراويش) مع الطريق الفرعي لقرية الزركانية في الخالص من المحطة (صفر + صفر) سيطرة الجيش الى (3+100)	الخالص	الطرق والجسور	منجز	100%	120	23/12/2018	90	23/1/2019	308,040,000
7	صيانة واكساء الطريق الرابط لقرى الجبل المساعد بطول 6كم من المحطة (صفر+صفر)الى (6+صفر) /ناحية بهرز	بهرز	الطرق والجسور	منجز	100%	139	31/12/2018	100	14/1/2019	518,640,000
8	إعادة تاهيل طريق التحويلة والقرى المحاذية لها		الطرق والجسور	منجز	100%	137	30/12/2018	120	13/1/2019	709,840,000
9	هدم واعدة بناء روضة اطفال السعدية النموذجية	السعدية	التربية	قيد التنفيذ	68%	133	30/12/2018	180	17/1/2019	426,670,000
10	صيانة واكساء وتبليط لقرى بلدروز (قرية عتبة 7.5 كم وقرية طعيما 1.5 كم) مقاطعة 17	بلدروز	الطرق	منجز	100%	4	20/6/2018	120	3/7/2018	921,260,000
11	اكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية قررة تبة و قصبته القديمة		الطرق	منجز	100%	9	28/10/2018	60	25/11/2018	320,000,000
12	تبليط شارع ام العظام العثمانية / بعقوبة بطول 2.15 كم	بعقوبة	الطرق	منجز	100%	5	25/6/2018	75	19/7/2018	227,020,000
13	تبليط شوارع بطول 11.8 كم لقرى خان بني سعد / بعقوبة / ربيع عطشانه / وعلي الهادي والشيماء	بعقوبة	الطرق	منجز	100%	6	25/6/2018	30	19/7/2018	185,040,000
14	تأهيل الشارع رقم 21 المار ضمن المحلة 311 و 313 بطول 1.4 كم للمقطع مابين المستوصف الصحي القديم واستدارة دور الجاهزة في حي التحرير / بعقوبة	بعقوبة	الطرق	منجز	100%	1	5/6/2018	100	20/6/2018	195,720,000
15	تبليط الشارع الرئيسي داخل حدود بلدية السلام بطول 550 م	السلام	الطرق	منجز	100%	53	5/12/2018	75	13/1/2019	96,184,000
16	تأهيل انارة شوارع ناحية كنعان في ديالى	بعقوبة	الكهرباء	منجز	100%	3	7/6/2018	45	21/6/2018	111,220,000
	المجموع									7,512,955,500



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / شمال بابل

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	صيانة طريق مسيب - جرف النصر على اعتبار المحطة (صفر+صفر) تقاطع التحرير	جرف النصر	الطرق والجسور	2,860,369,360	فيد التنفيذ /باشر بتاريخ 2019/2/10 بعد التوقف بسبب تاخر الموافقات الامنية	%44	68	12/12/2018	150	26/12/2018	27/12/2018	2,000,259,000
	المجموع			2,860,369,360								2,000,259,000

محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

Baghdad Governorate Projects

الانبار



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / حزام بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	هدم واعادة بناء مدرسة بن غازي الابتدائية 18 صف	الطارمية	التربية	1,207,253,080	قيد التنفيذ	37%	102	19/12/2018	240	2/1/2019	27/12/2018	840,178,000
2	هدم واعادة بناء مدرسة ابن النفيس الابتدائية 18 صف	المشاهدة	التربية	1,207,253,080	قيد التنفيذ	49%	127	26/12/2018	240	8/1/2019	8/1/2019	840,177,600
	المجموع			2,414,506,160								1,680,355,600

خطة مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تاهيل خط كهرباء (33 كي في) محطة الصمود/ مستودعات نطف المشاهدة	المشاهدة	الكهرباء	512,502,848	منجز	100%	57	9/12/2018	120	23/12/2018	507,471,500
2	ايرصال الماء الصافي الى قرية المزرفة في التاجي		الماء	99,800,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			25	21/10/2018	99,800,000
3	مجمع ماء الحركاوي الجنوبي سعة 200م3/س	اليوسفية	الماء	792,511,290	منجز	100%	70	13/12/2018	120	27/12/2018	718,103,100
4	تأهيل مجمع ماء عودة المفرجي سعة 200م3/س	اليوسفية	الماء		منجز	100%	70				
5	تأهيل مجمع ماء هور ابو فاضل سعة 200م3/س	اليوسفية	الماء		منجز	100%	70				
6	تيليط الشارع الرئيسي في حي الجزائر/ قضاء المحمودية	المحمودية	الطرق والجسور	230,270,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	24/12/2018	205,980,000
7	تاهيل خطوط تغذية الشبكة الكهربائية لمناطق الزيدان دولية/ قضاء ابو غريب		الكهرباء	561,344,763	منجز	100%	63	11/12/2018	60	25/12/2018	508,638,400
8	انشاء كرفان دار مبيت اطباء سبع البور		الصحة	17,437,235	لجنة مشتريات / منجز	100%					19,750,000
9	إعادة تاهيل طريق الشاحنات / سيطرة بغداد - كوت	الرستمية	الداخلية	249,485,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			50	23/12/2018	200,332,000
10	إعادة تاهيل طريق الشاحنات / سيطرة بغداد - الشعب	الشعب	الداخلية	248,676,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			50	23/12/2018	199,704,000
11	تاهيل طريق قرية البوذياب واطراف الحماميات	التاجي	البلدية	250,000,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	24/12/2018	210,000,000
12	تاهيل طريق حنون	الشعب	البلدية	262,075,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	24/12/2018	229,915,000
13	تاهيل طريق السدة المحاذي لنهر دجلة / جسر ذراع دجلة لغاية جامع نور المصطفى / مقاطعة مزرفة وحصيوه	التاجي	البلدية	286,350,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	24/12/2018	240,900,000
14	ترميم ابنية مدرسية (مدرسة الامام الصادق وعظماء العرب)	النهروان	التربية	73,200,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	27/12/2018	73,200,000
15	توسعة مقر الصندوق		مباني حكومية	500,000,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	27/12/2018	250,000,000
16	توسعة القسم الهندسي / مقر الصندوق		مباني حكومية	50,000,000	لجنة مشتريات / منجز	100%			60		50,000,000
	المجموع			4,133,652,136							3,513,794,000

مشاريع المنح والقروض التي يعمل الصندوق
كمشرف ومنسق لها

ملخص تخصيصات المنح والقروض 2015 - 2018

غير ملزم	المصرف	الملزم	التخصيص	القروض	المخطط	المصرف	الملزم	التخصيص	المنح
\$92,690,699	\$179,611,777	\$257,949,000	\$350,000,000	قرض البنك الدولي- مشروع التنمية الطارئ EODP-	\$458,000	0	0	\$458,000	المنحة الجيكية
\$400,000,000	\$0	\$0	\$400,000,000	قرض البنك الدولي- التنمية الطارئ الاضافي EODP/AF	\$100,000,000	0	0	\$100,000,000	المنحة الكويتية
\$494,384,528	\$0	\$55,615,472	\$550,000,000	قرض الالمانى - برنامج العاجل - M URE 135		\$9,000,000		\$9,000,000	المنحة الصينية
	\$0			قرض الالمانى - المرحلة الثانية- أ- M URE 140					
	\$0			قرض الالمانى - المرحلة الثانية- ب- M URE 225					
\$987,075,227	\$179,611,777	\$313,564,472	\$1,300,000,000		\$100,458,000	\$9,000,000	\$0	\$109,458,000	المجموع



مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي EODP

قرض البنك الدولي - \$350 - EODP

المحافظة	القطاع	التخصيص (م. دولار)	المخطط	المصرف (م. دولار)	المصرف %	الملزم (م. دولار)	الملزم %	غير ملزم ملاحظات
نينوى , الانبار , صلاح الدين, ديالى	الكهرباء (30 مشروع منها 3 استشاري) 28 مشروع منجز و 2 مستمر	\$70,000,000	\$70,000,000	\$63,158,096.04	92%	68,809,243.52	98%	
الانبار , صلاح الدين , ديالى	البلدية و البلديات (45 مشروع) عدد مشاريع الاشغال المنجزة 8 مشاريع و المستمرة 12 مشروع اما بخصوص التجهيزات فعدد المشاريع المنجزة 17 مشروع و المستمرة 8	\$62,000,000	\$62,000,000	\$32,750,864.02	53%	61,297,920.56	99%	
نينوى (3 جسور), الانبار (9 جسور) , صلاح الدين (5 جسور & 5 طرق) , ديالى(6 طرق & 6 جسور), حزام بغداد (1 جسور)	الطرق و الجسور (35 مشروع) عدد المشاريع المنجزة 22 مشروع و المستمرة 13	\$137,000,000	\$137,000,000	\$84,421,174.09	62%	115,072,556.71	84%	
صلاح الدين (13 سيارة اسعاف & 5 عيادات متقلة) + ديالى (26 سيارة اسعاف & 9 عيادات متقلة)	الصحة + المباني (3 مشاريع) عدد سيارات الاسعافات 39 و 14 سيارات متقلة	42,000,000	42,000,000	\$10,078,886.92	56.00%	10,088,942.86	56%	
سليمانية	موارد مائية (تعديل القرض)- قيد التحضير - تم ادراج 8 مشاريع من ضمن 18 مشروع	30,000,000	30,000,000	-	0%	-	0%	
	المجموع الجزئي	\$341,000,000	\$311,000,000	\$190,409,021.07		\$255,268,663.65	75%	
	صندوق اعادة الاعمار	\$9,200,000	\$9,200,000	\$2,079,936.02	23%	4,948,916.49	54%	
	رسوم			\$875,000.00		-		
	المجموع الكلي	350,000,000	350,000,000	\$193,363,957.09	55%	\$260,217,580.14	74%	

قرض البنك الدولي- الاضافي \$ 400

ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (م. دولار)	المصرف %	المصرف (م. دولار)	المخطط	التخصيص (م. دولار)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0	\$50,000,000	\$50,000,000	الكهرباء	صلاح الدين, نينوى, الانبار, كركوك
		0%	0	0%	0	\$45,000,000	\$45,000,000	البلدية و البلديات	صلاح الدين, نينوى, الانبار, كركوك
		0%	0	0%	0	\$110,000,000	\$110,000,000	الطرق و الجسور	صلاح الدين, نينوى, الانبار, كركوك
		0%	0	0%	0	\$32,000,000	\$32,000,000	الزراعة	صلاح الدين, نينوى, الانبار, كركوك
		0%	0	0%	0	\$5,000,000	\$5,000,000	النقل	صلاح الدين, نينوى, الانبار
		0%	0	0%	0	\$35,000,000	\$35,000,000	التربية	صلاح الدين, نينوى, الانبار
		0%	0	0%	0	\$32,000,000	\$32,000,000	موارد مائية	صلاح الدين, نينوى , الانبار, كركوك
		0%	0	0%	0	\$60,000,000	\$60,000,000	المكون العاشر (محافظات) و تشمل (صلاح الدين =10, ديالى =10, نينوى =20, الانبار =20)	(صلاح الدين , الانبار , نينوى, ديالى)
		0%	0	0%	0	\$369,000,000	\$369,000,000	المجموع الجزئي	
		0%	0	0%	0	\$1,000,000	\$1,000,000	رسوم	
		0%	0	0%	0	\$30,000,000	\$30,000,000	احتياط	
		0%	0	0%	0	\$400,000,000	\$400,000,000	المجموع الكلي	

قرض الالمانى - برنامج العاجل 135 مليون يورو

ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (م. يورو)	المصرف %	المصرف (م. يورو)	المخطط	التخصيص (م. يورو)	القطاع	المحافظة
		61%	27.69	8%	3,470,767.80	45,000,000	45,000,000	الكهرباء	نينوى
		0%	0	0%	0	45,000,000	45,000,000	البلدية و البلديات	نينوى
		0%	0	0%	0	45,000,000	45,000,000	الطرق و الجسور	نينوى
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها		المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها		الاحتياط
		0%	27.69	8%	3,470,767.80	135000000	135000000		المجموع الكلي

قرض الالمانى - برنامج العاجل المرحلة الثانية-أ 140 مليون يورو

ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم	المصرف %	المصرف (م. يورو)	المخطط	التخصيص (م. يورو)	القطاع	المحافظة
قيد الاعلان		0%	0	0%	0	140,000,000	140,000,000	الكهرباء	نينوى, صلاح الدين , الانبار
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها		المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها		الاحتياط
		0%	0	0%	0	140,000,000	140,000,000		المجموع الكلي

قرض الالمانى - برنامج العاجل المرحلة الثانية-ب 225 مليون يورو

ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم	المصرف %	المصرف (م. يورو)	المخطط	التخصيص (م. يورو)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0	90,000,000	90,000,000	الصحة	بغداد , صلاح الدين , الانبار
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	البلدية و البلديات	ليتم تعبئتها
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	الطرق و الجسور	ليتم تعبئتها
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها		المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها		الاحتياط
		0%	0	0%	0	135,000,000	135,000,000		المجموع الكلي

قرض البنك التنمى الاسلامى 250 مليون دولار تم تخصيص 119 مليون للقطاعات التالية:

ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (م. دولار)	المصرفوف %	المصرفوف (دولار) م.	المخطط	التخصيص (دولار) م.	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	صحة	الانبار و صلاح الدين - 2019
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	مياه	الانبار - 2019
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	تعليم تقني	كركوك - 2019
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	زراعة	صلاح الدين و الانبار - 2020
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	تعليم عالي	نينوى و الانبار - 2020
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	تعليم عالي	صلاح الدين - 2021
		0%	0	0%	0	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	طرق	بابل - 2021
		0%	0	0%	0				المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0				رسوم
		0%	0	0%	0				احتياط
		0%	0	0%	0				المجموع الكلي

المنحة الجيكية - 458 الف دولار

ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (دولار)	المصرفوف %	المصرفوف (دولار)	المخطط	التخصيص (دولار)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0	277,800	277,800	الصحة	نينوى (قضاء الحمدانية)
		0%	0	0%	0	180,200	180,200	الكهرباء	نينوى (قضاء الحمدانية)
		0%	0	0%	0	458,000	458,000		المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0				الاحتياط
		0%	0	0%	0	458,000	458,000		المجموع الكلي

المنحة الكويتية - المرحلة الاولى 15 مليون دولار									
ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (م. دولار)	المصرف %	المصرف (م. دولار)	المخطط	التخصيص (م. دولار)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0	\$ 6,021,418.00	\$ 6,021,418.00	الصحة	الانبار (8)
		0%	0	0%	0	\$ 1,238,817.00	\$ 1,238,817.00		ديالى (1)
		0%	0	0%	0	\$ 2,696,863.00	\$ 2,696,863.00		صلاح الدين (5)
		0%	0	0%	0	\$ 3,024,093.00	\$ 3,024,093.00		نينوى (4)
		0%	0	0%	0	\$ 415,638.00	\$ 415,638.00		شمال بابل (1)
		0%	0	0%	0	\$ 13,396,829.00	\$ 13,396,829.00		المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00		رسوم
		0%	0	0%	0	\$ 440,000.00	\$ 440,000.00		احتياط
		0%	0	0%	0	\$ 14,396,829.00	\$ 14,396,829.00		المجموع الكلي
المنحة الكويتية - المرحلة الثانية 85 مليون دولار									
ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (م. دولار)	المصرف %	المصرف (م. دولار)	المخطط	التخصيص (م. دولار)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0	\$ 28,153,489.00	\$ 28,153,489.00	الصحة	الانبار (6)
		0%	0	0%	0	\$ 7,162,400.00	\$ 7,162,400.00		ديالى (5)
		0%	0	0%	0	\$ 8,146,164.00	\$ 8,146,164.00		صلاح الدين (11)
		0%	0	0%	0	\$ 29,193,225.00	\$ 29,193,225.00		نينوى (2)
		0%	0	0%	0	\$ 2,868,384.00	\$ 2,868,384.00		كركوك (7)
		0%	0	0%	0	\$ 476,338.00	\$ 476,338.00		شمال بابل (1)
		0%	0	0%	0	\$ 76,000,000.00	\$ 76,000,000.00		المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0	5,000,000	5,000,000		رسوم
		0%	0	0%	0	4,000,000	4,000,000		احتياط
		0%	0	0%	0	\$ 85,000,000.00	\$ 85,000,000.00		المجموع الكلي

مشاريع المنحة الصينية عدد الاليات 118 بمبلغ ستون يوان صيني او \$ 9,000,000

قطاع البلديات					
عدد المستفيدين	مشاريع قيد الانجاز	مشاريع المنجزة	عدد المشاريع الكلية	القطاع	المحافظة
		36	36	تجهيز اليات	نينوى
		36	36	تجهيز اليات	الانبار
		18	18	تجهيز اليات	صلاح الدين
		11	11	تجهيز اليات	ديالى
		9	9	تجهيز اليات	كركوك
		7	7	تجهيز اليات	بغداد
		1	1	تجهيز اليات	بابل
		118	118		المجموع

منحة البنك الاسلامي للتنمية 5 مليون دولار

ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (دولار)	المصرف %	المصرف (دولار)	المخطط	التخصيص (دولار)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0	1.2	1.2	مياه - 2019	صلاح الدين (1)
		0%	0	0%	0	1.2	1.2	صرف صحي - 2020	الانبار (1)
		0%	0	0%	0	2.5	2.5	مياه- 2021	بغداد (1)
		0%	0	0%	0	4.9	4.9		المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0	0.1	0.1		احتياط
		0%	0	0%	0	5	5		المجموع الكلي

منحة الهند 494 الف دولار

ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (دولار)	المصرف %	المصرف (دولار)	المخطط	التخصيص (دولار)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0		ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات	ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات	نينوى / سنجار
		0%	0	0%	0		ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات	ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات	نينوى / سنجار
		0%	0	0%	0		ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات	ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات	نينوى / سنجار
		0%	0	0%	0				المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0				احتياط
		0%	0	0%	0				المجموع الكلي



جسر عمر بن عبد العزيز / الرمادي / الأنبار





إعادة تأهيل جسر شيشين | صلاح الدين



تجهيز محطات متنقلة للمحافظات



تجهيز اليات تخصصية للمحافظات المحررة



42.5 كم شارع نفط خانة - مندلي



إعادة تأهيل جسر القاسم ومقاربه



حل مؤقت لجسر الموصل الرابع

תודה
Dankie Gracias
Спасибо شكراً
Merci Takk
Köszönjük Terima kasih
Grazie Dziękujemy Děkojame
Ďakujeme Vielen Dank Paldies
Kiitos Tänname teid 谢谢
Thank You Tak
感謝您 Obrigado Teşekkür Ederiz
Σας ευχαριστούμε 감사합니다
ขอบคุณ
Bedankt Děkujeme vám
ありがとうございます
Tack
