



صندوق
إعادة اعمار المناطق المتضررة

Re
F
AA
T
O

التقرير الفني لمشاريع
صندوق إعادة الاعمار
منذ تأسيسه و لغاية
31/12/2019
الجزء (السادس والعشرون)
كانون الأول 2019

A decorative green pattern with repeating circular motifs, similar to the orange pattern but in green.

المقدمة

- تأسس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وفق المادة (28) من قانون الموازنة الفدرالية العامة لعام 2015. اعقبه صدور نظام الصندوق رقم (2) لسنة 2015، وقد نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددها (4352) في 16/2/2015 وقد جاء فيها (يؤسس صندوق إعادة اعمار المناطق التي دمرها الإرهاب ويمول من المنح والمساعدات الدولية، ويخصص له مبلغ من الموازنة الاتحادية).
- وفي عام 2017 تم تعديل بعض فقرات النظام وحددت الهيكلية الإدارية وصدر النظام رقم (3) في جريدة الوقائع العراقية بعددها (4441).
- وقد حددت مناطق عمل الصندوق في المدن التي دمرها الإرهاب في كل من الانبار، ديالى، صلاح الدين، نينوى، شمال بابل، حزام بغداد (أبو غريب) وبعض المناطق الجنوبية من كركوك.
- هذا الكراس وهو تقريراً فنياً والذي يصدر كل شهر لمشاريع التي ينفذها الصندوق من الموازنة الفدرالية بشقيها الاستثماري والبرامج الخاصة، ويتم التوثيق بإحداثيات الـ (GPS) إضافة الى صور ومراحل الإنجاز بصورة دقيقة، كما ويحتوي هذا الكراس على المشاريع التي تنفذها الوزارات القطاعية كجزء من واجبات الصندوق في التدقيق المالي والفني التي يشرف عليها مدققون عالميون معينين من قبل الصندوق من خلال البنك الدولي والبنك الألماني.
- نأمل ان ترسم هذه السلسلة الشهرية من الكراسات خارطة إعادة الاعمار المترقبة.
- والله ولي التوفيق.

مهدف انشاء الصندوق:-

- 1- إعادة اعمار وتأهيل المناطق التي دمرها الإرهاب وإزالة آثارها.
- 2- معالجة الاضرار الحاصلة في البنى التحتية.
- 3- تعويض الفرص التنموية.

آلية عمل الصندوق:

يعمل الصندوق كمنسق ومراقب على تنفيذ القروض التي تقدم للعراق مثل قرض البنك الدولي وقرض بنك التنمية الألماني والتي تنفذ من قبل الوزارات القطاعية او من خلال المنح (المنحة الكويتية للقطاع الصحي والمنحة الصينية لأليات البلديات والمنحة التشيكية).

كما ويعمل الصندوق كمنفذ للمشاريع التي تقدم له من المحافظات المتضررة من خلال المبالغ المرصودة من الموازنة الاتحادية

مهام صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وفق نظام رقم (3) لسنة 2017

- حسب المادة اولا من نظام صندوق إعادة الاعمار يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بشخصية معنوية وذات استقلال مالي واداري.

وفق المادة (5) يمارس الصندوق المهام الآتية:-

- التنسيق مع الجهات المعنية لوضع أولويات المشاريع في المحافظات المتضررة.
- السعي الى جلب المنح والهبات والمساعدات والقروض.
- القيام بإجراءات التعاقد ومتابعة تنفيذ المشاريع.
- متابعة تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار الممولة من المنح والقروض.
- تقديم الخطط اللازمة لإعادة الاعمار ووضع السياسات اللازمة لتحقيق اهداف الدولة.
- تنظيم ورعاية المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية المتعلقة بإعادة الاعمار وذلك سعيا لجلب المنح والهبات والمساعدات.

صندوق إعادة الاعمار

- الرؤيا:

بناء الثقة بين العراقيين والدولة من جهة وبين العراق والمجتمع الدولي من جهة أخرى.

- الرسالة:

إعادة بناء الانسان والجدران وادامة العجلة الاقتصادية في المدن المتضررة من العمليات الإرهابية.

وتتم من خلال الابعاد التالية:-

1- البعد الاجتماعي:

تجديد العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين على المصدقية والثقة في جهود إعادة

الاعمار.

2- البعد الاقتصادي:

ادامة العجلة الاقتصادية في المناطق المتضررة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة

3- البعد الفيزيائي وإعادة الخدمات:

إعادة اعمار المنشآت العامة والخاصة والمتضررة من العمليات الارهابية

القسم الأول

ملخص مشاريع الصندوق على الموازنة الفدرالية

عدد المشاريع المخطط لها والمنفذة والمنجزة والمستمرة للأعوام 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 للموازنة الفيدرالية

السنة	المبلغ المخصص / مليار دينار	عدد المشاريع المخطط لها	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المستمرة	نسبة المشاريع المنجزة من المتعاقد عليها
2016	155	150	150	150	—	100%
2017	150	163	159	156	3	98%
2018	150	198	196	170	26	87%
2019	244.3	442	442	18	424	4%
المجموع	699.3	953	947	494	453	52%

جدول يمثل اعداد مشاريع صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة للموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات منذ عام 2016 - 2019

المجموع	القطاعات																										المحافظات		
	دوائر حكومية		الموارد المائية		الماء والمجاري		الكهرباء		الطرق والجسور		الصحة		الشباب والرياضة		الزراعة		الداخلية		التعليم العالي		التربية		التجارة		البلدية و البلديات			نوع التمويل	
المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية		المنجز
227	376	5	20	7	12	106	124	15	36	8	23	9	12	1	2	0	3	9	11	24	30	35	68	1	3	7	32	الانبار	
39	160	0	13	0	2		17		14	4	18	3	6		1			4	6		5	28	60				18	استثماري	
188	216	5	7	7	10	106	107	15	22	4	5	6	6	1	1		3	5	5	24	25	7	8	1	3	7	14	تشغيلي	
20	22	0	0	0	0	17	17	0	1	3	4	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	شمال بابل
1	2						0		1	1	1																	استثماري	
19	20					17	17			2	3																	تشغيلي	
41	101	4	5	1	2	5	13	10	15	5	22	1	5			0	0	2	3	0	0	10	23	0	0	3	13	حزام بغداد	
10	49		1	1	1		4		5		14		1									9	15				8	استثماري	
31	52	4	4		1	5	9	10	10	5	8	1	4					2	3			1	8			3	5	تشغيلي	
52	133	0	0	0	0	7	21	4	17	30	50	1	4	0	1	0	0	0	3	0	0	7	20	0	0	3	17	ديالى	
31	94						6	3	11	24	43		3						3			4	14				14	استثماري	
21	39					7	15	1	6	6	7	1	1		1				0			3	6			3	3	تشغيلي	
45	87	0	7	0	0	5	8	3	3	1	11	1	4	0	1	0	0	9	12	2	4	12	20	0	0	12	17	صلاح الدين	
16	45		3				1	1	1	0	7		3						2	2	4	12	20			1	4	استثماري	
29	42		4			5	7	2	2	1	4	1	1		1				9	10						11	13	تشغيلي	
32	86	1	4	0	0	10	16	3	6	5	15	0	0			0	2	2	9	0	1	6	18	2	2	3	13	كركوك	
14	55	1	3			2	8	0	3	4	10						2	0	1	0	1	6	18			1	9	استثماري	
18	31		1			8	8	3	3	1	5							2	8					2	2	2	4	تشغيلي	
76	148	3	7	0	3	6	8	6	18	1	8	6	9			1	5	6	7	13	26	17	29	2	7	15	21	نينوى	
32	77	1	2		3			2	12	0	4	1	1				2	0	1	2	12	13	19	1	3	12	18	استثماري	
44	71	2	5		0	6	8	4	6	1	4	5	8			1	3	6	6	11	14	4	10	1	4	3	3	تشغيلي	
493	953	13	43	8	17	156	207	41	96	53	133	18	34	1	4	1	10	28	45	39	61	87	178	5	12	43	113	الإجمالي الكلي	

القسم الثاني

مشاريع المنح والقروض التي يعمل الصندوق كمشرف ومنسق لها

عدد المشاريع المخطط لها والمنفذة والمنجزة والمستمرة

نسبة المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المستمرة	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المخطط لها	المبلغ المخصص / دولار	نوع التمويل
78%	28	<u>88</u>	<u>114</u>	<u>137</u>	\$350,000,000	قرض البنك الدولي الطارئ- EODP
-	11	-	11	<u>~140</u>	\$400,000,000	قرض البنك الدولي الطارئ-الإضافي EODP
34%	6	3	<u>9</u>	<u>~46</u>	URE 500,000,000	القرض الألماني - GFCI
			-	<u>10</u>	\$458,000,000	المنحة التشيكية
100%	0	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	\$9,000,000	المنحة الصينية (118) آلية
-	19	-	-	<u>55</u>	\$100,000,000	المنحة الكويتية

ملخص بأعداد مشاريع المنح والقرض - التي يعمل الصندوق الأعمار كمشرف ومنسق لها / حسب المحافظات والقطاعات

المجموع		القطاعات																				المحافظة
		الشباب والرياضة		الموارد المائية		الماء		الكهرباء		الطرق والجسور		الصحة		الزراعة		التعليم العالي		التربية		البلديات		
مجموع المنجز	مجموع المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	
22	84	0	0	0	4	0	1	9	20	5	10	0	15	0	3	0	1	0	5	8	25	الأنبار
3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	3	شمال بابل
2	9	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	حزام بغداد
35	61	0	0	0	0	0	0	11	11	9	10	0	8	0	1	0	0	0	3	15	28	ديالى
34	99	0	1	0	6	0	1	16	24	6	9	0	20	0	2	0	1	0	3	12	32	صلاح الدين
1	31	0	0	0	3	0	0	0	7	0	1	0	7	0	0	0	1	0	2	1	10	كركوك
7	104	0	0	0	1	0	0	3	29	3	12	0	10	0	2	0	1	0	9	1	40	نينوى
104	395	0	1	0	14	0	3	39	91	24	45	0	62	0	8	0	4	0	26	41	139	المجموع

ملاحظة :- حقول المشاريع المنجزة تشمل (البنك الدولي المرحلة الاولى + المنحة الصينية)

جدول يمثل اعداد مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات لعام 2016 / منجزة

الإجمالي الكلي	القطاعات											المحافظات
	الموارد المائية	المحافظة	الماء	الكهرباء	القضاء	الصحة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة	البلديات	المحافظات
113	4	2	78	1	1	5	3	18			1	الانبار
13			13									بابل
6				6								بغداد
4							4					صلاح الدين
3			1				2					كركوك
11			2	2		2			2	1	2	نينوى
2				2								عقود محولات وقابلوات لجميع المحافظات
152	4	2	94	11	1	7	9	18	2	1	3	الإجمالي الكلي

جدول يمثل توزيع مبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية على المحافظات والقطاعات لعام 2016 / منجزة

الإجمالي الكلي	القطاعات											المحافظات
	الموارد المائية	المحافظة	الماء	الكهرباء	القضاء	الصحة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة	البلديات	
9,306,587,480	328,310,000	199,349,990	6,248,522,000	93,306,000	79,550,000	499,601,000	169,248,000	1,621,700,490			67,000,000	الأنبار
1,083,000,000			1,083,000,000									بابل
599,591,000				599,591,000								بغداد
263,340,000							263,340,000					صلاح الدين
285,023,500			95,000,000				190,023,500					كركوك
542,971,250			121,000,000	39,078,500		27,000,000			63,142,750	98,000,000	194,750,000	نينوى
7,703,490,000				7,703,490,000								عقود محولات وقابلوات لجميع المحافظات
19,784,003,230	328,310,000	199,349,990	7,547,522,000	8,435,465,500	79,550,000	526,601,000	622,611,500	1,621,700,490	63,142,750	98,000,000	261,750,000	الإجمالي الكلي

جدول يمثل اعداد مشاريع الصندوق على الموازنة الفدرالية حسب المحافظات و القطاعات ونوع التمويل لعام 2017

المجموع		دوائر حكومية		قطاع الموارد مانية		قطاع الطرق والجسور		قطاع الماء		قطاع الكهرباء		قطاع الداخلية		قطاع التعليم العالي		قطاع التربية		قطاع البلديات		المحافظة
المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	المنجز	الكلية	نوع التمويل
30	33	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	9	12	4	4	12	12	نينوى
15	15															4	4	11	11	استثماري
15	18									1	1	4	4	9	12			1	1	تشغيلي
11	11	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	0	0	0	0	2	2	2	2	كركوك
2	2															2	2			استثماري
9	9					1	1	3	3	3	3							2	2	تشغيلي
26	27	0	0	0	0	0	0	5	5	2	2	2	2	2	2	6	6	9	10	صلاح الدين
10	10									1	1			2	2	6	6	1	1	استثماري
16	17							5	5	1	1	2	2					8	9	تشغيلي
19	20	0	0	0	0	12	12	3	3	1	1	0	0	0	0	2	3	1	1	ديالى
15	16					12	12			1	1					2	3			استثماري
4	4							3	3									1	1	تشغيلي
6	7	0	0	0	0	2	2	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	بابل
0	1									1										استثماري
6	6					2	2	4	4											تشغيلي
49	52	1	1	3	5	3	3	2	2	2	3	1	1	3	3	28	28	6	6	الانبار
29	31				2	1	1									28	28			استثماري
20	21	1	1	3	3	2	2	2	2	2	3	1	1	3	3			6	6	تشغيلي
13	13	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	7	7	0	0	بغداد
8	8			1	1											7	7			استثماري
5	5	1	1			1	1	1	1	2	2									تشغيلي
154	163	3	3	7	11	37	37	35	35	20	24	14	14	28	34	91	93	60	62	المجموع الكلية

جدول يمثل توزيع مبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفدرالية على المحافظات و القطاعات لعام 2017

المجموع	دوائر حكومية	قطاع الموارد مائية	قطاع الطرق والجسور	قطاع الماء	قطاع الكهرباء	قطاع الداخلية	قطاع التعليم عالي	قطاع التربية	قطاع البلديات	المحافظة
16,583,191,450					731,600,000	519,926,500	9,418,039,550	2,885,667,900	3,027,957,500	نينوى
2,908,337,000			63,200,000	196,481,000	1,842,734,000			616,582,000	189,340,000	كركوك
12,547,743,900				1,713,600,000	1,628,400,000	779,982,000	1,214,602,000	3,491,996,900	3,719,163,000	صلاح الدين
6,825,722,350			4,196,530,750	385,400,000	111,220,000			2,025,821,600	106,750,000	ديالى
1,964,072,520			845,664,520	298,620,000	819,788,000					بابل
50,522,074,002	99750000	15612422000	2,507,415,000	136,800,000	3,614,782,980	1052385000	621812300	21,853,665,597	5,023,041,125	الانبار
6,193,070,280	100,000,000	899,346,750	88,225,000	284,350,000	694,443,370			4,126,705,160		بغداد
97,544,211,502	199,750,000	16,511,768,750	7,701,035,270	3,015,251,000	9,442,968,350	2,352,293,500	11,254,453,850	35,000,439,157	12,066,251,625	المجموع

جدول يمثل مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات لعام 2018

المجموع		القطاعات																				المحافظات		
		دوائر حكومية		الماء والمجاري		الكهرباء		الطرق والجسور		الصحة		الزراعة		الداخلية		التعليم العالي		التربية		التجارة			البلدية و البلديات	
المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	
51	51	0	0	16	16	10	10	5	5	4	4	0	0	5	5	3	3	7	7	1	1	0	0	الانبار
10	10							3	3	3	3			4	4									استثماري
41	41			16	16	10	10	2	2	1	1			1	1	3	3	7	7	1	1			تشغيلي
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	شمال بابل
1	1							1	1															استثماري
18	18	2	2	4	4	2	2	1	1	1	1	0	0	2	2	0	0	3	3	0	0	3	3	حزام بغداد
2	2																	2	2					استثماري
16	16	2	2	4	4	2	2	1	1	1	1			2	2			1	1			3	3	تشغيلي
33	34	0	0	4	4	3	3	18	18	1	1	0	0	0	0	0	0	5	6	0	0	2	2	ديالى
16	16					2	2	12	12									2	2					استثماري
17	18			4	4	1	1	6	6	1	1							3	4			2	2	تشغيلي
15	18	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	0	0	3	4	0	0	6	6	0	0	3	3	صلاح الدين
6	8								2									6	6					استثماري
9	10					1	1	1	1	1	1			3	4							3	3	تشغيلي
17	28	1	1	6	6	0	1	4	5	0	0	0	0	0	4	0	1	4	6	2	2	0	2	كركوك
11	16	1	1	2	2		1	4	4						1		1	4	6					استثماري
6	12			4	4				1						3					2	2		2	تشغيلي
35	48	3	5	4	4	3	6	1	4	4	4	1	1	2	3	4	5	11	13	1	2	1	1	نينوى
17	26	1	1			2	5		2	1	1				1	2	3	9	10	1	2	1	1	استثماري
18	22	2	4	4	4	1	1	1	2	3	3	1	1	2	2	2	2	2	3					تشغيلي
170	198	6	8	34	34	19	23	31	37	11	11	1	1	12	18	7	9	36	41	4	5	9	11	الإجمالي الكلي

جدول يمثل توزيع مبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية على المحافظات والقطاعات لعام 2018

الإجمالي الكلي	المحافظات											
	دوائر حكومية	الماء والمجاري	الكهرباء	الطرق والجسور	الصحة	الزراعة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة	البلدية و البلديات	نوع التمويل
19,120,011,200		4,021,707,200	2,658,704,000	3,013,384,000	1,242,514,000		2,345,197,800	1,141,948,900	4,089,139,300	607,416,000		الانبار
5,040,706,600				2,403,008,000	1,150,824,000		1,486,874,600					استثماري
14,079,304,600		4,021,707,200	2,658,704,000	610,376,000	91,690,000		858,323,200	1,141,948,900	4,089,139,300	607,416,000		تشغيلي
2,000,259,000				2,000,259,000								بابل
2,000,259,000				2,000,259,000								استثماري
5,194,149,600	300,000,000	817,903,100	1,016,109,900	205,980,000	19,750,000		400,036,000		1,753,555,600	680,815,000		بغداد
1,680,355,600									1,680,355,600			استثماري
3,513,794,000	300,000,000	817,903,100	1,016,109,900	205,980,000	19,750,000		400,036,000		73,200,000	680,815,000		تشغيلي
13,705,639,215		1,107,700,700	1,321,577,000	7,961,501,514	96,755,000				2,379,179,500	838,925,501		ديالى
7,512,775,500			742,572,500	5,803,121,500					967,081,500			استثماري
6,192,863,715		1,107,700,700	579,004,500	2,158,380,014	96,755,000				1,412,098,000	838,925,501		تشغيلي
14,564,300,850			1,017,611,200	4,985,812,000	284,192,000		2,579,462,400		4,281,372,250	1,415,851,000		صلاح الدين
9,827,395,450			1,017,611,200	4,528,412,000					4,281,372,250			استثماري
4,736,905,400				457,400,000	284,192,000		2,579,462,400			1,415,851,000		تشغيلي
11,219,925,305	362,528,000	2,248,862,005	467,952,500	2,278,434,000			1,678,050,400	864,570,000	2,398,886,000	576,140,000	344,502,400	كركوك
7,652,564,901	362,528,000	970,112,001	467,952,500	2,207,634,000			380,882,400	864,570,000	2,398,886,000			استثماري
3,567,360,404		1,278,750,004		70,800,000			1,297,168,000			576,140,000	344,502,400	تشغيلي
43,318,433,950	2,054,444,000	1,479,428,750	13,159,580,000	3,300,644,000	6,263,047,000	232,313,000	2,317,910,600	3,348,214,600	5,944,624,000	5,029,748,000	188,480,000	نينوى
30,864,723,800	589,560,000		11,741,080,000	2,331,764,000	1,038,672,000		1,961,520,000	2,600,567,000	5,383,332,800	5,029,748,000	188,480,000	استثماري
12,453,710,150	1,464,884,000	1,479,428,750	1,418,500,000	968,880,000	5,224,375,000	232,313,000	356,390,600	747,647,600	561,291,200			تشغيلي
109,122,719,120	2,716,972,000	9,675,601,755	19,641,534,600	23,746,014,514	7,906,258,000	232,313,000	9,320,657,200	5,354,733,500	20,846,756,650	6,213,304,000	3,468,573,901	الإجمالي الكلي

جدول يمثل اعداد مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات لعام 2019

الإجمالي الكلي		المحافظة																								نوع التمويل			
		القطاع																											
المنجز	الكلي	مباني حكومية		الموارد المائية		الماء والمجاري		الكهرباء		الطرق والجسور		الصحة		الشباب والرياضة		الزراعة		الداخلية		التعليم العالي		التربية		التجارة		البلدية والبلديات			
		المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي
13	160	1	17	0	3	10	28	2	22	0	15	0	3	0	1	0	3	0	2	0	6	0	33	0	2	0	25	الانبار	
0	119		13				17		14		14		3		1				2		5		32				18	استثماري	
13	41	1	4		3	10	11	2	8		1						3				1		1		2		7	تشغيلي	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	بابل
0	1										1																	0	تشغيلي
4	64	1	2	0	1	0	8	0	5	3	20	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	0	0	0	10	بغداد	
0	39		1				4		5		14		1										6				8	استثماري	
4	25	1	1		1		4			3	6		3						1				7				2	تشغيلي	
0	79	0	0	0	0	0	14	0	13	0	20	0	3	0	1	0	0	0	3	0	0	0	11	0	0	0	14	ديالى	
0	62						6		8		19		3						3				9				14	استثماري	
0	17						8		5		1				1								2				0	تشغيلي	
0	38	0	7	0	0	0	3	0	0	0	8	0	3	0	1	0	0	0	2	0	2	0	8	0	0	0	4	صلاح الدين	
0	27		3				1				5		3						2		2		8				3	استثماري	
0	11		4				2				3				1												1	تشغيلي	
1	44	0	3	0	0	0	6	0	2	0	9	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	10	0	0	1	9	كركوك	
1	37		2				6		2		6						2						10			1	9	استثماري	
0	7		1								3								3								0	تشغيلي	
0	56	0	2	0	3	0	2	0	9	0	4	0	3	0	0	0	4	0	0	0	9	0	10	0	4	0	6	نينوى	
0	36		1		3				7		2						2				9		5		1		6	استثماري	
0	20		1				2		2		2		3				2					5		3			0	تشغيلي	
18	442	2	31	0	7	10	61	2	51	3	77	0	16	0	3	0	9	0	11	0	17	0	85	0	6	1	68	الإجمالي الكلي	

جدول بمبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية لعام 2019 حسب المحافظات و القطاعات

المجموع	القطاعات													المحافظة
	مباني حكومية	الموارد المائية	الماء والمجاري	الكهرباء	الطرق والجسور	الصحة	الشباب والرياضة	الزراعة	الداخلية	التعليم العالي	التربية	التجارة	البلدية والبلديات	
158,600,932,300	12,110,614,375	1,051,286,300	19,323,918,355	14,361,824,570	20,378,870,950	3,793,976,000	1,064,000,000	724,195,250	6,892,069,400	11,004,979,750	33,524,561,750	640,423,500	33,730,212,100	الانبار
142,626,143,675	10,026,248,750		15,805,197,805	9,072,656,720	20,092,520,950	3,793,976,000	814,000,000		6,892,069,400	10,567,468,000	33,297,816,250		32,264,189,800	استثماري
15,974,788,625	2,084,365,625	1,051,286,300	3,518,720,550	5,289,167,850	286,350,000		250,000,000	724,195,250		437,511,750	226,745,500	640,423,500	1,466,022,300	تشغيلي
1,359,171,665			494,381,665		864,790,000									بابل
1,359,171,665			494,381,665		864,790,000									تشغيلي
33,768,053,575	250,000,000	409,647,250	2,768,044,500	3,486,228,900	19,258,540,000	2,307,237,525	0	0	254,006,250	0	4,534,349,150	0	500,000,000	بغداد
26,739,863,975			1,414,460,000	3,236,228,900	16,880,110,000	1,375,147,575					3,833,917,500			استثماري
7,028,189,600	250,000,000	409,647,250	1,353,584,500	250,000,000	2,378,430,000	932,089,950			254,006,250		700,431,650		500,000,000	تشغيلي
70,173,624,053	0	0	5,833,492,621	7,178,787,780	26,321,540,857	9,780,033,000	294,816,300	0	2,781,885,000	0	8,652,518,825	0	9,330,549,670	ديالى
62,225,268,507			2,626,401,400	4,899,478,580	24,667,204,857	9,780,033,000			2,781,885,000		8,139,716,000		9,330,549,670	استثماري
7,948,355,546			3,207,091,221	2,279,309,200	1,654,336,000		294,816,300				512,802,825			تشغيلي
39,609,188,200	6,490,640,000	0	1,530,688,200	0	15,708,897,150	3,871,000,000	477,462,750	0	1,560,000,000	1,323,208,000	5,888,610,000	0	2,758,682,100	صلاح الدين
32,651,622,650	3,876,000,000		517,000,000		13,586,572,150	3,871,000,000			1,560,000,000	1,323,208,000	5,888,610,000		2,029,232,500	استثماري
6,957,565,550	2,614,640,000		1,013,688,200		2,122,325,000		477,462,750						729,449,600	تشغيلي
34,570,620,919	2,122,000,000	0	2,998,970,000	1,636,154,059	11,128,003,000	0	0	3,057,000,000	751,537,075	0	3,406,459,000	0	9,470,497,785	كركوك
31,072,883,844	1,708,000,000		2,998,970,000	1,636,154,059	8,795,803,000			3,057,000,000			3,406,459,000		9,470,497,785	استثماري
3,497,737,075	414,000,000				2,332,200,000				751,537,075					تشغيلي
97,244,398,685	933,216,250	6,429,221,225	0	14,175,300,245	1,331,228,500	6,143,722,925	0	7,274,684,000	0	34,856,819,700	7,035,833,450	7,214,540,600	11,849,831,790	نينوى
82,538,802,535	581,000,000	5,844,589,975		12,938,757,570	549,803,500			6,343,000,000		34,856,819,700	4,616,000,000	4,959,000,000	11,849,831,790	استثماري
14,705,596,150	352,216,250	584,631,250		1,236,542,675	781,425,000	6,143,722,925		931,684,000			2,419,833,450	2,255,540,600		تشغيلي
435,325,989,397	21,906,470,625	7,890,154,775	32,949,495,341	40,838,295,554	94,991,870,457	25,895,969,450	1,836,279,050	11,055,879,250	12,239,497,725	47,185,007,450	63,042,332,175	7,854,964,100	67,639,773,445	الإجمالي الكلي

**مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية
حسب المحافظات لعام 2016**

مشروع محافظة الانبار

الانبار



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة الانبار

ت	القطاع	اسم المشروع	القضاء / الناحية	المبلغ
1	الماء	صيانة مجمع ماء الجبور / القرية العصرية سعة 100م ³ / ساعة + تأهيل مجمع زويغير سعة 200م ³ / ساعة	الرمادي	58,320,000
2	الماء	صيانة مجمع ماء زويغير الثاني سعة 200م ³ في الرمادي	الرمادي	69,525,000
3	الماء	صيانة مجمع ماء البوعيثة الخامس سعة 100م ³ + تأهيل مجمع ماء البوعيثة الرابع سعة 50م ³ / ساعة	الرمادي	55,534,000
4	الماء	تجهيز مولدة 150 كي في اي + مولدة 250 كي في اي لمشروع ماء تل اسود (عبد مخليف) وتل اسود (عبد مناور)	هيت / الفرات	86,000,000
5	الماء	صيانة مجمع ماء الحامضية القديم سعة 200م ³ / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	96,515,000
6	الماء	صيانة مجمع العدنان في قضاء الرمادي	الرمادي	76,570,000
7	الماء	تجهيز مولدة كهرباء 250 كي في اي لمجمع اليونسييف + تجهيز مولدة كهرباء لمجمع ماء زكورة الثالث	الرمادي	90,000,000
8	الماء	تجهيز مولدة 250 كي في اي مع هيكل السحب لمجمع العدنان في قضاء الرمادي	الرمادي	66,000,000
9	الماء	صيانة مجمع ماء البوغضبان + تجهيز مولدة بيركنز 250 كي في اي	الرمادي	81,167,000
10	الماء	صيانة ماء طوي البوجراد	الرمادي	72,500,000
11	الماء	صيانة مجمع ابو طيبان / صعب الحردان القصر سعة 200م ³ / ساعة + تأهيل مجمع ماء زكورة الاول سعة 200م ³ / ساعة	الرمادي	75,850,000
12	الماء	صيانة مجمع ماء البوعبيد الجديد سعة 200م ³ / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	84,960,000
13	الماء	صيانة مجمع ماء البوكاطع + تجهيز مولدة 250 كي في اي لمجمع ماء البوذباب الحويجة	الرمادي	93,000,000
14	الماء	صيانة مجمع ماء البوعبيد (طالب عفات) + تأهيل مجمع ماء البوذباب القصر سعة 200م ³ / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	73,280,000
15	الماء	تجهيز مولدة قدرة 250 كي في اي لمجمع ماء المداليس + تجهيز مولدة 250 كي في اي في البوذباب الجنابيين	الرمادي	90,000,000
16	الماء	صيانة مجمع ماء الحامضية الجديد سعة 200م ³ / ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	42,890,000
17	الماء	استبدال الاتبابيب الواقعة في منطقة الحوز شارع النهر الشارع الرابط بين جسر الحوز ومجسر الزيوت الجانب الايمن في الرمادي	الرمادي	68,495,000
18	الماء	استبدال الاتبابيب الواقعة في منطقة الحوز شارع النهر الشارع الرابط بين جسر الحوز ومجسر الزيوت الجانب الايسر في الرمادي	الرمادي	66,295,000
19	الماء	صيانة مجمعات اليونسييف / الدوار في قضاء الرمادي	الرمادي	72,960,000
20	البلديات	تأهيل الشارع الرابط بين شارع البوذباب وجسر الحوز في الرمادي	الرمادي	67,000,000

82,778,000	الرمادي	تاهيل الجناح الاداري والواجهة الخارجية لمديرية جنسية محافظة الانبار	الداخلية	21
40,950,000	الرمادي	ترميم وتاهيل جنسية واحوال الرمادي	الداخلية	22
82,120,000	الرمادي	صيانة مجمع ماء الدوار / عبد الصالح	الماء	23
75,493,000	الرمادي	صيانة مجمع ماء البو شعبان قرب مدرسة سمية + صيانة مجمع ماء البو شعبان 2	الماء	24
51,800,000	الرمادي	ايصال التيار الكهربائي المغذي لمحطات ضخ الماء في الموقع الجامعي لجامعة الانبار	الماء	25
99,325,000	الرمادي	تأهيل مبنى كلية الادارة والاقتصاد - القاعات الدراسية لجامعة الانبار	التعليم العالي	26
45,800,000	الرمادي	تأهيل محطة ري البوذيب المساعدة (البوهايس)	الموارد المائية	27
86,810,000	الرمادي	تجهيز محولات KVA 630 في محطة ري القطنية المساعدة ومحطة ري بزايذ ابو طيبان	الموارد المائية	28
97,235,000	الرمادي	صيانة وتأهيل محطة تصفية وتعقيم ماء الجامعة ومحطات الضخ لجامعة الانبار	التعليم العالي	29
87,740,000	الرمادي	تأهيل مبنى شؤون الطلبة لجامعة الانبار	التعليم العالي	30
99,999,990	الرمادي	اعادة تأهيل بناية الاقسام الادارية في المحافظة	التعليم العالي	31
45,520,000	الرمادي	اعادة تأهيل بناية دائرة حماية المنشأة في الرمادي	الداخلية	32
99,350,000	الرمادي	اعادة تأهيل بناية الاشراف الهندسي	المحافظة	33
83,660,000	الرمادي	صيانة مجمع ماء البوعيثة الاول بسعة 200م ³ في قضاء الرمادي	الماء	34
99,500,000	الرمادي	تأهيل القناة الناقلة لشارع اربعين في الرمادي	الموارد المائية	35
99,999,990	الرمادي	اعادة تأهيل بناية الاقسام الفنية في المحافظة	المحافظة	36
96,200,000	الرمادي	تأهيل المحطة المساعدة الغربية لمحطة ري البوذيب	الموارد المائية	37
19,638,000	الفلوجة	صيانة مجمع ماء البو كريطي	الماء	38
44,930,000	الفلوجة	تجهيز ونصب وتشغيل مولد 250 كي في اي لمجمع ماء ابو سديرة القديم	الماء	39
96,500,000	الفلوجة	تجهيز مواد لصيانة مشاريع وشبكات للمجمعات المائية في الفلوجة	الماء	40

58,405,000	هيت / الفرات	صيانة مجمع ماء جبيل سعة 200م ³ /ساعة	الماء	41
94,650,000	الفلوجة	صيانة مجمع ماء البوعبد الحسن في الفلوجة	الماء	42
78,500,000	الفلوجة	تاهيل مجمع ماء الشهداء القديم سعة 200م ² /ساعة في قضاء الفلوجة	الماء	43
73,000,000	الفلوجة	صيانة مجمع ماء الفلاحات وصبيحات القديم والهيثاويين في الفلوجة	الماء	44
86,950,000	الفلوجة	صيانة مجمع الفلاحات الجفة في قضاء الفلوجة	الماء	45
97,760,000	الفلوجة	تاهيل مجمع ماء البوخميس سعة 200م ³ /ساعة+تاهيل مجمع ماء البو يوسف	الماء	46
67,195,000	الفلوجة	صيانة مجمعات ماء البو عزام والفلاحات الجفة والبونياب في قضاء الفلوجة	الماء	47
75,180,000	الفلوجة	صيانة مجمع ماء البوشمخان الحلابسة والبشويش الحلابسة والشيخ نعيم والبوعلون 1 في الفلوجة	الماء	48
99,900,000	الفلوجة	تجهيز الاجهزة الطبية لكلية الطب والطب البيطري لجامعة الفلوجة	التعليم العالي	49
79,550,000	الفلوجة	تاهيل وترميم بناية محكمة الفلوجة	القضاء	50
90,000,000	الفلوجة	تجهيز مولدات عدد (2) اثنان لكلية الطب والطب البيطري جامعة الفلوجة	التعليم العالي	51
55,905,000	هيت	مجمع ماء تل اسود المكاشير وعودة الرجب	الماء	52
43,200,000	هيت	مد الخط الناقل لاهياء الحلبسية وفرات وسيطرة ماجد في هيت	الماء	53
84,505,000	هيت	اعادة تاهيل وصيانة مجمع ماء المحمدي القديم سعة 200م ³ /ساعة	الماء	54
93,306,000	هيت	تجهيز وتنصيب مواد صيانة الكهرباء لناحية المحمدي مركز المدينة	الكهرباء	55
67,000,000	هيت / الفرات	صيانة مجمع ماء البو مانع سعة 200م ³ /ساعة	الماء	56
58,405,000	هيت	صيانة مجمع ماء حي البكر الشرقي سعة 200م ³	الماء	57
42,000,000	هيت	تاهيل مشروع ماء المؤسسة	الماء	58
97,500,000	هيت	تاهيل مشروع ماء قرى هيت	الماء	59
90,350,000	هيت / الفرات	صيانة مجمع ماء زوية الشرقية + مجمع ماء بكرة البو غانم	الماء	60

84,810,000	هيت	صيانة مولدة مشروع ماء هيت- كبيسة الموحد قدرة 1100 كي في اي	الماء	61
92,620,000	هيت	تجهيز مواد صيانة شبكات لمركز ماء هيت	الماء	62
99,080,000	هيت / الفرات	صيانة مجمع ماء تل اسود (مخلف المحل) + صيانة مجمع ماء تل اسود (عبد مناور)	الماء	63
95,700,000	هيت	صيانة المجمعات المائية في ناحية البغدادي + تجهيز ونصب مضخة قدرة 250 م ³ /ساعة * 80 م ومد خط ناقل قطر 160 ملم لمنطقة شرق البغدادي قرب مدرسة الثواب في قضاء هيت	الماء	64
99,877,000	هيت	اعادة تأهيل ردهات الاطفال في مستشفى هيت	الصحة	65
99,928,000	هيت	اعادة تأهيل صالة العمليات الكبرى في مستشفى هيت العام	الصحة	66
99,972,000	هيت	اعادة تأهيل جناح الطوارئ في مستشفى هيت العام	الصحة	67
99,947,000	هيت	اعادة تأهيل صالة عمليات الولادة والاطفال في مستشفى هيت العام	الصحة	68
99,877,000	هيت	اعادة تأهيل ردهات الرجالية في مستشفى هيت العام	الصحة	69
96,500,000	هيت	تاهيل مشروع ماء هيت /كبيسة الموحد سعة 1000م ³ /ساعة	الماء	70
86,240,000	هيت / الفرات	صيانة ماء الغرير سعة 50م ³ /ساعة	الماء	71
84,769,000	هيت	صيانة واعادة تأهيل بناية كلية العلوم التطبيقية / جامعة الانبار في هيت	التعليم العالي	72
93,210,000	هيت	اعادة تأهيل وصيانة مجمع ماء المحمدي الجديد سعة 200م ³ / ساعة	الماء	73
97,000,000	حديثة	تجهيز مضخات ومحركات لمشاريع ومجمعات حديثة ونواحيها	الماء	74
97,500,000	حديثة	تجهيز مضخات ومحركات لمحطة توزيع مشروع حديثة / حقلانية الموحد	الماء	75
93,800,000	حديثة	تاهيل مشروع ماء البوحيات الشرقي سعة 50م ³ /ساعة	الماء	76
75,780,000	حديثة	تاهيل مشروع ماء البوحيات الوسطي بطاقة 50م ³ /ساعة	الماء	77
80,750,000	حديثة	تاهيل مجمع ماء الخسفة	الماء	78
80,650,000	حديثة	اعادة تأهيل مجمع ماء البوحيات الغربي 50م ³ /ساعة	الماء	79
76,250,000	حديثة	تاهيل مجمع ماء الشاعي سعة 100م ³ /ساعة	الماء	80

95,445,000	حديثة	تأهيل بناية القاعات الدراسية لكلية التربية الاساسية حديثة / الخدمات والتابعة لجامعة الانبار	التعليم العالي	81
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء البو تايه سعة 200م ³ في الكرمة	الماء	82
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء اللهب 2	الماء	83
98,260,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء اللهب 1 بسعة 100م ³	الماء	84
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء الغرير سعة 200م ³ في الكرمة	الماء	85
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء المصالحة سعة 200م ³	الماء	86
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء ذراع دجلة سعة 200م ³	الماء	87
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء البودخيل	الماء	88
87,685,000	الكرمة	صيانة مجمع ماء بني زيد الاول	الماء	89
94,750,000	الخالدية	صيانة مجمع البوبالي رقم 3 مع تجهيز مولدة 250 كي في اي في قضاء الرمادي	الماء	90
95,650,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء ابو زعيان في الخالدية	الماء	91
99,800,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء البوشهاب + تجهيز مولدة بيركنز 250 كي في اي	الماء	92
91,750,000	الخالدية	تجهيز مولدة كهرباء نوع بيركنز 500 كي في اي وبورد كهربائي لمشروع قرى الحباتية في قضاء الخالدية	الماء	93
96,700,000	الخالدية	صيانة مولدة 250 كي في اي لمجمع ماء البو شعبان 1 + صيانة مجمع ماء البو عبد المحسن + تجهيز ونصب مولدة 250 كي في اي	الماء	94
90,400,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء البوبالي الاول في الخالدية	الماء	95
99,700,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء الكرابلة+تجهيز ونصب مولدة بيركنز 250 كي في اي	الماء	96
63,520,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء سن الذبان سعة 200م ³ /ساعة	الماء	97
87,200,000	الخالدية	صيانة مجمع ماء الملاحمة + تجهيز ونصب مولدة بيركنز 250 كي في اي	الماء	98
93,300,000	الخالدية	صيانة مجمع البوبالي الثاني في الخالدية	الماء	99
95,000,000	الرطوبة	تجهيز طواقم ضخ عمودية خاصة بالابار لمركز ماء الرطوبة والوليد ومركز ماء النخيب ومركز ماء عرعر	الماء	100

84,000,000	الرطوبة	صيانة الفلاتر في المحطة الرئيسية لمشروع ماء الصحراء الغربية في الرطوبة	الماء	101
53,800,000	طربيل	تأهيل وجدة التحلية رقم (3) في مركز ماء طربيل الرئيسي	الماء	102
96,500,000	طربيل	استخراج البئر الساقط في منفذ طربيل الحدودي وبعمق 450 متر	الماء	103
82,175,000	الصقلاوية	تأهيل بناية الأقسام العلمية ومختبرات القسم المدني في المعهد التقني	التعليم العالي	104
88,700,000	الصقلاوية	تجهيز المتطلبات المهمة لضخ وتصفية وتوزيع الماء في المعهد التقني	التعليم العالي	105
90,334,000	الصقلاوية	انشاء مجموعتي حمامات للطلبة + انشاء ملحق قاعة دراسية سندويج بئل في المعهد التقني	التعليم العالي	106
87,455,000	الصقلاوية	تأهيل قسم الكهرباء والقسم المدني في المعهد التقني	التعليم العالي	107
70,900,000	الصقلاوية	اعادة ربط الكهرباء الوطنية لموقع المعهد التقني	التعليم العالي	108
97,060,000	الصقلاوية	توليد وايصال وتوزيع الكهرباء لموقع المعهد التقني	التعليم العالي	109
93,180,000	الصقلاوية	انشاء مسقف استراحة الطلاب في المعهد التقني	التعليم العالي	110
66,622,500	الصقلاوية	تأهيل وانشاء قاعة دراسية مرسوم المعهد التقني	التعليم العالي	111
93,860,000	الصقلاوية	عزل المواقع الغير مؤمنة في المعهد + تأهيل بناية قاعات قسم الكهرباء والورش الهندسية في المعهد التقني	التعليم العالي	112
97,000,000	الصقلاوية	تجهيز الاثاث المدرسي المطلوب لابنية موقع المعهد التقني	التعليم العالي	113
9,306,587,480		المجموع		

مشاريع محافظة نينوى



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة نينوى

ت	اسم المشروع	القضاء	القطاع	المبلغ
1	اعمار البئر الارتوازي في ناحية الشمال	سنجار	الماء	22,000,000
2	اعمار مدرسة (برج ابة لة ك) في ناحية شنكال	سنجار	التربية	45,886,000
3	اعمار مستوصف في مركز ناحية الشمال	سنجار	الصحة	8,000,000
4	اعمار القنطرة الصندوقية في وادي سنجار	سنجار	البلديات	95,000,000
5	اعمار مستوصف مجمع دوكري في ناحية الشمال	سنجار	الصحة	19,000,000
6	اعمار سايلو سنجار	سنجار	التجارة	98,000,000
7	محطة كهرباء الشمال في ناحية الشمال	سنجار	الكهرباء	19,078,500
8	شراء اليات تخصصية لبلدية سنجار	سنجار	البلديات	99,750,000
9	اعمار مركز تشغيل ماء سنجار	سنجار	الماء	99,000,000
10	بنابة دائرة كهرباء الشمال في ناحية الشمال	سنجار	الكهرباء	20,000,000
11	اعمار مدرسة كوهبةل في ناحية الشمال	سنجار	التربية	17,256,750
	المجموع			542,971,250

مشاريع محافظة صلاح الدين



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة صلاح الدين

ت	القطاع	اسم المشروع	القضاء	المبلغ
1	الداخلية	تأهيل وصيانة قسم شرطة الاسحافي ومركز شرطة السجلة	الدجيل	79,120,000
2	الداخلية	اعادة تأهيل وصيانة مقر فوج طوارئ الدجيل	الدجيل	61,820,000
3	الداخلية	اعادة تأهيل وصيانة قسم الكلاب البوليسية وقسم مكافحة الاجرام وقسم شؤون الميرة	تكريت	56,200,000
4	الداخلية	اعادة تأهيل وصيانة قسم الادلة الجنائية ومركز شرطة تكريت	تكريت	66,200,000
		المجموع		263,340,000



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة كركوك

المبلغ	اسم المنطقة	اسم المشروع	القطاع	ت
92,310,500	تازة	اعمار مركز شرطة البشير في ناحية تازة	الداخلية	1
95,000,000	تازة	اعمار شبكة ماء البشير في ناحية تازة	الماء	2
97,713,000	الملتقى	اعمار مركز شرطة ناحية الملتقى	الداخلية	3
285,023,500	المجموع			

مشاريع محافظة بابل

Babil Governorate projects

المسيب

المحلويل

الحلة

الهاشمية



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / محافظة بابل

ت	القطاع	اسم المشروع	اسم المنطقة	المبلغ
1	الماء	تأهيل مجمعات ماء الدوريين 14م ³ / ساعة	الاسكندرية	70,500,000
2	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الغربية)	الاسكندرية	82,500,000
3	الماء	تأهيل مجمع ماء الشيحة 14م ³ / ساعة	الاسكندرية	76,500,000
4	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الشرقية)	الاسكندرية	79,200,000
5	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الشمالية)	الاسكندرية	88,000,000
6	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الجنوبية)	الاسكندرية	80,300,000
7	الماء	تأهيل مجمعات ماء الحويجة 14م ³ / ساعة	الاسكندرية	70,500,000
8	الماء	تأهيل مجمع ماء ابو شمسي سعة 200م ³ / ساعة	الاسكندرية	92,000,000
9	الماء	تأهيل مجمع ماء الخضر سعة 200م ³ / ساعة	الاسكندرية	92,000,000
10	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (3) سعة 50م ³ / ساعة	جرف النصر	88,000,000
11	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (2) سعة 50م ³ / ساعة	جرف النصر	88,000,000
12	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (4) سعة 50م ³ / ساعة	جرف النصر	88,000,000
13	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (1) سعة 50م ³ / ساعة	جرف النصر	87,500,000
		المجموع		1,083,000,000

محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

Baghdad Governorate Projects

الانبار



مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام 2016 / حزام بغداد

ت	القطاع	اسم المشروع	اسم المنطقة	المبلغ
1	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية السعدان (1)	النصر والسلام	99,962,500
2	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية السعدان (2)	النصر والسلام	99,956,000
3	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العجاج	النصر والسلام	99,881,000
4	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العناز (1)	النصر والسلام	99,950,500
5	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العناز (2)	النصر والسلام	99,915,500
6	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية عودة الشكر	النصر والسلام	99,925,500
المجموع				599,591,000

**مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية
حسب المحافظات لعام 2017**

مشاريع محافظة نينوى



مشاريع محافظة نينوى على الموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة الشورة الابتدائية 12 صف/ القيارة / نينوى	التربية	35° 59'43.8"N 43° 13'18.5"E	600	38+170	715,512,000	716,492,000	2017-08-02	2017-08-16	7/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	اعدادية القيارة للبنين 12 صف / القيارة / نينوى	التربية	35° 47'23.1"N 43° 17'23.4"E	600	28+180	687,989,900	684,563,900	2017-08-02	2017-08-16	5/12/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	ثانوية الشورة للبنين 12 صف/ القيارة / نينوى	التربية	36° 00'03.8"N 43° 13'36.0"E	600	18+170	750,236,000	748,708,000	2017-08-02	2017-08-16	18/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة اجحلة الابتدائية للبنين 12 صف/ القيارة/ نينوى	التربية	35° 42'31.9"N 43° 17'58.5"E	600	28+160	737,710,000	735,904,000	2017-08-02	2017-08-13	5/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	صب ارصفة وبناء القوالب الجانبية للشارع الرئيسي / حي النصر وبربوش /مركز قضاء سنجار/نينوى	البلديات			60	188,480,000	188,480,000	2018-05-06	25L6L2016	16/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	تأهيل شوارع وصيغ القوالب في الشورة	البلديات												
7	إعادة تأهيل وأكساء شوارع رئيسية في حمام العليل	البلديات												
8	كشف أعمال تأهيل و أكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية القيارة	البلديات												
9	تأهيل وإكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية القيارة	البلديات		400,000	28+70	1,527,640,000	1,570,680,000	2017-11-05	2017-11-20	16/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	إعادة تأهيل المدخل الجنوبي للقصبة (شارع الصلاحية) مع تحويل العارض (أنبوب الماء) الموجود في وسط الشارع في ناحية حمام العليل/ المرحلة الاولى	البلديات												
11	إكساء شوارع داخل ناحية الشورة	البلديات												
12	إكساء طرق داخلية في ناحية بعشيقية													
13	صيانة شوارع متفرقة في ناحية بعشيقية													
14	بناء القوالب الجانبية وصب الارصفة والقسالس في برطلة													
15	تبليط مسارات شبكة مجاري في برطلة													
	المجموع					5,553,547,900	5,638,612,900							

مشاريع محافظة نينوى على الموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	صيانة وتأهيل ابنية كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36 22.897'N 43 8.592'E	2000	45+140	900,000,000	985,290,000	2017-08-02	2017-08-20		100%	100%	0%	انجاز العمل
2	تأهيل شبكات الكهرباء / الموصل	الكهرباء	36 21 34 05N 43 01 34 28E	25,000	30	731,600,000	731,600,000	2017-10-18	منجز		100%	100%	0%	انجاز العمل
3	تأهيل وصيانة طرق في قضاء الحمدانية وناحية النمرود	البلديات		85,000	4+50	275,012,500	275,012,500	2017-11-02	2017-11-16	29/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	تأهيل بناية مركز شرطة الوقاص	الداخلية		150000	12+50	303428000	327096500	2017-11-20	2017-12-04		100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تأهيل بناية مركز شرطة اليرموك	الداخلية		200000	12+50	175316000	192830000	2017-11-21	2017-12-03	2/11/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	تأهيل بناية مركز الدفاع المدني الجزائر	الداخلية		4000	40+154	1,414,930,000	1,539,455,000	2017-08-02	2017-10-08	16/5/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	تأهيل ابنية كلية الآداب / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36° 23.126'N 43° 8.471'E	4000	34+140	1,627,784,000	1,785,149,550	2017-09-25	2017-10-03	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تأهيل ابنية كلية التقانات وعلوم البيئة / جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي	36° 22.574'N 43° 8.948'E	4000	36+140	1,627,784,000	1,785,149,550	2017-09-25	2017-10-03	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	تأهيل ابنية كلية التمريض / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36° 22.696'N 43° 8.696'E	4000	28+140	1,464,915,000	1,611,067,000	2017-10-15	2017-10-29	26/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تأهيل ابنية كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36° 23.197'N 43° 8.919'E	2500	28+140	1,464,915,000	1,611,067,000	2017-10-15	2017-10-29	26/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تأهيل ابنية كلية الصيدلة/ جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي	36° 22.491'N 43° 8.637'E	2500	28+140	1,464,915,000	1,611,067,000	2017-10-15	2017-10-29	26/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	تأهيل بناية قسم الاعمار والمشاريع/جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي	36° 22.552'N 43° 8.762'E	4250	45+105	1,624,462,000	1,784,852,000	2017-09-28	2017-10-11	مستمر	100%	97%	3%	تلكو الشركة المنفذة , وتم توجيهه كتاب انذار
13	تأهيل ابنية كلية العلوم/جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36° 22.557'N 43° 8.579'E	4250	45+105	1,624,462,000	1,784,852,000	2017-09-28	2017-10-11	مستمر	100%	97%	3%	تلكو الشركة المنفذة , وتم توجيهه كتاب انذار
14	تأهيل ابنية المراكز البحثية/ جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي		4250	61+110	1,571,950,000	1,712,226,000	2017-10-30	2017-11-14	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
15	تأهيل ابنية كلية التربية / جامعة الموصل	التعليم العالي		4250	61+110	1,571,950,000	1,712,226,000	2017-10-30	2017-11-14	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
16	تأهيل ابنية كلية الهندسة / جامعة الموصل	التعليم العالي		4250	61+110	1,571,950,000	1,712,226,000	2017-10-30	2017-11-14	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
				481000		10089401500	10,944,578,550				40			



ثانوية الشورة / الشورة / نينوى



اعدادية القيارة / القيارة / نينوى



كلية طب الأسنان / جامعة الموصل / نينوى



كلية طب الأسنان / جامعة الموصل / نينوى



إعادة تأهيل طرق الحمدانية والنمرود / نينوى





تاهيل وتبليط مسارات شبكة مجاري في برطلة و بعشيقه





كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى



كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى



كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى



كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل / نينوى



46



كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل / نينوى



تجهيز محولات إلى الجانب الأيمن / الموصل

مشروع محافظة الانبار

الانبار



مشاريع محافظة الانبار للموازنة الاستثمارية / الخطة الاستثمارية 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	ثانوية العلا للبنات / 18 صف الرمادي/الانبار	التربية	33 25 13.0N 43 18 28.2E	650	95+210	1,066,033,000	2017-07-23	2017-08-06	18/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	ثانوية الكواكب للبنات /ثانوية/18 صف/الرمادي/الانبار	التربية	33 ° 24 37.3N 43° 16 42.6E	450	80+190	1,070,000,000	2017-07-24	2017-08-09	26/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	ثانوية دار السلام للبنين /ثانوية/18 صف /هيت /الانبار	التربية	33 39 03.0N 42 49 48.3E	650	78+190	1,144,525,000	2017-07-30	2017-08-21	15/5/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة أبو أيوب الانصاري للبنين /ابتدائية/12 صف/الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 23 31.4N 43 52 50.8E	450	177+160	659,631,000	2017-07-30	2017-08-17	2018-07-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	مدرسة صعدة الابتدائية المختلطة الابتدائية 12 صف/الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 33 14.7N 44 06 14.5E	450	166+170	585,985,000	2017-07-31	2017-08-13	18/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	مدرسة الوفاء الابتدائية للبنين 12 صف /الرمادي/ الانبار	التربية	33° 25 50.2N 43° 21 22.0E	450	83+165	598,000,000	2017-08-02	2017-08-15	2018-10-05	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	ثانوية الرشاد للبنين الثانوية 18 صف/الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 23 57.2N 43 36 01.7E	650	96+210	1,093,229,000	2017-08-02	2017-08-17	2/1/2019	100%	100%	0	انجاز العمل
8	مدرسة الافنان الابتدائية للبنين 12 صف /جزيرة الرمادي/ الانبار	التربية	33 28 03.5N 43 18 04.6E	450	153+180	611,468,000	2017-08-02	2017-08-15	2018-01-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	اعدادية حليلة السعدية للبنات 12 صف /الرمادي/ الانبار	التربية	33° 26' 00.0N 43° 22' 05.6E	450	103+180	599,981,000	2017-08-03	2017-08-08	30/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	مدرسة الصمد الابتدائية 12 صف/ هيت/ الانبار	التربية	33 37 55.3N 42 50 26.8E	450	63+170	639,571,000	2017-08-03	2017-08-21	2018-12-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	متوسطة المامون 18 صف /الرمادي/الانبار	التربية	33 25 17.0N 43 19 57.9E	650	29+210	1,266,865,000	2017-08-03	2017-08-15	2018-05-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	مدرسة دجلة الابتدائية للبنين 12 صف/الرمادي/ الانبار	التربية	33 25 39.2N 43 17 01.6E	450	20+170	592,525,000	2017-08-03	2017-08-16	25/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
13	اشبيلية الابتدائية المختلطة 12 صف /الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 29 46.6N 44 06 14.5E	450	143+160	614,777,000	2017-08-03	2017-08-13	20/12/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
14	مدرسة الخضر الابتدائية 12 صف /الصقلاوية/الفلوجة/الانبار	التربية	33 27 50.4N 43 36 27.3E	450	150+150	573,888,800	2017-08-03	2017-10-25	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
15	مدرسة السلوى الابتدائية 18 صف/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 19 49.2N 43 47 49.5E	650	161+210	1,078,596,000	2017-08-03	2017-08-15	19/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل

انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-05-02	2017-08-09	2017-08-03	631,520,000	93+180	450	33 27 29.1N 43 16 17.7E	التربية	مدرسة ابي ذر الغفاري الابتدائية للبنات 12 صف /جزيرة الرمادي/ الانبار	16
انجاز العمل	0%	100%	100%	20/12/2018	2017-08-23	2017-08-13	595,000,000	134+180	450	33 25 31.6N 43 43 10.7E	التربية	مدرسة المروج الخضراء الابتدائية 12 صف/ الفلوجة/ الانبار	17
انجاز العمل	0%	100%	100%	20/3/2018	2017-09-05	2017-08-13	688,586,000	15+170	450	33 00 16.3N 42 26 13.6E	التربية	مدرسة عامر بن ربيعة 12 صف/ حديثة/ الانبار	18
انجاز العمل	0%	100%	100%	14/7/2018	2017-09-10	2017-08-13	651,962,500	129+170	450	33 26 49.3N 43 44 37.4E	التربية	مدرسة الخالد الابتدائية 12 صف /الفلوجة/ الانبار	19
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-01-07	2017-08-23	2017-08-13	594,113,000	134+180	450	33 26 00.0N 43 22 05.6E	التربية	مدرسة الفتوة الابتدائية للبنين 12 صف/ الرمادي/ الانبار	20
انجاز العمل	4%	96%	100%	23/9/2018	2017-08-23	2017-08-13	575,131,000	101+160	450	33 54 33.0N 42 33 04.6E	التربية	ثانوية جبة للبنين 12 صف / البغدادي/ هيت/ الانبار	21
انجاز العمل	0%	100%	100%	19/8/2018	2017-08-27	2017-08-13	611,635,000	20+170	450	33 24 44.5N 43 18 24.5E	التربية	مدرسة دار العلم الابتدائية 12 صف / الرمادي/ الانبار	22
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-08-20	2017-08-13	669,928,000	114+180	450	33 42 17.7N 43 55 18.8E	التربية	متوسطة خالد بن الوليد 12 صف/ الكرمة/ الفلوجة/ الانبار	23
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-08-27	2017-08-13	672,513,500	145+160	450	33 23 02.4N 43 51 59.1E	التربية	ثانوية الشهابي للبنين 12 صف/ الفلوجة/ الانبار	24
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-09-07	2017-09-06	2017-08-14	577,451,000	20+165	450	33 24 04.0N 43 19 58.1E	التربية	ثانوية الرشيدية للبنين 12 صف /الرمادي/ الانبار	25
انجاز العمل	0%	100%	100%	25/4/2018	2017-09-06	2017-08-15	573,900,500	71+170	450	33 25 54.3N 43 12 40.1E	التربية	مدرسة جنة الماوى الابتدائية للبنين 12 صف /الرمادي/ الانبار	26
انجاز العمل	0%	100%	100%	30/1/2018	2017-08-23	2017-08-23	667,409,500	180	450	33 38 16.8N 42 49 34.1E	التربية	متوسطة الشيماء للبنات 12 صف/ هيت/ الانبار	27
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-10-11	2017-08-24	1,195,056,000	162+180	650	33 24 02.3N 43 42 05.6E	التربية	اعدادية صناعة الصقلاوية 18 صف/ الصقلاوية/الفلوجة/ الانبار	28
	-1%	99%	100%	مستمر	2017-11-19	2017-11-07	7,038,189,000	25+570	10,000,000	33° 26.057'N 43° 15.928'E	موارد مائية	مشروع ناظم الورار	29
الانحراف بسبب تأخر وصول المعدات الاستيرادية من تركيا .	-2%	98%	100%	مستمر	2017-11-19	2017-11-07	6,911,239,000	25+570	10,000,000	33° 26.444'N 43° 16.138'E	موارد مائية	اعادة اعمار ناظم سدة الرمادي على نهر الفرات	30
انجاز العمل	0%	100%	100%	منجز	2017-12-17	2017-12-07	1,983,315,000	180	200000		طرق وجسور	اعادة تاهيل جسر هيت الحديدي	31
							36,832,023,800		20,213,800			المجموع	

مشاريع محافظة الانبار للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	اصلاح وتاهيل طريق الرمادي- هيت/ الرمادي/ الانبار	طرق وجسور	33 25 36.6N 42 58 36.1E	400,000	145	285,000,000	312,200,000	2017-07-30	2017-08-21	2018-03-01	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	إعادة انشاء القسم البلدي السادس/ الرمادي الانبار	البلديات	33 24 46.0N 43 12 51.0E	100,000	180	220,575,000	242,575,000	2017-08-02	2017-08-29	25/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	تاهيل بناية الاقسام الداخلية في قضاء الفلوجة/ الانبار	التعليم العالي		500.00	80	211,829,000	229,851,000	2017-10-15	2017-10-29	2018-05-02	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	تأهيل المحطات الاروانية في جزيرة موارد وشامية الرمادي/ الانبار	موارد مانية		25+90	877,170,000	920,790,000	2017-10-17	2017-10-29	19/2/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل	
	تأهيل محطات البزل في جزيرة وشامية الرمادي / الانبار	موارد مانية												
	اعادة انشاء قناطر في البوعينة	موارد مانية												
7	اعادة انشاء السياج الامني لقضاء هيت / الانبار	دوائر حكومية		150,000		99,750,000	99,750,000	تنفيذ امانة	\	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	مجمع ماء الحميدية	ماء		12000		100,000,000	100,000,000	تنفيذ امانة	\	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	مجمع ماء الصبيحات	ماء		10000		36,800,000	36,800,000	تنفيذ امانة	\	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تجهيز وتنفيذ وتنصيب محطة تحويل الحصرة 33/11 كي في سعة 2*31.5 ام في أي / هيت/الانبار	كهرباء		200,000	25+90	361,000,000	396,779,980	2017-10-18	2017-10-30	17/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تاهيل شارع المعارض الى تقاطع الفرسان في الرمادي/ الانبار	البلدية		100,000	60+140	2,123,020,000	2,250,940,000	2017-10-22	2017-11-05	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	تاهيل شارع من تقاطع الفرسان الى تقاطع شارع (20) الرمادي/الانبار	البلدية		100,000	25+140	967,828,000	1,037,349,000	2017-10-22	2017-11-06	2018-04-06	100%	100%	0%	انجاز العمل

انجاز العمل	0%	100%	100%	14/4/2018	2017-11-14	2017-10-22	507,653,000	472,473,000	25+140	150,000		13 تجهيز ونصب محطة تحويل المشتل كهرباء 33/11 كي في /هيت/الانبار
سحب عمل من المقاول بموجب قرار محكمة			0%		2017-11-14	2017-10-25	2,710,350,000	2,710,350,000	140	1,500,000		14 إعادة تأهيل خط كهرباء غرب بغداد - حديثة 400 كي في /عموم محافظة الانبار كهرباء
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-05-07	2017-11-06	2017-10-26	410,812,000	373,752,000	70+170	200,000		15 تأهيل ابنية دائرة البلدية /القسم البلدي الثاني/الرمادي/الانبار البلديات
												16 تأهيل انية دائرة البلدية القسم البلدي الرابع/ الرمادي الانبار البلديات
انجاز العمل	0%	100%	100%	24/5/2018	2017-11-19	2017-10-30	1,052,385,000	974,585,000	25+150	250,000		17 اعادة انشاء مديرية شرطة نموذجية في قضاء الفلوجة الداخلية
انجاز العمل	0%	100%	100%	19/6/2018	2017-11-14	2017-11-12	1,081,365,125	983,270,000	30+120	100,000		18 الشارع الرابط بين تقاطع شارع عشرين الى شارع الملعب البلدية
انجاز العمل	0%	100%	100%	23/12/2017	2017-11-23	2017-11-14	211,900,000	194,400,000	30	75,000		19 العبارة النهريه في هيت (البانتونات) طرق وجسور
انجاز العمل	0%	100%	100%	2018-04-07		2017-12-04	391,961,300	360,895,000	25+75	8,000		20 تأهيل بناية قسمي الفيزياء والعربي في كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة الانبار التعليم العالي
												21 تأهيل بناية القاعات الدراسية في كلية الزراعة / جامعة الانبار التعليم العالي
							11,993,461,405	11,352,697,000		3,355,500		المجموع



مدرسة دار السلام / هيت / الانبار

مدرسة دار السلام / هيت / الانبار (صعب نقل مواد البناء)



مدرسة دار السلام / هيت / (قبل الاعمار)




اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت⁵³



اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت (انفجار عبوة)



اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت

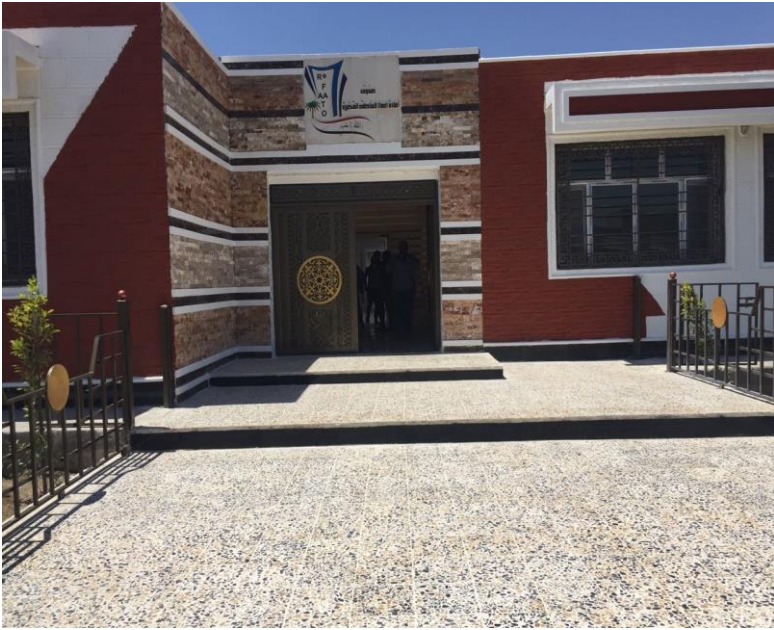

مدرسة السلوى / الفلوجة الانبار



مدرسة جنة الماوى / الرمادي / الانبار



تاهيل مباني كلية الزراعة/جامعة الانبار/ الرمادي / الانبار



مدرسة ابي ذر الغفاري / الجزيرة / الرمادي / الانبار



مدرسة الصمد / هيت / الانبار



مدرسة المأمون / الرمادي / الانبار




إعادة تاهيل مستشفى هيت العام





إعادة تأهيل جسر هيت

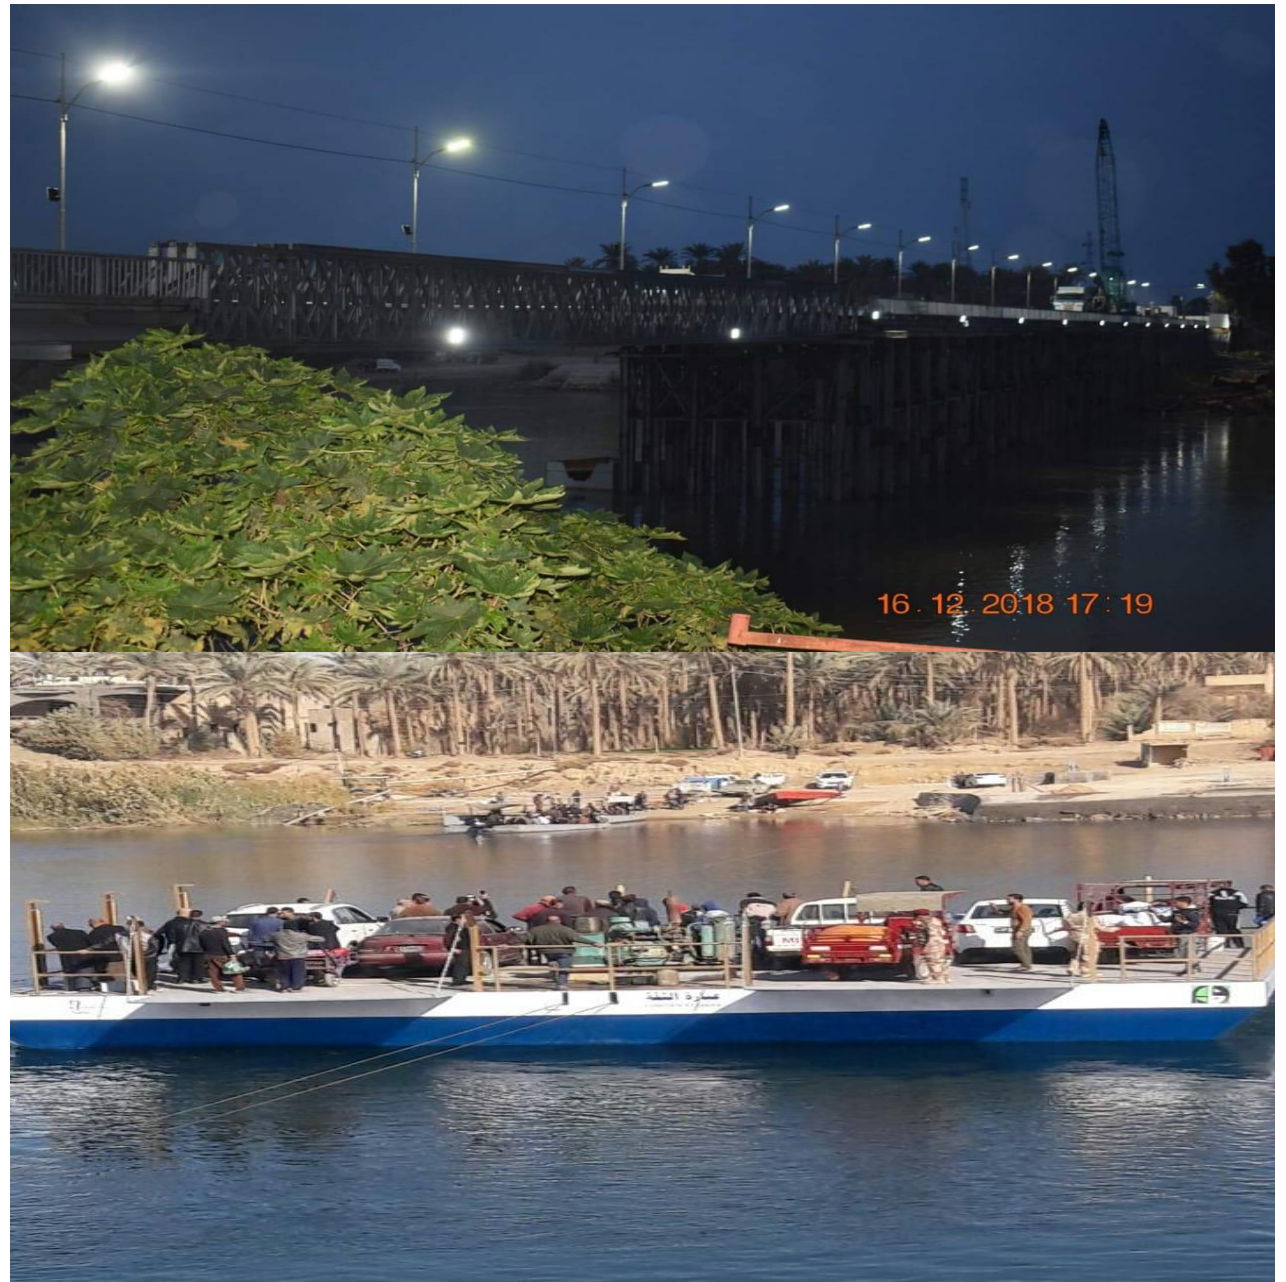

العبارة (حل مؤقت أثناء إعادة تأهيل الجسر)





هدم وإعادة بناء القسم البلدي السادس / الرمادي / الأنبار



هدم وإعادة بناء مدرسة الفتوة / الأنبار



إعادة بناء سدة الرمادي على نهر الفرات / الرمادي / الأنبار



مشاريع محافظة صلاح الدين



مشاريع محافظة صلاح الدين للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة الدور الأولى للبنات 12 صف/ الدور - صلاح الدين	التربية	34 27 26.2N 47 47 18.5 E	450	92+180	716,944,000	729,733,400	2017-07-25	2017-08-05	2018-05-08	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	ثانوية الفرقان 18 صف/ تكريت /صلاح الدين	التربية	34 26 18.0N 43 40 35.5E	700	120+170	1,119,644,000	1,194,869,900	2017-07-30	2017-08-28	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	مدرسة حفص الدوري للبنين 6 صف/ الدور/ صلاح الدين	التربية	34 27 42.8N 43 50 31.3E	255	12+120	330,000,000	339,733,500	2017-08-03	2017-08-21	2018-07-03	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية 6 صف/تكريت صلاح الدين	التربية	34 26 42.9N 43 44 05.2E	250	33+180	303,645,000	303,645,000	2017-08-13	2017-08-22	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	روضة الفارس العربي 4 صف/ تكريت / صلاح الدين	التربية	34 36 06.9 N 43 40 32.9 E	350	96+180	417,595,000	417,595,000	2017-08-13	2017-08-28	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	مدرسة الاشواس للبنين 9 صف/ ناحية مكيشيفة/ تكريت/	التربية	34 18 23.4N 43 46 59.1E	140	95+180	469,258,000	506,420,100	2017-08-24	2017-09-11	25/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	تاهيل اقسام داخلية للطالبات وقاعة الدري لمعهد الدور التقني /الدور -صلاح الدين	التعليم العالي	34 27 36N 43 48 34E	3000	10+150	484,140,000	484,140,000	2017-09-25	2017-10-04	2018-12-09	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	مد شبكة مياه تصريف الامطار واعمال الانارة والتبليط للطريق من مستشفى الحارث الى الوادي وبطول 1800 م طول / الضلوعية - صلاح الدين	البلديات	37 68 92N 42 77 17 E	25,000	80+150	994,050,000	1,083,067,000	2017-09-26	2017-10-10	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	اعمال اعادة بناء اقسام داخلية للطلاب عدد/4 جامعة تكريت	التعليم العالي	34° 40.717'N 43° 38.914'E	4,000	78+240	754,370,000	730,462,000	2017-12-11	2017-12-20	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تجهيز مواد لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم صلاح الدين (أعمدة)	كهرباء		50,000	20	144,600,000	144,600,000	2017-12-14		منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	تجهيز مواد لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم صلاح الدين (محولات)	كهرباء		25,000	30	939,000,000	939,000,000	2017-12-14		منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			109,145		6,673,246,000	6,873,265,900							

مشاريع محافظة صلاح الدين للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تاهيل وتشغيل وحدة ماء العيثة سعة 200م3/ساعة/ الشرايط /صلاح الدين	ماء	35 63 864N 43 24 181E	27,000	120	257900000	257900000	2017-07-25	2017-08-06	17/12/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
	تاهيل وتشغيل وحدة ماء الحجاج سعة 200م3/ساعة/بيجي/ صلاح الدين	ماء	34 85 308N 43 54 104E											
3	اكساء شارع معهد الدور في قضاء الدور/صلاح الدين	البلديات	34 28 12N 43 47 38.16E	10,000	80	435,000,000	435,000,000	2017-09-17	2017-09-26	منجز	100%	100%	0%	نجاز العمل
4	تاهيل واكمال بناية شرطة الدور وسيطرة العلم/العلم/ صلاح الدين	الداخلية	21 49 34 .27N 26 76 43 47E	40,000	10+90	307,000,000	324,387,000	2017-09-17	2017-10-01	16/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تأهيل مقرات مديريات (التدخل السريع (سوات) ومكافحة المتفجرات وانضباط الشرطة) وقاعة الشهيد صالح عويد/ تكريت/ صلاح الدين	الداخلية	3.21 34 37N 23.44 43 40E	30,000	85	455,595,000	455,595,000	2017-09-25	2017-10-05	20/12/2017	100%	100%	0	انجاز العمل
6	تاهيل الشارع الرابط بين شارع الزهور والشارع الحولي/ تكريت/ صلاح الدين	البلديات	34 35 159N 43 40 425E	150,000	20+80	762,737,000	767,215,000	2017-09-25	2017-10-02	26/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
	إعادة تاهيل الشارع الممتد من تقاطع المجلس القديم باتجاه القادسية بطول 680 م/ تكريت /صلاح الدين	البلديات	37 68 92N 42 77 17 E											
8	تاهيل مبنى مختبر صلاح الدين الاتشاني/ تكريت /صلاح الدين	البلديات	43 40 58.16E 34 34 47.29N	180,000	84	872,881,000	872,881,000	2017-10-03	2017-10-17	15/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تاهيل مديرية إحصاء صلاح الدين/ تكريت / صلاح الدين	البلديات	43 41 02.27E 34 35 13.79N	180,000	84	872,881,000	872,881,000	2017-10-03	2017-10-17	15/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تاهيل بناية ناحية دجلة المتضررة من الاعمال الإرهابية/سامراء/صلاح الدين	البلديات	43 44 11.1E 34 23 39.25N											
12	تاهيل مديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين	البلديات	43 41 01.15E 34 35 00.27N	80,000	90	561,000,000	561,000,000	2017-11-26	منجز	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
13	تاهيل مديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين	البلديات	43 41 01.15E 34 35 00.27N											
14	تجهيز مولدة مختلفة السعات لمشاريع الماء	ماء	مناطق متفرقة	80,000	90	561,000,000	561,000,000	2017-11-26	منجز	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
15	تجهيز مولدة مختلفة السعات لمحطات الرفع والضخ لمشاريع الصرف الصحي	البلديات	مناطق متفرقة											
15	تجهيز غواطس عدد 5 لمحطات ضخ مياه الامطار الأولى والثانية في قضاء الدجيل - صلاح الدين	ماء		75,000	30	95,450,000	95,450,000	2017-12-04	منجز	30/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
16	تجهيز غواطس نهريّة ومضخات الدفع لمجمعات الماء في شاطئ الجدر وهيجل الكبير والفياض الثاني وشهيد احمد وسديرة الوسطى	ماء		50,000	45	187,250,000	187,250,000	2017-12-10	منجز	22/2/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
17	تجهيز مواد لصيانة شبكة كهرباء مركز قضاء الطوز وامرلي (اعمدة)	كهرباء		50,000	20	75,300,000	75,300,000	2017-12-14	منجز	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	تجهيز مواد لصيانة شبكة كهرباء مركز قضاء الطوز وامرلي (محولات)	كهرباء		50,000	30	469,500,000	469,500,000	2017-12-14	منجز	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
							5,674,478,000	5,652,613,000						
المجموع														



مدرسة حفص الدوري / قرية أبي دلف / الدور / صلاح الدين



مدرسة الدور الأولى / الدور / صلاح الدين



قاعة الشهيد صالح عويد / تكريت / صلاح الدين



إعادة تأهيل مقر إدارة (سوات)



مركز شرطة الدور / صلاح الدين



ثانوية الفرقان / صلاح الدين



إعادة تأهيل بناية ناحية دجلة / سامراء / صلاح الدين





تأهيل الأقسام الداخلية للطالبات | المعهد الفني / الدور / صلاح الدين



إعادة تأهيل شارع معهد الدور / صلاح الدين



محطة ماء الحويجة / تكريت / صلاح الدين

مشروع محافظة كركوك



مشاريع محافظة كركوك للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	كلفة المشروع بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	هدم وإعادة بناء مدرسة الشهيد الابتدائية 6 صف/كركوك	التربية	35 14.653N 44 16.121E	180	165	306,926,000	306,926,000	2017-07-23	2017-08-03	29/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	هدم وإعادة بناء مدرسة الامام حسن الابتدائية 6 صف/ كركوك	التربية	35 13.101N 44 16.902E	180	165	309,656,000	306,926,000	2017-07-23	2017-08-03	27/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			360		616,582,000	613,852,000							

مشاريع محافظة كركوك للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	إعادة تاهيل الشبكات الكهربائية	كهرباء	35 27.117N 44 11.325E	5,200	30	153,734,000	153,734,000	2017-07-31	2017-08-10	31/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	إعادة تاهيل الشبكات الكهربائية في قرى ملا عبدالله وادريس خباز وادريس خزعل والهندية 1,2/كركوك													
3	تاهيل وتشغيل مجمع ماء بطاقة (50)م/3 ساعة في قرية قرنية- ناحية يايجي/كركوك	ماء	35 24.107N 44 21.151E	3,800	85	71,281,000	71,281,000	2017-07-31	2017-08-03	14/11/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	صيانة طريق الشمسية/كركوك	البلديات	35 14.511N 44 16.217E	4,000	55	189,340,000	189,340,000	2017-08-03	2017-08-03	24/9/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تبليط شوارع داخلية بالكونكريت قرب مدرسة البلديات الوقف الشيعي في قصر البشير // كركوك													
6	تجهيز محولات الى قضاء الحويجة	كهرباء		250,000	30	1,689,000,000	1,689,000,000	2017-12-14			100%	100%	0%	انجاز العمل
7	ايصال الماء الى قرية الهندية الجديدة / ناحية الملتقى	ماء		20,000		55,600,000	55,600,000		تنفيذ امانة	15/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تاهيل وتبليط طريق كركوك الحويجة قرب مجسر خالد	طرق وجسور		75,000		63,200,000	63,200,000		تنفيذ امانة	24/12/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	تاهيل محطة ماء مزر العاصي/ الحويجة	ماء		12,500		69,600,000	69,600,000		تنفيذ امانة	25/12/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			370,500		2,291,755,000	2,291,755,000							



إعادة تأهيل وتبليط طريق كركوك - الحويجة بالقرب من مجسر خالد



إعادة تأهيل محطة ماء مزهر العاصي / الحويجة



أعادة بناء مدرسة الشهيد الابتدائية / البشير / كركوك



تاهيل شبكة ماء قرية الهندية الجديدة / الملتقى / كركوك



إعادة تأهيل وصب شوارع في قرية البشير / كركوك



إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في قرية الملا عبد الله / كركوك

مشاريع محافظة ديالى

Diyala Governorate Projects




مشاريع محافظة ديالى للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)+المدة الإضافية	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة امر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة المامون /12 صف/ العظيم/الخالص/ديالى	التربية	34.273507 N 44. 542155E	720	107+180	752,704,000	745,105,400	2017-07-23	2017-09-26		100%	100%	0%	انجاز العمل
2	مدرسة الهديل /9 صف/الصدور/المقدادية/ديالى	التربية	34 03 44.1N 44 59 00.6E	600	168+63	461,667,000	505,058,200	2017-07-25	2017-09-24	2019-02-18	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	مدرسة ابن زيدون	التربية	34 01 30N 44 57 32.1E	600	160	775,658,000	775,658,000				0%	0%	0%	تم فسخ العقد رضائياً مع المقاول
4	تبليط شارع من جسر محمود العلي الى جسر سراجق دلي عباس بطول (6 كم)	الطرق	34 01 41.7N 44 45 17.4E	2,200	120	449,000,000	449,000,000	2017-11-12	2017-11-29	2018-04-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تبليط واكساء شوارع في منطقة الشرقية والغربية في ناحية سد العظيم (تبليط شوارع داخل حدود البلدية ناحية سد/العظيم)	الطرق		3800	60	390,420,000	390,420,000	2017-11-13	2017-12-25	13/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	صب شوارع حي الاسراء في السعدية	الطرق	34 11 18.24N 45 07 08.5E	2,500	45	116,040,000	116,040,000	2017-11-13	2017-12-04	17/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	تبليط طرق في المقدادية بطول (5 كم)	الطرق		10,000	60	348,860,000	348,860,000	2017-11-13	2017-12-13	28/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تأهيل الشارع العام لمدينة جلولاى الرئيسي	الطرق	34 15 41.59N 45 9 29.47E	200000	90	259,563,500	259,563,500	2017-11-13	2018-01-02	20/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	فرش خابط بطول (12 كم) من جسر شارقاق – قرية العباسية الى قرية العالي وزحام الاسيود	الطرق		2000	90	168,750,000	168,750,000	2017-11-07	2017-11-19	2018-08-02	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تبليط شوارع داخل حدود البلدية /بلدية المنصورية بطول 1650 م	الطرق		8000	40	375,373,250	375,373,250	2017-11-22	2017-12-06	25/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تبليط شوارع في قرى شيروين بطول 6,5 كم / المنصورية شيروين/ ديالى	الطرق	34 04 13 N 44 88 08E	10000	12+180	559,485,000	559,484,000	2017-11-13	2017-11-19	24/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	تأهيل الشارع رقم 21 المار ضمن م311 و 313 بطول 1,4 كم للمقطع ما بين المستوصف الصحي واستدارة الدور الجاهزة في حي التحرير/بعقوبة/ديالى	الطرق	46 82 27.411E 37 32 93 2.28N	4500	100	195,720,000	195,720,000	2018-05-06	20/6/2018	2019-02-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
13	مشروع تأهيل شبكة انارة شوارع ناحية كنعان- بعقوبة/ديالى	الكهرباء			45	111,220,000	111,220,000	2018-07-06	21/6/2018	29/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
14	مشروع صيانة واكساء وتبليط طرق وقرى بلد روز- قرية عتبه بطول 7,5 كم - قرية اطعيمات 1,5 قضاء بلدروز/ديالى	الطرق	33 40 39.7N 45 01 36.3E	8000	120	921,260,000	921,260,000	20/6/2018	2018-04-07	31/10/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
15	مشروع تبليط شارع ام العظام العثمانية بطول 2,15 كم قضاء بعقوبة/ديالى	الطرق	33 39 19N 44 44 37 35.7E	1000	75	227,020,000	227,020,000	25/6/2018	19/7/2018	2018-03-10	100%	100%	0%	انجاز العمل
16	مشروع تبليط شوارع بطول 1,8 كم لقرى خان بني سعد - بعقوبة (ربيع عطشانة وعلي الهادي والشيماء)/ديالى	الطرق	33 56 6 87N 44 44 54 89 57E	2500	30	185,040,000	185,040,000	25/6/2018	19/7/2018	2018-09-08	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			256420		6,297,780,750	6,333,572,350							

مشاريع محافظة ديالى للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تاهيل مجمع ماء سويد وزحام والعالى وبسعة 200 م ³ / ساعة/المقدادية/ ديالى	ماء	34 03 46 N 44 58 35 E											
2	تاهيل مجمع ماء نوفل والصدور والهارونية سعة 200 م ³ / ساعة / المقدادية /ديالى	ماء	34 02 79.1N 44 58 54.3E	13,500	60	385,400,000	385,400,000	2017-07-20	2017-08-27	26/10/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	تجهيز ونصب محطة تحلية بطاقة 200م ³ / ساعة قرية حد مزيد/ بعقوبة/ديالى	ماء	33 48 06 N 44 44 09 E											
4	تاهيل شارع السوق في ناحية السعدية/ديالى	البلديات	30 11 23.01N 45 07 13.63E	35,000	35	106,750,000	106,750,000	2017-07-31	2017-09-14	18/10/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
		المجموع		48,500		492,150,000	492,150,000							



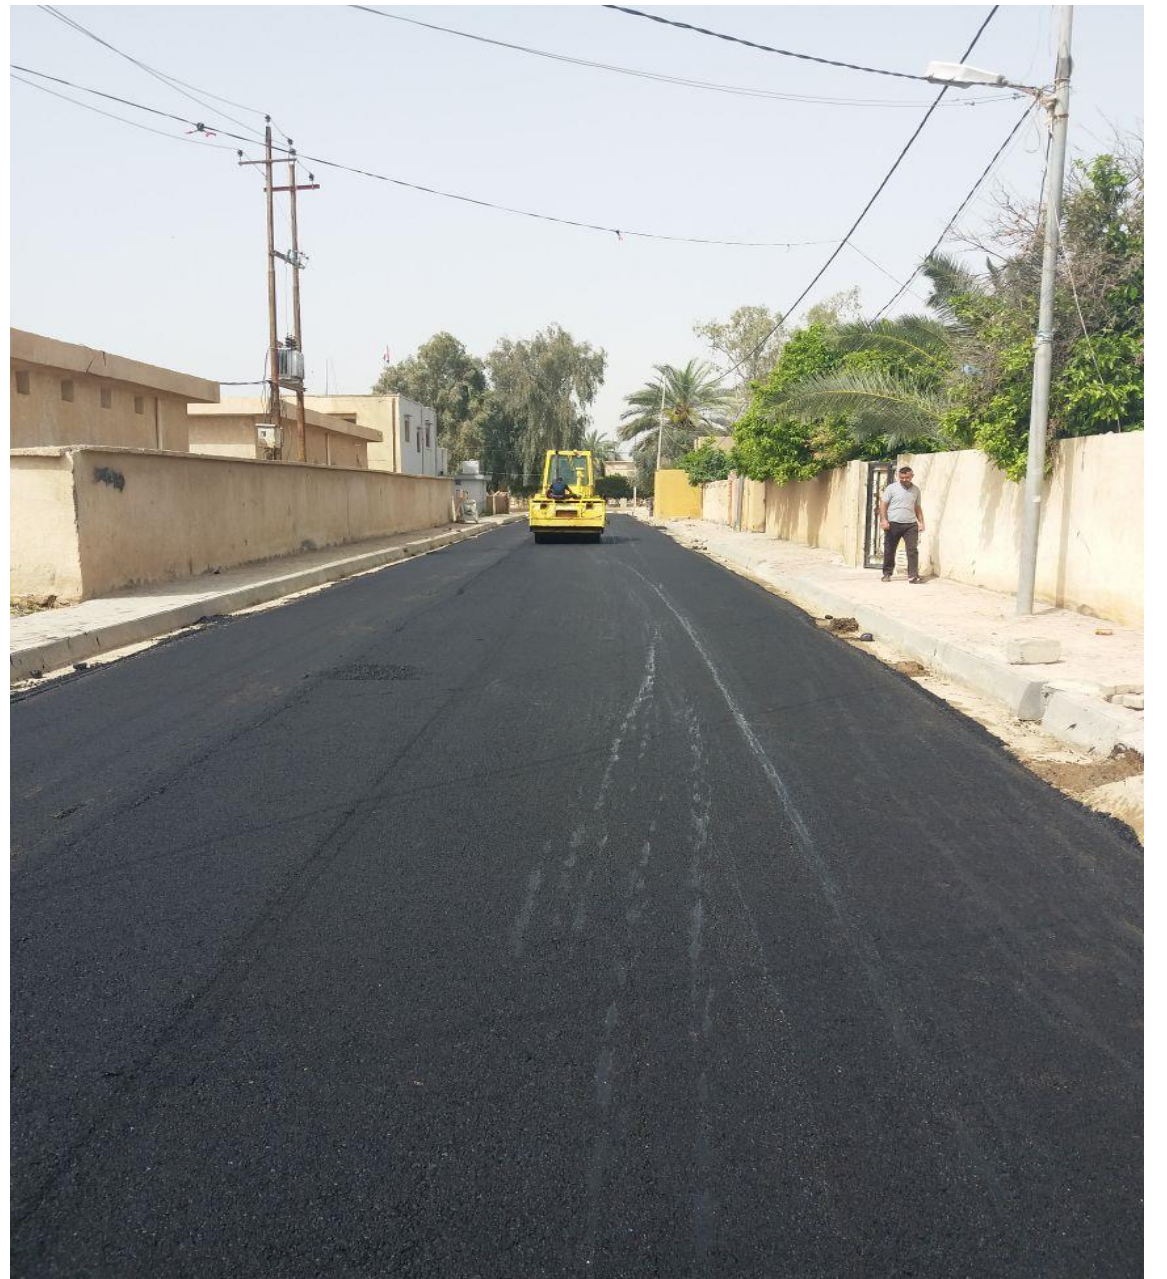

تبليط الشوارع وعمل أرصفة داخل الحدود البلدية بطول (1650 م) / المنصورية / ديالى





تأهيل وتبليط شارع السوق / السعدية / ديالى





مشروعات محافظة بابل / شمال بابل للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	تكلفة المشروع	التكلفة الكلية بعد اضافة اوامر التغيير	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تجهيز وفحص وتنفيذ خطوط جهد (11 كي.في) في قطاع المسيب / بابل	كهرباء		11,568	150	819,788,000	819,788,000	21-11-2017	26/11/2018		0%	0%	0%	تم فسخ العقد رضائياً مع المقاول
	المجموع					819,788,000	819,788,000							

مشروعات محافظة بابل / شمال بابل للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	تكلفة المشروع	التكلفة الكلية بعد اضافة اوامر التغيير	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	صيانة طريق الحامية - صنيديج بطول 3,5 كم/جرف النصر/شمال بابل	طرق وجسور	43 22 34 X 36 27 763 Y	12,500	40	287,125,000	287,125,000	13-08-2017	13-08-2017	09-05-2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	مد واستبدال شبكة ماء متفرقة في حي المواطنين والحي العسكري/جرف النصر/شمال بابل	ماء	32 46 32.1N 44 15 48.3E	18,000	50	298,620,000	298,620,000	13-08-2017	14-08-2017	10-04-2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	مد واستبدال شبكة ماء الحامية/جرف النصر/شمال بابل	ماء	32 48 28.4 N 44 15 53.9 E											
4	مد واستبدال شبكة ماء القاطع الشمالي 1 (الفاضلية 1)/جرف النصر /شمال بابل	ماء	33 00 53.5N 44 09 56.1 E											
5	مد واستبدال شبكة ماء القاطع الشمالي 2 (الفاضلية 2)/جرف النصر/شمال بابل	ماء	33 00 49.6N 44 08 36 E											
6	صيانة طريق الخضر بمحاذاة نهر الفرات بطول 18 كيلو	طرق وجسور	43 46 70X 36 33 44 6Y											
	المجموع			45,500		1,144,284,520	1,144,305,000							



استبدال شبكة الماء / شمال بابل



إعادة تاهيل الطريق (الحامية - صنديج) / جرف النصر / بابل



تاهيل طريق الخضر على طول نهر الفرات لمسافة 18 كم

محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

Baghdad Governorate Projects

الانبار



مشاريع محافظة بغداد/ حزام بغداد للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة حافظ ابراهيم الابتدائية 6 صف/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 195 557N 43 968 712E	360	59+70	349,240,000	380,255,000	23-07-2017	11-09-2017	24/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	مدرسة المسجد الأقصى الابتدائية 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 213 317N 43 892 967 E	600	170124+170	479,647,000	513,436,400	26-07-2017	11-09-2017	08-05-2018	100%	100%	87%	انجاز العمل
3	مدرسة ابراهيم طوقان الابتدائية 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 209 976N 43 930 087E	600	51+175	400,366,000	440,344,000	30-07-2017	11-09-2017	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة عز الدين القسم الابتدائية 18 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 216 750 N 43 879 541 E	900	105+200	827,057,000	815,204,000	30-07-2017	11-09-2017	17/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	مدرسة أسماء بنت أبو بكر 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 216 750 N 43 879 541 E	600	111+180	398,228,000	437,960,200	30-07-2017	11-09-2017	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	مدرسة الزخرف 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 219 497 N 43 911 557E	600	126+190	1,024,768,500	1,073,136,960	02-08-2017	11-09-2017	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	مدرسة الخوارزمي الابتدائية 9 صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 394 093N 44 037 368E	600	124+180	425,137,000	466,368,600	03-08-2017	11-09-2017	15/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تاهيل ناظم صدر ابو غريب والناظم القاطع في كيلو (8) من القناة الموحدة والمنشآت الاخرى.	الموارد المائية		2,000,000	100+120	830,278,500	899,346,750	07-11-2017	20-11-2017	14/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			2,004,260		4,734,722,000	5,026,051,910							

مشاريع محافظة بغداد/ حزام بغداد للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / 2017

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تجهيز وتنفيذ ونصب شبكات كهرباء في ناحية النصر والسلام/ أبو غريب/حزام	كهرباء		2000	50	438,843,370	13-08-2017	24-08-2017	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	تاهيل شبكات كهرباء (تجهيز محولات) أبو غريب/حزام بغداد	كهرباء		15000	15	255,600,000	18-10-2017	قيد التنفيذ	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	انشاء جسر عودة الشكر في الرفوش	الطرق والجسور		25000	30	88,225,000		تنفيذ امانة	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	تاهيل محطات ماء (السعدان, الهيتاويين, فزع شنيتر)	ماء		10,000		284,350,000		تنفيذ امانة	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تطوير موقع الصندوق	دوائر حكومية				100,000,000		20-11-2017	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			52000		1,167,018,370							



جسر عودة الشكر / حزام أبو غريب / بغداد



إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرى أبو غريب / حزام بغداد





(إعادة تأهيل محطة ماء السعدان / أبو غريب / حزام بغداد)



(إعادة تأهيل محطة ماء الهيتاويين / أبو غريب / حزام بغداد)

**مشاريع صندوق إعادة الأعمار للموازنة الفيدرالية
حسب المحافظات لعام 2018**

مشاريع محافظة نينوى



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / نينوى


ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	كانون 1		رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
					نسبة الإنجاز الفني						
1	إعادة تاهيل مستشفى تلعفر العام	تلعفر	الصحة	منجز	100%		12	13/11/2018	180	2018/11/27	1,038,672,000
2	صيانة وإعادة تاهيل القنطرة الصندوقية السداسية الواقعة على طريق موصل بغداد في المحطة (32+000) على وادي القصب ولممري الذهاب والاياب بطول 65م	القيارة	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	99%		16	18/11/2018	180	2018/11/27	830,406,000
3	إعادة اعمار بناية المركز الطلابي و وحدة الرياضة الجامعية في الكلية التقنية	الموصل	التعليم العالي	منجز	100%		140	31/12/2018	200	2019/01/14	553,100,000
4	ترميم بناية المجمع الاداعي والتلفزيوني / الفيصلية	الموصل	شبكة الاعلام العراقي	منجز	100%		28	29/11/2018	150	2018/12/03	589,560,000
5	إعادة تاهيل سقائف لمخزن المواد الغذائية الكرامة (1)	الموصل	التجارة	منجز	100%		35	4/12/2018	240	2018/12/18	2,254,676,800
6	تاهيل ابنية الاقسام الداخلية – مجمع القادسية / جامعة الموصل	الموصل	التعليم العالي	منجز	100%		111	19/12/2018	220	2019/01/02	509,927,000
7	تاهيل وصيانة جسر الحضر والاجزاء المتضررة في الطريق الرابط بين طريق (موصل – بغداد) والمنطقة الاثرية في الحضر (المرحلة الاولى)	الحضر	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	88%		99	18/12/2018	240	1/1/2019	1,501,358,000
8	إعادة تاهيل المشروع الوطني لمديرية المرور في الشلالات / المرحلة الاولى	الموصل	الداخلية	قيد التنفيذ	42%		132	30/12/2018	550	2019/01/10	1,961,520,000
9	تاهيل بناية كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل	الموصل	التعليم العالي	قيد التنفيذ	86%		41	4/12/2018	200	2018/12/18	1,537,540,000
10	هدم وإعادة بناء ثانوية تل واعي للبنين 12 صف	حمام العليل	التربية	منجز	100%		44	5/12/2018	240	2018/12/13	579,291,200
11	هدم وإعادة بناء ثانوية فلفيل 12 صف	تلكيف	التربية	منجز	100%		51	5/12/2018	240	2018/12/13	579,291,200
12	هدم وإعادة بناء متوسطة علي بن ابي طالب للبنين 12 صف	الأيمن	التربية	منجز	100%		45	5/12/2018	240	2018/12/13	579,291,200

579,291,200	2018-12-16	240	4/12/2018	36	100%	منجز	التربية	الايسر	هدم واعادة بناء متوسطة المسعودي 12 صف	13
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	76	65%	قيد التنفيذ	التربية	تلعفر	هدم واعادة بناء مدرسة كركافر 12 صف	14
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	75	100%	منجز	التربية	الأيمن	هدم واعادة بناء مدرسة العامل للبنين 12 صف	15
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	74	100%	منجز	التربية	الأيمن	هدم واعادة بناء مدرسة الحدباء للبنين 12 صف	16
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	73	100%	منجز	التربية	الايسر	هدم واعادة بناء مدرسة العطاء للبنات 12 صف	17
511,028,000	2018-12-27	220	13/12/2018	88	100%	منجز	التربية	الأيمن	هدم واعادة بناء مدرسة القدس الابتدائية للبنين 12 صف	18
511,028,000	2018-12-27	220	26/12/2018	126	100%	منجز	التربية	الايسر	هدم واعادة بناء مدرسة ابن رشد للبنين 12 صف	19
2,775,071,200	2019-01-23	450	26/12/2018	125	77%	قيد التنفيذ	التجارة	الموصل	تاهيل مجمع مخازن الحرية وتاهيل مباني الشركة العامة لتصنيع الحبوب	20
1,530,000,000	2018-10-23	45	23/10/2018	8	100%	منجز	الكهرباء		تجهيز محولات قدرة 16 MVA لمحطات جهد 33/11 كف ومحولات توزيع جهد 0,4 / 11 كف	21
177,500,000		45	23/10/2018	7	100%	منجز			تجهيز محولات توزيع سعة KVA250	22
2,988,297,000	2019-01-12	360	30/12/2018	135	57%	قيد التنفيذ	الكهرباء	الموصل	تاهيل محطة كهرباء النسيج في الساحل الايمن	23
3,381,299,000	2018-12-17	360	4/12/2018	39	96%	قيد التنفيذ	الكهرباء	الموصل	تاهيل محطة كهرباء الدواسه في الساحل الايمن	24
3,281,763,000	2018-12-17	360	4/12/2018	38	35%	قيد التنفيذ	الكهرباء	الموصل	تأهيل محطة كهرباء باب البيض في الساحل الايمن	25
382,221,000	2018-11-27	100	30/12/2018	134	100%	منجز	الكهرباء	الأيمن	المعدات المطلوبة لورشة فحص وتصليح المحولات في الجانب الايمن	26
188,480,000	2018-06-19	60	5/6/2018	2	100%	منجز	البلديات	سنجار	صب ارسفة وبناء القوالب الجانبية للشارع الرئيسي في حي النصر وبريوش وصيانة الحفر والتخسفات في مناطق متفرقة / مركز قضاء سنجار	27
30,864,723,800									المجموع	

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / نينوى


ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	كانون 1	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
					نسبة الإنجاز الفني					
1	تجهيز جهاز التصوير المقطعي عدد 2	الموصل	الصحة	منجز	100%	104	180	2019-01-02		1,700,000,000
2	تجهيز جهاز الرنين المغناطيسي عدد 2	الموصل	الصحة	منجز	100%	105	180	2019-01-02		2,560,000,000
3	تجهيز جهاز كرسي أسنان متكامل عدد(50)	عدة اقضية	الصحة	منجز	100%	110	180	2019-01-02		964,375,000
4	إعادة تأهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق حي الخضراء	الموصل	المجاري	منجز	100%	72	160	27/12/2018	2018-12-27	336,068,750
5	تاهيل المجرى الصندوقي في باب البيض	الموصل	الماء والمجاري	تنفيذ امانة / منجز	100%	تنفيذ امانة	60		2019-01-26	122,870,000
6	تاهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق اليرموك	الموصل	المجاري	منجز	100%	71	150	27/12/2018	2019-01-02	422,670,000
7	تاهيل بناية مخازن مديريةية المجاري مع انشاء مسقفات عدد/3 في وادي عكاب	الموصل	المجاري	منجز	100%	42	180	18/12/2018	2018-12-18	597,820,000
8	تاهيل بناية الهيئة العامة للضرائب في محافظة نينوى/ الجانب الايمن (عمارة التامين على الحياة)	الموصل	الادارة المحلية	تنفيذ امانة / الغي - مؤجل للعام القادم		تنفيذ امانة	60			197,495,000
9	تاهيل مخازن مركز تكنولوجيا البذور/ موقع الموصل	الموصل	العلوم والتكنولوجيا	تنفيذ امانة / منجز	100%	تنفيذ امانة	60		2019-01-03	221,525,000
10	اعادة تأهيل قسم بحوث نينوى		الزراعة	منجز	100%	47	100	19/12/2018	2018-12-19	232,313,000
11	إعادة اعمار بناية المعهد التقني نينوى		التعليم العالي	منجز	100%	13	180	27/11/2018	2018-11-26	747,647,600
12	اعادة اعمار بناية المختبرات العلمية في الكلية التقنية الزراعية / الموصل		التعليم العالي	منجز	100%	13				


322,399,200	2018-12-27	27/12/2018	150	87	96%	قيد التنفيذ	التربية	الموصل	تاهيل ابنية مدرسية في الموصل / الجانب الأيمن (البتول والمواهب)	13
574,228,000	2019-01-03	5/1/2019	180	114	100%	منجز	رئاسة الوزراء		تأهيل بناية مديرية المخابرات في نينوى	14
356,390,600	2019-01-10	2/1/2019	120	101	100%	منجز	الداخلية		إعادة تاهيل مراكز شرطة (اليرموك , الوقاص , النصر) المرحلة الثانية	15
				101	100%	منجز	الداخلية		تاهيل بناية الغرامات والحاسبة لمرور نينوى	16
471,636,000	2018-12-30	30/12/2018	180	90	77%	قيد التنفيذ	دوائر حكومية		أعادة بناء بناية مديرية مختبر نينوى الانشائي	17
598,800,000	2018-12-27	27/12/2018	180	89	96%	قيد التنفيذ	الطرق والجسور	تلعفر	صيانة و تاهيل جسر وادي المر على طريق (كسك - ربيعة)	18
370,080,000	2018-12-27	27/12/2018	100	83	100%	منجز	الطرق والجسور	تلعفر	تاهيل طرق ناحية العياضية	19
1,418,500,000	2018-12-23	من تاريخ استلام الدفعة المقدمة	45	117	100%	منجز	الكهرباء		تجهيز محولات كهربائية (تجهيز محولات سعة 400,250 kva عدد 185) محولة لمخزن الكرامة)	20
118,654,000	2019-01-03	3/1/2019	60	تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امانة / منجز	التربية	سنجار	تاهيل ابنية مدرسية في قضاء سنجان (مدرسة كوجو)	21
120,238,000	2019-01-21	18/11/2018	60	تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امانة / منجز	التربية	تلعفر	تاهيل ابنية مدرسية في قضاء تلعفر مدرسة (اميرة الجنة و المنتظر و الجزيرة)	22
12,453,710,150									المجموع	

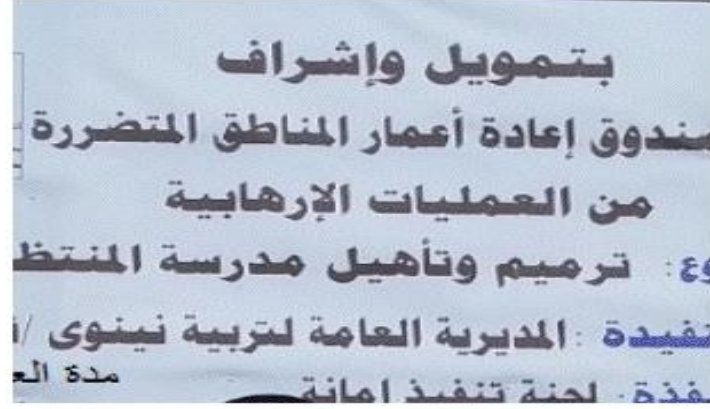

تأهيل الأبنية المدرسية لـ (مدرسة اميرة الجنة - الجزيرة -المنتظر)


قام صندوق إعادة اعمار
المناطق المتضررة من
العمليات الإرهابية بإعادة
اعمار مشروع تأهيل الأبنية
المدرسية وهو ضمن خطة
مشاريع عام 2018 مدة
العمل مشروع 75 يوم وقد
تم إنجاز العمل 100%
وحسب التوقيتات
الموضوعة في العقد

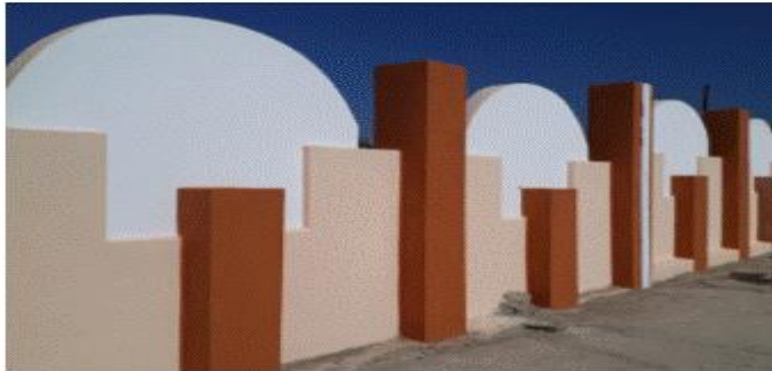

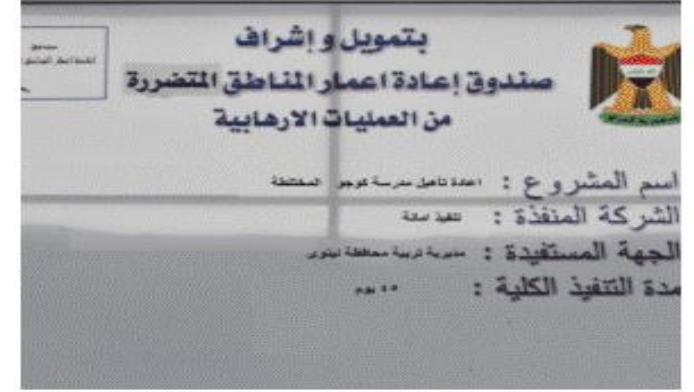

تأهيل مدرسة كوجو في قضاء سنجار

قام صندوق إعادة اعمار
المناطق المتضررة من
العمليات الإرهابية بإعادة
اعمار مشروع تأهيل
مدرسة كوجو وهو ضمن
خطة مشاريع عام 2018
مدة العمل مشروع 60 يوم
مستمر حالياً علماً ان نسبة
الإنجاز الفعلي 100%

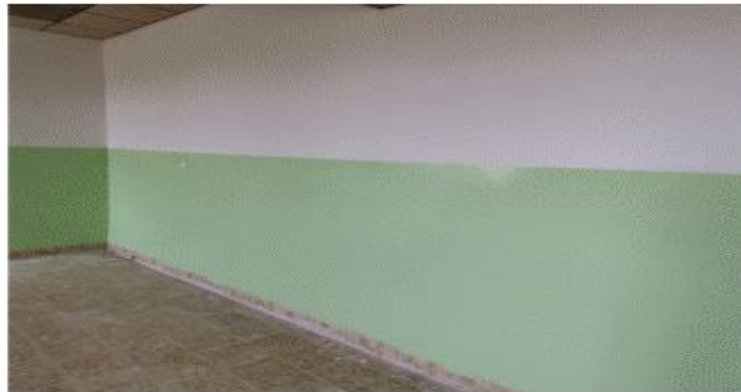



إعادة تأهيل مراكز الشرطة وأبنية مرور نينوى

قام صندوق إعادة اعمار
المناطق المتضررة من
العمليات الإرهابية بإعادة
اعمار مشروع إعادة تأهيل
مراكز الشرطة وأبنية مرور
نينوى وهو ضمن خطة
مشاريع عام 2018 مدة
العمل مشروع 120 يوم
ومستمر به العمل حالياً
علماً ان نسبة الإنجاز
الفعلي 100%



تأهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق اليرموك

قام صندوق إعادة اعمار
المناطق المتضررة من
العمليات الإرهابية بإعادة
اعمار مشروع معالجة
المياه الثقيلة لشقق
الخضراء وهو ضمن خطة
مشاريع عام 2018 مدة
العمل مشروع 150 يوم
ومستمر به العمل حالياً
علماً ان نسبة الإنجاز
الفعلي 100%

مشروع محافظة الانبار

الانبار



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	هدم واعادة بناء مركز صحي ودار سكن البوزعيان	الخالدية	الصحة	منجز	100%	124	26/12/2018	200	8/1/2019	1,150,824,000
2	هدم واعادة بناء مركز صحي المضيق	الخالدية	الصحة	منجز	100%	124	26/12/2018	200	8/1/2019	
3	هدم واعادة بناء مركز صحي في البوبالي مع دار سكن	الخالدية	الصحة	منجز	100%	124	26/12/2018	200	8/1/2019	
4	هدم واعادة بناء جنسية راوه	راوه	الداخلية	منجز	100%	136	30/12/2018	180	12/1/2019	907,329,600
5	هدم واعادة بناء جنسية عنه	عنه	الداخلية	منجز	100%	136	30/12/2018	180	12/1/2019	
6	هدم واعادة بناء البطاقة الوطنية في القائم	القائم	الداخلية	منجز	100%	138	30/12/2018	150	13/1/2019	579,545,000
7	تاهيل دائرة البطاقة الوطنية في العبيدي		الداخلية	منجز	100%	138	30/12/2018	150	13/1/2019	
8	اعادة اعمار جسر وادي الفحيمي الاول	عنه	الطرق والجسور	منجز	100%	130	27/12/2018	180	7/1/2019	633,920,000
9	اعادة اعمار جسر وادي زغيدان	حديثه	الطرق والجسور	منجز	100%	122	26/12/2018	180	7/1/2019	467,200,000
10	اعادة اعمار جسر البغدادي العائم بطول 420متر		الطرق والجسور	منجز	100%	131	30/12/2018	360	12/1/2019	1,301,888,000
	المجموع									5,040,706,600

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	صيانة مجمع ماء البوسودة سعة (200م3/سا)	الخالدية	الماء والمجاري	منجز	100%	19	22/11/2018	90	16/12/2018	560,392,000
2	تجهيز ونصب وحدة مجمعة تقوية سعة 200م3/ساعة حي القدس والشهداء	الخالدية	الماء والمجاري	منجز	100%	19				
3	تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 100م3/ساعة (النساف/البوعلون /البوراشد)	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56	6/12/2018	120	20/12/2018	1,003,847,500
4	تأهيل مجمع ماء الاسباني/ الشهداء النعيمية	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56				
5	تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 200م3/ساعة لمناطق الصبيحات	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56				
6	صيانة وتأهيل مجمع ماء بني زيد سعة (200)م3/س	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	56				
7	تاهيل مجمع ماء سويحل و النهضة الشرقية/ القائم	القائم	الماء والمجاري	منجز	100%	50	5/12/2018	55	2/1/2019	130,640,000
8	صيانة مجمع ماء الصروح سعة 300 م3/ساعة	هيت	الماء والمجاري	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	19/12/2018	125,670,000
9	تجهيز ونصب وحدة تقوية سعة مليون غالون لمجمع ماء الخسفة	حديثة	الماء والمجاري	منجز	100%	52	5/12/2018	90	3/1/2019	699,079,000
10	تاهيل مشروع ماء حديثة - حقلانية الموحد	حديثة	الماء والمجاري	منجز	100%	52				
11	تاهيل مجمع ماء حي الشرطة لناحية بروانة	حديثة	الماء والمجاري	منجز	100%	52				
12	صيانة مشروع ماء الجزيرة في الرمادي	الرمادي	الماء والمجاري	منجز	100%	62	11/12/2018	150	24/12/2018	743,927,500
13	مد شبكة ماء في الاحياء الجنوبية لمدينة الفلوجة	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	29	29/11/2018	80		560,939,200
14	تنفيذ خط دكتايل من ناقل الخزان الى الحي العسكري	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	29			24/12/2018	
15	مد شبكة ماء في حي الجمهورية وحي الشهداء	الفلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	29				
16	أنشاء خزان كونكريتي سعة (750) م3 في قضاء الرطبة	الرطبة	الماء والمجاري	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	14/12/2018	197,212,000
17	تاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء حديثة	حديثة	الكهرباء	منجز	100%	100	18/12/2018	180	5/1/2019	529,287,500
18	تأهيل الشبكة الكهربائية في ناحية حصيبة الشرقية / قضاء الخالدية	الخالدية	الكهرباء	منجز	100%	30	29/11/2018	150	23/12/2018	202,198,000
19	تأهيل الشبكة الكهربائية في زوية غراب	الخالدية	الكهرباء	منجز	100%	30				
20	تاهيل الشبكات الكهربائية في قضاء الرطبة	الرطبة	الكهرباء	منجز	100%			60	26/12/2018	248,715,000

مشاريع محافظة صلاح الدين



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / صلاح الدين

ت	اسم المشروع	التاحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	إعادة تاهيل جسر الشرفاط الكونكريتي ومقترباته في محافظة صلاح الدين	الشرفاط	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	75.1%	17	21/11/2018	360	2018-12-12	3,948,780,000
2	هدم وإعادة بناء مدرسة العلياء الابتدائية للبنات 12 صف	بلد	التربية	منجز	100%	54	5/12/2018	180	2019-01-15	610,965,000
3	هدم وإعادة بناء ثانوية جمال عبدالناصر 12 صف	بلد	التربية	منجز	100%	43	4/12/2018	180	2019-01-15	528,360,000
4	هدم وإعادة بناء مدرسة المحزم الابتدائية للبنين 12 صف	تكريت	التربية	منجز	100%	67	12/12/2018	180	2018-12-25	607,200,000
5	هدم وإعادة بناء ثانوية الأريج للبنات 12 صف	بيجي	التربية	منجز	100%	37	4/12/2018	180	2019-01-20	573,400,000
6	إعادة تاهيل جسر البوجواري ورفع انقاض جسر سكة القطار المتضرر في قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين	بيجي	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	95%	20	22/11/2018	150	2018-12-08	579,632,000
7	هدم وإعادة بناء ثانوية بيجي للبنات 18 صف	بيجي	التربية	منجز	100%	80	13/12/2018	180	2019-01-20	980,658,750
8	هدم وإعادة بناء ثانوية الخضراء للبنين 18 صف	يثرب	التربية	منجز	100%	64	11/12/2018	180	2019-01-14	980,788,500
	المجموع									8,809,784,250

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / صلاح الدين

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	توسعة مركز صحي في الساحل الأيسر/ قضاء الشرفا	الشرفا	الصحة	منجز	100%	55	5/12/2018	150	2018-12-18	284,192,000
2	هدم و إعادة بناء مديرية بلدية سليمان بيك	سليمان بيك	البلدية	منجز	100%	103	19/12/2018	120	2019-01-02	467,699,000
3	أكساء شوارع متفرقة في قضاء سامراء	سامراء	البلدية	منجز	100%	49	5/12/2018	120	2018-12-23	548,060,000
4	هدم و إعادة بناء مديرية بلدية يثرب	يثرب	البلدية	منجز	100%	65	11/12/2018	160	2018-12-24	400,092,000
5	هدم و إعادة بناء مركز شرطة سليمان بيك	سليمان بيك	الداخلية	منجز	100%	58	11/12/2018	180	2018-12-27	563,272,900
6	هدم و إعادة بناء مديرية شرطة يثرب	يثرب	الداخلية	قيد التنفيذ	92%	34	2/12/2018	180	2018-12-20	834,784,000
7	هدم و إعادة بناء مركز شرطة المعتم	المعتم	الداخلية	منجز	100%	18	22/11/2018	180	2018-12-16	591,548,000
8	هدم و إعادة بناء مركز شرطة دجلة	دجلة	الداخلية	منجز	100%	23	27/11/2018	180	2018-12-24	589,857,500
9	إعادة تأهيل 4 جسور للمحطة (700+ +16) كم و المحطة (115+17) كم على طريق تكريت - بيجي	بيجي	الطرق والجسور	منجز	100%	77	13/12/2018	150	2018-12-26	457,400,000
10	تأهيل كهرباء محطات التوزيع الرئيسية / A - B جامعة تكريت	تكريت	الكهرباء	منجز	100%	106	19/12/2018	140	2019-01-03	1,017,611,200
	المجموع									5,754,516,600



مشاريع محافظة كركوك



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / كركوك

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	كانون 1		تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
					نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد				
1	هدم وإعادة بناء مدرسة الاسكندرونة 12 صف في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	منجز	100%	15	18/11/2018	210	2018-11-19	557,435,000
2	تاهيل خطوط ابراج مغذي 33 كف لتغذية محطة الرياض من محطة ملاعبالله	الحويجة	الكهرباء	متوقف / بسبب وجود مخلفات حربية والغام	90%	22	26/11/2018	160	2018-12-09	467,952,500
3	اعادة انشاء الجسر الكونكريتي على طريق (كركوك - تكريت)		الطرق والجسور	منجز	100%	21	26/11/2018	360	2018-12-06	1,249,294,000
4	صيانة جسور باي حسن		الطرق والجسور	منجز	100%	26	27/11/2018	180	2018-12-09	391,990,000
5	اعادة اعمار بنايات المعهد التقني - الحويجة (بناية العمادة, المركز الثقافي, ورش تدريب الطلاب)	الحويجة	التعليم العالي	قيد التنفيذ	80%	108	19/12/2018	150	2018-12-30	864,570,000
6	اعادة ترميم محكمة بداءة الرياض	الرياض	وزارة العدل	منجز	100%	115	23/12/2018	150	2019-01-03	362,528,000
7	اعادة انشاء بناية مركز شرطة الزاب	الزاب	الداخلية	قيد التنفيذ/ الانحراف بسبب 1- تلكو الشركة 2- تأخر صدور امر غيار	59%	121	23/12/2018	150	2019-05-19	380,882,400
8	اعادة تاهيل ثانوية الاوس في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	قيد التنفيذ / الانحراف بسبب 1- الامطار 2- تلكو الشركة 3- امر غيار	98%	84	13/12/2018	240	2018-12-27	401,301,000
9	تاهيل مشروع ماء تل علي القديم (400) م/3 ساعة - قضاء الحويجة	الحويجة	الماء	منجز	100%	92	16/12/2018	180	2018-12-30	706,112,001
10	إعادة اعمار محطات الدفع العالي لمشاريع ماء (غريب وشجرة) ناحية العباسي	العباسي	الماء	منجز	100%	98	18/12/2018	150	2018-12-30	264,000,000
11	هدم وإعادة بناء مدرسة البونجم 12 صف في داقوق	داقوق	التربية	قيد التنفيذ / سبب الانحراف 1- فحص تحريات التربة 2- الامطار 3- تلكو الشركة	50%	82	13/12/2018	300	2018-12-27	557,408,000
12	هدم وإعادة بناء مدرسة ام البنين في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	منجز	100%	96	17/12/2018	300	2018-12-31	557,410,000
13	هدم وإعادة بناء مدرسة البوبتير 6 صف في ناحية الملتقى	الملتقى	التربية	منجز	100%	95	17/12/2018	200	2018-12-31	325,332,000
14	هدم وإعادة بناء مدرسة المرة 6 صف في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	منجز	100%	95			2018-12-31	
15	صيانة الشوارع الرابط بين كيوان وناحية الملتقى	الملتقى	الطرق والجسور	منجز	100%	143	31/12/2018	60	10/1/2019	280,000,000
16	إعادة اكساء الطريق الرابط بين ناحية الرياض وقضاء الحويجة	الرياض	الطرق والجسور	منجز	100%	128	27/12/2018	60	2019-01-08	286,350,000
	المجموع									7,652,564,901

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / كركوك

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تبديل رمل و حصي للفلاتر لمشروع ماء الحويجة الحديث	الحويجة	الماء	منجز / تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امانة		60	27/12/2018	162,250,000
2	تاهيل مجمع ماء جديدة السادة	الحويجة	الماء	منجز / تنفيذ امانة	100%	تنفيذ امانة				
3	هدم واعادة بناء مركز الدفاع المدني في قضاء الحويجة	الحويجة	الداخلية	قيد التنفيذ / أسباب الانحراف 1- تأخر تحريات التربة 2- شدة الامطار 3- امر غيار 4- تكلؤ الشركة	59%	93	16/12/2018	180	30/12/2018	535,403,200
4	تجهيز مضخات لمحطات الماء في المناطق المحررة/ الحويجة	الحويجة	الماء	منجز	100%	94	17/12/2018	50	31/12/2018	368,000,004
5	هدم واعادة بناء مركز شرطة الرياض	الرياض	الداخلية	قيد التنفيذ / أسباب الانحراف 1- شدة الامطار 2- امر غيار 3- تكلؤ الشركة	98%	11	4/11/2018	180	18/11/2018	380,882,400
6	هدم واعادة بناء مركز شرطة الرشاد	الرشاد	الداخلية	قيد التنفيذ / أسباب الانحراف 1- شدة الامطار 2- امر غيار 3- تكلؤ الشركة	96%	10	4/11/2018	180	16/12/2018	380,882,400
7	تجهيز مولدات لمشاريع الماء في المناطق المحررة / كركوك		الماء	منجز	100%	142	31/12/2018	60	31/1/2019	748,500,000
8	هدم وإعادة بناء بناية بلدية مجاري ناحية الرياض	الرياض	البلدية	متوقف / بسبب تكلؤ الشركة	65%	81	13/12/2018	150	26/12/2018	344,502,400
9	هدم وإعادة بناء بناية بلدية مجاري ناحية الزاب	الحويجة	البلدية		64%	81	13/12/2018	150	26/12/2018	
10	تاهيل سايلو حبوب في قضاء الحويجة	الحويجة	التجارة	منجز	100%	78	13/12/2018	183	26/12/2018	576,140,000
11	تاهيل سايلو حبوب في ناحية الرياض	الرياض	التجارة	منجز	100%	78				
12	رفع الصبات الكونكريتية / سدة كركوك الحديثة		الطرق والجسور	لم ينفذ / تم تحويله الى خطة عام 2019		تنفيذ امانة		25		70,800,000
	المجموع									3,567,360,404

مشروع محافظة ديالى

Diyala Governorate Projects



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تبليط واكساء شوارع متفرقة في مركز قضاء الخالص	الخالص	الطرق والجسور	منجز	100%	14	14/11/2018	90	21/11/2018	1,009,317,500
2	تجهيز مواد ومعدات لصيانة الشبكة الكهربائية في ناحية العظيم	العظيم	الكهرباء	منجز	100%	60	11/12/2018	60	28/1/2019	631,352,500
3	صيانة واكساء وتثبيت اكتاف طريق الصدور - ناحية المنصورية بطول 13,500 كم		الطرق والجسور	منجز	100%	97	18/12/2018	120	2/1/2019	908,000,000
4	هدم واعادة بناء مدرسة شجرة اليقطين 12 صف في جلولاء	جلولاء	التربية	منجز	100%	123	26/12/2018	180	4/2/2019	540,411,500
5	اعادة تاهيل طريق قرية الجبل بطول 4كم في ناحية بهرز باعتبار المحطة (صفر+صفر) هي الشارع الرئيسي لطريق بعقوبة - النهروان	بعقوبة	الطرق والجسور	منجز	100%	119	23/12/2018	120	8/1/2019	404,240,000
6	اعادة تاهيل طرق (الزركانية - العودة - سفيط - دراويش) مع الطريق الفرعي لقرية الزركانية في الخالص من المحطة (صفر + صفر) سيطرة الجيش الى (100+3)	الخالص	الطرق والجسور	منجز	100%	120	23/12/2018	90	23/1/2019	308,040,000
7	صيانة واكساء الطريق الرابط لقرى الجبل الصاعد بطول 6كم من المحطة (صفر+صفر)الى(6+صفر) /ناحية بهرز	بهرز	الطرق والجسور	منجز	100%	139	31/12/2018	100	14/1/2019	518,640,000
8	إعادة تاهيل طريق التحويلة والقرى المحاذية لها		الطرق والجسور	منجز	100%	137	30/12/2018	120	13/1/2019	709,840,000
9	هدم واعادة بناء روضة اطفال السعدية النموذجية	السعدية	التربية	منجز	100%	133	30/12/2018	180	17/1/2019	426,670,000
10	صيانة واكساء وتبليط لقرى بلدروز (قرية عتبة 7.5 كم وقرية طعيمات 1.5 كم (مقاطعة 17	بلدروز	الطرق	منجز	100%	4	20/6/2018	120	03/7/2018	921,260,000
11	اكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية قره تبة و قصبته القديمة		الطرق	منجز	100%	9	28/10/2018	60	25/11/2018	320,000,000
12	تبليط شارع ام العظام العثمانية / بعقوبة بطول 2.15 كم	بعقوبة	الطرق	منجز	100%	5	25/6/2018	75	19/7/2018	227,020,000
13	تبليط شوارع بطول 11.8 كم لقرى خان بني سعد / بعقوبه / ربيع عطشاته / وعلي الهادي والشيماء	بعقوبة	الطرق	منجز	100%	6	25/6/2018	30	19/7/2018	185,040,000
14	تاهيل الشارع رقم 21 المار ضمن المحلة 311 و 313 بطول 1.4 كم للمقطع ما بين المستوصف الصحي القديم واستدارة دور الجاهزة في حي التحرير / بعقوبة	بعقوبة	الطرق	منجز	100%	1	5/6/2018	100	20/6/2018	195,720,000
15	تبليط الشارع الرئيسي داخل حدود بلدية السلام بطول 550 م	السلام	الطرق	منجز	100%	53	5/12/2018	75	13/1/2019	96,184,000
16	تاهيل انارة شوارع ناحية كنعان في ديالى	بعقوبة	الكهرباء	منجز	100%	3	7/6/2018	45	21/6/2018	111,220,000
	المجموع									7,512,955,500

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	شهر أيلول نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
1	تبليط طرق في قضاء بلدروز	بلدروز	البلدية	منجز	100%	129	27/12/2018	90	28/1/2019	448,757,500
2	اكساء الشوارع الرئيسية - هيهب		البلدية	منجز	100%	24	27/11/2018	90	27/12/2018	390,168,001
3	صيانة واكساء طريق جيزاني الجول-الخالص	الخالص	الطرق	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	24/12/2018	216,000,000
4	صيانة جسر بعقوبة الثالث		الطرق	منجز	100%	31	29/11/2018	90	11/12/2018	193,240,000
5	صيانة و اكساء مدخل قرية الزهيرات بطول 3 كم / ابو صيدا		الطرق	منجز	100%	48	5/12/2018	60	3/1/2019	257,600,000
6	صيانة واكساء و تثبيت اكتاف طريق قره تبة/ ناحية جبارة		الطرق	منجز	100%	32	2/12/2018	90	16/12/2018	692,320,014
7	تبليط طريق ناحية السلام		الطرق	منجز	100%	59	11/12/2018	120	9/1/2019	412,320,000
8	تجهيز مواد لتاهيل شبكة كهرباء احياء (الرمادية-الحرية-الجزيرة-النضال-ابو الدهن)	المقدادية	الكهرباء	منجز	100%					579,004,500
	أ- تجهيز قابلات واسلاك كهربائية / كهرباء المقدادية	المقدادية	الكهرباء	منجز	100%	107	19/12/2018	30	9/1/2019	87,796,000
	ب- تجهيز محولات كهرباء / كهرباء المقدادية	المقدادية	الكهرباء	منجز	100%	118	23/12/2018	45	21/1/2019	184,000,000
9	تبدیل الخط الناقل المغذي من محطة تقوية ماء سيف سعد الى هيهب قطر 315 ملم	الخالص	الماء	تنفيذ امانة /منجز	100%			45	26/12/2018	167,800,000
10	تجهيز و نصب مجمع ماء الشاخرة في قضاء المقدادية	المقدادية	الماء	تنفيذ امانة /منجز	100%			60	30/12/2018	159,237,700
11	تاهيل مجمع ماء الشهيد غازي سعة 100 م3/ساعة مع تنفيذ خط ناقل سعة 250 ملم		الماء	منجز	100%	27	29/11/2018	120	9/12/2018	559,663,000
12	هدم و اعادة بناء مدرسة الرابطة (6) صف	خاتقين	التربية	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	26/12/2018	239,487,000
13	تجهيز مولدة لمستشفى جلولاء		الصحة	منجز	100%	141			31/1/2019	96,755,000
14	تبليط طريق كشكول الصغير و الكبير		الطرق	منجز	100%	86	13/12/2018	90	16/1/2019	386,900,000
15	هدم وإعادة بناء مدرسة ابن الهيثم 12 صف	الخالص	التربية	قيد التنفيذ	27%	79	13/12/2018	180		1,097,486,000
16	هدم وإعادة بناء مدرسة الاصاله 12 صف	الخالص	التربية	منجز	100%	79			4/2/2019	
17	تاهيل مجمع ماء السادة سعة 200م3/ساعة	بعقوبة	الماء	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	30/12/2018	221,429,100
18	هدم وإعادة بناء السياج الخارجي لمدرسة اعدادية مندلي	مندلي	التربية	تنفيذ امانة / منجز	100%			40	24/12/2018	75,125,000
	المجموع									6,465,088,815



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / شمال بابل

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	صيانة طريق مسيب - جرف النصر على اعتبار المحطة (صفر+صفر) تقاطع التحرير	جرف النصر	الطرق والجسور	2,860,369,360	انجز بتاريخ 8/8/2019	%100	68	12/12/2018	150	26/12/2018	27/12/2018	2,000,259,000
	المجموع			2,860,369,360								2,000,259,000

محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

Baghdad Governorate Projects

الانبار



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / حزام بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	هدم واعادة بناء مدرسة بن غازي الابتدائية 18 صف	الطارمية	التربية	1,207,253,080	منجز	100%	102	19/12/2018	240	2/1/2019	27/12/2018	840,178,000
2	هدم واعادة بناء مدرسة ابن النفيس الابتدائية 18 صف	المشاهدة	التربية	1,207,253,080	منجز	100%	127	26/12/2018	240	8/1/2019	8/1/2019	840,177,600
	المجموع			2,414,506,160								1,680,355,600

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2018 / بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تاهيل خط كهرباء (33 كي في) محطة الصمود/ مستودعات نطف المشاهدة	المشاهدة	الكهرباء	512,502,848	منجز	100%	57	9/12/2018	120	23/12/2018	507,471,500
2	اىصال الماء الصافى الى قرية المزرفة فى التاجى		الماء	99,800,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			25	21/10/2018	99,800,000
3	مجمع ماء الحركاوى الجنوبى سعة 200م3/س	اليوسفية	الماء	792,511,290	منجز	100%	70	13/12/2018	120	27/12/2018	718,103,100
4	تأهيل مجمع ماء عودة المفرجى سعة 200م3/س	اليوسفية	الماء		منجز	100%	70				
5	تأهيل مجمع ماء هور ابو فاضل سعة 200م3/س	اليوسفية	الماء		منجز	100%	70				
6	تبليط الشارع الرئيسى فى حى الجزائر/ قضاء المحمودية	المحمودية	الطرق والجسور	230,270,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	24/12/2018	205,980,000
7	تاهيل خطوط تغذية الشبكة الكهربائية لمناطق الزيدان دولية/ قضاء ابو غريب		الكهرباء	561,344,763	منجز	100%	63	11/12/2018	60	25/12/2018	508,638,400
8	انشاء كرفان دار مبيت اطباء سبع البور		الصحة	17,437,235	لجنة مشتريات / منجز	100%					19,750,000
9	إعادة تاهيل طريق الشاحنات / سيطرة بغداد - كوت	الرستمية	الداخلية	249,485,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			50	23/12/2018	200,332,000
10	إعادة تاهيل طريق الشاحنات / سيطرة بغداد - الشعب	الشعب	الداخلية	248,676,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			50	23/12/2018	199,704,000
11	تاهيل طريق قرية البوذياب واطراف الحماميات	التاجى	البلدية	250,000,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	24/12/2018	210,000,000
12	تاهيل طريق حنون	الشعب	البلدية	262,075,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	24/12/2018	229,915,000
13	تاهيل طريق السدة المحاذى لنهر دجلة / جسر ذراع دجلة لغاية جامع نور المصطفى / مقاطعة مزرفة وحصيوه	التاجى	البلدية	286,350,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	24/12/2018	240,900,000
14	ترميم ابنية مدرسية (مدرسة الامام الصادق وعظماء العرب)	النهروان	التربية	73,200,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45	27/12/2018	73,200,000
15	توسعة مقر الصندوق		مباني حكومية	500,000,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	27/12/2018	250,000,000
16	توسعة القسم الهندسى / مقر الصندوق		مباني حكومية	50,000,000	لجنة مشتريات / منجز	100%			60		50,000,000
	المجموع			4,133,652,136							3,513,794,000

**مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية
حسب المحافظات لعام 2019**

مشاريع محافظة نينوى



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / نينوى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	اعادة تاهيل ابنية الاقسام الداخلية مجمع الفاروق/ الساحل الايمن	الجانب الايمن	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	17%	23	19/8/2019	365	2019-09-02	2,969,285,600
2	تجهيز المعدات المطلوبة لورشة فحص وتصلح المحولات في قضاء تلعفر	تلعفر	الكهرباء	قيد التنفيذ	2%	37	1/9/2019	180	2019-09-03	445,851,000
3	تاهيل بناية ادارة الدراسات والتصاميم الهندسية في الموصل	الجانب الايمن	الموارد المائية	قيد التنفيذ	40%	45	30/9/2019	270	2019-10-06	606,156,800
4	تجهيز مواد لتاهيل واعمار وصيانة الشبكة الكهربائية - الجانب الايسر	الجانب الايسر	الكهرباء	إعادة اعلان -15						
5	اعادة تاهيل المستشفى البيطري في باب سنجار- الجانب الايمن	الجانب الايمن	الزراعة	معن						
6	تبليط وتاهيل وصيانة واكساء شوارع متفرقة داخل قضاء تلعفر	تلعفر	البلدية والبلديات	إعادة اعلان						
7	اعادة انشاء عمادة كلية الطب جامعة الموصل	الموصل	التربية والتعليم	محال						
8	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 1 / طب الموصل	الموصل	التربية والتعليم	محال						
9	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 2 / طب الموصل	الموصل	التربية والتعليم	محال						
10	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 3 / طب الموصل	الموصل	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	2%	66	2019-11-12	380	2019-11-18	2,416,492,800
11	اعادة انشاء الاقسام العلمية رقم 4 / طب الموصل	الموصل	التربية والتعليم	محال						2,335,423,000
12	اعادة انشاء كلية هندسة الكهرباء	الموصل	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	4%	55	24/10/2019	500	2019-10-30	5,444,672,000
13	تاهيل بناية شعبة احصاء تلعفر	تلعفر	مباني حكومية	قيد الإحالة						
14	هدم واعادة بناء متوسطة العقيدة للبنين 12 صف	الموصل	التربية والتعليم	محال						
15	هدم واعادة بناء روضة الاريح 4 صف	الموصل	التربية والتعليم	محال						
16	هدم واعادة بناء اعدادية اسماعيل طالب /ناحية القبروان- 12 صف	سنجار	التربية والتعليم	محال						
17	هدم واعادة بناء مدرسة عبدالرحمن الداخل 12 صف	الموصل	التربية والتعليم	معن						
18	اعادة انشاء بناية المقر الرئيسي لمديرية زراعة نينوى	الموصل	الزراعة	معن						
19	هدم واعادة بناء مجمع الكرامة 2/	الموصل	التجارة	محال						
20	اعادة اعمار وتاهيل جسر موقع سد بادوش الحديدي	تلكيف	الموارد المائية	معن						
21	اعادة انشاء بناية مديرية بلديات نينوى	الموصل	البلديات	قيد الإحالة						
22	اعادة تاهيل محطة كهرباء القبروان	سنجار	الكهرباء	معن						
23	تبليط وفرش اكتاف الطريق الرابط من مشروع ري الجزيرة الشمالي الى قرية حردان بطول 12,5 كم	سنجار	البلدية والبلديات	قيد الإحالة						
24	اعادة تاهيل ملعب جامعة الموصل	الموصل	التربية والتعليم	قيد الإعلان						
25	هدم واعادة بناء شعبة الموارد المائية في الموصل	الموصل	الموارد المائية	معن						
26	هدم و إعادة انشاء مدرسة الاعدادية المركزية 24 صف الموصل/ الجانب الايمن	الجانب الايمن	التربية والتعليم	معن						
27	اعادة تاهيل محطة كهرباء البعاج سعة 16*2 مفا	البعاج	الكهرباء	معن						
28	تاهيل وتبديل القوالب الجانبية لشوارع السوق من دورة القلعة الى دورة رأس الجادة في تلعفر مع تبليط شوارع بطول 1525م	تلعفر	الطرق والجسور	معن						
29	اعادة تاهيل مخازن كهرباء الكرامة	الموصل	الكهرباء	قيد الإعلان						
30	اعادة تاهيل مطبعة جامعة الموصل	الموصل	التعليم العالي	معن						
31	اعادة تاهيل بناية بلدية القبروان	سنجار	البلدية والبلديات	قيد الإعلان						
32	تبليط واكساء شوارع متفرقة في مركز قضاء تلكيف	تلكيف	البلدية والبلديات	قيد الإعلان						
33	هدم واعادة بناء محطة الشفاء الثانوية (11/33) kvالجانب الايمن	الموصل	الكهرباء	معن						
34	تجهيز وتنفيذ مصادر جهد (33) kv للمحطة كهرباء باب عشتار الثانوية من المحطة الرئيسية	الموصل	الكهرباء	قيد الإعلان						
35	تبليط وتاهيل شوارع في حي الكفاح وحي الجزيرة وحي العسكري والصناعة الجنوبي داخل قسبة تلعفر	تلعفر	البلديات	معن						
36	صيانة واكساء طريق تل زلط - الموالي	تلعفر	الطرق والجسور	معن						
										14,217,881,200

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / نينوى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	كانون 1 نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / تاريخ المباشرة الفعلي يوم	كلفة العقد الأصلي
1	اعادة انشاء مركز صحي الوحدة	الموصل	الصحة	قيد التنفيذ	54%	12	23/7/2019	180	455,116,000
2	اعادة تاهيل جسر الصابونية على طريق موصل - كسك	تلعفر	الجسور	قيد التنفيذ	15%	17	5/8/2019	150	601,200,000
3	اعادة تاهيل جسر المفري (حنكة - زمار)	زمار	الجسور	قيد التنفيذ	15%	17	5/8/2019	150	
4	هدم و اعادة بناء ثانوية زمار للبنات 12 صف	زمار	التربية	قيد التنفيذ	22%	25	2019-08-20	180	739,203,600
5	تاهيل مدرسة ابو خشب /ناحية ربيعة مع بناء جناح (6) صف طابقين مع وحدات صحية عدد (4)	ناحية ربيعة	التربية	قيد التنفيذ	22%	25	2019-08-20	180	
6	إعادة انشاء ورشة فحص المحولات ومركز صيانة كهرباء القاطع الجنوبي في تلعفر	تلعفر	الكهرباء	قيد التنفيذ	12%	26	2019-08-20	210	860,206,300
7	اعادة بناء القناطر في حي المامون	الموصل	المجاري	قيد التنفيذ	6%	40	2019-09-03	150	406,700,000
8	اعادة بناء القناطر في حي النجار	الموصل	المجاري	قيد التنفيذ	6%	40	2019-09-03	150	
9	تاهيل مبنى الإدارة و الجدار المحيطي لمعمل تنقية البذور	الموصل	الزراعة	قيد الإحالة					
10	تجهيز و نصب معمل تنقية البذور	الموصل	الزراعة	قيد الإحالة					
11	اعادة بناء مركز صيانة كهرباء القاطع الجنوبي / تلعفر	تلعفر	الكهرباء	توقيع عقد					
12	هدم و اعادة بناء جناح (6صف) طابقين + (4صف) + مجموعة صحية /مدرسة عبد الله بن مسعود / سنجار	سنجار	التربية	معلن					
13	هدم و اعادة بناء جناح (6صف) طابقين / مدرسة الفيروان / سنجار	سنجار	التربية	معلن					
14	هدم و اعادة بناء مدرسة ام الشبايط - 12 صف/سنجار	سنجار	التربية	معلن					
15	تجهيز جهاز تفتيت الحصى عدد (2)	الموصل	الصحة	قيد الإحالة					
16	تاهيل سايلو الموصل - وادي حجر لخرن الحبوب	الموصل	التجارة	قيد الإحالة					
17	تاهيل مجمع تل عبطة لخرن الحبوب	الموصل	التجارة	معلن					
18	صيانة و تاهيل ساحة الموصل لخرن الحبوب	الموصل	التجارة	معلن					
19	اعادة تاهيل جمعية الحدباء لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة	الموصل	مباني حكومية	معلن					
20	تجهيز و تنصيب و تشغيل جهاز قسطرة عدد 1	الموصل	الصحة	معلن					
									3,062,425,900

مشروع محافظة الانبار

الانبار



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	اكساء وتاهيل ارصفة في قضاء حديثة	حديثة	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	26%	16	200	2019-08-11	1,545,240,000
2	اعادة تاهيل طرق في عموم احياء وقرى البغدادي	هيت	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	30%	16	200	2019-08-11	
3	تاهيل شوارع حي الزيتون في منطقة 5 كيلو الرمادي	الرمادي	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	70%	21	360	2019-09-03	2,773,520,000
4	اعادة تاهيل طريق بين حي اليرموك وجسر التفاحة بطول 2900م	الفلوجة	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	30%	21	360	2019-09-03	
5	تاهيل طريق المدخل الشرقي للحي المدني (السي سي) من جهة حي العمال بطول اكم وعرض 25,5 متر	الحبانية	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	80%	22	120	2019-08-22	1,289,200,000
6	تاهيل طريق ابوقليس الحولي المحاذي لقاعدة الحبانية بطول 3425 م وعرض 30 متر	الحبانية	الطرق والجسور	لم يباشر / بسبب اعتراض القوات الأمنية	0%	22	120	2019-08-22	
7	تاهيل وصيانة محطة الفاو (14p التابعة الى مركز مجاري الفلوجة	الفلوجة	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	40%	24	210	2019-09-02	1,104,560,000
8	اعادة بناء هيئة استثمار الانبار	الرمادي	مباني حكومية	قيد التنفيذ	20.5%	36	360	2019-09-12	818,148,000
9	هدم واعادة بناء قطاع الرعاية الصحية الاولية في عنه	عنة	الصحة	قيد التنفيذ	41%	44	180	2019-10-14	443,448,000
10	هدم واعادة بناء مديرية شرطة الانبار	الرمادي	الداخلية	قيد التنفيذ	4%	46	730	2019-10-10	4,370,761,100
11	هدم واعادة انشاء محطة ماء الكرابلة /القائم	القائم	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	25%	48	180	2019-10-13	789,244,000
12	اعادة اعمار جسور زنكورة الفوقاني كم (94+000) على طريق المرور السريع	الرمادي	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	40%	57	200	2019-11-13	655,650,000
13	هدم واعادة بناء مدرسة المكاسب الابتدائية للبنين	الربطية	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	14%	59	180	2019-11-14	567,981,000
14	تاهيل محطة اسالة مياه الشرب ومحطة المعالجة الثقيلة في العامرية - مجمع الاخاء	الفلوجة	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	1%	62	240		1,141,571,200
15	تاهيل مشروع ماء ال 5 كيلو في الرمادي	الرمادي	الماء والمجاري	محال					
16	تاهيل سدة جويبة باتجاه النشاف بطول 3كم من المحطة 11+000 الى المحطة 14+000 باعتبار (صفر+صفر) جسر النافورة		الطرق والجسور	قيد الإحالة					
17	تاهيل شوارع عدد 7 لمديرية بلدية الربطية		البلدية والبلديات	قيد المباشرة		85	150		
18	تاهيل شارع نهر فليح من شارع المنجزات الى محطة الماء باتجاه النهر/ الفلوجة		البلدية والبلديات	قيد الإحالة					
19	اعادة بناء المجمع الحكومي في ناحية الرمانة		مباني حكومية	قيد الإحالة					
20	اعادة انشاء القسم البلدي في ناحية الوفاء		البلدية والبلديات	محال					

					محال	مباني حكومية		هدم واعادة بناء مديرية ناحية الصقلاوية	21
2,823,356,000		69	3%	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	الرمادي		هدم واعادة بناء مدرسة التل الاخضر- الحميرة 12 صف	22
		300	80	معن	التربية والتعليم			هدم واعادة بناء ثانوية الوطن للبنين 18 صف الكرمة	23
1,141,590,000	2019-11-17	180	70	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	الكرمة		هدم واعادة بناء مدرسة الغر المحجلين الابتدائية المختلطة 12 صف	24
2,271,912,000	2019-11-30	180	71	6%	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	هيت	هدم واعادة بناء ثانوية التهذيب للبنات 12 صف - هيت	25
				معن	التربية والتعليم	القائم		هدم واعادة بناء مدرسة الشعلة الابتدائية 12 صف - راوه	26
				معن	التربية والتعليم			هدم واعادة بناء ثانوية الامالي للبنين 18 صف - القائم	27
				معن	التربية والتعليم	القائم		هدم واعادة بناء ثانوية الرحاب للبنات 12 صف - القائم	28
	2019-11-17	180	70	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	الفلوجة		هدم واعادة بناء مدرسة الامين 12 صف- الفلوجة	29
		300	80	معن	التربية والتعليم			هدم واعادة بناء ثانوية الرشيد 18 صف	30
				معن	التربية والتعليم			تاهيل كلية العلوم الاسلامية / جامعة الفلوجة	31
				محال	الداخلية			هدم واعادة بناء قاطع مرور الرمادي	32
				محال	التربية والتعليم			هدم واعادة بناء بنائية الاقسام العلمية /كلية التربية في القائم	33
				محال	التربية والتعليم			تاهيل بنايتي عمادة كلية التربية لعلوم الصرفة وعمادة كلية التربية للعلوم الانسانية	34
				قيد الإحالة	مباني حكومية			تاهيل بنايتي مديرية احصاء الانبار	35
				معن	مباني حكومية			ترميم وتاهيل مبنى الدوائر الحكومية في عنه	36
				محال	الصحة			تاهيل مستشفى القائم العام	37
				محال	مباني حكومية			اعادة انشاء مبنى المجلس المحلي / قضاء القائم	38
				تدقيق التخطيط	مباني حكومية			اعادة انشاء بنائية المجلس المحلي لقضاء هيت	39
				معن	التربية والتعليم			اعادة انشاء بنائية الاقسام الداخلية للطلاب لكلية التربية في القائم	40
	2019-11-30	180	71	6%	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	هيت	هدم واعادة بناء مدرسة الحويبي الابتدائية 12 صف في البغدادي	41
	2019-12-23	180	96		قيد المباشرة	التربية والتعليم	الرمادي	هدم واعادة بناء مدرسة سومر الابتدائية / 12 صف	42
	2019-11-30	180	71	6%	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	هيت	هدم واعادة بناء مدرسة الاسكندرونة الابتدائية للبنين /12 صف	43
				معن	التربية والتعليم			هدم واعادة بناء مدرسة الفلاح الابتدائية للبنين / 12 صف	44
				معن	التربية والتعليم			هدم واعادة بناء مدرسة حلب الابتدائية للبنين/ 12 صف	45
				معن	التربية والتعليم			هدم واعادة بناء مدرسة الجماهير الابتدائية للبنين / 18 صف	46
				معن	التربية والتعليم			هدم واعادة بناء مدرسة المهدي الابتدائية للبنين/18 صف	47
				معن	الشباب والرياضة			اعادة تاهيل منتدى شباب هيت	48
	2019-12-12	180	79	قيد التنفيذ	البلدية والبلديات			اعادة انشاء الشارع الخدمي في الخمسة كيلو في الرمادي	49
				معن	الماء والمجاري			تاهيل وصيانة محطة (p10الفاو (امطار)	50
				معن	الكهرباء			تاهيل مغذي سعده من محطة سعده	51
				معن	الكهرباء			تاهيل مغذي الصفرة ومغذي النهية	52
				معن	الكهرباء			تاهيل مغذي جريجب من محطة القنيطرة	53
				معن	الكهرباء			تاهيل مغذي الكرابلة من محطة سعده	54
				معن	الكهرباء			تاهيل الشبكة الكهربائية لقرى جريجب والفاضية والقنيطرة	55
				معن	الكهرباء			اعادة اإصال التيار الكهربائي الى المجمع السكني التابع الى الشركة العامة للفوسفات	56
				قيد الإحالة	الكهرباء	هيت		تاهيل مغذي كهرياء المعسكر	57
				معن	الطرق والجسور			تاهيل الطريق الرابط بين جسر المخازن الى نهاية الجسر المؤدي الى منطقة البوعيثة	58
				معن	مباني حكومية			هدم و اعادة بناء بنائية قائممقامية الرطبة	59
				معن	التربية والتعليم			تاهيل عمادة كلية التربية الرياضية/بنائية/المساعد العلمي	60

			69	2%	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	الرمادي	هدم و اعادة بناء مدرسة دار العلم الابتدائية 12 صف في الرمادي / المركز	61
	2019-12-23	180	96		قيد التنفيذ	التربية والتعليم		هدم و اعادة بناء مدرسة التلاحم الابتدائية 12 صف	62
					معن	التربية والتعليم		هدم و اعادة بناء مدرسة فاطمة البرناوي للبنات 18 صف في هيت/ كبيسة	63
					معن	التربية والتعليم		هدم و اعادة بناء اعدادية حليلة السعدية للبنات/18 صف	64
	2019-12-23	180	96		قيد التنفيذ	التربية والتعليم		هدم و اعادة بناء مدرسة الوهج الابتدائية 12 صف في زنجورة	65
	2019-12-23	180	96		قيد التنفيذ	التربية والتعليم		هدم و اعادة بناء ثانوية ام سلمة 12 صف	66
			69	2%	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	الرمادي	هدم و اعادة بناء مدرسة بغداد الابتدائية للبنين 12 صف	67
					معن	التربية والتعليم		هدم و اعادة بناء قسم تربية الفلوجة	68
		300			محال	التربية والتعليم		هدم و اعادة بناء ثانوية الناظم للبنين 18 صف	69
			69	2%	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	الرمادي	هدم و اعادة بناء مدرسة الشفانق الابتدائية للبنات/ 12 صف	70
	2019-11-30	180	71	6%	قيد التنفيذ	التربية والتعليم	هيت	هدم و اعادة بناء مدرسة الاخاء الابتدائية المختلطة/ 12 صف	71
					معن	التربية والتعليم		هدم و اعادة بناء قسم تربية راوة	72
					تدقيق الصندوق	الماء والمجاري		تاهيل وتوسيع مجمع ماء سعدة مع اضافة وحدة مجمعة 200م3/ساعة مع خط ناقل بطول 1500 متر	73
					محال	الماء والمجاري		تاهيل وتوسيع مجمع ماء النهضة الشرقية مع اضافة خط ناقل بطول 3500 متر	74
					محال	الماء والمجاري		تاهيل وتوسيع مشروع الماء المركزي في القائم	75
					معن	الماء والمجاري		صيانة وتاهيل محطات الدفع لمشروع ماء الصحراء الغربية - هيت	76
					معن	البلدية والبلديات	الفلوجة	تاهيل الشوارع الشريانية في حي الضباط/قضاء الفلوجة	77
					معن	البلدية والبلديات	الفلوجة	تاهيل الشوارع الشريانية في حي الشرطة والجغيفي/قضاء الفلوجة	78
					معن	البلدية والبلديات	الفلوجة	تاهيل شارع المحيط الفاصل بين الحي العسكري وحي الشركة/قضاء الفلوجة	79
					محال	البلدية والبلديات	القائم	تاهيل الطريق الخدمي في الكرابلة - سعدة سايدين - المرحلة الثانية	80

				معن	الماء والمجاري	الكرمة	تجهيز ونصب مجمع ماء السعيد_ سعة 100م/3ساعة	81
				محال	مباني حكومية	القائم	اعادة اعمار محطة تبينة وقود ناحية الكرابلة/الانبار	82
				معن	الكهرباء		هدم واعادة بناء بناية كهرباء هيت مع ورشة الصيانة	83
				جديد	الماء والمجاري		تأهيل وتوسيع مشروع ماء الشرب للمدينة السكنية في القائم / العبيدي	84
				جديد	الماء والمجاري		استبدال نواقل رئيسية لمغذي المدينة السكنية / العبيدي	85
				معن	الماء والمجاري		الغاء مبزل الحفرية بمد خط دفع لمحطة مجاري الاحتفالات والمخابرات / الرمادي	86
				معن	طرق وجسور	الجبانية	صيانة وتأهيل جسر الخالدية الكونكريتي / قضاء الجبانية	87
				معن			اعادة تأهيل كورنيش الورا من جهة التاميم الرابط بين جسر الحوز الى جسر القاسم	88
				محال		عنة	اعادة تأهيل مقطع من الطريق العام حديثة.عنه	89
				محال		عنة	اعادة تأهيل قنطرة صندوقية ثلاثية على طريق حصي -جباب وقنطرة عبرة انحدارية على طريق الشارع العام /قضاء عنة	90
					تدقيق التخطيط		هدم واعادة انشاء مدرسة اغادير للبنين 12 صف / الانبار	91
					تدقيق التخطيط		تجهيز مواد لدعم وتأهيل الشبكات الكهربائية لفرع توزيع كهرباء مركز الانبار في اضية (الرمادي الخالدية هيت الرطبة)	92
				محال	الكهرباء		اعادة انشاء مديرية كهرباء الانبار مع مخزن	93
				معن	التربية والتعليم		هدم واعادة انشاء مدرسة الخليج العربي (12) صف / الانبار	94
				معن	التربية والتعليم		هدم واعادة انشاء مدرسة الصادق الامين (12) صف / الانبار	95
				معن	مباني حكومية		هدم واعادة بناء دار القضاء في الرطبة	96
				معن	مباني حكومية		هدم واعادة بناء دار القضاء في عنة	97
				معن	الطرق والجسور		اعادة تأهيل طريق محطة البزل الرئيسية في المضيق باتجاه نهر الفرات مع طريق داخلي	98
				معن	الطرق والجسور		تأهيل شارع الثرثار الحولي من تقاطع النافورة الى شارع المحيط / الفلوجة	99
				معن	الصحة		اعادة انشاء مركز صحي فرعي /العبيدي	100
				معن	الماء والمجاري	الكرمة	تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 100م/3س في قرية بني زيد	101

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تاهيل الشبكة الكهربائية في جزيرة الخالدية	الخالدية	الكهرباء	منجز	100%	1	2019-07-18	150	2019-08-01	1,649,372,000
2	فك اختناق مغذيات احياء العسكري والزراشة والحي القديم	راوه	الكهرباء	قيد التنفيذ	83%	1	2019-07-18	150	2019-08-01	
3	تاهيل جزء من شبكة مغذي الزراشية	راوه	الكهرباء	قيد التنفيذ	83%	1	2019-07-18	150	2019-08-01	
4	تاهيل جزء من مغذي راوه القديمة	راوه	الكهرباء	قيد التنفيذ	83%	1	2019-07-18	150	2019-08-01	
5	تاهيل جزء من شبكة مغذي الحي العسكري	رمادي	الكهرباء	قيد التنفيذ	83%	1	2019-07-18	150	2019-08-01	
6	تاهيل شبكات الضغط العالي والواطيء في مركز الكرمه	الكرمة	الكهرباء	منجز	100%	1	2019-07-18	150	2019-08-01	
7	اعادة اعمار محطة كهرباء جنوب الفلوجة	الفلوجة	الكهرباء	قيد التنفيذ	85%	1	2019-07-18	150	2019-08-01	
8	تاهيل مجمع ماء رميلة القديم سعة 50 م ³ /ساعة	فلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	2,447,805,800
9	تاهيل مجمع ماء البوعيثة البونجرس 200م ³ /ساعة	رمادي	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
10	تاهيل مجمع ماء سعة 250 الف غالون في الخفاجية	حديثة	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
11	استبدال الاتابيب الخاصة بمجمع ماء الزنكورة التاسع	رمادي	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
12	تاهيل مجمع ماء الدواية سعة 200م ³ /ساعة	فلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
13	تاهيل مجمع ماء الزغريت الصقلاوية	فلوجة	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
14	تاهيل شبكات الماء في قضاء الكرمه	الكرمة	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
15	تاهيل مجمع ماء الزاوية 200م ³ /ساعة	حديثة	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
16	صيانة مجمعات الماء في العامرية	العامرية	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
17	اعادة اعمار محطة الدفع (4م ³ تصريف مياه الامطار في الفلوجة	الفلوجة	الماء والمجاري	متوقف بسبب تأخر الفقرات الاستيرادية	25%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
18	اعادة تاهيل مجمع ماء البوشلال 200م ³ /ساعة في هيت	هيت	الماء والمجاري	منجز	100%	3	2019-07-21	120	2019-08-03	
19	اعادة تبليط شوارع في حي العروبة قضاء الكرمه	الكرمة	البلديات	قيد التنفيذ	80%	7	2019-07-22	120	2019-08-04	849,935,000
20	مشروع اكساء مدخل ناحية النخيب من ثلاث محاور (كيلو 160 و كربلاء و الرطبة)	الرطبة	الطرق	قيد التنفيذ	95%	7	2019-07-22	120	2019-08-04	

	2019-08-04	120	2019-07-22	7	85%	قيد التنفيذ	البلديات	هيت	تاهيل الشارع من السوق القديم الى دائرة الكهرباء مع شوارع متفرقة - كبيسه	21
	2019-08-04	120	2019-07-22	7	95%	قيد التنفيذ	البلديات	هيت	اعادة انشاء شوارع في حي السلام في ناحية المحمدي	22
1,093,879,000	2019-07-23	180	2019-07-23	9	70%	قيد التنفيذ		راوه	تاهيل بناية شعبة زراعة راوه	23
	2019-08-05	180	2019-07-23	9	41%	قيد التنفيذ	التجارة	الرمادي	اعادة انشاء مخازن كونكريتية عدد 3 في موقع سايلو الرمادي	24
	2019-08-05	180	2019-07-23	9	55%	قيد التنفيذ	الزراعة	الرطبة	هدم واعادة بناء شعبة زراعة الرطبة	25
	2019-08-05	180	2019-07-23	9	50%	قيد التنفيذ	الزراعة	القائم	اعادة انشاء شعبة الزراعة في الرمانة	26
	2019-08-05	180	2019-07-23	9	65%	قيد التنفيذ	التجارة	رمادي	اعادة انشاء بناية الرقابة التجارية و المالية - فرع الانبار	27
731,329,600	2019-08-10	210	28/7/2019	14	75%	قيد التنفيذ	موارد مانية	رمادي	اعادة انشاء القناطر المتفجرة للمشاريع الاروائية	28
	2019-08-10	210	28/7/2019	14	75%	قيد التنفيذ	الموارد المانية	راوه	انشاء شعبة الموارد المانية في راوه	29
	2019-08-10	210	28/7/2019	14	65%	قيد التنفيذ	الموارد المانية	القائم	هدم و اعادة بناء شعبة الموارد المانية في القائم	30
						معن	القائم		تاهيل المجمع الحكومي لناحية العبيدي في القائم	31
						معن	هيت		اعادة بناء الجناح الاداري المهدم مع تاهيل الاجزاء المتضررة في مدرسة المسار / هيت	32
						معن	القائم		هدم واعادة بناء مديرية بلدية القائم	33
						معن	هيت		تاهيل الاقسام الداخلية في قضاء هيت	34
						معن	عنه		اعادة انشاء مصرف الرافدين فرع عنه	35
						معن	الرطبة		اعادة انشاء مصرف الرافدين فرع الرطبة	36
						معن	القائم		اعادة تاهيل مصرف الرشيد في القائم	37
						معن	حديثة		تاهيل خط كهرباء الضغط الفائق حديثة - غرب بغداد /400ك ف	38
						محال	الصقلاوية		انشاء طريق قرية زغيدان بطول 1800 م و عرض 9م	39
						محال	الحقلانية		اعادة انشاء ملحق لمديرية ناحية الحقلانية	40
					100%	منجز /تنفيذ امانة	مباني حكومية	هيت	تاهيل شباب منتدى هيت	41
6,772,321,400									المجموع	

مشاريع محافظة صلاح الدين



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / صلاح الدين

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	اعادة تاهيل طريق تكريت - بييجي بطول 45 كم	عموم المحافظة	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	3%	35	26/8/2019	360	2019-09-07	3,289,200,000
2	هدم واعادة بناء مركز شرطة المحطة في قضاء بلد	بلد	الداخلية	قيد التنفيذ	13.60%	39	2019-09-02	220	2019-09-16	1,085,670,400
3	هدم واعادة بناء مركز شرطة الركة	سامراء	الداخلية	قيد التنفيذ	8.60%	39	2019-09-02	220	2019-09-16	
4	هدم واعادة بناء مدرسة 12 صف ثانوية قتيبة المختلطة	بلد	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	8%	51	14/10/2019	210	2019-10-28	2,038,806,000
5	هدم واعادة بناء مدرسة 12 صف التحدي الابتدائية	بلد	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	8%	51	14/10/2019	210	2019-10-28	
6	هدم واعادة بناء مدرسة لبنان الابتدائية 12 صف	بلد	التربية والتعليم	قيد التنفيذ	8%	51	14/10/2019	210	2019-10-28	
7	تاهيل وصيانة البنى التحتية لجامعة تكريت (كيوسكات) مع قابلووات الضغط الوطنى	تكريت	التربية والتعليم	قيد التنفيذ / لم يقدم المقاول برنامج تقدم العمل	0%	53	2019-10-17	150	2019-10-30	920,492,000
8	تاهيل وصيانة الصرف الصحي وشبكة تصريف مياه الامطار لجامعة تكريت	تكريت	التربية والتعليم	قيد التنفيذ / لم يقدم المقاول برنامج تقدم العمل	0%	53	2019-10-17	150	2019-10-30	
9	هدم واعادة بناء مركز صحي رئيس عزيز بلد	بييجي	الصحة	قيد التنفيذ	10%	54	17/10/2019	220	2019-10-30	2,698,634,400
10	هدم واعادة بناء مركز صحي نموذجي بييجي	بييجي	الصحة	قيد التنفيذ	10%	54	17/10/2019	220	2019-10-30	
11	هدم واعادة بناء مركز صحي نموذجي الحجاج	بييجي	الصحة	قيد التنفيذ	10%	54	17/10/2019	220	2019-10-30	
12	صيانة وتاهيل محطة تقوية الصينية سعة 500م3/ساعة		الماء والمجاري	محال						
13	اعادة تاهيل قناطر عدد 7 على طريق بييجي - الشرقاط	الشرقاط	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	12%	67	2019-11-14			1,285,004,000
14	اعادة تاهيل جسور صغيرة عدد 3 (جسري كيان والسيد غريب وجسر حاوي البور) في محافظة صلاح الدين	تكريت	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	12%	67	2019-11-14			
15	هدم واعادة بناء دار القضاء في الدور	الدور	مباني حكومية	معن						
16	هدم واعادة بناء دار القضاء في الضلوعية	الضلوعية	مباني حكومية	محال						
17	هدم واعادة بناء دار القضاء في يثرب	يثرب	مباني حكومية	محال						
18	هدم واعادة بناء مدرسة 12 صف سليمان بيك الابتدائية	الطوز	التربية والتعليم	معن						
19	هدم واعادة بناء مدرسة 12 صف بييجي الابتدائية للبنات	بييجي	التربية والتعليم	معن						
20	هدم واعادة بناء مدرسة 12 صف الخلفاء الابتدائية		التربية والتعليم	معن						
21	هدم واعادة بناء مدرسة الفياض للبنين 12 صف		التربية والتعليم	معن						
22	هدم واعادة بناء مدرسة الوادي الخصب 6 صف		التربية والتعليم	معن						
23	تليط الشوارع المجاورة لسايلو طوز في منطقة 77/قضاء الطوز	الطوز	البلدية والبلديات	معن						
24	اعمال الارصف الجانبية واكساء الشوارع في حي الطيار		البلدية والبلديات	معن						
25	اعادة تاهيل طريق كفري - سليمان بيك بطول 14.8 كم / صلاح الدين		الطرق والجسور	محال						
26	تليط طريق بييجي - مفرق الشرقاط المرحلة الاولى		الطرق والجسور	محال						
27	صيانة واكساء طريق سامراء بين جسر الثرثار وجسر العباسية / صلاح الدين		البلدية والبلديات	قيد الإعلان						
										11,317,806,800

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / صلاح الدين

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	مشروع معالجة و اكساء طريق (المدخل الشمالي) بطول 1700 م لمركز قضاء امرلي	امرلي	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	45%	20	2019-08-18	150	2019-09-01	905,440,000
2	اعادة تأهيل الشوارع الداخلية المتضررة من جراء العمليات الارهابية في قضاء امرلي	امرلي	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	45%	20	2019-08-18	150	2019-09-01	
3	هدم واعادة بناء بناية ناحية المعتصم	ناحية المعتصم	مباني حكومية	قيد التنفيذ	42%	10	2019-07-23	180	2019-08-05	782,609,500
4	تأهيل و صيانة منتدى شباب و رياضة بلد	بلد	الشباب والرياضة	قيد التنفيذ	60%	10	2019-07-23	180	2019-08-05	
5	هدم و اعادة بناء بناية ناحية مكحول	مكحول	مباني حكومية	قيد التنفيذ	15%	34	2019-08-26	220	2019-09-07	1,989,736,200
6	هدم و اعادة بناء بناية ناحية الصينية	الصينية	مباني حكومية	قيد التنفيذ	20%	34	2019-08-26	220	2019-09-07	
7	هدم و اعادة بناء مديرية بلدية الصينية	الصينية	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	15%	34	2019-08-26	220	2019-09-07	
8	هدم واعادة بناء بناية ناحية سليمان بيك	الطوز	الادارة المحلية	قيد التنفيذ	18%	34	2019-08-26	220	2019-09-07	
9	اعادة تأهيل طريق الشهيدة امية الجبارة	العلم	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	30%	41	2019-09-03	120	2019-09-16	606,960,000
10	هدم و اعادة بناء بناية مركز ماء يثرب	يثرب	الماء والمجاري	قيد الإحالة						0
11	هدم واعادة بناء بناية مركز ماء بيجي	بيجي	الماء والمجاري	قيد الإحالة						0
										4,284,745,700



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / كركوك

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم المناقصة	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تكلفة العقد الأصلي
1	تجهيز محولات مع ملحقات و مواد تأهيل في قضاء الحويجة		الكهرباء	معلن		116					
2	تأهيل شبكات كهرباء في قرى متفرقة ومغذيات 11كف - السلام وباجوان مع تنفيذ مغذي جديد من محطة الطابوق في ناحية الملتقى		الكهرباء	معلن		17					
3	تأهيل مجاري حي حطين في قضاء الحويجة	الحويجة	المجاري	قيد التنفيذ	35%	41	27	20/8/2019	330	2019-08-25	3,339,335,000
4	تأهيل مجاري حي النصر في قضاء الحويجة	الحويجة	المجاري	قيد التنفيذ	35%	41	27	20/8/2019	330	2019-08-25	
5	تأهيل مجاري حي النداء في قضاء الحويجة	الحويجة	المجاري	قيد التنفيذ	35%	41	27	20/8/2019	330	2019-08-25	
6	تأهيل شوارع حي النصر في قضاء الحويجة	الحويجة	البلديات	قيد التنفيذ	35%	41	27	20/8/2019	330	2019-08-25	
7	تأهيل شوارع حي حطين في قضاء الحويجة	الحويجة	البلديات	قيد التنفيذ	35%	41	27	20/8/2019	330	2019-08-25	
8	تأهيل شوارع حي النداء في قضاء الحويجة	الحويجة	البلديات	قيد التنفيذ	35%	41	27	20/8/2019	330	2019-08-25	
9	تأهيل شوارع القطاع الثالث في قضاء الحويجة	الحويجة	البلديات	قيد التنفيذ	25%	42	31	21/8/2019	220	2019-09-05	1,998,406,800
10	تأهيل السوق الصغير وجزء من حي اليرموك	الحويجة	البلديات	قيد التنفيذ	25%	42	31	21/8/2019	220	2019-09-05	
11	هدم وإعادة بناء ورشة مركزية لبلدية الحويجة	الحويجة	البلديات	قيد التنفيذ	25%	42	31	21/8/2019	220	2019-09-05	
12	تأهيل مجاري القطاع الثالث في قضاء الحويجة	الحويجة	المجاري	قيد التنفيذ	25%	42	31	21/8/2019	220	2019-09-05	
13	صيانة واكساء وتبليط الشوارع الداخلية في ناحية الرياض	الحويجة	البلديات	منجز	100%	25	13	25/7/2019		2019-08-18	333,646,000
14	هدم وإعادة بناء مدرسة اشبيلية 12 صف - مركز الحويجة	الحويجة	التربية	قيد التنفيذ	15%	12	15	30/7/2019	270	8/22/2019	2,369,721,600
15	هدم وإعادة بناء مدرسة الربيع 12 صف- دافوق -قرية الصمود	دافوق	التربية	قيد التنفيذ	25%	12	15	30/7/2019	270	8/22/2019	
16	هدم وإعادة بناء مدرسة كواز عرب الابتدائية 6 صف - ناحية الملتقى	الملتقى	التربية	قيد التنفيذ	10%	12	15	30/7/2019	270	8/22/2019	
17	هدم وإعادة بناء مدرسة زمزم الابتدائية 6 صف - دافوق -طويلة	دافوق	التربية	قيد التنفيذ	17%	12	15	30/7/2019	270	8/22/2019	
18	هدم وإعادة بناء مدرسة تل الجول 6 صف - تازة	الملتقى	التربية	قيد التنفيذ	10%	12	15	30/7/2019	270	8/22/2019	
19	هدم وإعادة بناء مدرسة الخندق 6 صف - الملتقى	الملتقى	التربية	قيد التنفيذ	5%	12	15	30/7/2019	270	8/22/2019	
20	هدم وإعادة بناء مدرسة الزيتون الابتدائية 6 صف - الدبس	الدبس	التربية	قيد التنفيذ	4%	12	15	30/7/2019	270	8/22/2019	
21	هدم وإعادة بناء مدرسة المصطافية الابتدائية المختلطة 6 صف - الحويجة - المصطافية	الحويجة	التربية	قيد التنفيذ	10%	12	15	30/7/2019	270	8/22/2019	
22	هدم وإعادة بناء مدرسة اسماعيل اوة الابتدائية المختلطة 6 صف - الدبس- اسماعيل اوة	الدبس	التربية	قيد التنفيذ	15%	12	15	30/7/2019	270	8/22/2019	
23	هدم وإعادة بناء مدرسة كواز كرد الابتدائية المختلطة 6 صف - الملتقى	الملتقى	التربية	قيد التنفيذ	4%	12	15	30/7/2019	270	8/22/2019	
24	هدم وإعادة بناء شعبية احصاء الحويجة	الحويجة	مباني	قيد الإحالة		126					
25	تأهيل مدخل المنزلة والاحياء المجاورة	البلديات	البلديات	قيد الإحالة		142					
26	تأهيل مشروع مجاري مدخل المنزلة والاحياء المجاورة	البلديات	البلديات	قيد الإحالة		142					
27	بناء دائرة ومركز جباية ماء قضاء الحويجة مع تأهيل المخزن	الحويجة	مباني	قيد الإحالة		173					
28	هدم وإعادة بناء مخازن عدد9 في قضاء الحويجة مع بنائة الشعبة الزراعية والقاعة الارشادية	الحويجة	الزراعة	قيد الإحالة		174					
29	اعادة تأهيل منشأة محطة بستنة الحويجة	الحويجة	الزراعة	قيد الإحالة		174					
30	صيانة وتأهيل جسر زغيتون على طريق (كركوك -نكرت)	الطرق والجسور	الطرق والجسور	قيد الإحالة		161					
31	اعادة تأهيل الطريق الرابط بين قضاء الحويجة ومفرق الصفرة	الطرق والجسور	الطرق والجسور	قيد الإحالة		140					
32	صيانة الطريق الرابط بين الشلالات وقرى النكارات	الطرق والجسور	الطرق والجسور	قيد الإحالة		141					
33	اعادة تأهيل الطريق الرابط بين تل علي قرية مصطفى العباسي والقرية الغازية بطول 10 كم	الطرق والجسور	الطرق والجسور	قيد الإحالة		141					
34	تأهيل وصيانة الطرق الخارجية الرابطة بين الاقضية والمدن التابعة للمحافظة	الطرق والجسور	الطرق والجسور	قيد الإحالة		140					
35	تجهيز مواد احتياطية لمحطات الضخ الكبرى في محافظة كركوك	الحويجة	الماء	قيد الإحالة							
36	تجهيز مضخات ومعدات لمشاريع الماء للمناطق المحررة في كركوك	الحويجة	الماء	قيد الإحالة		139					8,041,109,400

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / كركوك

ت	اسم المشروع	المحافظة	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم المناقصة	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كافة العقد الأصلي
1	رفع الصبات الكونكريتية الجاهزة و المخلفات الحربية على كتف القناة الرئيسية ري كركوك و نقلها الى مطار كركوك	كركوك	الحويجة	مباني حكومية	قيد التنفيذ	41%	10	4	21/7/2019	180	2019-08-05	1,910,400,000
2	اصيانة واكساء طريق الحويجة - العباسي	كركوك	الحويجة	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	41%	10	4	21/7/2019	180	2019-08-05	
3	اكساء شوارع قرى (ابو الجيس - الرشيدية - النعيمية)	كركوك	الحويجة	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	41%	10	4	21/7/2019	180	2019-08-05	
4	صيانة طريق كركوك - تكريت	كركوك	الحويجة	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	41%	10	4	21/7/2019	180	2019-08-05	
5	هدم واعادة بناء مركز شرطة المحاوز - الحويجة	كركوك	الحويجة	الداخلية	قيد التنفيذ	40%	5	8	23/7/2019	150	2019-09-02	461,959,000
6	هدم واعادة بناء مركز شرطة الشعب	كركوك	الحويجة	الداخلية	قيد التنفيذ	40%	5	8	23/7/2019	150	2019-09-02	
7	هدم واعادة بناء قسم مكافحة الاجرام	كركوك	الحويجة	الداخلية	قيد التنفيذ	40%	5	8	23/7/2019	13	2019-09-02	
												2,372,359,000

مشروع محافظة ديالى

Diyala Governorate Projects



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الاجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تجهيز مواد لتاهيل وتحسين وفك اختناق الشبكة الكهربائية لناحية ابي صيدا وقرها	المقدادية	الكهرباء	لم يباشر لوجود تعديل بالعقد		49	13/10/2019			1,709,140,000
2	تجهيز مواد لتاهيل وتحسين وفك اختناق الشبكة الكهربائية في مناطق متفرقة في المقدادية	المقدادية	الكهرباء			49	13/10/2019			
3	صيانة واكساء وتبليط طرق في قرى الخالص (منصورية الشط بطول 5كم , الجيزاني الامام بطول 1,5كم , السنديية بطول 1,4كم , البوبالي بطول 1,5كم)	الخالص	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	45%	2	2019-07-21	210	2019-08-04	881,920,000
4	اكساء شوارع في ناحية ابي صيدا في قضاء المقدادية	المقدادية	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	14%	33	2019-08-22	240	2019-10-02	1,789,146,400
5	اعادة تاهيل تبليط شوارع في حي المعلمين في قضاء المقدادية	المقدادية	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	14%	33	2019-08-22	240	2019-10-02	
6	تاهيل شوارع في قضاء المقدادية (حي التاميم - حي اشور - الحي العصري - حي التحرير)	المقدادية	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	14%	33	2019-08-22	240	2019-10-02	
7	صيانة واكساء طريق اشتوكان وعرجان وتبليط طرق البكالي وسيف سعد في ناحية جبارة وقره تبه	خاتقين	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	60%	38	2019-09-02	210	2019-09-15	1,010,560,000
8	تبليط طرق في ناحية جديدة الشط والقرى التابعة لها وناحية بني سعد والقرى التابعة لها وتبليط طرق في قضاء الخالص وقرها وقضاء بعقوبة وقرها	الخالص	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	9%	47	2019-10-07	210	2019-10-09	1,511,600,000
9	اعادة تاهيل شارع سايدين مع سايدين خدمي لمدخل قرة تبة مع اكساء شوارع متفرقة لاجياء(الصدر - الشرطة - الشهداء - المشروع)	خاتقين	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	4%	61	2019-11-03	240	2019-11-14	1,947,480,000
10	اعادة تاهيل الشارع امام المجلس المحلي والشوارع المحيطة به مع اكمال كافة المتطلبات الخاصة به	خاتقين	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	4%	61	2019-11-03	240	2019-11-14	
11	اعادة تاهيل شوارع في حي (الزهور والزهراء- المصطفى -الرسول والنور)قضاء بعقوبة بلدروز	بعقوبة	البلدية والبلديات	قيد المباشرة		64				1,266,747,000
12	تبليط شوارع في قرية سنسل (عدنان النهيبي) وتبليط افرع الحساوية والحي العسكري وتبليط قرى الوسط وحميس وجرخي اسويد وصيانة طريق الوجيحية	المقدادية	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	40%	32		180	2019-09-01	1,792,062,000
13	تاهيل مستشفى بعقوبة التعليمي	بعقوبة	الصحة	محال						
14	تاهيل مستشفى البتول التعليمي للنسائية والاطفال	بعقوبة	الصحة	محال						
15	هدم واعادة بناء مدرسة الزهراوي 12 صف	خاتقين	التربية والتعليم	محال						
16	هدم واعادة بناء مدرسة الفراهيدي 12 صف	خاتقين	التربية	محال						
17	هدم واعادة بناء مدرسة الحليمة الابتدائية 12 صف	السعدية	التربية والتعليم	محال						
18	صيانة وتاهيل طرق في محافظة ديالى (رعد الفرج طامي , الزاوية , زرکوش عساكره)	المقدادية	الطرق والجسور	قيد التنفيذ	5.5%	56	2019-10-27	180	2019-11-07	1,425,158,000
19	اعادة تاهيل الجزيرة الوسطية طريق بغداد - كركوك في ناحية سد العظيم وتبليط شوارع في الجهة الشرقية والغربية للناحية	الخالص	البلدية والبلديات	محال		52	10/16/2019	120		771,600,800
20	اعادة تاهيل شوارع (الافرازات -شوارع خلف محطة الغاز في الحي العسكري - شوارع حي المعلمين)	المقدادية	البلدية والبلديات	محال						

21	تجهيز مواد لتاهيل وتشبيد خط 33كف دبل سركت اعمدة 14م من محطة بلدروز 33/11كف الى محطة مندلي 11/33ك بطول 45 كم	خاتقين	الكهرباء	محال	102			
22	ايصال الماء الصافي لمنطقة الحد الاخضر/العبارة		الماء والمجاري	قيد الاحالة				
23	مشروع ماء خان العرقة/العظيم	العظيم	الماء والمجاري	قيد الاحالة				
24	تاهيل مشروع ماء خاتقين	خاتقين	الماء والمجاري	قيد الاحالة	194			
25	هدم واعادة بناء مدرسة التجنيد(12 صف)في ناحية جلولا.	جلولاء	التربية والتعليم	قيد الاحالة	180			
26	هدم واعادة بناء مدرسة هاشم بن عتبة في قضاء خاتقين	خاتقين	التربية والتعليم	قيد الاحالة	180			
27	هدم واعادة بناء قسم الاعداد والتدريب للتربية	بعقوبة	التربية والتعليم	قيد الاحالة	179			
28	تاهيل وتطوير طريق بعقوبة من تقاطع القدس الى مجسر الغالية لممرى الذهاب والاياب	بعقوبة	الطرق والجسور	قيد الاحالة	131			
29	تاهيل وتبليط شوارع في بلدروز	بلدروز	الطرق والجسور	قيد الاحالة	176			
30	تاهيل طريق التحويلة من المحطة (صفر+صفر) تقاطع سيطرة ابو نخل المحطة (3+700)	الخالص	الطرق والجسور	قيد الاحالة	178			
31	تاهيل شوارع قرية شيروين/ قضاء الخالص	الخالص	الطرق والجسور	قيد الاحالة	178			
32	تاهيل طرق سراجق العزبان والمحاذي لنهر الخالص والحي العسكري/ المنصورية	الخالص	الطرق والجسور	قيد الاحالة	178			
33	تاهيل طريق الدوريين في ناحية العبارة /قضاء بعقوبة	بعقوبة	الطرق والجسور	قيد الاحالة	177			
34	تاهيل طرق في بهرز(خميس - علي الحمود)	بعقوبة	الطرق والجسور	قيد الاحالة	177			
35	تاهيل طريق المنصوريه مع القنطرة	الخالص	الطرق والجسور	قيد الاحالة				
36	تاهيل طرق الدائنية	الخالص	الطرق والجسور	قيد الاحالة	193			
37	اعادة تاهيل الشارع الرئيسي لحي الضباط في جلولاء	خاتقين	الطرق والجسور	قيد الاحالة	123			
38	اعادة تاهيل الشوارع في حي السلام الثاني في جلولاء	خاتقين	الطرق والجسور	قيد الاحالة	123			
39	اعادة تاهيل الشوارع الاربعة خلف مركز الشباب في جلولاء	خاتقين	الطرق والجسور	قيد الاحالة	123			
40	تاهيل مشروع ماء المنصورية الموحد	الخالص	الماء والمجاري	قيد الاحالة	194			
41	هدم واعادة بناء مركز شرطة جلولاء	السعدية	الداخلية	قيد الاحالة	66			
42	هدم واعادة بناء مركز شرطة المنصورية	الخالص	الداخلية	قيد الاحالة	66			
43	تاهيل مركز صحي الشهيد حسين الشاجي وتحويله من مركز صحي فرعي الى مركز صحي رئيسي	المقدادية	الصحة	قيد الاحالة	214			
44	هدم واعادة مدرسة السهول 12 صف	العظيم	التربية والتعليم	قيد الاحالة				
45	هدم واعادة مدرسة العلوم6 صف	جلولاء	التربية والتعليم	قيد الاحالة	180	0		
46	هدم واعادة مدرسة الفرات6 صف	جلولاء	التربية والتعليم	قيد الاحالة	180			
47	صيانة طريق سليمان بيك - كفري /مقطع محافظة ديالى	خاتقين	الطرق والجسور	قيد الاحالة	147			
48	الخط الناقل قطره (225) ملم لمنطقة جلوة واعفا وخليفة مع مضخة الرفع		الماء والمجاري	قيد الاحالة				
49	اعادة تاهيل المدخل الشمالي لمدينة جلولاء (مرحلة اولى)	السعدية	الطرق والجسور	قيد الاحالة				
50	تاهيل طريق الزركانية سفيط , العودة, الدراويش,) المرحلة الثانية 5 كم / قضاء الخالص	الخالص	البلدية والبلديات	قيد الاحالة	193			
51	تاهيل بناية جنسية بعقوبة	بعقوبة	الداخلية	قيد الاحالة				
52	تجهيز محولات واسلاك واعمدة لقرى ناحية بني سعد	السعدية	الكهرباء	قيد الاحالة				
53	هدم واعادة مدرسة سيوييه 12 صف	العظيم	التربية	قيد الاحالة				
54	تاهيل خط جهد 33 كي في وتحويله الى خط دبل سركت باستخدام اعمدة 14 م من محطة الغربية الى محطة جديدة الشط بطول 22 كم		الكهرباء	قيد الاحالة	24			
المجموع								
7,182,828,400								

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	ايصال الماء الصافي لقرية جبارة	ناحية بهرز	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	98%	6	22/7/2019	120		712,233,600
2	تجهيز ونصب محطة تحلية سعة 3م5 0 ساعة في قرية الشيخ طامي / ناحية بهرز	ناحية بهرز	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	98%	6	22/7/2019	120		
3	صيانة و تأهيل 4 كم من طريق السندية الرابط مع محافظة صلاح الدين	الخالص	طرق وجسور	قيد التنفيذ	60%	18	2019-08-08	180	2019-08-21	1,153,920,000
4	تأهيل مشروع ماء الحويش - جديدة الشط	جديدة الشط	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	51%	11	23/7/2019	200	2019-08-06	1,442,400,000
5	تأهيل وصيانة مجمع ماء عتبة بطاقة نصف مليون غالون - بلدروز	بلدروز	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	51%	11	23/7/2019	200	2019-08-06	
6	تأهيل مشروع ماء ابي صيدا	ابي صيدا	الماء والمجاري	قيد التنفيذ	51%	11	23/7/2019	200	2019-08-06	
7	تجهيز اعمدة كهربائية مع الملحقات لقرى شمال المقدادية	المقدادية	الكهرباء	محال		58	2019-10-31			510,000,000
8	تجهيز محولات جهد 0,4/11 كف سعة 250 KVI عدد 40 لتأهيل شبكة كهرباء احياء المفرق و حي المعلمين و الكاطون	بعقوبة - المقدادية	الكهرباء	محال		58	2019-10-31			
9	اعادة اعمار و تأهيل الشبكة الكهربائية للقرى المتضررة في ناحية العظيم و ناحية دلي عباس و ناحية المنصورية	العظيم - دلي عباس - المنصورية	الكهرباء	محال		65	2019-11-11			1,461,010,000
10	اعادة اعمار و تأهيل الشبكة الكهربائية لحياء (313 و 303) مع تأهيل شبكة انارة الشوارع الرئيسية في التحرير / بعقوبة	بعقوبة	الكهرباء	محال		65	2019-11-11			
11	اعادة تأهيل و تحسين و فك اختناق الشبكة الكهربائية لمناطق ناحية جلولاء قرى (الشموخ ,شيخ بابا ,جميلة,الاصلاح,امين الحبيب ,حي السلام,انارة الشارع بين القصبه القديمة و حي المشروع)	جلولاء	الكهرباء	محال		65	2019-11-11			
12	استبدال الخط الناقل الرئيسي العائد لمشروع ماء ابي صيدا 500ملم دكتايل	المقدادية	الماء والمجاري	محال						
13	صيانة مجمعات ماءسعة نصف مليون غالون /جلبي/ابي صيدا	المقدادية	الماء والمجاري	محال						
14	تأهيل مجمع ماء قرية شيخي سعة مليون غالون	المقدادية	الماء والمجاري	محال						
15	اعادة تأهيل مدرسة صفية في قضاء الخالص	الخالص	التربية والتعليم	معلن						
16	اعادة تأهيل ثانوية سعد الواقعة في قضاء الخالص	الخالص	التربية والتعليم	معلن						
17	اعادة تأهيل ساحة (11) لاعب بمساحة (70*100) م	الخالص	الشباب والرياضة	معلن						
	المجموع									5,279,563,600

محافظة بغداد

صلاح الدين

ديالى

Baghdad Governorate Projects

الانبار



واسط



الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفتي	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تاهيل مغذي 33 كي في (مغذي ماء الكرخ - طارمية قديمة / طارمية جديدة وبنظام الدبل سيركت)	الطارمية	الكهرباء	قيد التنفيذ	96%	5	2019-07-21	120	2019-08-08	1,051,360,000
2	نقل خزان وتنفيذ خط ناقل لمنطقة 9 نيسان / النهروان	النهران	الماء	معن						
3	تصليح وصيانة طريق مرمرة وطريق البوصالح الاحمد بطول 8كم	الطارمية	الطرق والجسور	محال						
4	تاهيل طريق تل طاسة وطريق الثائر الثانية- الطارمية	الطارمية	الطرق والجسور	محال						
5	تاهيل طريق تل طاسة وطريق الثائر الاولي وطريق البوفراس 8كم	الطارمية	الطرق والجسور	محال						
6	تصليح وصيانة طريق شيخ رافع حاتم والطرق المجاورة له بطول 7كم	الطارمية	الطرق والجسور	مؤجل						
7	تصليح واكساء طريق زملة حمدي في قضاء الطارمية بطول 1400م وعرض 6 متر	الطارمية	الطرق والجسور	محال						
8	قلع وتوسيع واكساء طريق مدخل سجن التاجي المركزي من الشارع العام بغداد-موصل الى موقع السجن بطول 6000 متر ويعرض 8 م	التاجي	الطرق والجسور	محال						
9	قلع وتبليط طريق محطة الكهرباء الغازية ابتداءا من طريق بغداد - الموصل الى منطقة السدة التابعة الى قضاء التاجي بطول 5000 متر وعرض 6 متر	التاجي	الطرق والجسور	محال						
10	تصليح وتبليط واكساء طريق اللين من سكة القطار الى سيطرة ام نجم ضمن مقاطعة 12 ضبايعي التابعة الى مديرية ناحية التاجي الجديد بطول 10000متر وعرض 6 متر	التاجي	الطرق والجسور	محال						
11	قلع واعادة تبليط مع انبوب تصريف مياه الامطار لشوارع هور الباشا	التاجي	الطرق والجسور	محال						
12	تصليح واكساء طريق هور الباشا من شارع بغداد- موصل الى منطقة الشيخ عامر/قضاء التاجي	التاجي	الطرق والجسور	محال						
13	هدم واعادة بناء مدرسة البواسل 9 صف في قضاء الطارمية	الطارمية	التربية	محال						
14	تأهيل واكساء طريق قرية الضحي	الطارمية	الطرق والجسور	معن						
15	صيانة واكساء الشوارع الممتد من حي بانوراما الى شارع البنية بطول 23000 م وعرض 7	المدائن	الطرق والجسور	محال						
16	تأهيل مركز صحي الخناسا	المدائن	الصحة	محال						
17	هدم واعادة بناء مدرسة الرواشد	المحمودية	التربية	محال						
18	هدم واعادة بناء مدرسة عباس بن فرناس	المحمودية	التربية	محال						
19	هدم واعادة بناء مدرسة المنامة	المحمودية	التربية	محال						
20	هدم واعادة بناء مدرسة الايثار الابتدائية 12 صف	الطارمية	التربية	تدقيق التخطيط						

						الطرق والجسور	اللطفية	اعمال الصيانة والاكساء لطرق شاخنة (1,2,3) / ناحية اللطفية	21
						الكهرباء	المدائن	اعادة تأهيل شبكات كهرباء في قضاء المدائن والقرى والنواحي	22
						الطرق والجسور	النهروان	تأهيل طريق القرية الهولندية وطريق فيصل مريخ	23
						التربية	اللطفية	هدم واعادة بناء مدرسة العراق الجديد 12 صف	24
						الكهرباء	أبو غريب	مشروع تأهيل انارة ابو غريب القديم	25
						الماء والمجاري	الطارمية	تاهيل وتوسعة مجمع 200 م3 ساعة (مجمع القدس 2) / المشاهدة	26
						الماء والمجاري	الطارمية	تجهيز ونصب وتشغيل مجمع قرية (سعة 200 م3/س) ابار اليساري	27
						الكهرباء	الطارمية	تأهيل مغذيات (4مشاهدة والسوايلة) 11 كي في	28
						البلدية والبلديات	الطارمية	صيانة وتطوير الشارع الرئيسي لمدينة الطارمية بطول 3كم	29
						البلدية والبلديات	الطارمية	اعادة تأهيل وتبليط الطريق الرابط بين طريق بغداد -موصل وطريق السدة الشيخ حمد والقرى المجاورة لها بطول (12000) م وبعرض 5م مقاطعة 1/2 ابو سريول ضمن قضاء الطارمية	30
						البلدية والبلديات	التاجي	تاهيل وتوسيع مدخل هور الباشا ومدرسة التطور مرورا بجامع المعز الى جسر الشيخ عامر	31
						البلدية والبلديات	الطارمية	تبليط طريق البعجور+قرية عبد احمد النمر مع القرى والدور المجاورة لها بطول 10 متر وعرض 4م	32
						البلدية والبلديات	الطارمية	تاهيل مجموعة طرق في قرى (مشرف حسين - وقرية جاسم محمد خلف وقرية لطيف الحسن رمضان وطريق 32 الاروانية	33
						البلدية والبلديات	الطارمية	ترميم الاجزاء المتضررة لبنائية قائمقامية قضاء الطارمية	34
						البلدية والبلديات	الطارمية	تبليط طريق قرية دحام البرع مع القرى المجاورة + طريق ابو شعبان 10 كم	35
						الكهرباء	الطارمية	تاهيل الاحياء السكنية (شبكة الكهرباء) للاحياء الحكم المحلي -الضباط وحي التربية	36
						المباني	الطارمية	اعادة تأهيل مكتبة الطارمية	37
						البلدية والبلديات	الطارمية	تاهيل وتبليط الطريق الرابط بين بغداد - الموصل وطريق الاسحافي بطول 1500م وعرض 6م مقاطعة 2/ ابو سريول في مركز قضاء الطارمية	38
						الماء والمجاري	الطارمية	تاهيل جزء من الانبواب الناقل للماء الى مركز قضاء الطارمية قطر (500ملم وبتول 1500م.ط	39
								المجموع	
									1,051,360,000

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تبليط شوارع قرية المهجرين الثانية /النهروان	النهروان	الطرق والجسور	منجز	100%	19	8/8/2019	90	2019-09-22	1,215,600,000
2	تبليط شوارع قرية المهجرين الاولى /النهروان	النهروان	الطرق والجسور	منجز	100%	19	8/8/2019	90	2019-09-22	
3	تبليط طرق قرية الزيتية /النهروان	النهروان	الطرق والجسور	منجز	100%	19	8/8/2019	90	2019-09-22	
4	تاهيل مجمع ماء صالح الاحمد 3م50/ساعة	النهروان	الماء والمجاري	محال						
5	تاهيل مجمع ماء المشاهدة 3م200/ساعة	المشاهدة	الماء والمجاري	محال						
6	صيانة مجمعات ماء النهروان ومشروع التوسعة ومحطة الخام	النهروان	الماء والمجاري	محال						
7	تاهيل جسر السيارات المتضرر لناظم قاطع (8) كم وناظم صدر ابو غريب	ابو غريب	الموارد المائية	قيد التنفيذ	16%	42	2019-09-16	180	2019-10-28	284,972,000
8	تصليح الاضرار و مد شبكة امطار و صرف صحي في قرية الحرية	النهروان	الطرق والجسور	محال		60	2019-10-31			1,056,200,000
9	تبليط شوارع قرية الامام الرضا (ع)	النهروان	الطرق والجسور	محال		60	2019-10-31			
10	تبليط طرق حي الصدرين خلف القرية النفطية و المفروشة بالسبب عن طريق محافظة بغداد بطول (2500م) و بعرض (5م)	النهروان	الطرق والجسور	محال		60	2019-10-31			
11	مشروع مد انبوب ناقل للماء الصالح للشرب في منطقة شاطيء التاجي و بطول (40000م) و قطر (8 انج) في ناحية الحماميات	التاجي/ الحماميات	الماء والمجاري							
12	تاهيل مركز صحي النصر و السلام	ابو غريب	الصحة	محال						
13	تاهيل بناية الجوازات	ابو غريب	الداخلية							
14	توسيع و تاهيل مركز صحي عكركوف	ابو غريب	الصحة							
15	توسيع و تاهيل مركز صحي الزيتون	ابو غريب	الصحة							
16	اعادة تاهيل مدرسة ابن الارقم الابتدائية	ابو غريب	التربية والتعليم	محال		68	2019-11-14			
17	اعادة تاهيل مدرسة اعياد الربيع	ابو غريب	التربية والتعليم	محال		68	2019-11-14			
18	اعادة تاهيل مدرسة الحضارة للبنات	ابو غريب	التربية والتعليم	محال		68	2019-11-14			
19	اعادة تاهيل مدرسة نور العلم	ابو غريب	التربية والتعليم	محال		68	2019-11-14			
20	اعادة تاهيل مدرسة القبة الزرقاء الابتدائية	ابو غريب	التربية والتعليم	محال		68	2019-11-14			
21	اعادة تاهيل ثانوية ابي غريب للبنات	ابو غريب	التربية والتعليم	محال		68	2019-11-14			
22	اعادة تاهيل مدرسة المنامة الابتدائية	ابو غريب	التربية والتعليم	محال		68	2019-11-14			
23	تاهيل سوق ابي غريب	ابو غريب	البلدية والبلديات	تنفيذ امانة /لم تتم المباشرة بسبب مشاكل فنية						
24	تبليط طريق قرية العفو	ابو غريب	البلدية والبلديات	قيد التنفيذ	90%					250,000,000
25	إضافة وحدة الارشفة في مقر الصندوق		مباني حكومية	منجز	100%					250,000,000
	المجموع									3,056,772,000



الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام 2019 / بابل

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم المناقصة	رقم العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة الفعلي	تاريخ الإنجاز الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تاهيل طريق المسيب - الصويرة	جرف النصر	الطرق والجسور	منجز	100%	تنفيذ امانة	تنفيذ امانة	75	2019-08-27	2019-11-10	197,190,000
	المجموع										197,190,000

مشاريع المنح والقروض التي يعمل الصندوق كمشرف ومنسق لها

ملخص تخصيصات المنح والقروض

غير ملتزم	المصرف	الملتزم به	التخصيص	القروض	المخطط	المصرف	الملتزم به	التخصيص	المنح
\$82,425,324.27	\$217,738,486.92	\$267,574,675.73	\$350,000,000	قرض البنك الدولي- مشروع التنمية الطارئ EODP-	\$100,000,000	0	0	\$100,000,000	المنحة الكويتية
\$377,282,415.36	\$6,417,400.71	\$22,717,584.64	\$400,000,000	قرض البنك الدولي- التنمية الطارئ الاضافي EODP/AF		\$9,000,000		\$9,000,000	المنحة الصينية
EUR 417,640,791	EUR 13,299,315	EUR 44,594,141	EUR 500,000,000	قرض الالمانى - البرنامج العاجل M URE 135 -	10000000 Corona أي مايعادل \$458,000	0	0	10000000 Corona أي مايعادل \$458,000	المنحة الجيكية
	EUR 6,676,074	EUR 37,765,068		قرض الالمانى - المرحلة الثانية M URE 365 -					



مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي EODP

قرض البنك الدولي - \$350 EODP (عدد المشاريع 140 مشروع)

المحافظة	القطاع	التخصيص(م. دولار)	المخطط	المصرف (م. دولار)	المصرف %	الملتزم (م. دولار)	الملتزم %	غير ملتزم	ملاحظات
نينوى (6) , الانبار (10), صلاح الدين (15), ديالى (11)	الكهرباء (42 مشروع منها 3 استشاري) المشاريع المنجزة (36) مشروع	\$70,000,000	\$70,000,000	\$67,078,202.87	95.8%	\$69,025,221	99%		
الانبار(8) , صلاح الدين(31) , ديالى(22)	البلدية و البلديات (61 مشروع) // عدد المشاريع المنجزة 48 مشروع	\$62,000,000	\$62,000,000	\$45,509,443.73	73%	\$61,335,543.71	99%		
نينوى (3 جسور), الانبار (9 جسور) , صلاح الدين (5 جسور & 5 طرق) , ديالى(6 طرق & 6 جسور), حزام بغداد (1 جسور)	الطرق و الجسور (33 مشروع) // عدد المشاريع المنجزة 29 مشروع	\$137,000,000	\$137,000,000	\$101,894,393.27	74%	\$115,987,158.68	85%		
صلاح الدين (13 سيارة اسعاف & 5 عيادات متنقلة) + ديالى (26 سيارة اسعاف & 9 عيادات متنقلة)	الصحة (4 مشاريع) عدد سيارات الاسعافات 39 و 14 عيادات متنقلة // منجزة	\$28,000,000	\$28,000,000	\$336,984.62	51%	15,031,353.67	54%		
ديالى + صلاح الدين	المباني (مراكز صحية + عيادات)	\$12,100,000	\$12,100,000						
عدة محافظات	موارد مائية (تعديل القرض)- قيد التحضير - تم ادراج 8 مشاريع من ضمن 18 مشروع المجموع الجزئي	30,000,000	30,000,000	-	0%	-	0%		
	صندوق اعادة الاعمار	\$341,000,000	\$327,000,000	\$223,965,036	90%	\$248,592,091.56	76%		
	رسوم	\$9,200,000	\$9,200,000	\$3,448,048.3	37%	6,205,848.31	67%		
		\$875,000		\$875,000.00		-			
	المجموع الكلي	350,200,000	336,200,000	230,377,576	92%	251,374,595	75%		

قرض البنك الدولي- الاضافي \$ 400 (عدد المشاريع 114 مشروع)

ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم	المصرف	المصرف	المخطط	التخصيص(م. دولار)	القطاع	المحافظة
			(م. دولار)	%	(م. دولار)				
	\$49,991,548	2%	8,452	0%	0	\$50,000,000	\$50,000,000	الكهرباء (17)	صلاح الدين, نينوى, الانبار, كركوك
	\$47,486,904	3%	13,096	0%	0	\$47,500,000	\$47,500,000	البلدية و البلديات (13)	صلاح الدين, نينوى, الانبار, كركوك, ديالى
	\$101,625,957.56	8.68%	\$96.,9,639,647	1.23%	\$1,369,765.48	\$111,000,000	\$111,000,000	الطرق و الجسور (8)	نينوى, الانبار, كركوك
	\$31,973,997	8%	26,003	0%	0	\$32,000,000	\$32,000,000	الزراعة (9)	صلاح الدين, نينوى, الانبار, ديالى
		0%	0	0%	0	\$35,000,000	\$35,000,000	التربية والتعليم (26)	صلاح الدين, نينوى, الانبار, ديالى, كركوك
		3%	\$8,767,000	0%	\$8,705,000	\$32,000,000	\$32,000,000	موارد مائية (10)	صلاح الدين, نينوى, الانبار
		0%	0	0%	0	\$354,000,000	\$354,000,000	المجموع الجزئي	
		0%	0	0%	0	\$1,000,000	\$1,000,000	رسوم	
		0%	0	0%	0	\$30,000,000	\$30,000,000	احتياط	
		0%	0	0%	0	\$385,000,000	\$385,000,000	المجموع الكلي	

القرض الألماني - البرنامج العاجل 135 مليون يورو

ملاحظات	نسبة الملتزم من التخصيص %	نسبة المصروف من الملتزم %	المصروف (يورو)	الملتزم به (يورو)	التخصيص (يورو)	القطاع	المحافظة
	99%	30%	EUR 13,299,315	EUR 44,594,141	EUR 45,000,000	الكهرباء (2)	نينوى
	0%	0%	0	0	EUR 45,000,000	الماء والصرف الصحي عدد(8)	
	0%	0%	0	0	EUR 45,000,000	الطرق و الجسور عدد(5)	
	33%	30%	13,299,315.00	EUR 44,594,141	EUR 135,000,000	المجموع الكلي	

القرض الألماني - البرنامج العاجل المرحلة الثانية / لقطاع الكهرباء - 180 مليون يورو

ملاحظات	نسبة الملتزم من التخصيص %	نسبة المصروف من الملتزم %	المصروف (م. يورو)	الملتزم به	التخصيص (م. يورو)	القطاع	المحافظة
	21%	18%	EUR 6,676,074	EUR 37,765,068	EUR 180,000,000	الكهرباء	نينوى(1), صلاح الدين(3) , الانبار(3)
	21%	18%	EUR 6,676,074	EUR 37,765,068	EUR 180,000,000	المجموع الكلي	

القرض الألماني / قطاع الصحة - 185 مليون يورو

ملاحظات	نسبة الملتزم من التخصيص %	نسبة المصروف من الملتزم %	المصروف (م. يورو)	الملتزم به	التخصيص (م. يورو)	القطاع	المحافظة
	0%	0%	0	0	185,000,000	الصحة	بغداد , صلاح الدين , الانبار , نينوى
	0%	0%	0	0	185,000,000	المجموع الكلي	

المنحة الكويتية - المرحلة الاولى 15 مليون دولار

ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (م. دولار)	المصرف %	المصرف (م. دولار)	المخطط	التخصيص (م. دولار)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0	\$ 6,021,418.00	\$ 6,021,418.00	الصحة	الانبار (8)
		0%	0	0%	0	\$ 1,238,817.00	\$ 1,238,817.00		ديالى (1)
		0%	0	0%	0	\$ 2,696,863.00	\$ 2,696,863.00		صلاح الدين (5)
		0%	0	0%	0	\$ 3,024,093.00	\$ 3,024,093.00		نينوى (4)
		0%	0	0%	0	\$ 415,638.00	\$ 415,638.00		شمال بابل (1)
		0%	0	0%	0	\$ 13,396,829.00	\$ 13,396,829.00		المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00		رسوم
		0%	0	0%	0	\$ 440,000.00	\$ 440,000.00		احتياط
		0%	0	0%	0	\$ 14,396,829.00	\$ 14,396,829.00		المجموع الكلي

المنحة الكويتية - المرحلة الثانية 85 مليون دولار

ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (م. دولار)	المصرف %	المصرف (م. دولار)	المخطط	التخصيص (م. دولار)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0	\$ 28,153,489.00	\$ 28,153,489.00	الصحة	الانبار (6)
		0%	0	0%	0	\$ 7,162,400.00	\$ 7,162,400.00		ديالى (5)
		0%	0	0%	0	\$ 8,146,164.00	\$ 8,146,164.00		صلاح الدين (11)
		0%	0	0%	0	\$ 29,193,225.00	\$ 29,193,225.00		نينوى (2)
		0%	0	0%	0	\$ 2,868,384.00	\$ 2,868,384.00		كركوك (7)
		0%	0	0%	0	\$ 476,338.00	\$ 476,338.00		شمال بابل (1)
		0%	0	0%	0	\$ 76,000,000.00	\$ 76,000,000.00		المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0	5,000,000	5,000,000		رسوم
		0%	0	0%	0	4,000,000	4,000,000		احتياط
		0%	153 0	0%	0	\$ 85,000,000.00	\$ 85,000,000.00		المجموع الكلي

مشاريع المنحة الصينية عدد الاليات 118 بمبلغ ستون يوان صيني او \$ 9,000,000

قطاع البلديات

عدد المستفيدين	مشاريع قيد الانجاز	مشاريع المنجزة	عدد المشاريع الكلية	القطاع	المحافظة
		36	36	تجهيز اليات	نينوى
		36	36	تجهيز اليات	الانبار
		18	18	تجهيز اليات	صلاح الدين
		11	11	تجهيز اليات	ديالى
		9	9	تجهيز اليات	كركوك
		7	7	تجهيز اليات	بغداد
		1	1	تجهيز اليات	بابل
		118	118		المجموع

قرض البنك التنمىة الاسلامى 250 مليون دولار تم تخصيص 119 مليون للقطاعات التالية:

ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (م. دولار)	المصرف %	المصرف (م. دولار)	المخطط	التخصيص (م. دولار)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0	26	26	صحة	الانبار و صلاح الدين - 2019
		0%	0	0%	0	21	21	مياه	الانبار - 2019
		0%	0	0%	0	17	17	تعليم تقنى	كركوك - 2019
		0%	0	0%	0	18	18	زراعة	صلاح الدين و الانبار - 2020
		0%	0	0%	0	18.5	18.5	تعليم على	نينوى و الانبار - 2020
		0%	0	0%	0	17	17	تعليم على	صلاح الدين - 2021
		0%	0	0%	0	16.5	16.5	طرق	بابل - 2021
		0%	0	0%	0				المجموع الجزئى
		0%	0	0%	0				رسوم
		0%	0	0%	0				احتياط
		0%	0	0%	0				المجموع الكلى

المنحة الجىكىة - 458 الف دولار

ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (دولار)	المصرف %	المصرف (دولار)	المخطط	التخصيص (دولار)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0	277,800	277,800	الصحة (4)	نينوى (قضاء الحمدانىة)
		0%	0	0%	0	180,200	180,200	الكهرباء (6)	نينوى (قضاء الحمدانىة)
		0%	0	0%	0	458,000	458,000		المجموع الجزئى
		0%	0	0%	0				الاحتياط
		0%	0	0%	0	458,000	458,000		المجموع الكلى

منحة البنك الاسلامي للتنمية 5 مليون دولار

ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (دولار)	المصرف %	المصرف (دولار)	المخطط	التخصيص (دولار)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0	1.2	1.2	مياه - 2019	صلاح الدين (1)
		0%	0	0%	0	1.2	1.2	صرف صحي - 2020	الانبار (1)
		0%	0	0%	0	2.5	2.5	مياه - 2021	بغداد (1)
		0%	0	0%	0	4.9	4.9		المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0	0.1	0.1		احتياط
		0%	0	0%	0	5	5		المجموع الكلي

منحة الهند 494 الف دولار

ملاحظات	غير ملزم	الملتزم %	الملتزم (دولار)	المصرف %	المصرف (دولار)	المخطط	التخصيص (دولار)	القطاع	المحافظة
		0%	0	0%	0			ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات	نينوى / سنجار
		0%	0	0%	0			ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات	نينوى / سنجار
		0%	0	0%	0			ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات	نينوى / سنجار
		0%	0	0%	0				المجموع الجزئي
		0%	0	0%	0				احتياط
		0%	0	0%	0				المجموع الكلي

اليات المنحة الصينية





جسر عمر بن عبد العزيز / الرمادي / الأنبار





إعادة تأهيل جسر شيشين | صلاح الدين



تجهيز محطات متنقلة للمحافظات



تجهيز اليات تخصصية للمحافظات المحررة



42.5 كم شارع نفط خانة - مندلي



إعادة تأهيل جسر القاسم ومقاربه



حل مؤقت لجسر الموصل الرابع

תודה
Dankie Gracias
Спасибо شكراً
Merci Takk
Köszönjük Terima kasih
Grazie Dziękujemy Děkojame
Ďakujeme Vielen Dank Paldies
Kiitos Tänname teid 谢谢
Thank You Tak
感謝您 Obrigado Teşekkür Ederiz
Σας ευχαριστούμε 감사합니다
ขอบคุณ
Bedankt Děkujeme vám
ありがとうございます
Tack
