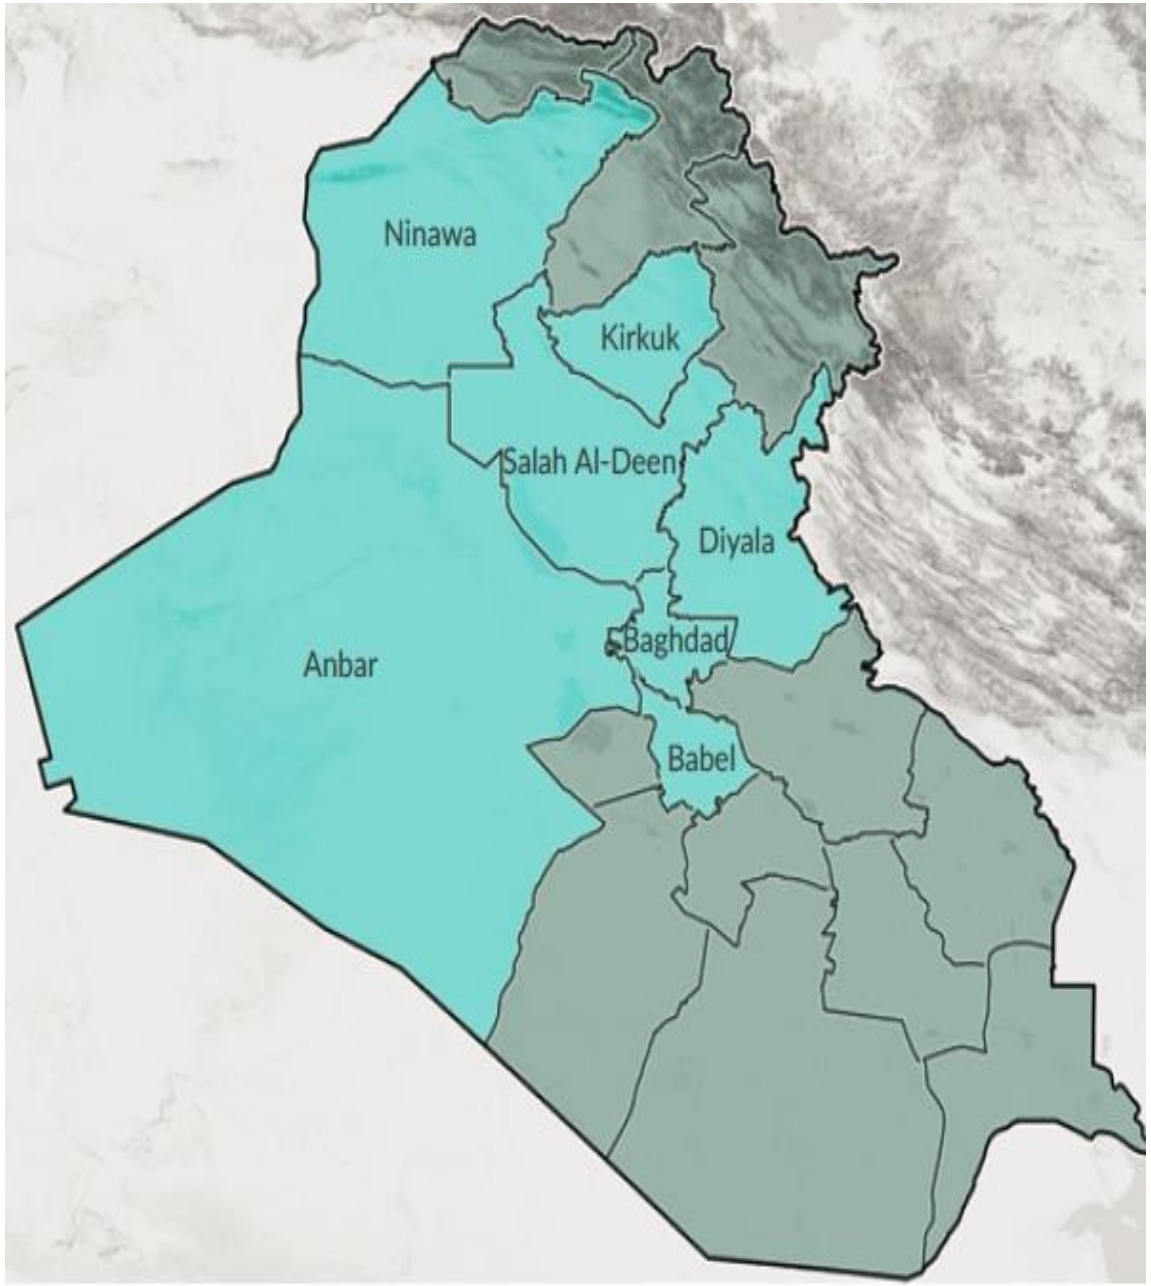

صندوق
اعادة اعمار المناطق المتضررة

التقرير الفني لمشاريع صندوق إعادة الاعمار منذ تأسيسه و لغاية ٢٠١٩/٤/٣٠

الجزء (الثامن عشر)
نيسان ٢٠١٩

المقدمة

- تأسس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وفق المادة (٢٨) من قانون الموازنة الفدرالية العامة لعام ٢٠١٥. اعقبه صدور نظام الصندوق رقم (٢) لسنة ٢٠١٥، وقد نشر في جريدة الوقائع العر اقية بعددها (٤٣٥٢) في ١٦/٢/٢٠١٥ وقد جاء فيها (يؤسس صندوق إعادة اعمار المناطق التي دمرها الإرهاب ويمول من المنح والمساعدات الدولية، ويخصص له مبلغ من الموازنة الاتحادية).
- وفي عام ٢٠١٧ تم تعديل بعض فقرات النظام وحددت الهيكلية الإدارية وصدر النظام رقم (٣) في جريدة الوقائع العر اقية بعددها (٤٤٤١).
- وقد حددت مناطق عمل الصندوق في المدن التي دمرها الإرهاب في كل من الانبار، ديالى، صلاح الدين، نينوى، شمال بابل، حزام بغداد (أبو غريب) وبعض المناطق الجنوبية من كركوك.
- هذا الكراس وهو تقريرا فنيا والذي يصدر كل شهر لمشاريع التي ينفذها الصندوق من الموازنة الفدرالية بشقيها الاستثماري والبرامج الخاصة، ويتم التوثيق بإحداثيات الـ (GPS) إضافة الى صور ومراحل الإنجاز بصورة دقيقة، كما ويحتوي هذا الكراس على المشاريع التي تنفذها الوزارات القطاعية كجزء من واجبات الصندوق في التدقيق المالي والفني التي يشرف عليها مدققون عالميون معينين من قبل الصندوق من خلال البنك الدولي والبنك الألماني.
- نأمل ان ترسم هذه السلسلة الشهرية من الكراسات خارطة إعادة الاعمار المرتقبة.
- والله ولي التوفيق.

هدف انشاء الصندوق:-

١- إعادة اعماروتأهيل المناطق التي دمرها الإرهاب وإزالة آثارها.

٢- معالجة الاضرار الحاصلة في البنى التحتية.

٣- تعويض الفرص التنموية.

آلية عمل الصندوق:

يعمل الصندوق كمنسق ومراقب على تنفيذ القروض التي تقدم للعراق مثل قرض البنك الدولي وقرض بنك التنمية الألماني والتي تنفذ من قبل الوزارات القطاعية او من خلال المنح (المنحة الكويتية للقطاع الصحي والمنحة الصينية لأليات البلديات والمنحة التشيكيه).

كما ويعمل الصندوق كمنفذ للمشاريع التي تقدم له من المحافظات المتضررة من خلال المبالغ المرصودة من الموازنة الاتحادية

مهام صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وفق نظام رقم (٣) لسنة ٢٠١٧

- حسب المادة اولا من نظام صندوق إعادة الاعمار يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بشخصية معنوية وذات استقلال مالي و اداري.

وفق المادة (٥) يمارس الصندوق المهام الاتية:-

- التنسيق مع الجهات المعنية لوضع أولويات المشاريع في المحافظات المتضررة.
- السعي الى جلب المنح و الهبات و المساعدات و القروض.
- القيام بإجراءات التعاقد و متابعة تنفيذ المشاريع.
- متابعة تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار الممولة من المنح و القروض.
- تقديم الخطط اللازمة لإعادة الاعماروضع السياسات اللازمة لتحقيق اهداف الدولة.
- تنظيم ورعاية المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية المتعلقة بإعادة الاعمار وذلك سعيا لجلب المنح والهبات والمساعدات.

صندوق إعادة الاعمار

- الرؤيا:

بناء الثقة بين العر اقيين والدولة من جهة وبين العراق والمجتمع الدولي من جهة أخرى.

- الرسالة:

إعادة بناء الانسان والجدران وادامة العجلة الاقتصادية في المدن المتضررة من العمليات الإرهابية.

وتتم من خلال الابعاد التالية:-

١- البعد الاجتماعي:

تجديد العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين على المصداقية والثقة في جهود إعادة الاعمار.

٢- البعد الاقتصادي:

ادامة العجلة الاقتصادية في المناطق المتضررة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة

٣- البعد الفيزيائي وإعادة الخدمات:

إعادة اعمار المنشآت العامة و الخاصة والمتضررة من العمليات الارهابية

القسم الأول

ملخص مشاريع الصندوق على الموازنة الفدرالية

عدد المشاريع المخطط لها والمنفذة والمنجزة والمستمرة للأعوام ٢٠١٦ ، ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ للموازنة الفيدراليـــة

السنة	المبلغ المخصص / مليار دينار	عدد المشاريع المخطط لها	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المستمرة	نسبة المشاريع المنجزة من المتعاقد عليها
2016	155	150	150	150	—	100%
2017	150	163	159	154	5	97%
2018	150	198	198	60	138	30%
المجموع	455	511	507	364	143	72%

ملاحظة : المجموع الكلي لمشاريع صندوق إعادة الاعمار لمراحل (الادراج ، التعاقد ، التنفيذ) = 1023 مشروع
مجموع المشاريع المنجزة (لجميع مصادر التمويل) = 580 مشروع

جدول يمثل مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات من ٢٠١٦ - ٢٠١٨

المحافظات	القطاعـــــــــات																						المجموع	
نوع التمويل	البلدية و البلديات		التجارة		التربية		التعليم العالي		الداخلية		الزراعة		الصحة		الطرق والجسور		الكهرباء		الماء والمجاري		الموارد المائية		دوائر حكومية	
	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز
الانبار	7	7	1	0	35	28	24	23	9	4	0	0	9	6	8	4	14	12	96	83	9	9	4	4	216	180
شمال بابل	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	17	17	0	0	0	0	21	19
حزام بغداد	3	3	0	0	10	8	0	0	2	2	0	0	1	1	2	2	10	9	5	4	1	1	3	3	37	33
ديالى	3	2	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	1	1	30	23	4	3	7	6	0	0	0	0	54	38
صلاح الدين	13	9	0	0	12	6	2	2	10	6	0	0	0	1	3	0	3	2	5	5	0	0	0	0	49	30
كركوك	4	2	2	0	8	2	1	0	6	2	0	0	0	0	6	3	4	3	10	8	0	0	1	0	42	20
نينوى	15	15	3	1	19	7	17	9	7	4	1	0	6	2	4	0	9	4	6	2	0	0	5	0	92	44
الإجمالي الكلي	45	38	6	1	93	54	44	34	34	18	1	0	18	10	56	34	45	33	146	125	10	10	13	7	511	364

القسم الثاني

مشاريع المنح والقروض التي يعمل الصندوق كمشرف ومنسق لها

عدد المشاريع المخطط لها والمنفذة والمنجزة والمستمرة

نوع التمويل	المبلغ المخصص / دولار	عدد المشاريع المخطط لها	عدد المشاريع المتعاقد عليها	عدد المشاريع المنجزة	عدد المشاريع المستمرة	نسبة المشاريع المنجزة
قرض البنك الدولي الطارئ- EODP	$350,000,000	137	137	98	37	74.60%
قرض البنك الدولي الطارئ-الإضافي EODP	$400,000,000	~140	-	-	-	-
القرض الألماني - GFCI	$550,000,000	~46	9	-	-	-
المنحة التشيكية	$458,000,00	10	-			
المنحة الصينية (١١٨) آلية	$9,000,000	118	118	118	0	100%
المنحة الكويتية	$100,000,000	51	-	-	-	-

ملخص بأعداد مشاريع المنح والقرض - التي يعمل الصندوق الأعمار كمشرف ومنسق لها / حسب المحافظات والقطاعات

المحافظة	القطاعات																						المجموع	
	البلديات		التجارة		التربية		التعليم العالي		الداخلية		الزراعة		الصحة		الطرق والجسور		الكهرباء		الماء		الموارد المائية		المباني الحكومية		الشباب والرياضة			
	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	المخطط	المنجز	مجموع المخطط	مجموع المنجز
الأنبار	60	43	0	0	5	0	1	0	0	0	3	0	15	0	12	5	20	9	1	0	4	0	0	0	0	0	121	57
شمال بابل	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4
حزام بغداد	7	7	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	8
ديالى	38	25	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	8	0	12	9	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	73	45
صلاح الدين	49	29	0	0	3	0	1	0	0	0	2	0	20	0	11	6	24	16	1	0	6	0	0	0	1	0	118	51
كركوك	18	9	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	7	0	1	0	7	0	0	0	3	0	0	0	0	0	39	9
نينوى	75	36	0	0	9	0	1	0	0	0	2	0	10	0	13	3	29	3	0	0	1	0	0	0	0	0	140	42
المجموع	251	153	0	0	26	0	4	0	0	0	8	0	62	0	52	24	91	39	3	0	14	0	0	0	1	0	512	216
ملاحظة :- حقول المشاريع المنجزة تشمل (البنك الدولي المرحلة الاولى + المنحة الصينة)																												

جدول يمثل اعداد مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات لعام ٢٠١٦ / منجزة

المحافظات	القطاعات										الإجمالي الكلي
المحافظات	البلديات	التجارة	التربية	التعليم العالي	الداخلية	الصحة	القضاء	الكهرباء	الماء	المحافظة	الموارد المائية	
الانبار	1			18	3	5	1	1	78	2	4	113
بابل									13			13
بغداد								6				6
صلاح الدين					4							4
كركوك					2				1			3
نينوى	2	1	2			2		2	2			11
عقود محولات وقابلوات لجميع المحافظات								2				2
الإجمالي الكلي	3	1	2	18	9	7	1	11	94	2	4	152

جدول يمثل توزيع مبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية على المحافظات والقطاعات لعام ٢٠١٦ / منجزة

المحافظات	القطاعات										الإجمالي الكلي
	البلديات	التجارة	التربية	التعليم العالي	الداخلية	الصحة	القضاء	الكهرباء	الماء	المحافظة	الموارد المائية	
الانبار	67,000,000			1,621,700,490	169,248,000	499,601,000	79,550,000	93,306,000	6,248,522,000	199,349,990	328,310,000	9,306,587,480
بابل									1,083,000,000			1,083,000,000
بغداد								599,591,000				599,591,000
صلاح الدين					263,340,000							263,340,000
كركوك					190,023,500				95,000,000			285,023,500
نينوى	194,750,000	98,000,000	63,142,750			27,000,000		39,078,500	121,000,000			542,971,250
عقود محولات وقابلوات لجميع المحافظات								7,703,490,000				7,703,490,000
الإجمالي الكلي	261,750,000	98,000,000	63,142,750	1,621,700,490	622,611,500	526,601,000	79,550,000	8,435,465,500	7,547,522,000	199,349,990	328,310,000	19,784,003,230

جدول يمثل اعداد مشاريع الصندوق على الموازنة الفدرالية حسب المحافظات و القطاعات ونوع التمويل لعام ٢٠١٧

المحافظة	قطاع البلديات		قطاع التربية		قطاع التعليم العالي		قطاع الداخلية		قطاع الكهرباء		قطاع الماء		قطاع الطرق والجسور		قطاع الموارد مائية		دوائر حكومية		المجموع	
نوع التمويل	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز
نينوى	12	12	4	4	12	9	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	33	30
استثماري	11	11	4	4															15	15
تشغيلي	1	1			12	9	4	4	1	1									18	15
كركوك	2	2	2	2	0	0	0	0	3	3	3	3	1	1	0	0	0	0	11	11
استثماري			2	2															2	2
تشغيلي	2	2							3	3	3	3	1	1					9	9
صلاح الدين	10	9	6	6	2	2	2	2	2	2	5	5	0	0	0	0	0	0	27	26
استثماري	1	1	6	6	2	2			1	1									10	10
تشغيلي	9	8					2	2	1	1	5	5							17	16
ديالى	1	1	2	3	0	0	0	0	1	1	3	3	12	12	0	0	0	0	20	19
استثماري			2	3					1	1			12	12					16	15
تشغيلي	1	1									3	3							4	4
بابل	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	2	2	0	0	0	0	7	6
استثماري										1									1	0
تشغيلي											4	4	2	2					6	6
الانبار	6	6	28	28	3	3	1	1	2	3	2	2	3	3	3	5	1	1	52	49
استثماري			28	28									1	1		2			31	29
تشغيلي	6	6			3	3	1	1	2	3	2	2	2	2	3	3	1	1	21	20
بغداد	0	0	7	7	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13	13
استثماري			7	7											1	1			8	8
تشغيلي									2	2	1	1	1	1			1	1	5	5
المجموع الكلي	62	60	93	91	34	28	14	14	24	20	35	35	37	37	7	11	3	3	163	154

جدول يمثل توزيع مبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفدرالية على المحافظات و القطاعات لعام ٢٠١٧

المحافظة	قطاع البلديات	قطاع التربية	قطاع التعليم عالي	قطاع الداخلية	قطاع الكهرباء	قطاع الماء	قطاع الطرق والجسور	قطاع الموارد مائية	دوائر حكومية	المجموع
نينوى	3,027,957,500	2,885,667,900	9,418,039,550	519,926,500	731,600,000					16,583,191,450
كركوك	189,340,000	616,582,000			1,842,734,000	196,481,000	63,200,000			2,908,337,000
صلاح الدين	3,719,163,000	3,491,996,900	1,214,602,000	779,982,000	1,628,400,000	1,713,600,000				12,547,743,900
ديالى	106,750,000	2,025,821,600			111,220,000	385,400,000	4,196,530,750			6,825,722,350
بابل					819,788,000	298,620,000	845,664,520			1,964,072,520
الانبار	5,023,041,125	21,853,665,597	621812300	1052385000	3,614,782,980	136,800,000	2,507,415,000	15612422000	99750000	50,522,074,002
بغداد		4,126,705,160			694,443,370	284,350,000	88,225,000	899,346,750	100,000,000	6,193,070,280
المجموع	12,066,251,625	35,000,439,157	11,254,453,850	2,352,293,500	9,442,968,350	3,015,251,000	7,701,035,270	16,511,768,750	199,750,000	97,544,211,502

جدول يمثل مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية حسب المحافظات والقطاعات لعام ٢٠١٨

المحافظات	القطاعـــــــــات																				المجموع	
	البلدية و البلديات		التجارة		التربية		التعليم العالي		الداخلية		الزراعة		الصحة		الطرق والجسور		الكهرباء		الماء والمجاري		دوائر حكومية	
نوع التمويل	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز	الكلي	المنجز
الانبار	0	0	1	0	7	0	3	2	5	0	0	0	4	1	5	1	10	9	16	3	0	0	51	16
استثماري									4				3		3								10	0
تشغيلي			1		7		3	2	1				1	1	2	1	10	9	16	3			41	16
شمال بابل	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
استثماري															1								1	0
حزام بغداد	3	3	0	0	3	1	0	0	2	2	0	0	1	1	1	1	2	1	4	3	2	2	18	14
استثماري					2																		2	0
تشغيلي	3	3			1	1			2	2			1	1	1	1	2	1	4	3	2	2	16	14
ديالى	2	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	1	1	18	11	3	4	4	3	0	0	34	21
استثماري					2										12	9	2	1					16	10
تشغيلي	2	1			4	1							1	1	6	2	1	3	4	3			18	11
صلاح الدين	3	0	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	18	0
استثماري					6										2		1						9	0
تشغيلي	3								4				1		1								9	0
كركوك	2	0	2	0	6	0	1	0	4	0	0	0	0	0	5	2	1	0	6	4	1	0	28	6
استثماري					6		1		1						4	2	1		2		1		16	2
تشغيلي	2		2						3						1				4	4			12	4
نينوى	1	1	2	0	13	1	5	0	3	0	1	0	4	0	4	0	6	1	4	0	5	0	48	3
استثماري	1	1	2		10		3		1				1		2		5	1			1		26	2
تشغيلي					3	1	2		2		1		3		2		1		4		4		22	1
الإجمالي الكلي	11	5	5	0	41	3	9	2	18	2	1	0	11	3	37	15	23	15	34	13	8	2	198	60

جدول يمثل توزيع مبالغ مشاريع الصندوق للموازنة الفيدرالية على المحافظات والقطاعات لعام ٢٠١٨

المحافظات	القطاعـــــــــــــات											الإجمالي الكلي
نوع التمويل	البلدية و البلديات	التجارة	التربية	التعليم العالي	الداخلية	الزراعة	الصحة	الطرق والجسور	الكهرباء	الماء والمجاري	دوائر حكومية	
الانبار		607,416,000	4,089,139,300	1,141,948,900	2,345,197,800		1,242,514,000	3,013,384,000	2,658,704,000	4,021,707,200		19,120,011,200
استثماري					1,486,874,600		1,150,824,000	2,403,008,000				5,040,706,600
تشغيلي		607,416,000	4,089,139,300	1,141,948,900	858,323,200		91,690,000	610,376,000	2,658,704,000	4,021,707,200		14,079,304,600
بابل								2,000,259,000				2,000,259,000
استثماري								2,000,259,000				2,000,259,000
بغداد	680,815,000		1,753,555,600		400,036,000		19,750,000	205,980,000	1,016,109,900	817,903,100	300,000,000	5,194,149,600
استثماري			1,680,355,600									1,680,355,600
تشغيلي	680,815,000		73,200,000		400,036,000		19,750,000	205,980,000	1,016,109,900	817,903,100	300,000,000	3,513,794,000
ديالى	838,925,501		2,379,179,500				96,755,000	7,961,501,514	1,321,577,000	1,107,700,700		13,705,639,215
استثماري			967,081,500					5,803,121,500	742,572,500			7,512,775,500
تشغيلي	838,925,501		1,412,098,000				96,755,000	2,158,380,014	579,004,500	1,107,700,700		6,192,863,715
صلاح الدين	1,415,851,000		4,281,372,250		2,579,462,400		284,192,000	4,985,812,000	1,017,611,200			14,564,300,850
استثماري			4,281,372,250					4,528,412,000	1,017,611,200			9,827,395,450
تشغيلي	1,415,851,000				2,579,462,400		284,192,000	457,400,000				4,736,905,400
كركوك	344,502,400	576,140,000	2,398,886,000	864,570,000	1,678,050,400			2,278,434,000	467,952,500	2,248,862,005	362,528,000	11,219,925,305
استثماري			2,398,886,000	864,570,000	380,882,400			2,207,634,000	467,952,500	970,112,001	362,528,000	7,652,564,901
تشغيلي	344,502,400	576,140,000			1,297,168,000			70,800,000		1,278,750,004		3,567,360,404
نينوى	188,480,000	5,029,748,000	5,944,624,000	3,348,214,600	2,317,910,600	232,313,000	6,263,047,000	3,300,644,000	13,159,580,000	1,479,428,750	2,054,444,000	43,318,433,950
استثماري	188,480,000	5,029,748,000	5,383,332,800	2,600,567,000	1,961,520,000		1,038,672,000	2,331,764,000	11,741,080,000		589,560,000	30,864,723,800
تشغيلي			561,291,200	747,647,600	356,390,600	232,313,000	5,224,375,000	968,880,000	1,418,500,000	1,479,428,750	1,464,884,000	12,453,710,150
الإجمالي الكلي	3,468,573,901	6,213,304,000	20,846,756,650	5,354,733,500	9,320,657,200	232,313,000	7,906,258,000	23,746,014,514	19,641,534,600	9,675,601,755	2,716,972,000	109,122,719,120

مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية
حسب المحافظات لعام ٢٠١٦

مشاريع محافظة الانبار

مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام ٢٠١٦ / محافظة الانبار

ت	القطاع	اسم المشروع	القضاء / الناحية	المبلغ
1	الماء	صيانة مجمع ماء الجبور / القرية العصرية سعة ١٠٠م³ / ساعة + تأهيل مجمع زويغير سعة ٢٠٠م³ / ساعة	الرمادي	58,320,000
2	الماء	صيانة مجمع ماء زويغير الثاني سعة ٢٠٠م³ في الرمادي	الرمادي	69,525,000
3	الماء	صيانة مجمع ماء البوعيثة الخامس سعة ١٠٠م³ + تاهيل مجمع ماء البوعيثة الرابع سعة ٥٠م³ /ساعة	الرمادي	55,534,000
4	الماء	تجهيز مولدة ١٥٠ كي في اي + مولدة ٢٥٠ كي في اي لمشروعي ماء تل اسود (عبد مخيلف) وتل اسود (عبد مناور)	هيت / الفرات	86,000,000
5	الماء	صيانة مجمع ماء الحامضية القديم سعة ٢٠٠م³/ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	96,515,000
6	الماء	صيانة مجمع العدنان في قضاء الرمادي	الرمادي	76,570,000
7	الماء	تجهيز مولدة كهرباء ٢٥٠ كي في اي لمجمع اليونسيف + تجهيز مولدة كهرباء لمجمع ماء زنكورة الثالث	الرمادي	90,000,000
8	الماء	تجهيز مولدة ٢٥٠ كي في اي مع هيكل السحب لمجمع العدنان في قضاء الرمادي	الرمادي	66,000,000
9	الماء	صيانة مجمع ماء البوغضبان + تجهيز مولدة بيركنز ٢٥٠ كي في اي	الرمادي	81,167,000
10	الماء	صيانة ماء طوي البوجراد	الرمادي	72,500,000
11	الماء	صيانة مجمع ابو طيبان / صعب الحردان القصر سعة ٢٠٠م³/ساعة+تاهيل مجمع ماء زنكورة الاول سعة ٢٠٠م³/ساعة	الرمادي	75,850,000
12	الماء	صيانة مجمع ماء البوعبيد الجديد سعة ٢٠٠م³/ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	84,960,000
13	الماء	صيانة مجمع ماء البو كاطع + تجهيزمولدة ٢٥٠ كي في اي لمجمع ماء البوذياب الحويجة	الرمادي	93,000,000
14	الماء	صيانة مجمع ماء البوعبيد (طالب عفات) + تاهيل مجمع ماء البوذياب القصر سعة ٢٠٠م³/ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	73,280,000
15	الماء	تجهيز مولدة قدرة ٢٥٠ كي في اي لمجمع ماء المداليس + تجهيز مولدة ٢٥٠ كي في اي في البوذياب الجنابيين	الرمادي	90,000,000
16	الماء	صيانة مجمع ماء الحامضية الجديد سعة ٢٠٠م³/ساعة في قضاء الرمادي	الرمادي	42,890,000
17	الماء	استبدال الانابيب الواقعة في منطقة الحوز شارع النهر الشارع الرابط بين جسر الحوز ومجسر الزيوت الجانب الايمن في الرمادي	الرمادي	68,495,000
18	الماء	استبدال الانابيب الواقعة في منطقة الحوز شارع النهر الشارع الرابط بين جسر الحوز ومجسر الزيوت الجانب الايسر في الرمادي	الرمادي	66,295,000
19	الماء	صيانة مجمعات اليونسيف / الدوار في قضاء الرمادي	الرمادي	72,960,000
20	البلديات	تاهيل الشارع الرابط بين شارع البو ذويب وجسر الحوز في الرمادي	الرمادي	67,000,000

21	الداخلية	تاهيل الجناح الاداري والواجهة الخارجية لمديرية جنسية محافظة الانبار	الرمادي	82,778,000
22	الداخلية	ترميم وتاهيل جنسية واحوال الرمادي	الرمادي	40,950,000
23	الماء	صيانة مجمع ماء الدوار / عبد الصالح	الرمادي	82,120,000
24	الماء	صيانة مجمع ماء البو شعبان قرب مدرسة سمية + صيانة مجمع ماء البو شعبان ٢	الرمادي	75,493,000
25	الماء	ايصال التيار الكهربائي المغذي لمحطات ضخ الماء في الموقع الجامعي لجامعة الانبار	الرمادي	51,800,000
26	التعليم العالي	تأهيل مبنى كلية الادارة والاقتصاد - القاعات الدراسية لجامعة الانبار	الرمادي	99,325,000
27	الموارد المائية	تأهيل محطة ري البوذياب المساعدة (البوهايس)	الرمادي	45,800,000
28	الموارد المائية	تجهيز محولات ٦٣٠ KVAفي محطة ري القطنية المساعدة ومحطة ري بزايز ابو طيبان	الرمادي	86,810,000
29	التعليم العالي	صيانة وتأهيل محطة تصفية وتعقيم ماء الجامعة ومحطات الضخ لجامعة الانبار	الرمادي	97,235,000
30	التعليم العالي	تأهيل مبنى شؤون الطلبة لجامعة الانبار	الرمادي	87,740,000
31	التعليم العالي	اعادة تأهيل بناية الاقسام الادارية في المحافظة	الرمادي	99,999,990
32	الداخلية	اعادة تأهيل بناية دائرة حماية المنشاة في الرمادي	الرمادي	45,520,000
33	المحافظة	اعادة تأهيل بناية الاشراف الهندسي	الرمادي	99,350,000
34	الماء	صيانة مجمع ماء البوعيثة الاول بسعة ٢٠٠م^3 في قضاء الرمادي	الرمادي	83,660,000
35	الموارد المائية	تأهيل القناة الناقلة لشارع اربعين في الرمادي	الرمادي	99,500,000
36	المحافظة	اعادة تأهيل بناية الاقسام الفنية في المحافظة	الرمادي	99,999,990
37	الموارد المائية	تأهيل المحطة المساعدة الغربية لمحطة ري البو ذياب	الرمادي	96,200,000
38	الماء	صيانة مجمع ماء البو كريطي	الفلوجة	19,638,000
39	الماء	تجهيز ونصب وتشغيل مولد ٢٥٠ كي في اي لمجمع ماء ابو سديرة القديم	الفلوجة	44,930,000
40	الماء	تجهيز مواد لصيانة مشاريع وشبكات للمجمعات المائية في الفلوجة	الفلوجة	96,500,000

41	الماء	صيانة مجمع ماء جبيل سعة ٢٠٠م³/ساعة	هيت / الفرات	58,405,000
42	الماء	صيانة مجمع ماء البوعبد الحسن في الفلوجة	الفلوجة	94,650,000
43	الماء	تاهيل مجمع ماء الشهداء القديم سعة ٢٠٠م²/ساعة في قضاء الفلوجة	الفلوجة	78,500,000
44	الماء	صيانة مجمع ماء الفلاحات وصبيحات القديم والهيتاويين في الفلوجة	الفلوجة	73,000,000
45	الماء	صيانة مجمع الفلاحات الجفة في قضاء الفلوجة	الفلوجة	86,950,000
46	الماء	تاهيل مجمع ماء البوخميس سعة ٢٠٠م³/ساعة+تاهيل مجمع ماء البو يوسف	الفلوجة	97,760,000
47	الماء	صيانة مجمعات ماء البو عزام والفلاحات الجفة والبوذياب في قضاء الفلوجة	الفلوجة	67,195,000
48	الماء	صيانة مجمع ماء البوشمخان الحلابسة والبشويش الحلابسة والشيخ نعيم والبوعلوان ١ في الفلوجة	الفلوجة	75,180,000
49	التعليم العالي	تجهيز الاجهزة الطبية لكلية الطب والطب البيطري لجامعة الفلوجة	الفلوجة	99,900,000
50	القضاء	تأهيل وترميم بناية محكمة الفلوجة	الفلوجة	79,550,000
51	التعليم العالي	تجهيز مولدات عدد (٢) اثنان لكلية الطب والطب البيطري جامعة الفلوجة	الفلوجة	90,000,000
52	الماء	مجمع ماء تل اسود المكاشير وعودة الرجب	هيت	55,905,000
53	الماء	مد الخط الناقل لاحياء الحلبسية وفرات وسيطرة ماجد في هيت	هيت	43,200,000
54	الماء	اعادة تأ هيل وصيانة مجمع ماء المحمدي القديم سعة ٢٠٠م³/ساعة	هيت	84,505,000
55	الكهرباء	تجهيز وتنصيب مواد صيانة الكهرباء لناحية المحمدي مركز المدينة	هيت	93,306,000
56	الماء	صيانة مجمع ماء البو مانع سعة ٢٠٠م³/ساعة	هيت / الفرات	67,000,000
57	الماء	صيانة مجمع ماء حي البكر الشرقي سعة ٢٠٠م³	هيت	58,405,000
58	الماء	تاهيل مشروع ماء المؤسسة	هيت	42,000,000
59	الماء	تاهيل مشروع ماء قرى هيت	هيت	97,500,000
60	الماء	صيانة مجمع ماء زوية الشرقية + مجمع ماء بكرة البو غانم	هيت / الفرات	90,350,000

61	الماء	صيانة مولدة مشروع ماء هيت- كبيسة الموحد قدرة ١١٠٠ كي في اي	هيت	84,810,000
62	الماء	تجهيز مواد صيانة شبكات لمركز ماء هيت	هيت	92,620,000
63	الماء	صيانة مجمع ماء تل اسود (مخلف المحل) + صيانة مجمع ماء تل اسود (عبد مناور)	هيت / الفرات	99,080,000
64	الماء	صيانة المجمعات المائية في ناحية البغدادي + تجهيز ونصب مضخة قدرة ٢٥٠ م³/ساعة * ٨٠م ومد خط ناقل قطر ١٦٠ ملم لمنطقة شرق البغداداي قرب مدرسة الثواب في قضاء هيت	هيت	95,700,000
65	الصحة	اعادة تأهيل ردهات الاطفال في مستشفى هيت	هيت	99,877,000
66	الصحة	اعادة تاهيل صالة العمليات الكبرى في مستشفى هيت العام	هيت	99,928,000
67	الصحة	اعادة تاهيل جناح الطوارئ في مستشفى هيت العام	هيت	99,972,000
68	الصحة	اعادة تاهيل صالة عمليات الولادة والاطفال في مستشفى هيت العام	هيت	99,947,000
69	الصحة	اعادة تاهيل ردهات الرجالية في مستشفى هيت العام	هيت	99,877,000
70	الماء	تاهيل مشروع ماء هيت /كبيسة الموحد سعة ١٠٠٠م³/ساعة	هيت	96,500,000
71	الماء	صيانة ماء الغرير سعة ٥٠م³/ساعة	هيت / الفرات	86,240,000
72	التعليم العالي	صيانة واعادة تأهيل بناية كلية العلوم التطبيقية / جامعة الانبار في هيت	هيت	84,769,000
73	الماء	اعادة تأهيل وصيانة مجمع ماء المحمدي الجديد سعة ٢٠٠م³ / ساعة	هيت	93,210,000
74	الماء	تجهيز مضخات ومحركات لمشاريع ومجمعات حديثة ونواحيها	حديثة	97,000,000
75	الماء	تجهيز مضخات ومحركات لمحطة توزيع مشروع حديثة / حقلانية الموحد	حديثة	97,500,000
76	الماء	تاهيل مشروع ماء البوحيات الشرقي سعة ٥٠م³/ساعة	حديثة	93,800,000
77	الماء	تاهيل مشروع ماء البوحيات الوسطي بطاقة ٥٠م³/ساعة	حديثة	75,780,000
78	الماء	تاهيل مجمع ماء الخسفة	حديثة	80,750,000
79	الماء	اعادة تاهيل مجمع ماء البوحيات الغربي ٥٠م³/ساعة	حديثة	80,650,000
80	الماء	تاهيل مجمع ماء الشاعي سعة ١٠٠م³/ساعة	حديثة	76,250,000

81	التعليم العالي	تأهيل بناية القاعات الدراسية لكلية التربية الاساسية حديثة / الخدمات والتابعة لجامعة الانبار	حديثة	95,445,000
82	الماء	صيانة مجمع ماء البو تايه سعة ٢٠٠م^3 في الكرمة	الكرمة	87,685,000
83	الماء	صيانة مجمع ماء اللهيب ٢	الكرمة	87,685,000
84	الماء	صيانة مجمع ماء اللهيب ١ بسعة ١٠٠م^3	الكرمة	98,260,000
85	الماء	صيانة مجمع ماء الغرير سعة ٢٠٠م^3 في الكرمة	الكرمة	87,685,000
86	الماء	صيانة مجمع ماء المصالحة سعة ٢٠٠م^3	الكرمة	87,685,000
87	الماء	صيانة مجمع ماء ذراع دجلة سعة ٢٠٠م^3	الكرمة	87,685,000
88	الماء	صيانة مجمع ماء البودخيل	الكرمة	87,685,000
89	الماء	صيانة مجمع ماء بني زيد الاول	الكرمة	87,685,000
90	الماء	صيانة مجمع البوبالي رقم ٣ مع تجهيز مولدة ٢٥٠ كي في اي في قضاء الرمادي	الخالدية	94,750,000
91	الماء	صيانة مجمع ماء ابو زعيان في الخالدية	الخالدية	95,650,000
92	الماء	صيانة مجمع ماء البوشهاب + تجهيز مولدة بيركز ٢٥٠ كي في اي	الخالدية	99,800,000
93	الماء	تجهيز مولدة كهرباء نوع بيركنز ٥٠٠ كي في اي وبورد كهربائي لمشروع قرى الحبانية في قضاء الخالدية	الخالدية	91,750,000
94	الماء	صيانة مولدة ٢٥٠ كي في اي لمجمع ماء البو شعبان ١ + صيانة مجمع ماء البو عبد المحسن + تجهيز ونصب مولدة ٢٥٠ كي في اي	الخالدية	96,700,000
95	الماء	صيانة مجمع ماء البوبالي الاول في الخالدية	الخالدية	90,400,000
96	الماء	صيانة مجمع ماء الكرابلة+تجهيز ونصب مولدة بيركنز ٢٥٠ كي في اي	الخالدية	99,700,000
97	الماء	صيانة مجمع ماء سن الذبان سعة ٢٠٠م^3/ساعة	الخالدية	63,520,000
98	الماء	صيانة مجمع ماء الملاحمة + تجهيز ونصب مولدة بيركنز ٢٥٠ كي في اي	الخالدية	87,200,000
99	الماء	صيانة مجمع البوبالي الثاني في الخالدية	الخالدية	93,300,000
100	الماء	تجهيز طواقم ضخ عمودية خاصة بالابار لمركز ماء الرطبة والوليد ومركز ماء النخيب ومركز ماء عرعر	الرطبة	95,000,000

101	الماء	صيانة الفلاتر في المحطة الرئيسية لمشروع ماء الصحراء الغربية في الرطبة	الرطبة	84,000,000
102	الماء	تأهيل وجدة التحلية رقم (٣) في مركز ماء طريبيل الرئيسي	طريبيل	53,800,000
103	الماء	استخراج البئر الساقط في منفذ طربيل الحدودي وبعمق ٤٥٠ متر	طريبيل	96,500,000
104	التعليم العالي	تاهيل بناية الاقسام العلمية ومختبرات القسم المدني في المعهد التقني	الصقلاوية	82,175,000
105	التعليم العالي	تجهيز المتطلبات المهمة لضخ وتصفية وتوزيع الماء في المعهد التقني	الصقلاوية	88,700,000
106	التعليم العالي	انشاء مجموعتي حمامات للطلبة + انشاء ملحق قاعة دراسية سندويج بنل في المعهدالتقني	الصقلاوية	90,334,000
107	التعليم العالي	تاهيل قسم الكهرباء والقسم المدني في المعهد التقني	الصقلاوية	87,455,000
108	التعليم العالي	اعادة ربط الكهرباء الوطنية لموقع المعهد التقني	الصقلاوية	70,900,000
109	التعليم العالي	توليد وايصال وتوزيع الكهرباء لموقع المعهد التقني	الصقلاوية	97,060,000
110	التعليم العالي	انشاء مسقف استراحة الطلاب في المعهد التقني	الصقلاوية	93,180,000
111	التعليم العالي	تاهيل وانشاء قاعة دراسية مرسم المعهد التقني	الصقلاوية	66,622,500
112	التعليم العالي	عزل المواقع الغير مؤمنة في المعهد + تاهيل بناية قاعات قسم الكهرباء والورش الهندسية في المعهد التقني	الصقلاوية	93,860,000
113	التعليم العالي	تجهيز الاثاث المدرسي المطلوب لابنية موقع المعهد التقني	الصقلاوية	97,000,000
		المجـــــــــــــــــــــــــــــــوع		9,306,587,480

مشاريع محافظة نينوى

مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام ٢٠١٦ / محافظة نينوى				
ت	اسم المشروع	القضاء	القطاع	المبلغ
1	اعمار البئر الارتوازي في ناحية الشمال	سنجار	الماء	22,000,000
2	اعمار مدرسة (برجا بة لة ك) في ناحية شنكال	سنجار	التربية	45,886,000
3	اعمار مستوصف في مركز ناحية الشمال	سنجار	الصحة	8,000,000
4	اعمار القنطرة الصندوقية في وادي سنجار	سنجار	البلديات	95,000,000
5	اعمار مستوصف مجمع دوكري في ناحية الشمال	سنجار	الصحة	19,000,000
6	اعمار سايلو سنجار	سنجار	التجارة	98,000,000
7	محطة كهرباء الشمال في ناحية الشمال	سنجار	الكهرباء	19,078,500
8	شراء اليات تخصصية لبلدية سنجار	سنجار	البلديات	99,750,000
9	اعمار مركز تشغيل ماء سنجار	سنجار	الماء	99,000,000
10	بناية دائرة كهرباء الشمال في ناحية الشمال	سنجار	الكهرباء	20,000,000
11	اعمار مدرسة كوهبةل في ناحية الشمال	سنجار	التربية	17,256,750
	المجـــمـــــــــــــوع			542,971,250

مشاريع محافظة صلاح الدين

مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام ٢٠١٦ / محافظة صلاح الدين

ت	القطاع	اسم المشروع	القضاء	المبلغ
1	الداخلية	تأهيل وصيانة قسم شرطة الاسحاقي ومركز شرطة السجلة	الدجيل	79,120,000
2	الداخلية	اعادة تأهيل وصيانة مقر فوج طوارئ الدجيل	الدجيل	61,820,000
3	الداخلية	اعادة تأهيل وصيانة قسم الكلاب البوليسية وقسم مكافحة الاجرام وقسم شؤون الميرة	تكريت	56,200,000
4	الداخلية	اعادة تأهيل وصيانة قسم الادلة الجنائية ومركز شرطة تكريت	تكريت	66,200,000
المجمـــــــــــــــــــــــوع				263,340,000

مشاريع محافظة كركوك

مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام ٢٠١٦ / محافظة كركوك				
ت	القطاع	اسم المشروع	اسم المنطقة	المبلغ
1	الداخلية	اعمار مركز شرطة البشير في ناحية تازة	تازة	92,310,500
2	الماء	اعمار شبكة ماء البشير في ناحية تازة	تازة	95,000,000
3	الداخلية	اعمار مركز شرطة ناحية الملتقى	الملتقى	97,713,000
		المجمـــــــــــــــــــــــوع		285,023,500

مشاريع محافظة بابل

Babil Governorate projects

مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام ٢٠١٦ / محافظة بابل				
ت	القطاع	اسم المشروع	اسم المنطقة	المبلغ
1	الماء	تأهيل مجمعات ماء الدوريين ١٤م³ / ساعة	الاسكندرية	70,500,000
2	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الغربية)	الاسكندرية	82,500,000
3	الماء	تأهيل مجمع ماء الشيحة ١٤م³ / ساعة	الاسكندرية	76,500,000
4	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الشرقية)	الاسكندرية	79,200,000
5	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الشمالية)	الاسكندرية	88,000,000
6	الماء	مد واستبدال شبكة متفرقة في ناحية الاسكندرية (المنطقة الجنوبية)	الاسكندرية	80,300,000
7	الماء	تأهيل مجمعات ماء الحويجة ١٤م³ / ساعة	الاسكندرية	70,500,000
8	الماء	تأهيل مجمع ماء ابو شمسي سعة ٢٠٠م³ / ساعة	الاسكندرية	92,000,000
9	الماء	تأهيل مجمع ماء الخضر سعة ٢٠٠م³ / ساعة	الاسكندرية	92,000,000
10	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (٣) سعة ٥٠م³ / ساعة	جرف النصر	88,000,000
11	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (٢) سعة ٥٠م³ / ساعة	جرف النصر	88,000,000
12	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (٤) سعة ٥٠م³ / ساعة	جرف النصر	88,000,000
13	الماء	تأهيل مجمع ماء الفاضلية (١) سعة ٥٠م³ / ساعة	جرف النصر	87,500,000
المجمـــــــــــــــــوع				1,083,000,000

Baghdad Governorate Projects

مشاريع الصندوق على الموازنة الفيدرالية لعام ٢٠١٦ / حزام بغداد

ت	القطاع	اسم المشروع	اسم المنطقة	المبلغ
1	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية السعدان (١)	النصر والسلام	99,962,500
2	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية السعدان (٢)	النصر والسلام	99,956,000
3	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العجاج	النصر والسلام	99,881,000
4	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العناز (١)	النصر والسلام	99,950,500
5	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية العناز (٢)	النصر والسلام	99,915,500
6	الكهرباء	تجهيز وتنصيب لاعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرية عودة الشكر	النصر والسلام	99,925,500
		المجـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع		599,591,000

مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية
حسب المحافظات لعام ٢٠١٧

مشاريع محافظة نينوى

مشاريع محافظة نينوى على الموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / ٢٠١٧

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة الشورة الابتدائية ١٢ صف/ القيارة / نينوى	التربية	35° 59’43.8"N 43° 13’18.5"E	600	38+170	715,512,000	716,492,000	2017-08-02	2017-08-16	7/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	اعدادية القيارة للبنين ١٢ صف /القيارة / نينوى	التربية	35° 47’23.1"N 43° 17’23.4"E	600	28+180	687,989,900	684,563,900	2017-08-02	2017-08-16	5/12/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	ثانوية الشورة للبنين ١٢ صف/ القيارة / نينوى	التربية	36° 00’03.8"N 43° 13’36.0"E	600	18+170	750,236,000	748,708,000	2017-08-02	2017-08-16	18/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة اجحلة الابتدائية للبنين١٢ صف/ القيارة/ نينوى	التربية	35° 42’31.9"N 43° 17’58.5"E	600	28+160	737,710,000	735,904,000	2017-08-02	2017-08-13	5/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	صب ارصفة وبناء القوالب الجانبية للشارع الرئيسي / حي النصر وبربوش /مركز قضاء سنجار/نينوى	البلديات			60	188,480,000	188,480,000	2018-05-06	25L6L2016	16/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	تأهيل شوارع وصبغ القوالب في الشورة	البلديات		400,000	28+70	1,527,640,000	1,570,680,000	2017-11-05	2017-11-20	16/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	إعادة تأهيل وأكساء شوارع رئيسية في حمام العليل	البلديات												
8	كشف أعمال تأهيل و أكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية القيارة	البلديات												
9	تأهيل وإكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية القيارة	البلديات												
10	إعادة تأهيل المدخل الجنوبي للقصبة (شارع الصلاحية) مع تحويل العارض (أنبوب الماء) الموجود في وسط الشارع في ناحية حمام العليل/ المرحلة الاولى	البلديات												
11	إكساء شوارع داخل ناحية الشورة	البلديات												
12	إكساء طرق داخلية في ناحية بعشيقة	البلديات		150,000	24+65	945,980,000	993,785,000	2017-11-14	2017-11-28	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
13	صيانة شوارع متفرقة في ناحية بعشيقة													
14	بناء القوالب الجانبية وصب الارصفة والقسالس في برطلة													
15	تبليط مسارات شبكة مجاري في برطلة													
	المجموع			552400		5,553,547,900	5,638,612,900							

مشاريع محافظة نينوى على الموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / ٢٠١٧

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	صيانة وتاهيل ابنية كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36 22.897’N 43 8.592’E	2000	45+140	900,000,000	985,290,000	2017-08-02	2017-08-20		100%	100%	0%	انجاز العمل
2	تاهيل شبكات الكهرباء / الموصل	الكهرباء	36 21 34 05N 43 01 34 28E	25,000	30	731,600,000	731,600,000	2017-10-18	منجز		100%	100%	0%	انجاز العمل
3	تأهيل وصيانة طرق في قضاء الحمدانية وناحية النمرود	البلديات		85,000	4+50	275,016,500	275,012,500	2017-11-02	2017-11-16	29/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	تاهيل بناية مركز شرطة الوقاص	الداخلية		150000	12+50	303428000	327096500	2017-11-20	2017-12-04		100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تأهيل بناية مركز شرطة اليرموك	الداخلية												
6	تأهيل بناية مركز الدفاع المدني الجزائر	الداخلية		200000	12+50	175316000	192830000	2017-11-21	2017-12-03	2/11/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	تأهيل بناية مديرية شرطة النصر	الداخلية												
8	تاهيل ابنية كلية الاداب / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي		4000	40+154	1,414,930,000	1,539,455,000	2017-08-02	2017-10-08	16/5/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	تاهيل ابنية كلية التقانات وعلوم البيئة / جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي	36° 23.126'N 43° 8.471'E											
10	تاهيل ابنية كلية التمريض / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36° 22.574'N 43° 8.948'E	4000	34+140	1,627,784,000	1,785,149,550	2017-09-25	2017-10-03	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تاهيل ابنية كلية التربية الرياضية / جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36° 22.696'N 43° 8.696'E											
12	تاهيل كلية طب الاسنان/جامعة الموصل /نينوى	التعليم العالي	36° 23.197'N 43° 8.919'E	2500	28+140	1,464,915,000	1,611,067,000	2017-10-15	2017-10-29	26/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
13	تاهيل كلية الصيدلة/ جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي	36° 22.491'N 43° 8.637'E											
14	تاهيل بناية قسم الاعمار والمشاريع/جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي	36° 22.552'N 43° 8.762'E	4250	45+105	1,624,462,000	1,784,852,000	2017-09-28	2017-10-11	مستمر	100%	95%	5%	تلكؤ الشركة المنفذة , وتم توجيه كتاب انذار
15	تاهيل ابنية كلية العلوم/جامعة الموصل/ نينوى	التعليم العالي	36° 22.557'N 43° 8.579'E											
16	تاهيل ابنية المراكز البحثية/ جامعة الموصل/نينوى	التعليم العالي												
17	تأهيل ابنية كلية التربية / جامعة الموصل	التعليم العالي		4250	61+110	1,571,950,000	1,712,226,000	2017-10-30	2017-11-14	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
18	تأهيل ابنية كلية الهندسة / جامعة الموصل	التعليم العالي												
				481000		10089401500	10,944,578,550							

ثانوية الشورة / الشورة / نينوى

اعدادية القيارة / القيارة / نينوى

كلية طب الأسنان / جامعة الموصل / نينوى

كلية طب الأسنان / جامعة الموصل / نينوى

إعادة تأهيل طرق الحمدانية والنمرود / نينوى

تأهيل مديرية شرطة النصر/ نينوى

تاهيل وتبليط مسارات شبكة مجاري في برطلة و بعشيقة

إعادة تأهيل الطرق في ناحية (الشورى ، القيارة ، حمام العليل)

كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى

كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى

كلية الصيدلة / جامعة الموصل / نينوى

كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل / نينوى

كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل / نينوى

تجهيز محولات إلى الجانب الأيمن / الموصل

مشاريع محافظة الانبار

مشاريع محافظة الانبار للموازنة الاستثمارية / الخطة الاستثمارية ٢٠١٧

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	ثانوية العلا للبنات / ١٨ صف الرمادي/الانبار	التربية	33 25 13.0N 43 18 28.2E	650	95+210	1,066,033,000	2017-07-23	2017-08-06	18/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	ثانوية الكواكب للبنات /ثانوية/١٨ صف/الرمادي/الانبار	التربية	33 ° 24 37.3N 43° 16 42.6E	450	80+190	1,070,000,000	2017-07-24	2017-08-09	26/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	ثانوية دار السلام للبنين /ثانوية/١٨ صف /هيت /الانبار	التربية	33 39 03.0N 42 49 48.3E	650	78+190	1,144,525,000	2017-07-30	2017-08-21	15/5/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة أبو أيوب الانصاري للبنين /ابتدائية/١٢ صف/ الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 23 31.4N 43 52 50.8E	450	177+160	659,631,000	2017-07-30	2017-08-17	2018-07-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	مدرسة صعدة الابتدائية المختلطة الابتدائية ١٢ صف/الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 33 14.7N 44 06 14.5E	450	166+170	585,985,000	2017-07-31	2017-08-13	18/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	مدرسة الوفاء الابتدائية للبنين ١٢ صف /الرمادي/ الانبار	التربية	33° 25 50.2N 43° 21 22.0E	450	83+165	598,000,000	2017-08-02	2017-08-15	2018-10-05	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	ثانوية الرشاد للبنين الثانوية ١٨ صف/ الكرمة/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 23 57.2N 43 36 01.7E	650	96+210	1,093,229,000	2017-08-02	2017-08-17	2/1/2019	100%	100%	0	انجاز العمل
8	مدرسة الافنان الابتدائية للبنين ١٢ صف /جزيرة الرمادي/ الانبار	التربية	33 28 03.5N 43 18 04.6E	450	153+180	611,468,000	2017-08-02	2017-08-15	2018-01-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	اعدادية حليمة السعدية للبنات ١٢ صف /الرمادي/ الانبار	التربية	33° 26’ 00.0N 43° 22’ 05.6E	450	103+180	599,981,000	2017-08-03	2017-08-08	30/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	مدرسة الصمد الابتدائية ١٢ صف/ هيت/ الانبار	التربية	33 37 55.3N 42 50 26.8E	450	63+170	639,571,000	2017-08-03	2017-08-21	2018-12-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	متوسطة المامون ١٨ صف /الرمادي/الانبار	التربية	33 25 17.0N 43 19 57.9E	650	29+210	1,266,865,000	2017-08-03	2017-08-15	2018-05-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	مدرسة دجلة الابتدائية للبنين ١٢ صف/ الرمادي/ الانبار	التربية	33 25 39.2N 43 17 01.6E	450	20+170	592,525,000	2017-08-03	2017-08-16	25/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
13	اشبيلية الابتدائية المختلطة ١٢ صف / الكرمة/ الفلوجة/ الانبار	التربية	33 29 46.6N 44 06 14.5E	450	143+160	614,777,000	2017-08-03	2017-08-13	20/12/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
14	مدرسة الخضر الابتدائية ١٢ صف /الصقلاوية/الفلوجة/الانبار	التربية	33 27 50.4N 43 36 27.3E	450	150+150	573,888,800	2017-08-03	2017-10-25	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
15	مدرسة السلوى الابتدائية ١٨ صف/ الفلوجة/ الانبار	التربية	33 19 49.2N 43 47 49.5E	650	161+210	1,078,596,000	2017-08-03	2017-08-15	19/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل

16	مدرسة ابي ذر الغفاري الابتدائية للبنات ١٢ صف /جزيرة الرمادي/ الانبار	التربية	33 27 29.1N 43 16 17.7E	450	93+180	631,520,000	2017-08-03	2017-08-09	2018-05-02	100%	100%	0%	انجاز العمل
17	مدرسة المروج الخضراء الابتدائية ١٢ صف/ الفلوجة/ الانبار	التربية	33 25 31.6N 43 43 10.7E	450	134+180	595,000,000	2017-08-13	2017-08-23	20/12/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
18	مدرسة عامر بن ربيعة ١٢ صف/ حديثة/ الانبار	التربية	33 00 16.3N 42 26 13.6E	450	15+170	688,586,000	2017-08-13	2017-09-05	20/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
19	مدرسة الخالد الابتدائية ١٢ صف /الفلوجة/ الانبار	التربية	33 26 49.3N 43 44 37.4E	450	129+170	651,962,500	2017-08-13	2017-09-10	14/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
20	مدرسة الفتوة الابتدائية للبنين ١٢ صف/ الرمادي/ الانبار	التربية	33 26 00.0N 43 22 05.6E	450	134+180	594,113,000	2017-08-13	2017-08-23	2018-01-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
21	ثانوية جبة للبنين ١٢ صف / البغدادي/هيت/ الانبار	التربية	33 54 33.0N 42 33 04.6E	450	101+160	575,131,000	2017-08-13	2017-08-23	23/9/2018	100%	96%	4%	انجاز العمل
22	مدرسة دار العلم الابتدائية ١٢ صف / الرمادي/ الانبار	التربية	33 24 44.5N 43 18 24.5E	450	20+170	611,635,000	2017-08-13	2017-08-27	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
23	متوسطة خالد بن الوليد ١٢ صف/ الكرمة/ الفلوجة/ الانبار	التربية	33 42 17.7N 43 55 18.8E	450	114+180	669,928,000	2017-08-13	2017-08-20	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
24	ثانوية الشهابي للبنين ١٢ صف/ الفلوجة/ الانبار	التربية	33 23 02.4N 43 51 59.1E	450	145+160	672,513,500	2017-08-13	2017-08-27	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
25	ثانوية الرشيدية للبنين١٢ صف /الرمادي/ الانبار	التربية	33 24 04.0N 43 19 58.1E	450	20+165	577,451,000	2017-08-14	2017-09-06	2018-09-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
26	مدرسة جنة الماوى الابتدائية للبنين١٢ صف /الرمادي/ الانبار	التربية	33 25 54.3N 43 12 40.1E	450	71+170	573,900,500	2017-08-15	2017-09-06	25/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
27	متوسطة الشيماء للبنات ١٢ صف/ هيت/ الانبار	التربية	33 38 16.8N 42 49 34.1E	450	180	667,409,500	2017-08-23	2017-08-23	30/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
28	اعدادية صناعة الصقلاوية ١٨ صف/ الصقلاوية/الفلوجة/ الانبار	التربية	33 24 02.3N 43 42 05.6E	650	162+180	1,195,056,000	2017-08-24	2017-10-11	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
29	مشروع ناظم الورار	موارد مائية	33° 26.057'N 43° 15.928'E	10,000,000	25+570	7,038,189,000	2017-11-07	2017-11-19	مستمر	78%	78%		
30	اعادة اعمار ناظم سدة الرمادي على نهر الفرات	موارد مائية	33° 26.444'N 43° 16.138'E	10,000,000	25+570	6,911,239,000	2017-11-07	2017-11-19	مستمر	82.5%	65.5%	-17%	الانحراف بسبب تأخر وصول المعدات الاستيرادية من تركيا ، توجيه كتاب حث للشركة المنفذة.
31	اعادة تاهيل جسر هيت الحديدي	طرق وجسور		200000	180	1,983,315,000	2017-12-07	2017-12-17	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			20,213,800		36,832,023,800							

مشاريع محافظة الانبار للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / ٢٠١٧

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	اصلاح وتاهيل طريق الرمادي-هيت/ الرمادي/ الانبار	طرق وجسور	33 25 36.6N 42 58 36.1E	400,000	145	285,000,000	312,200,000	2017-07-30	2017-08-21	2018-03-01	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	إعادة انشاء القسم البلدي السادس/ الرمادي الانبار	البلديات	33 24 46.0N 43 12 51.0E	100,000	180	220,575,000	242,575,000	2017-08-02	2017-08-29	25/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	تاهيل بناية الاقسام الداخلية في قضاء الفلوجة/ الانبار	التعليم العالي		500.00	80	211,829,000	229,851,000	2017-10-15	2017-10-29	2018-05-02	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	تأهيل المحطات الاروائية في جزيرة وشامية الرمادي/ الانبار	موارد مائية												
5	تأهيل محطات البزل في جزيرة وشامية الرمادي / الانبار	موارد مائية			25+90	877,170,000	920,790,000	2017-10-17	2017-10-29	19/2/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	اعادة انشاء قناطر في البوعيثة	موارد مائية												
7	اعادة انشاء السياج الامني لقضاء هيت / الانبار	دوائر حكومية		150,000		99,750,000	99,750,000	تنفيذ امانة	\	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	مجمع ماء الحميدية	ماء		12000		100,000,000	100,000,000	تنفيذ امانة	\	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	مجمع ماء الصبيحات	ماء		10000		36,800,000	36,800,000	تنفيذ امانة	\	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تجهيز وتنفيذ وتنصيب محطة تحويل الحضرة ٣٣/١١ كي في سعة ٢*٣١,٥ ام في أي/ هيت/الانبار	كهرباء		200,000	25+90	361,000,000	396,779,980	2017-10-18	2017-10-30	17/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تاهيل شارع المعارض الى تقاطع الفرسان في الرمادي/ الانبار	البلدية		100,000	60+140	2,123,020,000	2,250,940,000	2017-10-22	2017-11-05	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	تاهيل شارع من تقاطع الفرسان الى تقاطع شارع (٢٠) الرمادي/الانبار	البلدية		100,000	25+140	967,828,000	1,037,349,000	2017-10-22	2017-11-06	2018-04-06	100%	100%	0%	انجاز العمل

13	تجهيز ونصب محطة تحويل المشتل ٣٣/١١ كي في /هيت/الانبار	كهرباء		150,000	25+140	472,473,000	507,653,000	2017-10-22	2017-11-14	14/4/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
14	إعادة تاهيل خط كهرباء غرب بغداد - حديثة ٤٠٠ كي في /عموم محافظة الانبار	كهرباء		1,500,000	140	2,710,350,000	2,710,350,000	2017-10-25	2017-11-14	متوقف	0%	متوقف	متوقف	المشروع متوقف بسبب مشاكل تعاقدية
15	تاهيل ابنية دائرة البلدية /القسم البلدي الثاني/الرمادي/الانبار	البلديات		200,000	70+170	373,752,000	410,812,000	2017-10-26	2017-11-06	2018-05-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
16	تاهيل انية دائرة البلدية القسم البلدي الرابع/ الرمادي الانبار	البلديات												
17	اعادة انشاء مديرية شرطة نموذجية في قضاء الفلوجة	الداخلية		250,000	25+150	974,585,000	1,052,385,000	2017-10-30	2017-11-19	24/5/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
18	الشارع الرابط بين تقاطع شارع عشرين الى شارع الملعب	البلدية		100,000	30+120	983,270,000	1,081,365,125	2017-11-12	2017-11-14	19/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
19	العبارة النهريه في هيت (البانتونات)	طرق وجسور		75,000	30	194,400,000	211,900,000	2017-11-14	2017-11-23	23/12/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
20	تأهيل بناية قسمي الفيزياء والعربي في كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة الانبار	التعليم العالي		8,000	25+75	360,895,000	391,961,300	2017-12-04		2018-04-07	100%	100%	4%	انجاز العمل
21	تأهيل بناية القاعات الدراسية في كلية الزراعة / جامعة الانبار	التعليم العالي												
	المجموع			3,355,500		11,352,697,000	11,993,461,405							

مدرسة دار السلام / هيت / (قبل الاعمار)

مدرسة دارالسلام / هيت / الانبار(صعب نقل مواد البناء)

مدرسة دار السلام / هيت / الانبار

اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت

اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي – هيت (انفجار عبوة)

اعمار وإعادة تأهيل طريق الرمادي - هيت

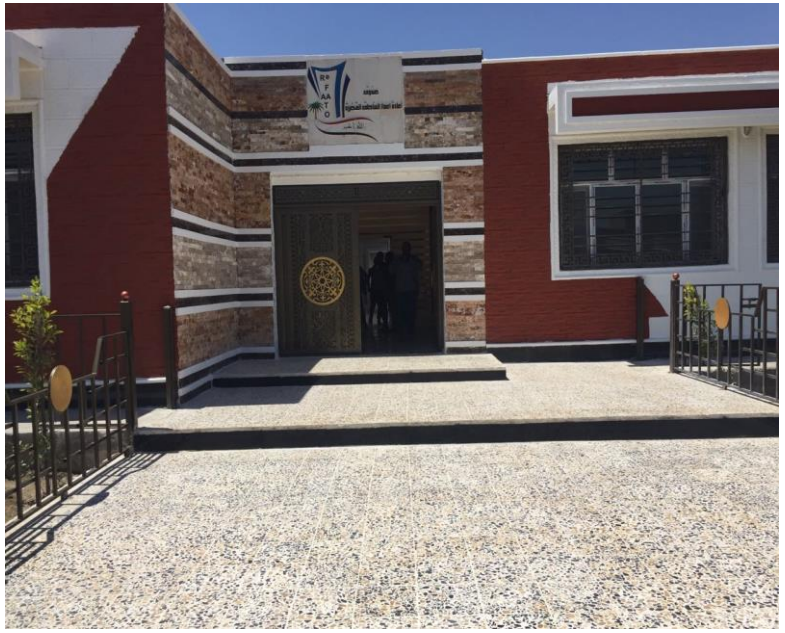

مدرسة السلوى / الفلوجة الانبار

مدرسة جنة المأوى / الرمادي / الانبار

تاهيل مباني كلية الزراعة/جامعة الانبار/ الرمادي / الانبار

مدرسة ابي ذر الغفاري / الجزيرة / الرمادي / الانبار

مدرسة الصمد / هيت / الانبار

مدرسة المأمون / الرمادي / الانبار

إعادة تاهيل مستشفى هيت العام

ثانوية الشيماء للبنات / الانبار

إعادة تاهيل جسر هيت

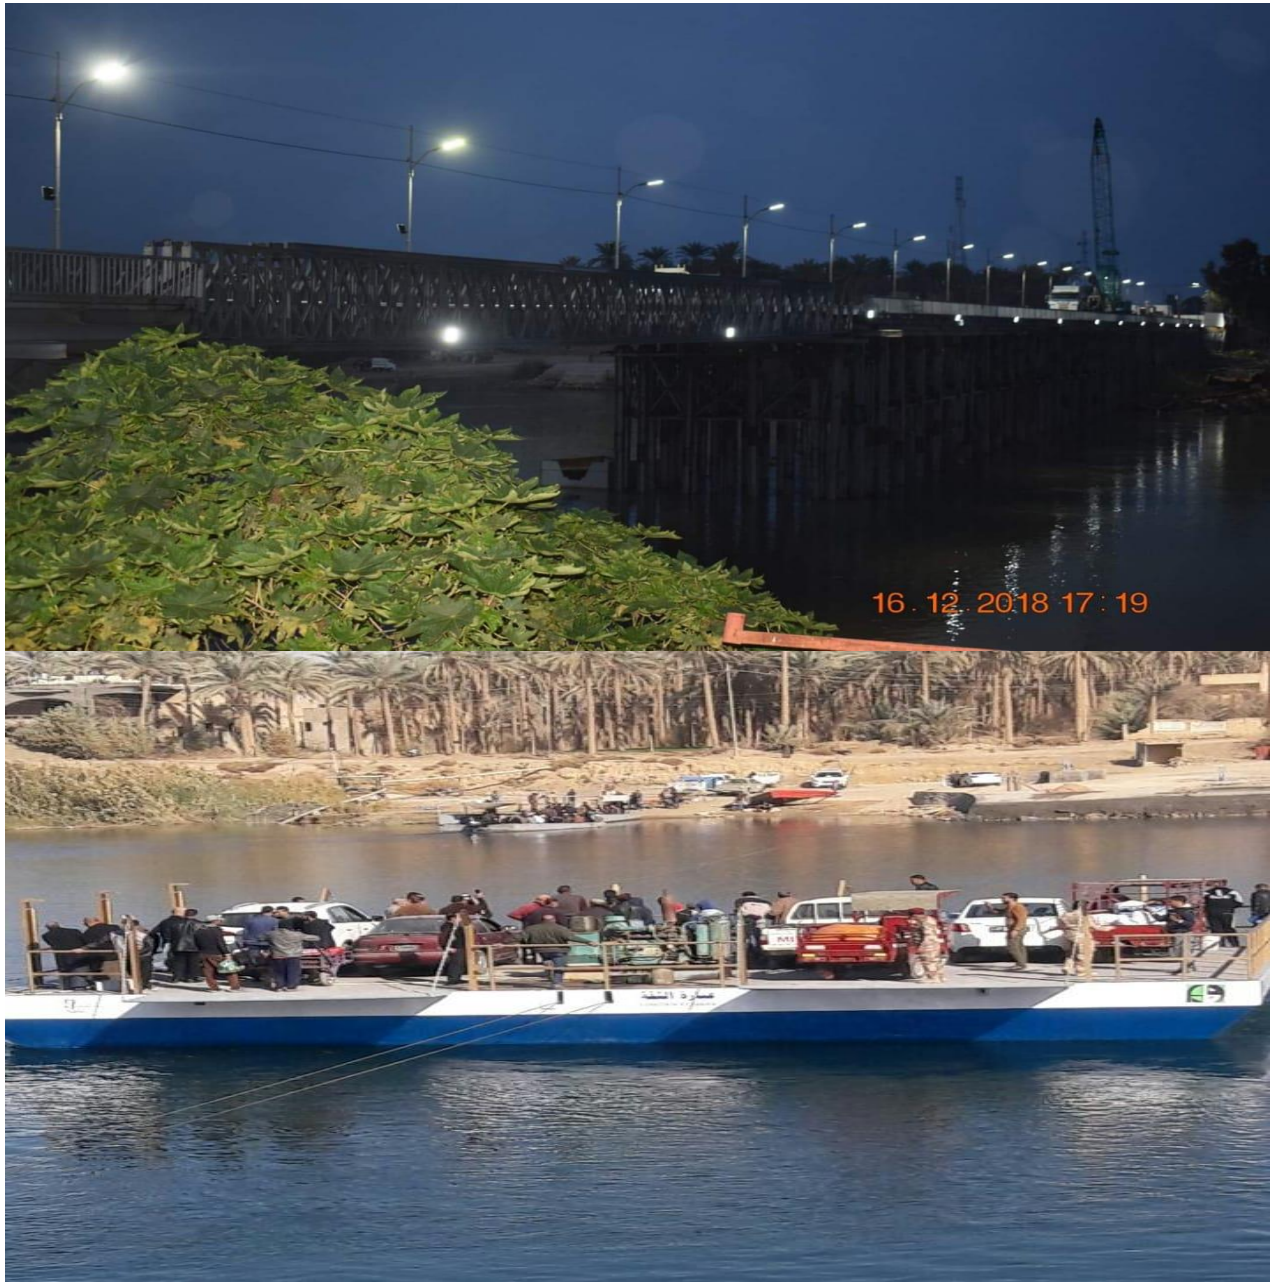

العبارة (حل مؤقت أثناء إعادة تأهيل الجسر)

هدم وإعادة بناء القسم البلدي السادس / الرمادي / الأنبار

هدم وإعادة بناء مدرسة الفتوة / الأنبار

إعادة بناء سدة الرمادي على نهر الفرات / الرمادي / الأنبار

تجهيز و ونصب محطة المشتل ٣٣/١١ كي في / هيت / الانبار

مشاريع محافظة صلاح الدين

مشاريع محافظة صلاح الدين للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / ٢٠١٧

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة الدور الأولى للبنات ١٢ صف/ الدور - صلاح الدين	التربية	34 27 26.2N 47 47 18.5 E	450	92+180	716,944,000	729,733,400	2017-07-25	2017-08-05	2018-05-08	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	ثانوية الفرقان ١٨ صف/ تكريت /صلاح الدين	التربية	34 26 18.0N 43 40 35.5E	700	120+170	1,119,644,000	1,194,869,900	2017-07-30	2017-08-28	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	مدرسة حفص الدوري للبنين ٦ صف/ الدور/ صلاح الدين	التربية	34 27 42.8N 43 50 31.3E	255	12+120	330,000,000	339,733,500	2017-08-03	2017-08-21	2018-07-03	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية ٦ صف/تكريت صلاح الدين	التربية	34 26 42.9N 43 44 05.2E	250	33+180	303,645,000	303,645,000	2017-08-13	2017-08-22	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	روضة الفارس العربي ٤ صف/ تكريت / صلاح الدين	التربية	34 36 06.9 N 43 40 32.9 E	350	96+180	417,595,000	417,595,000	2017-08-13	2017-08-28	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	مدرسة الاشاوس للبنين ٩ صف/ ناحية مكيشيفة/ تكريت/	التربية	34 18 23.4N 43 46 59.1E	140	95+180	469,258,000	506,420,100	2017-08-24	2017-09-11	25/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	تاهيل اقسام داخلية للطالبات وقاعة الدري لمعهد الدور التقني /الدور -صلاح الدين	التعليم العالي	34 27 36N 43 48 34E	3000	10+150	484,140,000	484,140,000	2017-09-25	2017-10-04	2018-12-09	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	مد شبكة مياه تصريف الامطار واعمال الانارة والتبليط للطريق من مستشفى الحارث الى الوادي وبطول ١٨٠٠ م طول / الضلوعية - صلاح الدين	البلديات	37 68 92N 42 77 17 E	25,000	80+150	994,050,000	1,083,067,000	2017-09-26	2017-10-10	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	اعمال اعادة بناء اقسام داخلية للطلاب عدد/٤ جامعة تكريت	التعليم العالي	34° 40.717'N 43° 38.914'E	4,000	78+240	754,370,000	730,462,000	2017-12-11	2017-12-20	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تجهيز مواد لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم صلاح الدين (أعمدة)	كهرباء		50,000	20	144,600,000	144,600,000	2017-12-14		منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	تجهيز مواد لتأهيل الشبكة الكهربائية في عموم صلاح الدين (محولات)	كهرباء		25,000	30	939,000,000	939,000,000	2017-12-14		منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			109,145		6,673,246,000	6,873,265,900							

مشاريع محافظة صلاح الدين للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / ٢٠١٧

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تاهيل وتشغيل وحدة ماء العيثة سعة ٢٠٠م٣/ساعة/ الشرقاط /صلاح الدين	ماء	35 63 864N 43 24 181E	27,000	120	257900000	257900000	2017-07-25	2017-08-06	17/12/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	تاهيل وتشغيل وحدة ماء الحجاج سعة ٢٠٠م٣/ساعة/بيجي/ صلاح الدين	ماء	34 85 308N 43 54 104E											
3	اكساء شارع معهد الدور في قضاء الدور/صلاح الدين	البلديات	34 28 12N 43 47 38.16E	10,000	80	435,000,000	435,000,000	2017-09-17	2017-09-26	مستمر	100%	95%	5%	تم توجيه كتاب انذار للمقاول بسبب تلكؤنه بإنجاز الملاحظات
4	تاهيل واكمال بناية شرطة الدور وسيطرة العلم/العلم/ صلاح الدين	الداخلية	21 49 34 .27N 26 76 43 47E	40,000	10+90	307,000,000	324,387,000	2017-09-17	2017-10-01	16/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تأهيل مقرات مديريات (التدخل السريع (سوات) ومكافحة المتفجرات وانضباط الشرطة) وقاعة الشهيد صالح عويد/ تكريت/ صلاح الدين	الداخلية	3.21 34 37N 23.44 43 40E	30,000	85	455,595,000	455,595,000	2017-09-25	2017-10-05	20/12/2017	100%	100%	0	انجاز العمل
6	تاهيل الشارع الرابط بين شارع الزهور والشارع الحولي/ تكريت/ صلاح الدين	البلديات	34 35 159N 43 40 425E	150,000	20+80	762,737,000	767,215,000	2017-09-25	2017-10-02	26/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	إعادة تاهيل الشارع الممتد من تقاطع المجلس القديم باتجاه القادسية بطول ٦٨٠ م/ تكريت /صلاح الدين	البلديات	37 68 92N 42 77 17 E											
8	تاهيل مبنى مختبر صلاح الدين الانشائي/ تكريت /صلاح الدين	البلديات	43 40 58.16E 34 34 47.29N	180,000	84	872,881,000	872,881,000	2017-10-03	2017-10-17	15/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	تاهيل مديرية كمارك صلاح الدين/ تكريت /صلاح الدين	البلديات	43 41 01.95E 34 35 11.93N											
10	تاهيل مديرية إحصاء صلاح الدين/ تكريت / صلاح الدين	البلديات	43 41 02.27E 34 35 13.79N											
11	تاهيل بناية ناحية دجلة المتضررة من الاعمال الإرهابية/سامراء/صلاح الدين	البلديات	43 44 11.1E 34 23 39.25N											
12	تاهيل مديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين	البلديات	43 41 01.15E 34 35 00.27N											
13	تجهيز مولدة مختلفة السعات لمشاريع الماء	ماء	مناطق متفرقة	80,000	90	1,173,000,000	1,173,000,000	2017-11-26	منجز		100%	100%	0%	انجاز العمل
14	تجهيز مولدة مختلفة السعات لمحطات الرفع والضخ لمشاريع الصرف الصحي	البلديات	مناطق متفرقة			561,000,000	561,000,000							
15	تجهيز غواطس عدد / ٥ لمحطات ضخ مياه الامطار الأولى والثانية في قضاء الدجيل - صلاح الدين	ماء		75,000	30	95,450,000	95,450,000	2017-12-04	منجز	30/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
16	تجهيز غواطس نهرية ومضخات الدفع لمجمعات الماء في شاطئ الجدر وهيجل الكبير والفياض الثاني وشهيد احمد وسديرة الوسطى	ماء		50,000	45	187,250,000	187,250,000	2017-12-10	منجز	22/2/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
17	تجهيز مواد لصيانة شبكة كهرباء مركز قضاء الطوز وامرلي (أعمدة)	كهرباء		50,000	20	75,300,000	75,300,000	2017-12-14	منجز		100%	100%	0%	انجاز العمل
	تجهيز مواد لصيانة شبكة كهرباء مركز قضاء الطوز وامرلي (محولات)	كهرباء		50,000	30	469,500,000	469,500,000	2017-12-14	منجز		100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			742,000		5,652,613,000	5,674,478,000							

مدرسة حفص الدوري / قرية أبي دلف / الدور/ صلاح الدين

مدرسة الدور الأولى / الدور/ صلاح الدين

قاعة الشهيد صالح عويد / تكريت / صلاح الدين

إعادة تأهيل مقر إدارة (سوات)

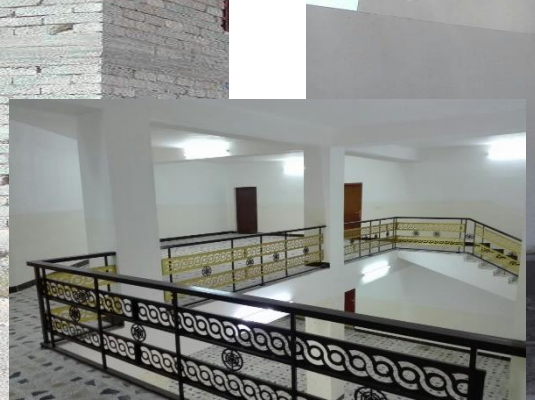

مركز شرطة الدور \ صلاح الدين

ثانوية الفرقان / صلاح الدين

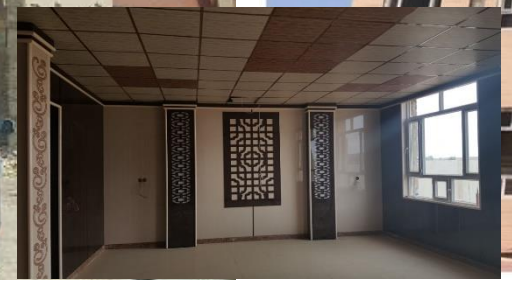

إعادة تأهيل بناية ناحية دجلة / سامراء / صلاح الدين

تأهيل مديرية الزراعة / صلاح الدين

تأهيل الأقسام الداخلية للطالبات \ المعهد الفني / الدور / صلاح الدين

إعادة تأهيل شارع معهد الدور / صلاح الدين

محطة ماء الحويجة / تكريت / صلاح الدين

مشاريع محافظة كركوك

مشاريع محافظة كركوك للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / ٢٠١٧

ت	المشروع	القطاع	GPS	اعداد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع	كلفة المشروع بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	هدم وإعادة بناء مدرسة الشهيد الابتدائية ٦ صف/كركوك	التربية	35 14.653N 44 16.121E	180	165	306,926,000	306,926,000	2017-07-23	2017-08-03	29/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	هدم وإعادة بناء مدرسة الامام حسن الابتدائية ٦ صف/ كركوك	التربية	35 13.101N 44 16 .902E	180	165	306,926,000	309,656,000	2017-07-23	2017-08-03	27/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			360		613,852,000	616,582,000							

مشاريع محافظة كركوك للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / ٢٠١٧

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	إعادة تاهيل الشبكات الكهربائية	كهرباء	35 27 .117N 44 11 .325E	5,200	30	153,734,000	153,734,000	2017-07-31	2017-08-10	31/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	إعادة تاهيل الشبكات الكهربائية في قرى ملا عبدالله وادريس خباز وادريس خزعل والهندية ١,٢/كركوك													
3	تاهيل وتشغيل مجمع ماء بطاقة (٥٠)م٣/ساعة في قرية قرتبة- ناحية يايجي/كركوك	ماء	35 24 .107N 44 21.151E	3,800	85	71,281,000	71,281,000	2017-07-31	2017-08-03	14/11/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	صيانة طريق الشمسية/كركوك	البلديات	35 14 .511N 44 16.217E	4,000	55	189,340,000	189,340,000	2017-08-03	2017-08-03	24/9/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تبليط شوارع داخلية بالكونكريت قرب مدرسة الوقف الشيعي في قصر البشير)/ كركوك	البلديات												
6	تجهيز محولات الى قضاء الحويجة	كهرباء		250,000	30	1,689,000,000	1,689,000,000	2017-12-14			100%	100%	0%	انجاز العمل
7	ايصال الماء الى قرية الهندية الجديدة / ناحية الملتقى	ماء		20,000		55,600,000	55,600,000	تنفيذ امانة		15/1/2018	100%	100%		انجاز العمل
8	تاهيل وتبليط طريق كركوك الحويجة قرب مجسر خالد	طرق وجسور		75,000		63,200,000	63,200,000	تنفيذ امانة		24/12/2017	100%	100%		انجاز العمل
9	تاهيل محطة ماء مزهر العاصي/ الحويجة	ماء		12,500		69,600,000	69,600,000	تنفيذ امانة		25/12/2017	100%	100%		انجاز العمل
	المجموع			370,500		2,291,755,000	2,291,755,000							

إعادة تأهيل وتبليط طريق كركوك - الحويجة بالقرب من مجسر خالد

إعادة تأهيل محطة ماء مزهر العاصي / الحويجة

أعادة بناء مدرسة الشهيد الابتدائية / البشير / كركوك

تاهيل شبكة ماء قرية الهندية الجديدة / الملتقى / كركوك

إعادة تأهيل وصب شوارع في قرية البشير / كركوك

إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في قرية الملا عبد الله / كركوك

مشاريع محافظة ديالى

Diyala Governorate Projects

مشاريع محافظة ديالى للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / ٢٠١٧

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)+المدة الاضافية	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة امر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة المامون /١٢ صف/ العظيم/الخالص/ديالى	التربية	34.273507 N 44. 542155E	720	107+180	752,704,000	745,105,400	2017-07-23	2017-09-26		100%	100%	0%	انجاز العمل
2	مدرسة الهديل /٩ صف/الصدور/المقدادية/ديالى	التربية	34 03 44.1N 44 59 00.6E	600	168+63	461,667,000	505,058,200	2017-07-25	2017-09-24	2019-02-18	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	مدرسة ابن زيدون	التربية	34 01 30N 44 57 32.1E	600	160	775,658,000	775,658,000				100%	0%	100%	تم فسخ العقد رضائياً مع المقاول
4	تبليط شارع من جسر محمود العلي الى جسر سراجق دلي عباس بطول (٦كم)	الطرق	34 01 41.7N 44 45 17.4E	2,200	120	449,000,000	449,000,000	2017-11-12	2017-11-29	2018-04-04	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تبليط واكساء شوارع في منطقة الشرقية والغربية في ناحية سد العظيم (تبليط شوارع داخل حدود البلدية ناحية سد/العظيم)	الطرق		3800	60	390,420,000	390,420,000	2017-11-13	2017-12-25	13/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	صب شوارع حي الاسراء في السعدية	الطرق	34 11 18.24N 45 07 08.5E	2,500	45	116,040,000	116,040,000	2017-11-13	2017-12-04	17/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	تبليط طرق في المقدادية بطول (٥ كم)	الطرق		10,000	60	348,860,000	348,860,000	2017-11-13	2017-12-13	28/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تأهيل الشارع العام لمدينة جلولاء الرئيسي	الطرق	34 15 41.59N 45 9 29.47E	200000	90	259,563,500	259,563,500	2017-11-13	2018-01-02	20/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
9	فرش خابط بطول (١٢كم) من جسر شاقراق – قرية العباسية الى قرية العالي وزحام الاسيود	الطرق		2000	90	168,750,000	168,750,000	2017-11-07	2017-11-19	2018-08-02	100%	100%	0%	انجاز العمل
10	تبليط شوارع داخل حدود البلدية /بلدية المنصورية بطول ١٦٥٠ م	الطرق		8000	40	375,373,250	375,373,250	2017-11-22	2017-12-06	25/3/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
11	تبليط شوارع في قرى شيروين بطول ٦,٥ كم / المنصورية شيروين/ ديالى	الطرق	34 04 13 N 44 88 08E	10000	12+180	559,485,000	559,484,000	2017-11-13	2017-11-19	24/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
12	تاهيل الشارع رقم ٢١ المار ضمن م٣١١ و ٣١٣ بطول ١,٤كم للمقطع ما بين المستوصف الصحي واستدارة الدور الجاهزة في حي التحرير/بعقوبة/ديالى	الطرق	46 82 27.411E 37 32 93 2.28N	4500	100	195,720,000	195,720,000	2018-05-06	20/6/2018	2019-02-07	100%	100%	0%	انجاز العمل
13	مشروع تاهيل شبكة انارة شوارع ناحية كنعان- بعقوبة/ديالى	الكهرباء		45		111,220,000	111,220,000	2018-07-06	21/6/2018	29/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
14	مشروع صيانة واكساء وتبليط طرق وقرى بلد روز- قرية عتبة بطول ٧,٥ كم - قرية اطعيمات ١,٥ قضاء بلدروز/ديالى	الطرق	33 40 39.7N 45 01 36.3E	8000	120	921,260,000	921,260,000	20/6/2018	2018-04-07	31/10/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
15	مشروع تبليط شارع ام العظام العثمانية بطول ٢,١٥ كم قضاء بعقوبة/ديالى	الطرق	33 39 19N 44 37 35.7E	1000	75	227,020,000	227,020,000	25/6/2018	19/7/2018	2018-03-10	100%	100%	0%	انجاز العمل
16	مشروع تبليط شوارع بطول ١,٨ كم لقرى خان بني سعد - بعقوبة (ربيع عطشانة وعلي الهادي والشيماء)/ديالى	الطرق	33 56 6 87N 44 54 89 57E	2500	30	185,040,000	185,040,000	25/6/2018	19/7/2018	2018-09-08	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			256420		6,297,780,750	6,333,572,350							

مشاريع محافظة ديالى للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / ٢٠١٧

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تاهيل مجمع ماء سويد وزحام والعالي وبسعة ٢٠٠ م٣/ ساعة/المقدادية/ ديالى	ماء	34 03 46 N 44 58 35 E	13,500	60	385,400,000	385,400,000	2017-07-20	2017-08-27	26/10/2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	تاهيل مجمع ماء نوفل والصدور والهارونية سعة ٢٠٠ م٣ / ساعة /المقدادية /ديالى	ماء	34 02 79.1N 44 58 54.3E											
3	تجهيز ونصب محطة تحلية بطاقة ٢٠٠م٣ / ساعة قرية حد مزيد/ بعقوبة/ديالى	ماء	33 48 06 N 44 44 09 E											
4	تاهيل شارع السوق في ناحية السعدية/ديالى	البلديات	30 11 23.01N 45 07 13.63E	35,000	35	106,750,000	106,750,000	2017-07-31	2017-09-14	18/10/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			48,500		492,150,000	492,150,000							

تبليط شوارع / قرية علي الهادي / خان بني سعد / ديالى

تبليط الشوارع وعمل أرصفة داخل الحدود البلدية بطول(١٦٥٠ م) / المنصورية / ديالى

إعادة تأهيل الشارع العام الرئيسي / جلولاء / ديالى

تأهيل وتبليط شارع السوق / السعدية / ديالى

مدرسة المأمون / ديالى

مشاريع محافظة بابل

مشاريع محافظة بابل / شمال بابل للموازنة الفيدرالية / الخطة الاستثمارية / ٢٠١٧

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تجهيز وفحص وتنفيذ خطوط جهد (١١ كي.في) في قطاع المسيب / بابل	كهرباء		11,568	150	819,788,000	819,788,000	21-11-2017	26/11/2018		0%	0%	0%	متوقف منذ تاريخ توقيع العقد بسبب وجود مشاكل فنية
	المجموع					819,788,000	819,788,000							

مشاريع محافظة بابل / شمال بابل للموازنة الفيدرالية /البرامج الخاصة / ٢٠١٧

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	صيانة طريق الحامية - صنيديج بطول ٣,٥ كم/جرف النصر/شمال بابل	طرق وجسور	43 22 34 X 36 27 763 Y	12,500	40	287,125,000	287,125,000	13-08-2017	13-08-2017	09-05-2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	مد واستبدال شبكة ماء متفرقة في حي المواطنين والحي العسكري/جرف النصر/شمال بابل	ماء	32 46 32.1N 44 15 48.3E	18,000	50	298,620,000	298,620,000	13-08-2017	14-08-2017	10-04-2017	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	مد واستبدال شبكة ماء الحامية/جرف النصر/شمال بابل	ماء	32 48 28.4 N 44 15 53.9 E											
4	مد واستبدال شبكة ماء القاطع الشمالي ١ (الفاضلية ١)/جرف النصر /شمال بابل	ماء	33 00 53.5N 44 09 56.1 E											
5	مد واستبدال شبكة ماء القاطع الشمالي ٢ (الفاضلية ٢)/جرف النصر/شمال بابل	ماء	33 00 49.6N 44 08 36 E											
6	صيانة طريق الخضر بمحاذاة نهر الفرات بطول ١٨ كيلو	طرق وجسور	43 46 70X 36 33 44 6Y	15,000	60	558,560,000	558,539,520	16-11-2017	19-11-2017	18/1/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			45,500		1,144,305,000	1,144,284,520							

استبدال شبكة الماء / شمال بابل

إعادة تاهيل الطريق (الحامية - صنديج) / جرف النصر / بابل

تاهيل طريق الخضر على طول نهر الفرات لمسافة ١٨ كم

Baghdad Governorate Projects

مشاريع محافظة بغداد/ حزام بغداد للموازنة الفيدارلية / الخطة الاستثمارية / ٢٠١٧

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	الكلفة الكلية بعد اضافة اوامر الغيار	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	مدرسة حافظ إبراهيم الابتدائية ٦ صف/ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 195 557N 43 968 712E	360	59+70	349,240,000	380,255,000	23-07-2017	11-09-2017	24/6/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	مدرسة المسجد الأقصى الابتدائية ٩ صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 213 317N 43 892 967 E	600	170124+170	479,647,000	513,436,400	26-07-2017	11-09-2017	08-05-2018	100%	100%	87%	انجاز العمل
3	مدرسة إبراهيم طوقان الابتدائية ٩ صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 209 976N 43 930 087E	600	51+175	400,366,000	440,344,000	30-07-2017	11-09-2017	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	مدرسة عزالدين القسام الابتدائية ١٨ صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 216 750 N 43 879 541 E	900	105+200	827,057,000	815,204,000	30-07-2017	11-09-2017	17/9/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	مدرسة أسماء بنت أبو بكر ٩ صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 216 750 N 43 879 541 E	600	111+180	398,228,000	437,960,200	30-07-2017	11-09-2017	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
6	مدرسة الزخرف ٩ صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 219 497 N 43 911 557E	600	126+190	1,024,768,500	1,073,136,960	02-08-2017	11-09-2017	19/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
7	مدرسة الخوارزمي الابتدائية ٩ صف//ناحية النصر والسلام/أبو غريب/بغداد	التربية	33 394 093N 44 037 368E	600	124+180	425,137,000	466,368,600	03-08-2017	11-09-2017	15/7/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
8	تاهيل ناظم صدر ابو غريب والناظم القاطع في كيلو (٨) من القناة الموحدة والمنشآت الاخرى.	الموارد المائية		2,000,000	100+120	830,278,500	899,346,750	07-11-2017	20-11-2017	14/8/2018	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			2,004,260		4,734,722,000	5,026,051,910							

مشاريع محافظة بغداد/ حزام بغداد للموازنة الفيدرالية / البرامج الخاصة / ٢٠١٧

ت	المشروع	القطاع	GPS	عدد المستفيدين	مدة المشروع (يوم)	كلفة المشروع (دينار)	تاريخ العقد	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الإنجاز الفعلية	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف
1	تجهيز وتنفيذ ونصب شبكات كهرباء في ناحية النصر والسلام/ أبو غريب/حزام	كهرباء		2000	50	438,843,370	13-08-2017	24-08-2017	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
2	تاهيل شبكات كهرباء (تجهيز محولات) أبو غريب/حزام بغداد	كهرباء		15000	15	255,600,000	18-10-2017	قيد التنفيذ	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
3	انشاء جسر عودة الشكر في الرفوش	الطرق والجسور		25000	30	88,225,000		تنفيذ امانة	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
4	تاهيل محطات ماء (السعدان, الهيتاويين, فزع شنيتر)	ماء		10,000		284,350,000		تنفيذ امانة	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
5	تطوير موقع الصندوق	دوائر حكومية				100,000,000		20-11-2017	منجز	100%	100%	0%	انجاز العمل
	المجموع			52000		1,167,018,370							

جسر عودة الشكر / حزام أبو غريب / بغداد

إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قرى أبو غريب / حزام بغداد

مدرسة المسجد الأقصى الابتدائية / بغداد / حزام بغداد

(إعادة تأهيل محطة ماء السعدان / أبو غريب / حزام بغداد)

(إعادة تأهيل محطة ماء الهيتاويين / أبو غريب / حزام بغداد)

مشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية
حسب المحافظات لعام ٢٠١٨

مشاريع محافظة نينوى

الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام ٢٠١٨ / نينوى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	اعادة تاهيل مستشفى تلعفر العام	تلعفر	الصحة	1,500,057,600	قيد التنفيذ	64%	12	13/11/2018	180	27/11/2018	27/11/2018	1,038,672,000
2	صيانة واعادة تاهيل القنطرة الصندوقية السداسية الواقعة على طريق موصل بغداد في المحطة (٣٢+٠٠٠) على وادي القصب ولممري الذهاب والاياب بطول ٦٥م	القيارة	الطرق والجسور	1,133,118,000	متوقف بسبب الامطار والسيول	4%	16	18/11/2018	180	1/12/2018	27/11/2018	830,406,000
3	اعادة اعمار بناية المركز الطلابي و وحدة الرياضة الجامعية في الكلية التقنية	الموصل	التربية والتعليم	795,075,500	قيد التنفيذ	32%	140	31/12/2018	200	14/1/2019	14/1/2019	553,100,000
4	ترميم بناية المجمع الاذاعي والتتلفزيوني / الفيصلية	الموصل	مباني حكومية	847,492,500	قيد التنفيذ	75%	28	29/11/2018	150	12/12/2018	3/12/2018	589,560,000
5	اعادة تاهيل سقانف لمخزن المواد الغذائية الكرامة (١)	الموصل	مباني حكومية	3,222,914,440	قيد التنفيذ	18%	35	4/12/2018	240	18/12/2018	18/12/2018	2,254,676,800
6	تاهيل ابنية الاقسام الداخلية – مجمع القادسية / جامعة الموصل	الموصل	التربية والتعليم	728,841,250	قيد التنفيذ	24%	111	19/12/2018	220	2/1/2019	2/1/2019	509,927,000
7	تاهيل وصيانة جسر الحضر والاجزاء المتضررة في الطريق الرابط بين طريق (موصل – بغداد) والمنطقة الاثرية في الحضر (المرحلة الاولى)	الحضر	الطرق والجسور	2,149,435,150	قيد التنفيذ	1%	99	18/12/2018	240	1/1/2019	1/1/2019	1,501,358,000
8	اعادة تاهيل المشروع الوطني لمديرية المرور في الشلالات / المرحلة الاولى	الموصل	الداخلية	2,827,966,000	متوقف / لوجود ساتر امني يمنع وصول الاليات	12%	132	30/12/2018	550	13/1/2019	10/1/2019	1,961,520,000
9	تاهيل بناية كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل	الموصل	التربية والتعليم	2,200,994,500	متوقف / لاسباب تعود الى المقاول	8%	41	4/12/2018	200	18/12/2018	18/12/2018	1,537,540,000
10	هدم واعادة بناء ثانوية تل واعي للبنين ١٢ صف	حمام العليل	التربية والتعليم	832,731,100	قيد التنفيذ	20%	44	5/12/2018	240	19/12/2018	13/12/2018	579,291,200
11	هدم واعادة بناء ثانوية فلفيل ١٢ صف	تلكيف	التربية والتعليم	832,731,100	قيد التنفيذ	20%	51	5/12/2018	240	19/12/2018	13/12/2018	579,291,200
12	هدم واعادة بناء متوسطة علي بن ابي طالب للبنين ١٢صف	الأيمن	التربية والتعليم	832,731,100	قيد التنفيذ	7%	45	5/12/2018	240	19/12/2018	13/12/2018	579,291,200

13	هدم واعادة بناء متوسطة المسعودي ١٢ صف	الايسر	التربية والتعليم	832,731,100	قيد التنفيذ	23%	36	4/12/2018	240	18/12/2018	16/12/2018	579,291,200
14	هدم واعادة بناء مدرسة كركافر ١٢ صف	تلعفر	التربية والتعليم	734,602,750	قيد التنفيذ	5%	76	13/12/2018	220	27/12/2018	27/12/2018	511,028,000
15	هدم واعادة بناء مدرسة العامل للبنين ١٢ صف	الأيمن	التربية والتعليم	734,602,750	قيد التنفيذ	12%	75	13/12/2018	220	27/12/2018	27/12/2018	511,028,000
16	هدم واعادة بناء مدرسة الحدباء للبنين ١٢ صف	الأيمن	التربية والتعليم	734,602,750	قيد التنفيذ	8%	74	13/12/2018	220	27/12/2018	27/12/2018	511,028,000
17	هدم واعادة بناء مدرسة العطاء للبنات ١٢ صف	الايسر	التربية والتعليم	734,602,750	قيد التنفيذ	12%	73	13/12/2018	220	27/12/2018	27/12/2018	511,028,000
18	هدم واعادة بناء مدرسة القدس الابتدائية للبنين ١٢ صف	الأيمن	التربية والتعليم	734,602,750	قيد التنفيذ	24%	88	13/12/2018	220	27/12/2018	27/12/2018	511,028,000
19	هدم واعادة بناء مدرسة ابن رشد للبنين ١٢ صف	الايسر	التربية والتعليم	734,602,750	قيد التنفيذ	20%	126	26/12/2018	220	8/1/2019	17/1/2019	511,028,000
20	تاهيل مجمع مخازن الحرية وتاهيل مباني الشركة العامة لتصنيع الحبوب	الموصل	مباني حكومية	3,964,476,360	قيد التنفيذ	14%	125	26/12/2018	450	8/1/2019	23/1/2019	2,775,071,200
21	تجهيز محولات قدرة ١٦ MVAلمحطات جهد ٣٣/١١ كف ومحولات توزيع جهد ١١/ ٠,٤ كف		الكهرباء	1,760,000,000	منجز	100%	8	23/10/2018	45			1,530,000,000
	تجهيز محولات توزيع سعة ٢٥٠KVA				منجز	100%	7	23/10/2018	45			177,500,000
22	تاهيل محطة كهرباء النسيج في الساحل الايمن	الموصل	الكهرباء	4,042,351,000	قيد التنفيذ	2%	135	30/12/2018	360	12/1/2019	12/1/2019	2,988,297,000
23	تاهيل محطة كهرباء الدواسه في الساحل الايمن	الموصل	الكهرباء	4,278,200,000	قيد التنفيذ	2%	39	4/12/2018	360	18/12/2018	17/12/2018	3,381,299,000
24	تأهيل محطة كهرباء باب البيض في الساحل الايمن	الموصل	الكهرباء	4,278,200,000	قيد التنفيذ	2%	38	4/12/2018	360	18/12/2018	17/12/2018	3,281,763,000
25	المعدات المطلوبة لورشة فحص وتصليح المحولات في الجانب الايمن	الأيمن	الكهرباء	483,500,000	قيد التنفيذ	5%	134	30/12/2018	100			382,221,000
26	صب ارصفة وبناء القوالب الجانبية للشارع الرئيسي في حي النصر وبربوش وصيانة الحفر والتخسفات في مناطق متفرقة / مركز قضاء سنجار	سنجار	البلدية و البلديات	249,977,800	منجز	100%	2	5/6/2018	60	19/6/2018	19/6/2018	188,480,000
	المجموع			42,201,141,000								30,864,723,800

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام ٢٠١٨ / نينوى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تجهيز جهاز التصوير المقطعي عدد ٢	الموصل	الصحة	1,765,795,940	قيد التنفيذ	5%	104	19/12/2018	180	2/1/2019		1,700,000,000
2	تجهيز جهاز الرنين المغناطيسي عدد ٢	الموصل	الصحة	2,825,273,503	قيد التنفيذ	5%	105	19/12/2018	180	2/1/2019		2,560,000,000
3	تجهيز جهاز كرسي أسنان متكامل عدد(٥٠)	عدة اقضية	الصحة	1,059,477,564	قيد التنفيذ	5%	110	19/12/2018	180	2/1/2019		964,375,000
4	إعادة تأهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق حي الخضراء	الموصل	الماء و المجاري	315,793,842	قيد التنفيذ	51%	72	13/12/2018	160	27/12/2018	27/12/2018	336,068,750
5	تاهيل المجرى الصندوقي في باب البيض	الموصل	الماء و المجاري	114,865,026	تنفيذ امانة / قيد التنفيذ	90%			60		24/12/2018	122,870,000
6	تاهيل وحدة معالجة المياه الثقيلة لشقق اليرموك	الموصل	الماء و المجاري	412,432,543	قيد التنفيذ	57%	71	13/12/2018	150	27/12/2018	27/12/2018	422,670,000
7	تاهيل بناية مخازن مديرية المجاري مع انشاء مسقفات عدد/٣ في وادي عكاب	الموصل	الماء و المجاري	659,767,580	متوقف	2%	42	4/12/2018	180	18/12/2018	18/12/2018	597,820,000
8	تاهيل بناية الهيئة العامة للضرائب في محافظة نينوى/ الجانب الايمن (عمارة التامين على الحياة)	الموصل	مباني حكومية	203,680,147	تنفيذ امانة / متوقف بسبب عائدية الأرض	صفر			60		24/12/2018	197,495,000
9	تاهيل مخازن مركز تكنولوجيا البذور/ موقع الموصل	الموصل	مباني حكومية	212,902,016	تنفيذ امانة / قيد التنفيذ	85%			60		24/12/2018	221,525,000
10	اعادة تأهيل قسم بحوث نينوى		مباني حكومية	219,778,026	قيد التنفيذ	90%	47	5/12/2018	100	19/12/2018	16/12/2018	232,313,000
11	إعادة اعمار بناية المعهد التقني نينوى		التربية والتعليم	825,120,685	قيد التنفيذ	60%	13	13/11/2018	180	27/11/2018	25/11/2018	747,647,600
12	اعادة اعمار بناية المختبرات العلمية في الكلية التقنية الزراعية / الموصل		التربية والتعليم			60%	13					

13	تاهيل ابنية مدرسية في الموصل / الجانب الأيمن (البتول والمواهب)	الموصل	التربية والتعليم	355,806,999	قيد التنفيذ	26%	87	13/12/2018	150	27/12/2018	27/12/2018	322,399,200
14	تأهيل بناية مديرية المخابرات في نينوى		مباني حكومية	633,730,919	قيد التنفيذ	27%	114	23/12/2018	180	5/1/2019	3/1/2019	574,228,000
15	إعادة تاهيل مراكز شرطة (اليرموك , الوقاص , النصر) المرحلة الثانية		الداخلية	388,404,033	قيد التنفيذ	97%	101	19/12/2018	120	2/1/2019	3/1/2019	356,390,600
16	تاهيل بناية الغرامات والحاسبة لمرور نينوى		الداخلية		قيد التنفيذ	97%	101					
17	أعادة بناء بناية مديرية مختبر نينوى الانشائي		مباني حكومية	520,508,084	قيد التنفيذ	30%	90	16/12/2018	180	30/12/2018	30/12/2018	471,636,000
18	صيانة و تاهيل جسر وادي المر على طريق (كسك - ربيعة)		الطرق والجسور	660,186,957	قيد التنفيذ	5%	89	13/12/2018	180	27/12/2018	27/12/2018	598,800,000
19	تاهيل طرق ناحية العياضية	تلعفر	الطرق والجسور	408,428,601	قيد التنفيذ	78%	83	13/12/2018	100	27/12/2018	27/12/2018	370,080,000
20	تجهيز محولات كهربائية (تجهيز محولات سعة(٤٠٠,٢٥٠) kvaعدد (١٨٥)محولة لمخزن الكرامة)		الكهرباء	1,103,622,462	قيد التنفيذ		117	23/12/2018	45	من تاريخ استلام الدفعة المقدمة	21/1/2019	1,418,500,000
21	تاهيل ابنية مدرسية في قضاء سنجار (مدرسة كوجو)	سنجار	التربية والتعليم	104,759,376	تنفيذ امانة / قيد التنفيذ	95%			60	3/1/2019	24/12/2018	118,654,000
22	تاهيل ابنية مدرسية في قضاء تلعفر مدرسة (اميرة الجنة و المنتظر و الجزيرة)	تلعفر	التربية والتعليم	106,157,886	تنفيذ امانة / منجز	100%			60	18/11/2018	24/12/2018	120,238,000
	المجموع			12,896,492,190								12,453,710,150

مشاريع محافظة الانبار

الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام ٢٠١٨ / الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة الكلية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	هدم واعادة بناء مركز صحي ودار سكن البوزعيان	الخالدية	الصحة	331,793,400	قيد التنفيذ	70%	124	26/12/2018	200	8/1/2019	8/1/2019	1,150,824,000
2	هدم واعادة بناء مركز صحي المضيق	الخالدية	الصحة	791,556,500		70%	124					
3	هدم واعادة بناء مركز صحي في البوبالي مع دار سكن	الخالدية	الصحة	349,555,150		70%	124					
4	هدم واعادة بناء جنسية راوه	راوه	الداخلية	652,143,150	قيد التنفيذ	28%	136	30/12/2018	180	13/1/2019	12/1/2019	907,329,600
5	هدم واعادة بناء جنسية عنه	عنه	الداخلية	652,143,150	قيد التنفيذ	5%	136		180			
6	هدم واعادة بناء البطاقة الوطنية في القائم	القائم	الداخلية	652,143,150	قيد التنفيذ	50%	138	30/12/2018	150	13/1/2019	13/1/2019	579,545,000
7	تاهيل دائرة البطاقة الوطنية في العبيدي		الداخلية	171,638,000	قيد التنفيذ	50%	138		150			
8	اعادة اعمار جسر وادي الفحيمي الاول	عنه	الطرق والجسور	906,085,000	قيد التنفيذ	65%	130	27/12/2018	180	9/1/2019	7/1/2019	633,920,000
9	اعادة اعمار جسر وادي زغيدان	حديثة	الطرق والجسور	671,600,000	قيد التنفيذ	95%	122	26/12/2018	180	8/1/2019	7/1/2019	467,200,000
10	اعادة اعمار جسر البغدادي العائم بطول ٤٢٠متر		الطرق والجسور	1,865,190,000	قيد التنفيذ	58%	131	30/12/2018	360	13/1/2019	12/1/2019	1,301,888,000
	المجموع			7,043,847,500								5,040,706,600

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام ٢٠١٨ / الانبار

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	صيانة مجمع ماء البوسودة سعة (٢٠٠م٣/سا)	الخالدية	الماء والمجاري	537,766,090	قيد التنفيذ	96%	19	22/11/2018	90	5/12/2018	16/12/2018	560,392,000
2	تجهيز ونصب وحدة مجمعة تقوية سعة ٢٠٠م٣/ساعة حي القدس والشهداء	الخالدية	الماء والمجاري			96%	19					
3	تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة ١٠٠م٣/ساعة (النسافالبوعلوان /البوراشد)	الفلوجة	الماء والمجاري	619,065,101	قيد التنفيذ	80%	56	6/12/2018	120	20/12/2018	20/12/2018	1,003,847,500
4	تأهيل مجمع ماء الاسباني/ الشهداء النعيمية	الفلوجة	الماء والمجاري			80%	56					
5	تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة ٢٠٠م٣/ساعة لمناطق الصبيحات	الفلوجة	الماء والمجاري			80%	56					
6	صيانة وتأهيل مجمع ماء بني زيد سعة (٢٠٠)م٣/س	الفلوجة	الماء والمجاري			80%	56					
7	تاهيل مجمع ماء سويحل و النهضة الشرقية/ القائم	القائم	الماء والمجاري	135,348,259	منجز	100%	50	5/12/2018	55	19/12/2018	2/1/2019	130,640,000
8	صيانة مجمع ماء الصروح سعة ٣٠٠ م٣/ساعة	هيت	الماء والمجاري	118,484,908	تنفيذ امانة / منجز	100%			60		19/12/2018	125,670,000
9	تجهيز ونصب وحدة تقوية سعة مليون غالون لمجمع ماء الخسفة	حديثة	الماء والمجاري	714,157,500	قيد التنفيذ	80%	52	5/12/2018	90	19/12/2018	3/1/2019	699,079,000
10	تاهيل مشروع ماء حديثة - حقلانية الموحد	حديثة	الماء والمجاري			80%	52					
11	تاهيل مجمع ماء حي الشرطة لناحية بروانة	حديثة	الماء والمجاري			80%	52					
12	صيانة مشروع ماء الجزيرة في الرمادي	الرمادي	الماء والمجاري	802,152,448	قيد التنفيذ	65%	62	11/12/2018	150	25/12/2018	24/12/2018	743,927,500
13	مد شبكة ماء في الاحياء الجنوبية لمدينة الفلوجة	الفلوجة	الماء والمجاري	1,059,373,382	قيد التنفيذ	90%	29	29/11/2018	80	11/12/2018		560,939,200
14	تنفيذ خط دكتايل من ناقل الخزان الى الحي العسكري	الفلوجة	الماء والمجاري			90%	29				24/12/2018	
15	مد شبكة ماء في حي الجمهورية وحي الشهداء	الفلوجة	الماء والمجاري			90%	29					
16	أنشاء خزان كونكريتي سعة (٧٥٠) م٣ في قضاء الرطبة	الرطبة	الماء والمجاري	180,199,476	تنفيذ امانة / منجز	100%			60		14/12/2018	197,212,000
17	تاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء حديثة	حديثة	الكهرباء	584,052,458	قيد التنفيذ	67%	100	18/12/2018	180	1/1/2019	5/1/2019	529,287,500
18	تأهيل الشبكة الكهربائية في ناحية حصيبة الشرقية / قضاء الخالدية	الخالدية	الكهرباء	192,118,598	منجز	100%	30	29/11/2018	150	12/12/2018	23/12/2018	202,198,000
19	تأهيل الشبكة الكهربائية في زوية غراب	الخالدية	الكهرباء			100%	30					
20	تاهيل الشبكات الكهربائية في قضاء الرطبة	الرطبة	الكهرباء	259,965,000	منجز	100%			60		26/12/2018	248,715,000

21	تاهيل الشبكة الكهربائية الهوائية المتضررة في قضاء الكرمة	الكرمة	الكهرباء	746,597,285	منجز	100%	46	5/12/2018	120	19/12/2018	17/12/2018	794,233,500
22	تجهيز مولد كهرباء / قائمقامية القائم	القائم	الكهرباء	22,000,000	شراء مباشر / منجز	100%						22,000,000
23	تجهيز مولد كهرباء / تربية القائم	القائم	الكهرباء	28,000,000	شراء مباشر / منجز	100%						28,000,000
24	اعادة اعمار جسر البغدادي الخرساني على طريق رمادي-حديثة	البغدادي	الطرق والجسور	450,251,478	قيد التنفيذ	71%	33	2/12/2018	150	16/12/2018	11/12/2018	407,976,000
25	أعادة أعمار جسر الجغيفي فوق سكة القطار/ الفلوجة	الفلوجة	الطرق والجسور	223,364,357	منجز	100%	61	11/12/2018	90	25/12/2018	20/12/2018	202,400,000
26	ترميم وصيانة مخازن عدد /٦ في سايلو الرمادي	الرمادي	مباني حكومية	670,026,855	قيد التنفيذ	97%	25	27/11/2018	120	10/12/2018	9/12/2018	607,416,000
27	هدم واعادة بناء مدرسة الدعاء/١٢ صف	الرمادي	التربية والتعليم	633,356,571	قيد التنفيذ	35%	112	20/12/2018	180	2/1/2019	2/1/2019	573,888,800
28	تاهيل الورش لاعدادية صناعة عنة	عنه	التربية والتعليم	599,035,236	قيد التنفيذ	83%	91	16/12/2018	160	30/12/2018	28/12/2018	552,765,000
29	هدم واعادة بناء مدرسة الفداء /١٢ صف	الكرمة	التربية والتعليم	601,857,861	قيد التنفيذ	70%	40	4/12/2018	180	18/12/2018	16/12/2018	581,613,500
30	هدم وإعادة بناء مدرسة المواهب للبنين ١٢ صف	راوه	التربية والتعليم	1,313,791,909	قيد التنفيذ	38%	113	20/12/2018	180	2/1/2019	10/1/2019	1,190,436,000
31	هدم وإعادة بناء مدرسة ذو البجادين للبنين ١٢ صف	راوه	التربية والتعليم			38%	113					
32	هدم وإعادة بناء مدرسة شط العرب للبنين ١٢ صف	القائم	التربية والتعليم	1,313,791,909	قيد التنفيذ	75%	109	19/12/2018	180	2/1/2019	2/1/2019	1,190,436,000
33	هدم وإعادة بناء مدرسة النهضة الشرقية للبنين ١٢ صف	القائم	التربية والتعليم			75%	109					
34	تأهيل الشقق السكنية للتدريسيين في جامعة الفلوجة	الفلوجة	التربية والتعليم	642,368,310	منجز	100%	69	13/12/2018	90	27/12/2018	27/12/2018	694,910,500
35	تأهيل قسم السدود والكهرباء جامعة الانبار	الرمادي	التربية والتعليم			100%	69					
36	هدم و اعادة بناء بناية العمادة/ المعهد التقني في الصقلاوية	الصقلاوية	التربية والتعليم	493,361,620	قيد التنفيذ	64%	66	11/12/2018	180	25/12/2018	3/1/2019	447,038,400
37	هدم وإعادة بناء مديرية شرطة الرمادي	الرمادي	الداخلية	1,103,622,462	قيد التنفيذ	50%	85	13/12/2018	180	27/12/2018	27/12/2018	858,323,200
38	تجهيز محولات كهرباء		الكهرباء	882,897,970	منجز	100%	116	23/12/2018	45	من تاريخ استلام الدفعة المقدمة	30/1/2019	691,500,000
39	ترميم بناية الردهة المشتركة في مستشفى القائم العام	القائم	الصحة		منجز	100%			60		26/12/2018	91,690,000
40	تاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء راوة مع تاهيل بناية كهرباء راوه	راوه	الكهرباء	164,185,500	منجز	100%			60		23/12/2018	142,770,000
41	تاهيل الشبكة الكهربائية في قضاء هيت	هيت	الكهرباء		منجز	100%			60			
	المجموع			15,091,192,542								14,079,304,600

مشاريع محافظة صلاح الدين

الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام ٢٠١٨ / صلاح الدين

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	اعادة تاهيل جسر الشرقاط الكونكريتي ومقترباته في محافظة صلاح الدين	الشرقاط	الطرق والجسور	5,818,388,500	قيد التنفيذ	13%	17	21/11/2018	360	4/12/2018	12/12/2018	3,948,780,000
2	هدم واعادة بناء مدرسة العلياء الابتدائية للبنات ١٢ صف		التربية	759,414,575	قيد التنفيذ	33%	54	5/12/2018	180	19/12/2018	15/1/2019	610,965,000
3	هدم واعادة بناء ثانوية جمال عبدالناصر ١٢صف		التربية	759,414,575	قيد التنفيذ	33%	43	4/12/2018	180	18/12/2018	15/1/2019	528,360,000
4	هدم واعادة بناء مدرسة المحزم الابتدائية للبنين ١٢ صف		التربية	759,414,575	قيد التنفيذ	55%	67	12/12/2018	180	26/12/2018	25/12/2018	607,200,000
5	هدم واعادة بناء ثانوية الاريج للبنات ١٢صف		التربية	759,414,575	قيد التنفيذ	22%	37	4/12/2018	180	18/12/2018	20/1/2019	573,400,000
6	اعادة تاهيل جسر البوجواري ورفع انقاض جسر سكة القطار المتضرر في قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين		الطرق والجسور	833,221,000	قيد التنفيذ	35%	20	22/11/2018	150	5/12/2018	8/12/2018	579,632,000
7	هدم واعادة بناء ثانوية بيجي للبنات ١٨ صف	بيجي	التربية	1,407,430,240	قيد التنفيذ	33%	80	13/12/2018	180	27/12/2018	20/1/2019	980,658,750
8	هدم واعادة بناء ثانوية الخضراء للبنين ١٨ صف	يثرب	التربية	1,407,430,240	قيد التنفيذ	23%	64	11/12/2018	180	25/12/2018	14/1/2019	980,788,500
9	تاهيل كهرباء محطات التوزيع الرئيسية / A - Bجامعة تكريت	تكريت	الكهرباء	1,460,095,960	قيد التنفيذ / تم توجيه كتاب حث سابقا وسيتم توجيه كتاب انذار للشركة بسبب التلكؤ	42%	106	19/12/2018	140	2/1/2019	3/1/2019	1,017,611,200
	المجموع			13,964,224,240								9,827,395,450

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام ٢٠١٨ / صلاح الدين

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	توسعة مركز صحي في الساحل الأيسر/ قضاء الشرقاط	الشرقاط	الصحة	313,640,675	قيد التنفيذ / تم توجيه كتاب حث للشركة المنفذة	20%	55	5/12/2018	150	19/12/2018	18/12/2018	284,192,000
2	هدم و اعادة بناء مديرية بلدية سليمان بيك	سليمان بيك	البلدية	509,632,546	قيد التنفيذ	96%	103	19/12/2018	120	2/1/2019	2/1/2019	467,699,000
3	أكساء شوارع متفرقة في قضاء سامراء	سامراء	البلدية	604,851,327	قيد التنفيذ	55%	49	5/12/2018	120	5/12/2018	23/12/2018	548,060,000
4	هدم و اعادة بناء مديرية بلدية يثرب	يثرب	البلدية	441,550,518	قيد التنفيذ	54%	65	11/12/2018	160	25/12/2018	24/12/2018	400,092,000
5	هدم و أعادة بناء مركز شرطة سليمان بيك	سليمان بيك	الداخلية	595,392,841	قيد التنفيذ	35%	58	11/12/2018	180	25/12/2018	27/12/2018	563,272,900
6	هدم و أعادة بناء مديرية شرطة يثرب	يثرب	الداخلية	921,286,374	قيد التنفيذ	35%	34	2/12/2018	180	16/12/2018	20/12/2018	834,784,000
7	هدم و أعادة بناء مركز شرطة المعتصم	المعتصم	الداخلية	595,392,841	قيد التنفيذ	45%	18	22/11/2018	180	5/12/2018	16/12/2018	591,548,000
8	هدم و أعادة بناء مركز شرطة دجلة	دجلة	الداخلية	595,392,841	قيد التنفيذ	79.8%	23	27/11/2018	180	10/12/2018	24/12/2018	589,857,500
9	أعادة تأهيل ٤ جسور للمحطة (٧٠٠+ +١٦) كم و المحطة (١١٥+١٧) كم على طريق تكريت - بيجي		الطرق والجسور	504,611,506	قيد التنفيذ	73%	77	13/12/2018	150	27/12/2018	26/12/2018	457,400,000
	المجموع			5,081,751,467								4,736,905,400

مشاريع محافظة كركوك

الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام ٢٠١٨ / كركوك

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	هدم واعادة بناء مدرسة الاسكندرونة ١٢صف في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	801,274,000	قيد التنفيذ	58%	15	18/11/2018	210	1/12/2018	19/11/2018	557,435,000
2	تاهيل خطوط ابراج مغذي ٣٣كف لتغذية محطة الرياض من محطة ملاعبدالله	الحويجة	الكهرباء	601,956,000	قيد التنفيذ/ توجيه حث / الانحراف بسبب تاخر فحوصات المواد	60%	22	26/11/2018	160	9/12/2018	9/12/2018	467,952,500
3	اعادة انشاء الجسر الكونكريتي على طريق (كركوك –تكريت)		الطرق والجسور	1,790,243,826	قيد التنفيذ	67%	21	26/11/2018	360	9/12/2018	6/12/2018	1,249,294,000
4	صيانة جسور باي حسن		الطرق والجسور	457,654,000	قيد التنفيذ	80%	26	27/11/2018	180	10/12/2018	9/12/2018	391,990,000
5	اعادة اعماربنايات المعهد التقني - الحويجة (بناية العمادة, المركز الثقافي, ورش تدريب الطلاب)	الحويجة	التعليم العالي	1,241,656,000	قيد التنفيذ / توجيه حث	60%	108	19/12/2018	150	2/1/2019	30/12/2018	864,570,000
6	اعادة ترميم محكمة بداءة الرياض	الرياض	وزارة العدل	443,572,250	قيد التنفيذ	38%	115	23/12/2018	150	5/1/2019	3/1/2019	362,528,000
7	اعادة انشاء بناية مركز شرطة الزاب	الزاب	الداخلية	547,518,450	متوقف/ توجيه كتب بسحب العمل بسبب تغيير موقع المشروع		121	23/12/2018	150	5/1/2019		380,882,400
8	اعادة تاهيل ثانوية الاوس في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	536,894,750	قيد التنفيذ / توجيه حث	28%	84	13/12/2018	240	27/12/2018	27/12/2019	401,301,000
9	تاهيل مشروع ماء تل علي القديم (٤٠٠) م٣/ساعة – قضاء الحويجة	الحويجة	الماء	1,034,241,000	قيد التنفيذ	73%	92	16/12/2018	180	30/12/2018	30/12/2018	706,112,001
10	إعادة اعمار محطات الدفع العالي لمشاريع ماء (غريب وشجرة) ناحية العباسي	العباسي	الماء	379,500,000	قيد التنفيذ	82%	98	18/12/2018	150	1/1/2019	30/12/2018	264,000,000
11	هدم واعادة بناء مدرسة البونجم ١٢ صف في داقوق	داقوق	التربية	801,274,000	قيد التنفيذ / توجيه حث	12%	82	13/12/2018	300	27/12/2018	27/12/2018	557,408,000
12	هدم واعادة بناء مدرسة ام البنين في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	801,274,000	قيد التنفيذ	16%	96	17/12/2018	300	31/12/2018	31/12/2018	557,410,000
13	هدم واعادة بناء مدرسة البوبتير ٦ صف في ناحية الملتقى	الملتقى	التربية	225,490,850	قيد التنفيذ / توجيه حث	24%	95	17/12/2018	200	31/12/2018	31/12/2018	325,332,000
14	هدم واعادة بناء مدرسة المرة ٦ صف في قضاء الحويجة	الحويجة	التربية	225,490,850	قيد التنفيذ / توجيه حث	20%	95					
15	صيانة الشارع الرابط بين كيوان وناحية الملتقى	الملتقى	الطرق والجسور	402,500,000	منجز	100%	143	31/12/2018	60	14/1/2018	10/1/2019	280,000,000
16	إعادة اكساء الطريق الرابط بين ناحية الرياض وقضاء الحويجة	الرياض	الطرق والجسور	396,750,000	منجز	100%	128	27/12/2018	60	9/1/2019		286,350,000
	المجموع			10,687,289,976								7,652,564,901

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام ٢٠١٨ / كركوك

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	نسبة الإنجاز المخطط	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تبديل رمل و حصى للفلاتر لمشروع ماء الحويجة الحديث	الحويجة	الماء	499,058,077	منجز	100%	100%			60		27/12/2018	162,250,000
2	تاهيل مجمع ماء جديدة السادة	الحويجة	الماء		منجز	100%	100%						
3	هدم واعادة بناء مركز الدفاع المدني في قضاء الحويجة	الحويجة	الداخلية	590,882,998	قيد التنفيذ / توجيه كتاب حث/ أسباب الحيود ١- تأخر تحريات التربة ٢- شدة الامطار	25%	64%	93	16/12/2018	180	30/12/2018	30/12/2018	535,403,200
4	تجهيز مضخات لمحطات الماء في المناطق المحررة/ الحويجة	الحويجة	الماء	406,133,066	منجز بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٩	100%	100%	94	17/12/2018	50	31/12/2018	31/12/2018	368,000,004
5	هدم واعادة بناء مركز شرطة الرياض	الرياض	الداخلية	420,350,372	قيد التنفيذ	70%	67%	11	4/11/2018	180	18/11/2018	18/11/2018	380,882,400
6	هدم واعادة بناء مركز شرطة الرشاد	الرشاد	الداخلية	420,350,372	قيد التنفيذ	66%	60%	10	4/11/2018	180	18/11/2018	16/12/2018	380,882,400
7	تجهيز مولدات لمشاريع الماء في المناطق المحررة / كركوك		الماء	604,785,109	منجز	100%	100%	142	31/12/2018	60		31/1/2019	748,500,000
8	هدم وإعادة بناء بناية بلدية مجاري ناحية الرياض	الرياض	البلدية	380,200,587	قيد التنفيذ /تم توجيه كتاب حث/ التاخر بسبب تغيير تصاميم الأساس حسب تقرير فحص التربة	10%	75%	81	13/12/2018	150	27/12/2018	26/12/2018	344,502,400
9	هدم وإعادة بناء بناية بلدية مجاري ناحية الزاب	الحويجة	البلدية			10%	75%	81					
10	تاهيل سايلو حبوب في قضاء الحويجة	الحويجة	التجارة	584,340,216	قيد التنفيذ	65%	50%	78	13/12/2018	183	27/12/2018	26/12/2018	576,140,000
11	تاهيل سايلو حبوب في ناحية الرياض	الرياض	التجارة			65%	50%	78					
12	رفع الصبات الكونكريتية / سدة كركوك الحديثة		الطرق والجسور	250,000,000	لم ينفذ / تم تحويله الى خطة عام ٢٠١٩					25			70,800,000
	المجموع			4,156,100,798									3,567,360,404

مشاريع محافظة ديالى

Diyala Governorate Projects

الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام ٢٠١٨ / ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	نسبة الإنجاز المخطط	نسبة الانحراف	اسم الشركة المنفذة	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تبليط واكساء شوارع متفرقة في مركز قضاء الخالص	الخالص	الطرق والجسور	1,375,336,960	منجز	100%	100%	0%	سيف الملوك	14	14/11/2018	90	28/11/2018	21/11/2018	1,009,317,500
2	تجهيز مواد ومعدات لصيانة الشبكة الكهرباء في ناحية العظيم	العظيم	الكهرباء	799,655,375	قيد التنفيذ / امر غيار	95%	100%	-5%	بركة القطيف	60	11/12/2018	60	25/12/2018	28/1/2019	631,352,500
3	صيانة واكساء وتثبيت اكتاف طريق الصدور - ناحية المنصورية بطول ١٣,٥٠٠ كم		الطرق والجسور	1,303,900,000	قيد التنفيذ	45%	85%	-40%	الحميدية	97	18/12/2018	120	1/1/2019	2/1/2019	908,000,000
4	هدم واعادة بناء مدرسة شجرة اليقطين ١٢ صف في جلولاء	جلولاء	التربية	799,489,200	قيد التنفيذ	68%	68%		جبال الشمال	123	26/12/2018	180	8/1/2019	4/2/2019	540,411,500
5	اعادة تاهيل طريق قرية الجيل بطول ٤كم في ناحية بهرز باعتبار المحطة (صفر+صفر) هي الشارع الرئيسي لطريق بعقوبة - النهروان	بعقوبة	الطرق والجسور	558,670,000	متوقف بسبب مرور الاليات	45%	90%	-45%	اسكي بان	119	23/12/2018	120	5/1/2019	8/1/2019	404,240,000
6	اعادة تأهيل طرق (الزركانية - العودة - سفيط - دراويش) مع الطريق الفرعي لقرية الزركانية في الخالص من المحطة (صفر + صفر) سيطرة الجيش الى (٣+١٠٠)	الخالص	الطرق والجسور	402,028,500	قيد التنفيذ	60%	90%		ديالى الخير	120	23/12/2018	90	5/1/2019	23/1/2019	308,040,000
7	صيانة واكساء الطريق الرابط لقرى الجيل الصاعد بطول ٦كم من المحطة (صفر+صفر)الى (٦+صفر) /ناحية بهرز	بهرز	الطرق والجسور	752,100,000	منجز	100%	100%		سيف الملوك	139	31/12/2018	100	14/1/2019	14/1/2019	518,640,000
8	إعادة تاهيل طريق التحويلة والقرى المحاذية لها		الطرق والجسور	1,020,395,000	منجز	100%	100%	0%	ركن الشارقة وشريكها حضارة التصاميم	137	30/12/2018	120	13/1/2019	13/1/2019	709,840,000
9	هدم واعدة بناء روضة اطفال السعدية النموذجية	السعدية	التربية	533,000,000	قيد التنفيذ	56%	63%	-7%	سما الجبال	133	30/12/2018	180	13/1/2019	17/1/2019	426,670,000
10	صيانة واكساء وتبليط لقرى بلدروز (قرية عتبة ٧,٥ كم وقرية طعيمات ١,٥ كم) مقاطعة ١٧	بلدروز	الطرق	1,289,840,000	منجز	100%	100%		رياض الفراتين	4	20/6/2018	120	3/7/2018	3/7/2018	921,260,000
11	اكساء شوارع متفرقة في مركز ناحية قرة تبة و قصبتها القديمة		الطرق	460,000,000	منجز	100%	100%		نور السنا	9	28/10/2018	60	10/11/2018	25/11/2018	320,000,000
12	تبليط شارع ام العظام العثمانية / بعقوبة بطول ٢,١٥ كم	بعقوبة	الطرق	291,669,000	منجز	100%	100%		قوس الخليج	5	25/6/2018	75	3/7/2018	19/7/2018	227,020,000
13	تبليط شوارع بطول ١١,٨ كم لقرى خان بني سعد / بعقوبه / ربيع عطشانه / وعلي الهادي والشيماء	بعقوبة	الطرق	229,936,000	منجز	100%	100%		نبض الرافدين	6	25/6/2018	30	8/7/2018	19/7/2018	185,040,000
14	تأهيل الشارع رقم ٢١ المار ضمن المحلة ٣١١ و ٣١٣ بطول ١,٤ كم للمقطع مابين المستوصف الصحي القديم واستدارة دور الجاهزة في حي التحرير / بعقوبة	بعقوبة	الطرق	228,620,000	منجز	100%	100%		سيف الملوك	1	5/6/2018	100	19/6/2018	20/6/2018	195,720,000
15	تبليط الشارع الرئيسي داخل حدود بلدية السلام بطول ٥٥٠ م	السلام	الطرق	145,475,000	منجز	100%	100%	0%	اسكي بان	53	5/12/2018	75	19/12/2018	13/1/2019	96,184,000
16	تأهيل انارة شوارع ناحية كنعان في ديالى	بعقوبة	الكهرباء	142,791,000	منجز	100%	100%		طريق التبر	3	7/6/2018	45	21/6/2018	21/6/2018	111,220,000
	المجموع			10,332,906,035											7,512,955,500

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام ٢٠١٨ / ديالى

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	نسبة الإنجاز المخطط	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تبليط طرق في قضاء بلدروز	بلدروز	البلدية	514,000,000	قيد التنفيذ	55%	100%	129	27/12/2018	90	9/1/2019	28/1/2019	448,757,500
2	اكساء الشوارع الرئيسية - هبهب		البلدية	454,192,000	منجز	100%	100%	24	27/11/2018	90	10/12/2018	27/12/2018	390,168,001
3	صيانة واكساء طريق جيزاني الجول-الخالص	الخالص	الطرق	243,000,000	تنفيذ امانة / منجز	100%	100%			45		24/12/2018	216,000,000
4	صيانة جسر بعقوبة الثالث		الطرق	277,783,000	قيد التنفيذ	75%	100%	31	29/11/2018	90	12/12/2018	11/12/2018	193,240,000
5	صيانة و اكساء مدخل قرية الزهيرات بطول ٣ كم / ابو صيدا		الطرق	322,000,000	متوقف / تم توجيه انذار للشركة المنفذة	15%	100%	48	5/12/2018	60	19/12/2018	3/1/2019	257,600,000
6	صيانة واكساء و تثبيت اكتاف طريق قرة تبة/ ناحية جبارة		الطرق	997,500,000	منجز	100%	100%	32	2/12/2018	90	16/12/2018	16/12/2018	692,320,014
7	تبليط طريق ناحية السلام		الطرق	539,000,000	قيد التنفيذ	80%	80%	59	11/12/2018	120	25/12/2018	9/1/2019	412,320,000
8	تجهيز مواد لتاهيل شبكة كهرباء احياء (الرمادية-الحرية-الجزيرة-النضال-ابو الدهن)	المقدادية	الكهرباء	665,000,000	منجز	100%	100%						579,004,500
	أ- تجهيز قابلوات واسلاك كهربائية / كهرباء المقدادية	المقدادية	الكهرباء		منجز	100%	100%	107	19/12/2018	30	من تاريخ استلام الدفعة المقدمة	9/1/2019	87,796,000
	ب- تجهيز محولات كهرباء / كهرباء المقدادية	المقدادية	الكهرباء		منجز	100%	100%	118	23/12/2018	45	من تاريخ استلام الدفعة المقدمة	21/1/2019	184,000,000
9	تبديل الخط الناقل المغذي من محطة تقوية ماء سيف سعد الى هبهب قطر ٣١٥ ملم	الخالص	الماء	215,000,000	تنفيذ امانة /منجز	100%	100%			45		26/12/2018	167,800,000
10	تجهيز و نصب مجمع ماء الشاخة في قضاء المقدادية	المقدادية	الماء	201,841,905	تنفيذ امانة /منجز	100%	100%			60		30/12/2018	159,237,700
11	تاهيل مجمع ماء الشهيد غازي سعة ١٠٠ م٣/ساعة مع تنفيذ خط ناقل سعة ٢٥٠ ملم		الماء	736,856,000	قيد التنفيذ	67%	100%	27	29/11/2018	120	11/12/2018	9/12/2018	559,663,000
12	هدم و اعادة بناء مدرسة الرابطة (٦) صف	خانقين	التربية	282,485,500	تنفيذ امانة / قيد التنفيذ	93%	58%			60		26/12/2018	239,487,000
13	تجهيز مولدة لمستشفى جلولاء		الصحة	97,000,000	منجز	100%	100%	141				31/1/2019	96,755,000
14	تبليط طريق كشكول الصغير و الكبير		الطرق	442,200,000	قيد التنفيذ	56%	100%	86	13/12/2018	90	27/12/2018	16/1/2019	386,900,000
15	هدم وإعادة بناء مدرسة ابن الهيثم ١٢ صف	الخالص	التربية	1,300,000,000	قيد التنفيذ	5%	20%	79	13/12/2018	180	27/12/2018		1,097,486,000
16	هدم وإعادة بناء مدرسة الاصالة ١٢ صف	الخالص	التربية		قيد التنفيذ	30%	30%	79				4/2/2019	
17	تاهيل مجمع ماء السادة سعة ٢٠٠م٣/ساعة	بعقوبة	الماء	226,680,000	تنفيذ امانة / قيد التنفيذ	100%	100%			60		30/12/2018	221,429,100
18	هدم وإعادة بناء السياج الخارجي لمدرسة اعدادية مندلي	مندلي	التربية	82,000,000	تنفيذ امانة / منجز	100%	100%			40		24/12/2018	75,125,000
	المجموع			7,596,538,405									6,465,088,815

مشاريع محافظة بابل

	الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام ٢٠١٨ / شمال بابل											
ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	صيانة طريق مسيب – جرف النصر على اعتبار المحطة (صفر+صفر) تقاطع التحرير	جرف النصر	الطرق والجسور	2,860,369,360	باشر بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٠ بعد التوقف / قيد التنفيذ	25%	68	12/12/2018	150	26/12/2018		2,000,259,000
	المجموع			2,860,369,360								2,000,259,000

Baghdad Governorate Projects

الخطة الاستثمارية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام ٢٠١٨ / حزام بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	نسبة الإنجاز المخطط	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	هدم واعادة بناء مدرسة بن غازي الابتدائية ١٨ صف	الطارمية	التربية	1,207,253,080	قيد التنفيذ	16%	15%	102	19/12/2018	240	2/1/2019	27/12/2018	840,178,000
2	هدم واعادة بناء مدرسة ابن النفيس الابتدائية ١٨ صف	المشاهدة	التربية	1,207,253,080	قيد التنفيذ	36%	35%	127	26/12/2018	240	8/1/2019	8/1/2019	840,177,600
	المجموع			2,414,506,160									1,680,355,600

الخطة التشغيلية لمشاريع صندوق إعادة الاعمار للموازنة الفيدرالية لعام ٢٠١٨ / حزام بغداد

ت	اسم المشروع	الناحية او القضاء	القطاع	الكلفة التخمينية	حالة المشروع	نسبة الإنجاز الفني	رقم العقد	تاريخ العقد	مدة العقد / يوم	تاريخ المباشرة العقدي	تاريخ المباشرة الفعلي	كلفة العقد الأصلي
1	تاهيل خط كهرباء (٣٣ كي في) محطة الصمود/ مستودعات نفط المشاهدة	المشاهدة	الكهرباء	512,502,848	منجز	100%	57	9/12/2018	120	23/12/2018	23/12/2018	507,471,500
2	ايصال الماء الصافي الى قرية المزرفة في التاجي		الماء	99,800,000	تنفيذ امانة / متوقف بسبب مشاكل فنية	55%			25		21/10/2018	99,800,000
3	مجمع ماء الحركاوي الجنوبي سعة ٢٠٠م٣/س	اليوسفية	الماء	792,511,290	منجز	100%	70	13/12/2018	120	27/12/2018	27/12/2018	718,103,100
4	تأهيل مجمع ماء عودة المفرجي سعة ٢٠٠م٣/س	اليوسفية	الماء			100%	70					
5	تأهيل مجمع ماء هور ابو فاضل سعة ٢٠٠م٣/س	اليوسفية	الماء			100%	70					
6	تبليط الشارع الرئيسي في حي الجزائر/ قضاء المحمودية	المحمودية	الطرق والجسور	230,270,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45		24/12/2018	205,980,000
7	تاهيل خطوط تغذية الشبكة الكهربائية لمناطق الزيدان دوليبة/ قضاء ابو غريب		الكهرباء	561,344,763	قيد التنفيذ	70%	63	11/12/2018	60	25/12/2018	25/12/2018	508,638,400
8	انشاء كرفان دار مبيت اطباء سبع البور		الصحة	17,437,235	لجنة مشتريات / منجز	100%						19,750,000
9	إعادة تاهيل طريق الشاحنات / سيطرة بغداد - كوت	الرستمية	الداخلية	249,485,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			50		23/12/2018	200,332,000
10	إعادة تاهيل طريق الشاحنات / سيطرة بغداد - الشعب	الشعب	الداخلية	248,676,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			50		23/12/2018	199,704,000
11	تاهيل طريق قرية البوذياب واطراف الحماميات	التاجي	البلدية	250,000,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45		24/12/2018	210,000,000
12	تاهيل طريق حنون	الشعب	البلدية	262,075,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45		24/12/2018	229,915,000
13	تاهيل طريق السدة المحاذي لنهر دجلة / جسر ذراع دجلة لغاية جامع نور المصطفى / مقاطعة مزرفة وحصيوة	التاجي	البلدية	286,350,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45		24/12/2018	240,900,000
14	ترميم ابنية مدرسية (مدرسة الامام الصادق وعظماء العرب)	النهروان	التربية	73,200,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			45		27/12/2018	73,200,000
15	توسعة مقر الصندوق		مباني حكومية	500,000,000	تنفيذ امانة / منجز	100%			60		27/12/2018	250,000,000
16	توسعة القسم الهندسي / مقر الصندوق		مباني حكومية	50,000,000	لجنة مشتريات / منجز	100%			60			50,000,000
	المجموع			4,133,652,136								3,513,794,000

مشاريع المنح والقروض التي يعمل الصندوق كمشرف ومنسق لها

ملخص تخصيصات المنح والقروض ٢٠١٥ - ٢٠١٨

المنح	التخصيص	الملزم	المصروف	المخطط	القروض	التخصيص	الملزم	المصروف	غير ملزم
المنحة الجيكية	$458,000	0	0	$458,000	قرض البنك الدولي- مشروع التنمية الطارئ -EODP	$350,000,000	$257,949,000	$179,611,777	$92,690,699
المنحة الكويتية	$100,000,000	0	0	$100,000,000	قرض البنك الدولي- التنمية الطارئ الاضافي EODP/AF	$400,000,000	$0	$0	$400,000,000
المنحة الصينية	$9,000,000		$9,000,000		قرض الالماني - برنامج العاجل - M URE ١٣٥	$550,000,000	$55,615,472	$0	$494,384,528
					قرض الالماني - المرحلة الثانية- أ- M URE ١٤٠			$0	
					قرض الالماني - المرحلة الثانية- ب- M URE ٢٢٥			$0	
المجموع	$109,458,000	$0	$9,000,000	$100,458,000		$1,300,000,000	$313,564,472	$179,611,777	$987,075,227

مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي

EODP

قرض البنك الدولي- $350 - EODP

المحافظة	القطاع	التخصيص(م. دولار)	المخطط	المصروف (م. دولار)	المصروف %	الملزم (م. دولار)	الملزم %	غير ملزم	ملاحظات
نينوى , الانبار , صلاح الدين, ديالى	الكهرباء (٣٠ مشروع منها ٣ استشاري) ٢٨ مشروع منجز و ٢ مستمر	$70,000,000	$70,000,000	$63,158,096.04	92%	68,809,243.52	98%		
الانبار , صلاح الدين , ديالى	البلدية و البلديات(٤٥ مشروع) عدد مشاريع الاشغال المنجزة ٨ مشاريع و المستمرة ١٢ مشروع اما بخصوص التجهيزات فعدد المشاريع المنجزة ١٧مشروع و المستمرة ٨	$62,000,000	$62,000,000	$32,750,864.02	53%	61,297,920.56	99%		
نينوى (٣ جسور), الانبار (٩ جسور) , صلاح الدين (٥ جسور & ٥ طرق) , ديالى(٦ طرق & ٦ جسور), حزام بغداد (١ جسور)	الطرق و الجسور (٣٥ مشروع) عدد المشاريع المنجزة ٢٢ مشروع و المستمرة ١٣	$137,000,000	$137,000,000	$84,421,174.09	62%	115,072,556.71	84%		
صلاح الدين (١٣ سيارة اسعاف & ٥ عيادات متنقلة) + ديالى (٢٦ سيارة اسعاف & ٩ عيادات متنقلة)	الصحة + المباني (٣ مشاريع) عدد سيارات الاسعافات ٣٩ و ١٤ سيارات متنقلة	42,000,000	42,000,000	$10,078,886.92	56.00%	10,088,942.86	56%		
سليمانية	موارد مائية (تعديل القرض)- قيد التحضير - تم ادراج ٨ مشاريع من ضمن ١٨ مشروع	30,000,000	30,000,000	-	0%	-	0%		
المجموع الجزئي		$341,000,000	$311,000,000	$190,409,021.07		$255,268,663.65	75%		
صندوق اعادة الاعمار		$9,200,000	$9,200,000	$2,079,936.02	23%	4,948,916.49	54%		
رسوم				$875,000.00		-			
المجموع الكلي		350,000,000	350,000,000	$193,363,957.09	55%	$260,217,580.14	74%		

قرض البنك الدولي- الاضافي ٤٠٠ $

المحافظة	القطاع	التخصيص(م. دولار)	المخطط	المصروف (م. دولار)	المصروف %	الملزم (م. دولار)	الملزم %	غير ملزم	ملاحظات
صلاح الدين, نينوى, الانبار, كركوك	الكهرباء	$50,000,000	$50,000,000	0	0%	0	0%		
صلاح الدين, نينوى, الانبار, كركوك	البلدية و البلديات	$45,000,000	$45,000,000	0	0%	0	0%		
صلاح الدين, نينوى, الانبار, كركوك	الطرق و الجسور	$110,000,000	$110,000,000	0	0%	0	0%		
صلاح الدين, نينوى, الانبار, كركوك	الزراعة	$32,000,000	$32,000,000	0	0%	0	0%		
صلاح الدين, نينوى, الانبار	النقل	$5,000,000	$5,000,000	0	0%	0	0%		
صلاح الدين, نينوى, الانبار	التربية	$35,000,000	$35,000,000	0	0%	0	0%		
صلاح الدين, نينوى , الانبار, كركوك	موارد مائية	$32,000,000	$32,000,000	0	0%	0	0%		
(صلاح الدين , الانبار , نينوى, ديالى)	المكون العاشر (محافظات) و تشمل (صلاح الدين =١٠, ديالى =١٠, نينوى=٢٠, الانبار= ٢٠)	$60,000,000	$60,000,000	0	0%	0	0%		
المجموع الجزئي		$369,000,000	$369,000,000	0	0%	0	0%		
رسوم		$1,000,000	$1,000,000	0	0%	0	0%		
احتياط		$30,000,000	$30,000,000	0	0%	0	0%		
المجموع الكلي		$400,000,000	$400,000,000	0	0%	0	0%		

قرض الالماني - برنامج العاجل ١٣٥ مليون يورو

المحافظة	القطاع	التخصيص (م. يورو)	المخطط	المصروف (م. يورو)	المصروف %	الملزم (م. يورو)	الملزم %	غير ملزم	ملاحظات
نينوى	الكهرباء	45,000,000	45,000,000	3,470,767.80	8%	27.69	61%		
نينوى	البلدية و البلديات	45,000,000	45,000,000	0	0%	0	0%		
نينوى	الطرق و الجسور	45,000,000	45,000,000	0	0%	0	0%		
المجموع الجزئي		ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	0	0%	0	0%		
الاحتياط		ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	0	0%	0	0%		
المجموع الكلي		135000000	135000000	3,470,767.80	8%	27.69	0%		

قرض الالماني - برنامج العاجل المرحلة الثانية-أ ١٤٠ مليون يورو

المحافظة	القطاع	التخصيص (م. يورو)	المخطط	المصروف (م. يورو)	المصروف %	الملزم	الملزم %	غير ملزم	ملاحظات
نينوى, صلاح الدين , الانبار	الكهرباء	140,000,000	140,000,000	0	0%	0	0%		قيد الاعلان
المجموع الجزئي		ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	0	0%	0	0%		
الاحتياط		ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	0	0%	0	0%		
المجموع الكلي		140,000,000	140,000,000	0	0%	0	0%		

قرض الالماني - برنامج العاجل المرحلة الثانية-ب ٢٢٥ مليون يورو

المحافظة	القطاع	التخصيص (م. يورو)	المخطط	المصروف (م. يورو)	المصروف %	الملزم	الملزم %	غير ملزم	ملاحظات
بغداد , صلاح الدين , الانبار	الصحة	90,000,000	90,000,000	0	0%	0	0%		
ليتم تعبئتها	البلدية و البلديات	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	0	0%	0	0%		
ليتم تعبئتها	الطرق و الجسور	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	0	0%	0	0%		
المجموع الجزئي		ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	0	0%	0	0%		
الاحتياط		ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	0	0%	0	0%		
المجموع الكلي		135,000,000	135,000,000	0	0%	0	0%		

قرض البنك التنمية الاسلامي٢٥٠ مليون دولار تم تخصيص ١١٩ مليون للقطاعات التالية:									
المحافظة	القطاع	التخصيص(م. دولار)	المخطط	المصروف (م. دولار)	المصروف %	الملزم (م. دولار)	الملزم %	غير ملزم	ملاحظات
الانبار و صلاح الدين - ٢٠١٩	صحة	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	0	0%	0	0%		
الانبار -٢٠١٩	مياه	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	0	0%	0	0%		
كركوك -٢٠١٩	تعليم تقني	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	0	0%	0	0%		
صلاح الدين و الانبار -٢٠٢٠	زراعة	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	0	0%	0	0%		
نينوى و الانبار -٢٠٢٠	تعليم عالي	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	0	0%	0	0%		
صلاح الدين -٢٠٢١	تعليم عالي	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	0	0%	0	0%		
بابل -٢٠٢١	طرق	ليتم تعبئتها	ليتم تعبئتها	0	0%	0	0%		
المجموع الجزئي				0	0%	0	0%		
رسوم				0	0%	0	0%		
احتياط				0	0%	0	0%		
المجموع الكلي				0	0%	0	0%		
المنحة الجيكية - ٤٥٨ الف دولار									
المحافظة	القطاع	التخصيص (دولار)	المخطط	المصروف (دولار)	المصروف %	الملزم (دولار)	الملزم %	غير ملزم	ملاحظات
نينوى(قضاء الحمدانية)	الصحة	277,800	277,800	0	0%	0	0%		
نينوى(قضاء الحمدانية)	الكهرباء	180,200	180,200	0	0%	0	0%		
المجموع الجزئي		458,000	458,000	0	0%	0	0%		
الاحتياط				0	0%	0	0%		
المجموع الكلي		458,000	458,000	0	0%	0	0%		

المنحة الكويتية - المرحلة الاولى ١٥ مليون دولار									
المحافظة	القطاع	التخصيص(م. دولار)	المخطط	المصروف (م. دولار)	المصروف %	الملزم (م. دولار)	الملزم %	غير ملزم	ملاحظات
الانبار (٨)	الصحة	$ 6,021,418.00	$ 6,021,418.00	0	0%	0	0%		
ديالى (١)		$ 1,238,817.00	$ 1,238,817.00	0	0%	0	0%		
صلاح الدين (٥)		$ 2,696,863.00	$ 2,696,863.00	0	0%	0	0%		
نينوى (٤)		$ 3,024,093.00	$ 3,024,093.00	0	0%	0	0%		
شمال بابل (١)		$ 415,638.00	$ 415,638.00	0	0%	0	0%		
المجموع الجزئي		$ 13,396,829.00	$ 13,396,829.00	0	0%	0	0%		
رسوم		$ 560,000.00	$ 560,000.00	0	0%	0	0%		
احتياط		$ 440,000.00	$ 440,000.00	0	0%	0	0%		
المجموع الكلي		$ 14,396,829.00	$ 14,396,829.00	0	0%	0	0%		

المنحة الكويتية - المرحلة الثانية ٨٥ مليون دولار									
المحافظة	القطاع	التخصيص(م. دولار)	المخطط	المصروف (م. دولار)	المصروف %	الملزم (م. دولار)	الملزم %	غير ملزم	ملاحظات
الانبار(٦)	الصحة	$ 28,153,489.00	$ 28,153,489.00	0	0%	0	0%		
ديالى (٥)		$ 7,162,400.00	$ 7,162,400.00	0	0%	0	0%		
صلاح الدين (١١)		$ 8,146,164.00	$ 8,146,164.00	0	0%	0	0%		
نينوى (٢)		$ 29,193,225.00	$ 29,193,225.00	0	0%	0	0%		
كركوك (٧)		$ 2,868,384.00	$ 2,868,384.00	0	0%	0	0%		
شمال بابل (١)		$ 476,338.00	$ 476,338.00	0	0%	0	0%		
المجموع الجزئي		$ 76,000,000.00	$ 76,000,000.00	0	0%	0	0%		
رسوم		5,000,000	5,000,000	0	0%	0	0%		
احتياط		4,000,000	4,000,000	0	0%	0	0%		
المجموع الكلي		$ 85,000,000.00	$ 85,000,000.00	0	0%	0	0%		

مشاريع المنحة الصينية عدد الاليات 118 بمبلغ ستون يوان صيني او ٩,٠٠٠,٠٠٠ $					
قطاع البلديات					
المحافظة	القطاع	عدد المشاريع الكلية	مشاريع المنجزة	مشاريع قيد الانجاز	عدد المستفيدين
نينوى	تجهيز اليات	36	36		
الانبار	تجهيز اليات	36	36		
صلاح الدين	تجهيز اليات	18	18		
ديالى	تجهيز اليات	11	11		
كركوك	تجهيز اليات	9	9		
بغداد	تجهيز اليات	7	7		
بابل	تجهيز اليات	1	1		
المجموع		118	118		

منحة البنك الاسلامي للتنمية ٥ مليون دولار

المحافظة	القطاع	التخصيص (دولار)	المخطط	المصروف (دولار)	المصروف %	الملزم (دولار)	الملزم %	غير ملزم	ملاحظات
صلاح الدين (١)	مياه - ٢٠١٩	1.2	1.2	0	0%	0	0%		
الانبار (١)	صرف صحي - ٢٠٢٠	1.2	1.2	0	0%	0	0%		
بغداد (١)	مياه- ٢٠٢١	2.5	2.5	0	0%	0	0%		
المجموع الجزئي		4.9	4.9	0	0%	0	0%		
احتياط		0.1	0.1	0	0%	0	0%		
المجموع الكلي		5	5	0	0%	0	0%		

منحة الهند ٤٩٤ الف دولار

المحافظة	القطاع	التخصيص (دولار)	المخطط	المصروف (دولار)	المصروف %	الملزم (دولار)	الملزم %	غير ملزم	ملاحظات
نينوى/ سنجار	ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات	ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات		0	0%	0	0%		
نينوى/ سنجار	ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات	ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات		0	0%	0	0%		
نينوى/ سنجار	ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات	ليتم تعبئتها فور وصول المعلومات		0	0%	0	0%		
المجموع الجزئي				0	0%	0	0%		
احتياط				0	0%	0	0%		
المجموع الكلي				0	0%	0	0%		

جسر عمر بن عبد العزيز / الرمادي / الأنبار

إعادة تأهيل جسر شيشين \ صلاح الدين

تجهيز محطات متنقلة للمحافظات

تجهيز اليات تخصصية للمحافظات المحررة

٤٢,٥ كم شارع نفط خانة - منديلي

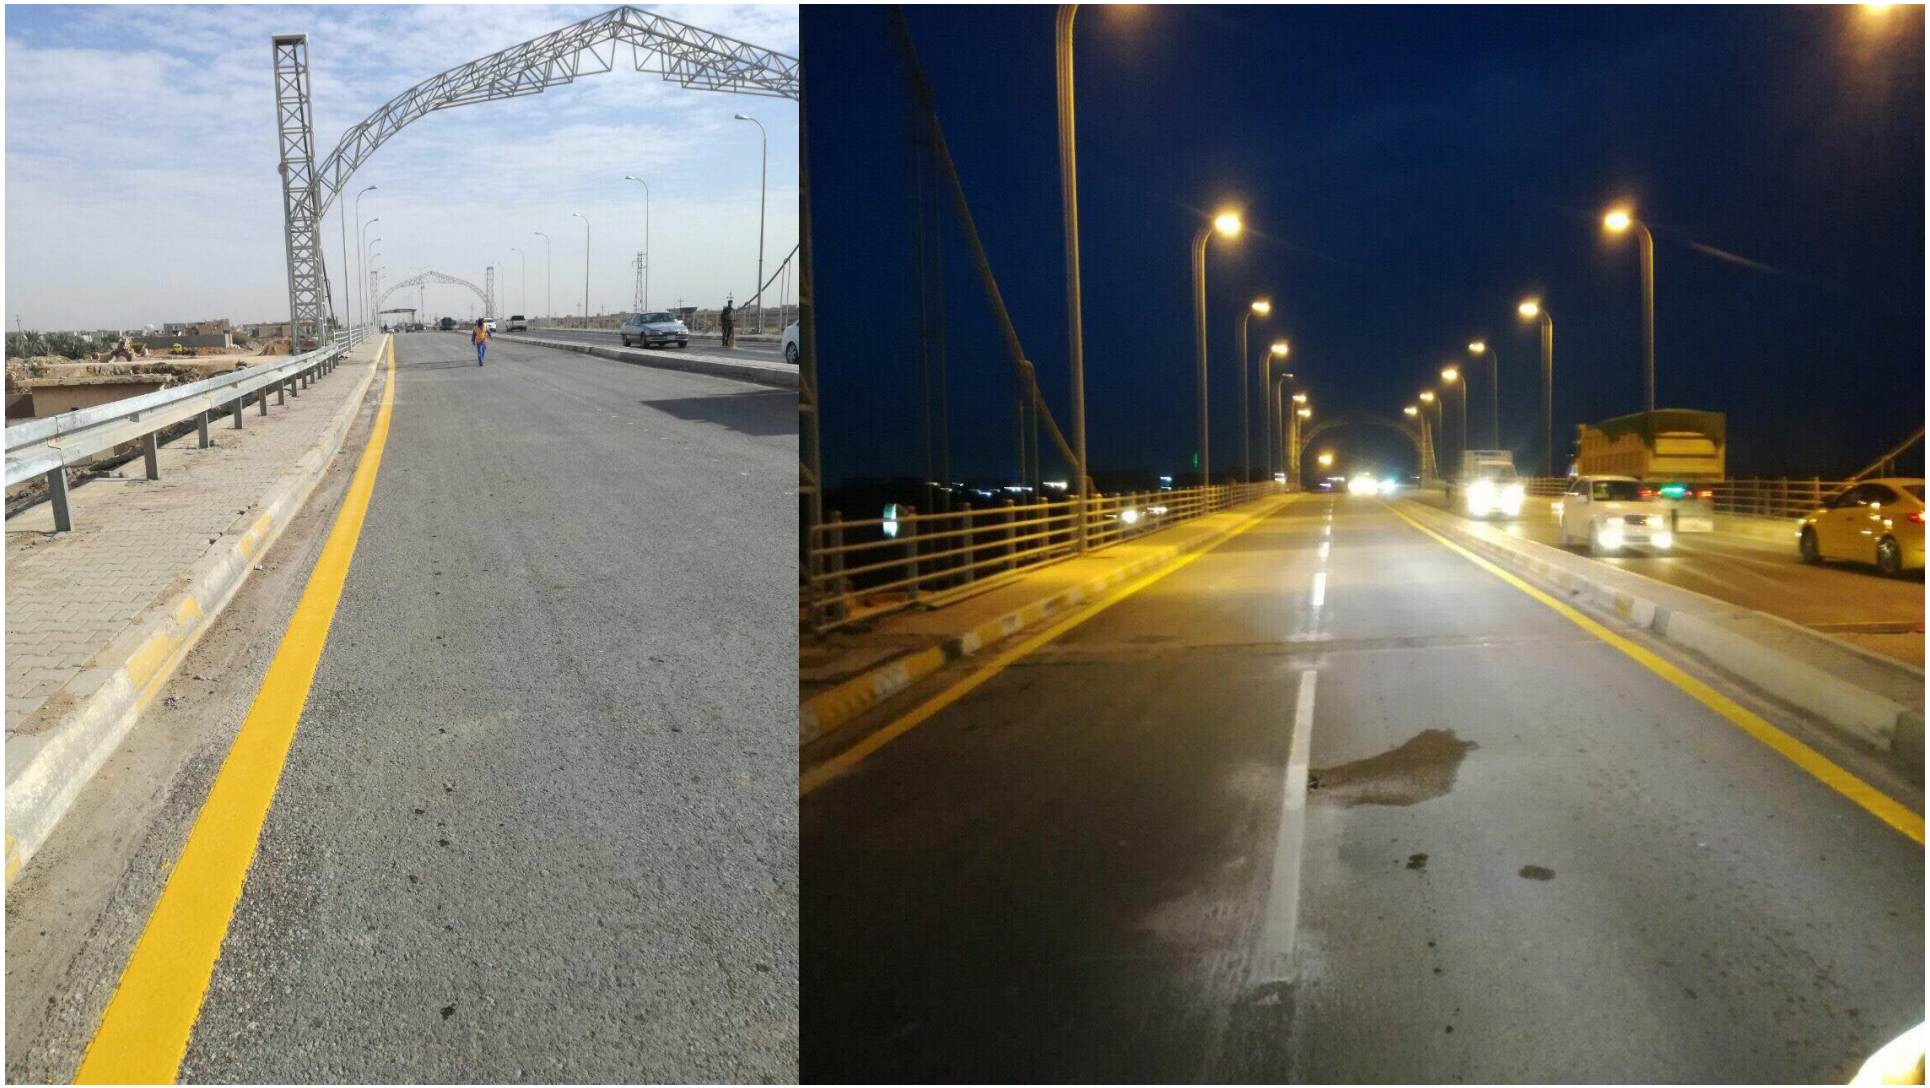

إعادة تأهيل جسر القاسم ومقاربه

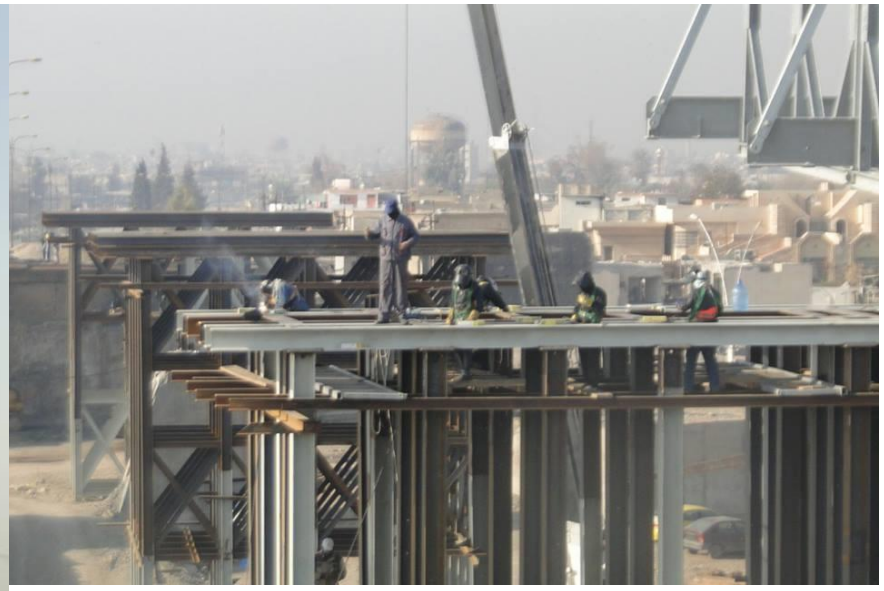

حل مؤقت لجسر الموصل الرابع

תודה
Dankie
Gracias
Спасибо
شكرًا
Merci
Takk
Köszönjük
Terima kasih
Grazie
Dziękujemy
Dėkojame
Ďakujeme
Vielen Dank
Paldies
Kiitos
Täname teid
谢谢
Thank You
Tak
感謝您
Obrigado
Teşekkür Ederiz
감사합니다
Σας ευχαριστούμε
ขอบคุณ
Bedankt
Děkujeme vám
ありがとうございます
Tack
